


Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2006

INTRODUCCION


La Inversión Pública Nacional comprende todas aquellas erogaciones que realiza la Administración Nacional destinadas a la adquisición de bienes que incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

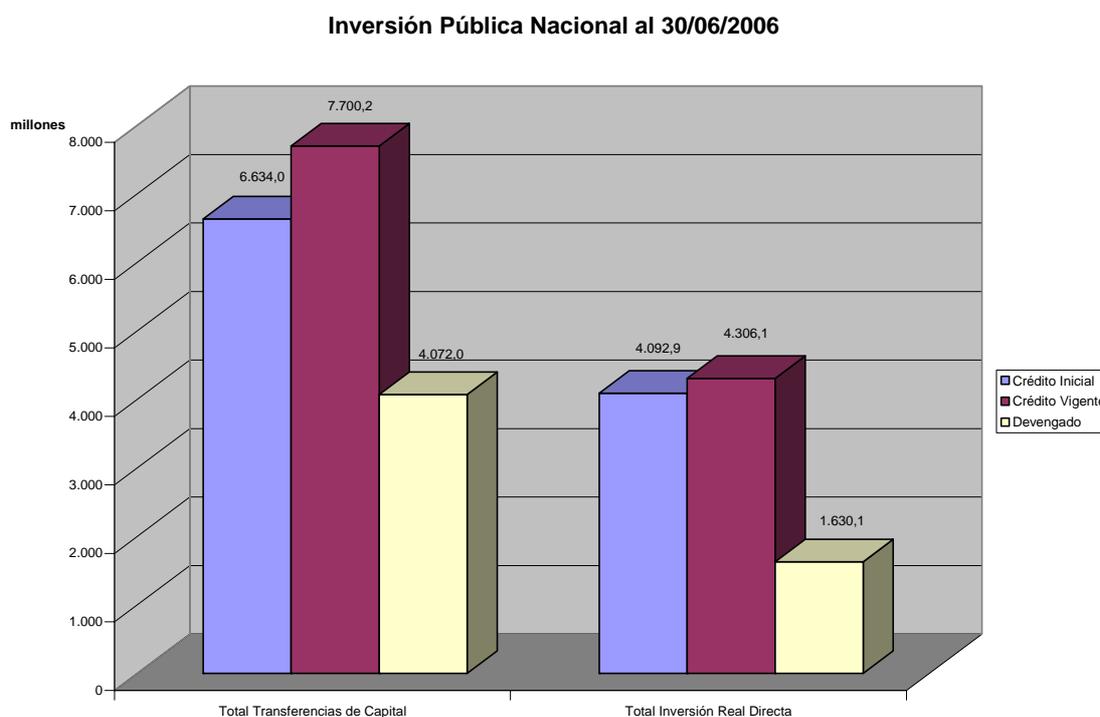

La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. La IRD tuvo un crédito inicial de 4.092,9 millones de pesos en el ejercicio 2006, que se incrementó en 213,2 millones de pesos al cierre del primer semestre (+5,2%). Los proyectos de inversión, principal componente de la Inversión Real Directa, dispusieron al 30/06/2006 de una asignación de 3.583,4 millones de pesos; mientras que para Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso se contó con un crédito de 722,8 millones de pesos.


Los proyectos de inversión incluyen los gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 3.583,4 millones de pesos asignados a este fin, 3.459,8 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de 1.437,2 millones de pesos al cierre del primer semestre), 47,5 millones de pesos a maquinarias y equipos y 55,8 millones de pesos a servicios no personales, con una ejecución de 17,9 y 30,1 millones de pesos respectivamente.

La Inversión Real Directa incluye también Adquisiciones de Bienes de Capital, categoría que puede desagregarse de la siguiente forma: 584,7 millones de pesos a maquinarias y equipos con una ejecución de 127,7 millones de pesos; 72,3 a edificios e instalaciones con una ejecución de 277 mil pesos y 46,2 a activos intangibles con una ejecución de 5,7 millones de pesos.

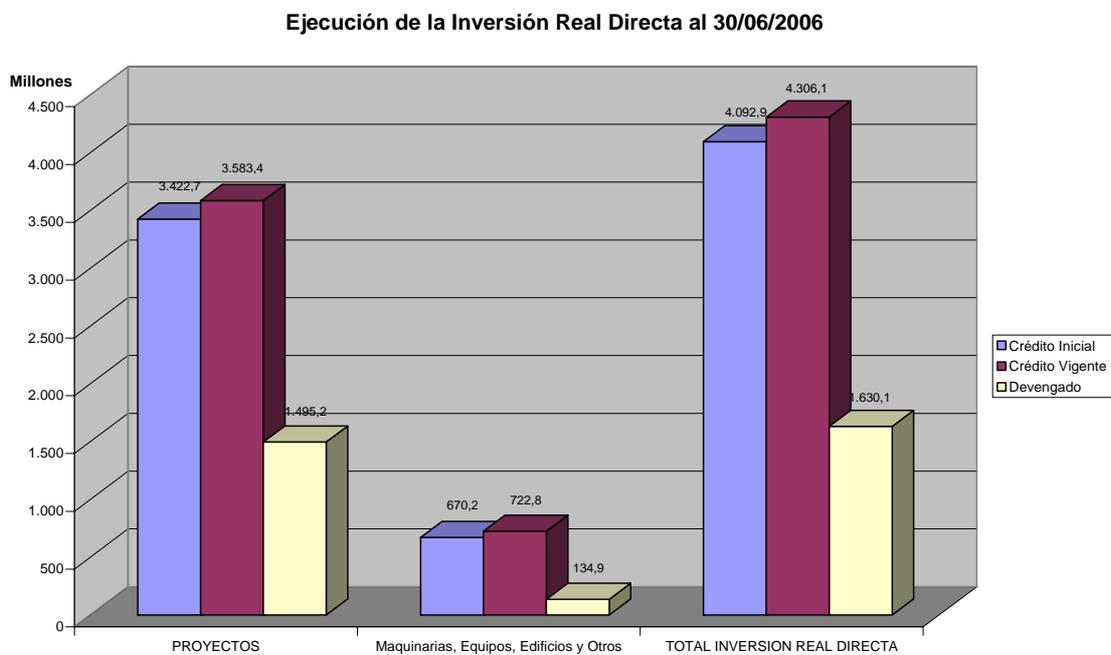

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 7.700,2 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del primer semestre del ejercicio fue de 4.072,0 millones de pesos.

Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2006

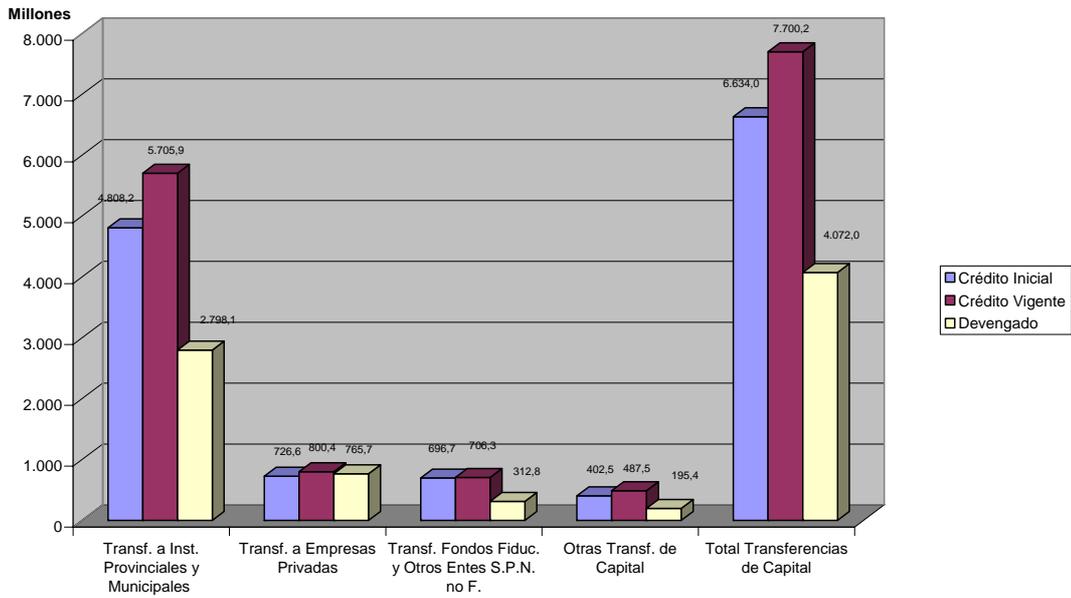


Respecto a las transferencias de capital, 2.798,1 millones de pesos del crédito devengado al 30/06/2006 (68,7% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, 765,7 millones de pesos (18,8% del total) fueron transferencias a empresas privadas y 312,8 millones de pesos (7,7% del total) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2006

Durante el primer semestre de 2006 la ejecución de la inversión real directa alcanzó a 1.630,1 millones de pesos, lo que implica un incremento de 60% respecto a igual período del año anterior. Este aumento entre semestres, sin embargo, es inferior al observado en años anteriores: si se compara el primer semestre de 2005 respecto al mismo período de 2004 el aumento alcanzó al 105%; y este último año respecto al ejercicio 2003 en 129%. El incremento acumulado de la inversión real directa, entre al primer semestre 03 y el primer semestre 06 fue en consecuencia de 751,2%.

Inversión Real Directa- Devengado 1º Semestre

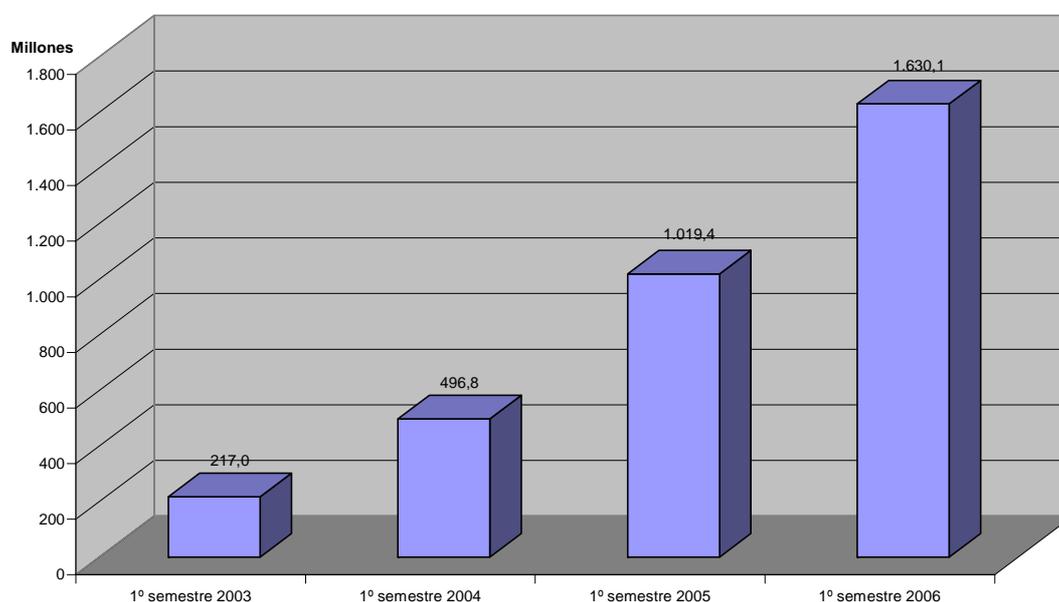

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la Inversión Real Directa durante el primer semestre de 2006 se incrementó en 213,2 millones de pesos de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el Cuadro N°1.

Cuadro N°1

Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/2006
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	1.247.802.356	1.262.734.745	263.658.170	20,9%
Organismos Descentralizados	2.819.844.659	3.015.132.164	1.361.940.546	45,2%
Instituciones de Seguridad Social	25.254.000	28.254.000	4.495.928	15,9%
TOTAL	4.092.901.015	4.306.120.909	1.630.094.644	37,9%


El crédito asignado originalmente a los proyectos de inversión, por su parte, registró un aumento de 160,7 millones de pesos (+4,7%) al cierre del primer semestre de 2006, mientras que el gasto en adquisición de bienes de uso aumentó en 52,5 millones de pesos (+7,8%).

En la Administración Central, los servicios que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con 137,3 millones de pesos, Estado Mayor General del Ejército con 26,9 millones de pesos y Policía Federal Argentina con 25,6 millones de pesos.

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad con 1.210,7 millones de pesos. También resultó relevante la inversión realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, con 52,0 millones de pesos, el Organo de Control de Concesiones Viales con 44,8 millones de pesos y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 26,2 millones de pesos.

2-Según Fuente de Financiamiento

El financiamiento de la Inversión Real Directa proveniente del Tesoro Nacional aumentó considerablemente durante el primer semestre del ejercicio 2006 respecto al mismo período del 2005; mientras que en el presente ejercicio alcanzó al 50,3% del total de la inversión, en el primer semestre del 2005 fue del 36,7% del total. Por su parte, las transferencias internas pasaron a financiar el 30,2% de la Inversión Real Directa frente al 45,1% que alcanzaban al primer semestre de 2005.

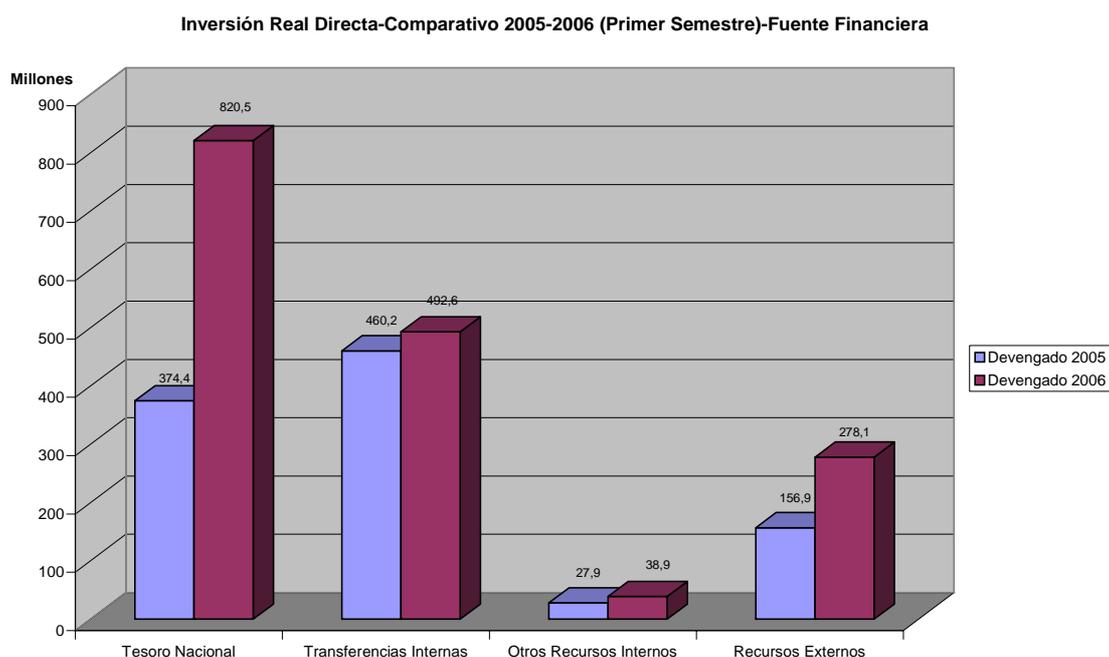

Al cierre del primer semestre de 2006 el aumento de los recursos del Tesoro Nacional respecto a 2005 fue de 446,1 millones de pesos (+119,1%). Por su parte, el financiamiento externo se incrementó en 121,2 millones de pesos (+77,3%), las transferencias internas en 32,4 millones de pesos (+7,0%) y los otros recursos internos en 11,0 millones de pesos (+39,4%).

Cuadro N°2
Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/2006


FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	1.669.596.510	1.867.936.984	820.527.760	43,9 %
Transferencias Internas	1.009.911.000	1.010.050.300	492.557.845	48,8 %
Otros Recursos Internos	392.722.842	401.132.351	38.924.410	9,7 %
Financiamiento Externo	1.020.670.663	1.027.001.274	278.084.629	27,1%
TOTAL	4.092.901.015	4.306.120.909	1.630.094.644	37,9%

De los 820,5 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional ejecutados al cierre del primer semestre de 2006, 518,4 millones de pesos financiaron la inversión en la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 96,8; 398,5 y 21,5 millones de pesos, respectivamente), 47,3 millones de pesos el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II, 21,0 millones de pesos el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula, 10,3 millones de pesos el proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal y 9,6 millones de pesos el Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El Tesoro Nacional, también, financió la inversión en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por 52,0 millones de pesos, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por 26,2 millones de pesos, en la Policía Federal Argentina por 25,3 millones de pesos, en el Estado Mayor General del Ejército por 22,3 millones de pesos y en el Organismo de Control de las Concesiones Viales por 20,2 millones de pesos.

Respecto a la ejecución de la Inversión Real Directa con fuente de financiamiento Transferencias Internas, se incluyen los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organismo de Control de Concesiones Viales que recibieron con transferencias provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 465,1 millones de pesos y 24,5 millones de pesos, respectivamente.

La fuente de financiamiento externa se concentró en los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad: el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 192,0 millones de pesos y el programa Construcciones con 35,2 millones de pesos, y en menor medida, el financiamiento otorgado al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires (Préstamo BIRF 4163/AR Etapa II) por 29,4 millones de pesos y para la Construcción Alteo Terraplén Viaducto La Picasa por 6,5 millones de pesos.

Inversión Real Directa- Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/06/2006

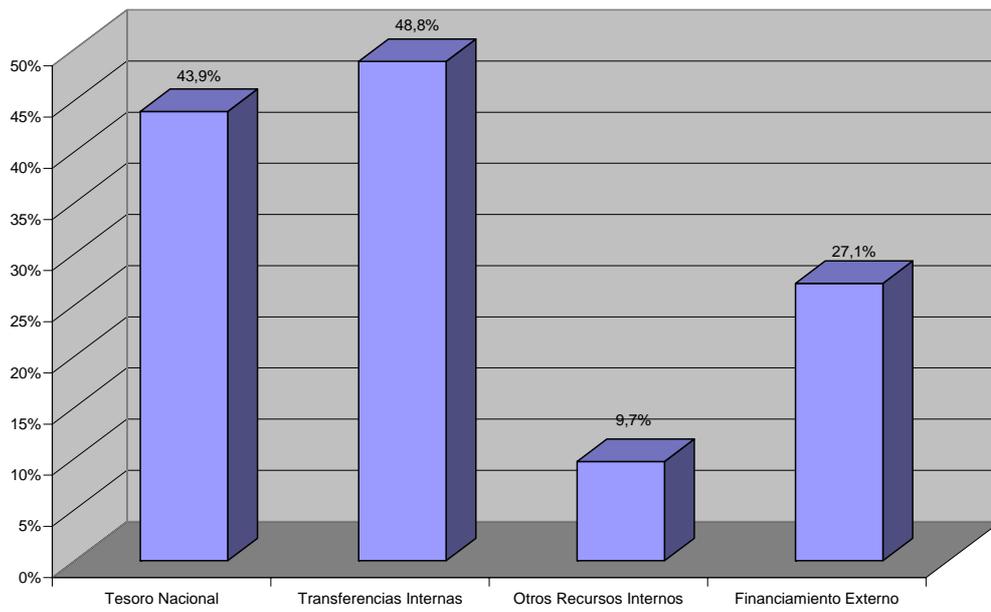

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa se concentró, aproximadamente, en un 65% en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chubut y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los 244,0 millones de pesos incluyendo, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por 152,4 millones de pesos, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento por 23,4 millones de pesos y del Organo de Control de Concesiones Viales por 18,2 millones de pesos. Además, son importantes los proyectos Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal y Hospital El Cruce Florencio Varela por 10,3 y 9,6 millones de pesos, respectivamente.

La ciudad de Buenos Aires tuvo una inversión de 250,1 millones de pesos; principalmente destinados al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 76,7 millones de pesos. En este caso, en algunas inversiones los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

En la provincia de Santa Cruz se invirtieron 182,0 millones de pesos (11,2% de inversión sobre el total ejecutado), los que se aplicaron, principalmente, en construcciones viales (173,8 millones de pesos).

En cuanto a la provincia de Córdoba la inversión se concentró, fundamentalmente, a construcciones de rutas por 157,7 millones de pesos; destacándose los montos devengados en la R.N.Nº9 Autopista Rosario Córdoba por 130,1 millones de pesos y R.N.Nº 9 Villa María por 20,3 millones de pesos.

En la provincia de Santa Fe, los principales proyectos en ejecución corresponden a construcciones viales por 61,1 millones de pesos y a proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) por 8,9 millones de pesos.

Respecto a la provincia de Mendoza la inversión se concentró en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y por el Organo de Control de Concesiones Viales por 50,4 y 13,6 millones de pesos, respectivamente.

En la provincia de Chubut la inversión se dirigió, principalmente, a financiar los proyectos de los programas Contratos de Recuperación y Mantenimiento (mallas viales) y


construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad por 32,8 millones de pesos y 17,1 millones de pesos, respectivamente.

Teniendo en cuenta los datos del Censo Poblacional del año 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la extensión territorial de cada jurisdicción se construyó el indicador de gasto de inversión real directa según densidad poblacional (habitante/km²).

El indicador de inversión real directa según densidad poblacional surge de la fórmula:

$$= \text{Inversión Real Directa} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \text{habitantes} / \text{Km}^2$$

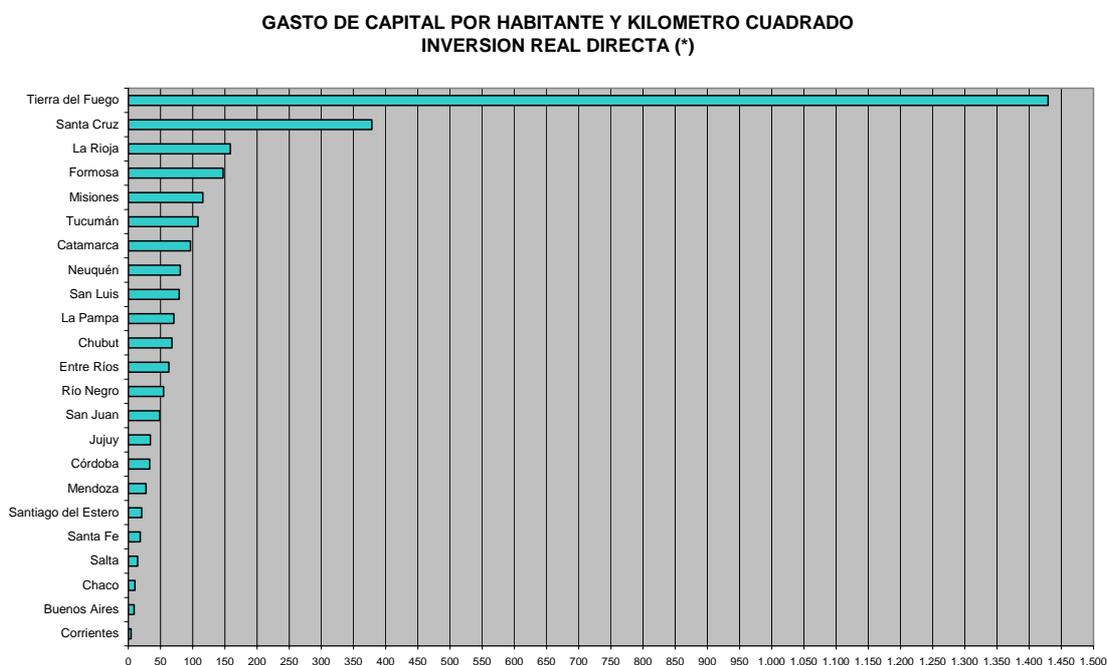

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala

De acuerdo a este indicador la Ciudad de Buenos Aires, con la menor extensión geográfica y la isla de Tierra del Fuego con la menor cantidad de habitantes presentan los valores más elevados. Por su parte, la provincia de Corrientes tiene el menor valor seguido por Buenos Aires, provincia que posee el mayor número de habitantes y la mayor extensión geográfica.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este capítulo se hace referencia a la ejecución física de los proyectos de inversión. Para ello se tomó un subconjunto que representa al cierre del primer semestre el 83,5% de la ejecución total. Cabe destacar que los proyectos mencionados tienen gran relevancia económica y un importante impacto social.

Servicio Administrativo	Proyecto	Crédito Devengado al 30/06/2006	% s/total Inversión Real Directa
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Construcciones de Rutas	722.483.002	44,32%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento	389.798.268	23,91%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Mantenimiento de Rutas	96.856.222	5,94%
Secretaría de Transporte	Transporte Urbano de Buenos Aires	76.022.117	4,66%
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	20.974.060	1,29%*
CONAE	Misiones Satelitales	19.922.100	1,22%
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	9.641.139	0,59%
Secretaría Obras Públicas	Aliviador Holmberg-Villa Martelli	7.542.664	0,46%
Estado Mayor Gral.Armada	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	7.020.400	0,43%
CONAE	Infraestructura Terrestre	5.448.984	0,33%
Estado Mayor Gral.Armada	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	3.862.951	0,24%
CNEA	Instalaciones para Aplicaciones Médicas de la Radiación Fase II	772.444	0,05%
CNEA	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase I	367.506	0,02%
Estado Mayor Gral.Armada	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	208.263	0,01%
CNEA	Residuos Radiactivos de Baja Actividad Fase II	194.655	0,01%
CNEA	Construcción de Instalaciones del Ciclo del Combustible (Cerro Solo)	154.727	0,01%
Subtotal		1.361.269.502	83,51%
Total Inversión Real Directa		1.630.094.644	100,00%

(*) se realizó un anticipo financiero, las obras se iniciarán a fines de julio 2006

Administración Central

Ministerio de Defensa

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

Se continuó con las construcciones referentes al traslado de las diversas dependencias educativas del organismo, como así también con los trabajos en la Fragata Libertad.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

La mayor ejecución comprendió al Aliviador Holmberg – Villa Martelli, una obra del proyecto Desagües Pluviales que está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López. Al cierre del primer semestre devengó 7,5 millones de pesos.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El Hospital Interzonal El Cruce, de Florencio Varela, es un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorio externo.

El programa médico asistencial que se propone ha sido diseñado como un establecimiento polivalente de agudos con posibilidad de dar respuesta a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondiente al 3° nivel de atención de salud, de la población de su área programática: los distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.

Al primer semestre del ejercicio devengó 9,6 millones de pesos.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires registró al primer semestre del ejercicio una ejecución física del 16,8%, devengando 77,1 millones de pesos.

Se continuaron con los trabajos de modernización de líneas subterráneas y en distintas líneas ferroviarias, como así también diversas obras de paso a diferente nivel.

Programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y Vías Navegables

El puerto de Caleta Paula se encuentra ubicado próximo a la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

Este proyecto comprende la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste en un frente de 160 mts. medidos en sentido Norte-Sur, y una longitud de 150 mts. medidos en sentido Este-Oeste, y una obra de control de deriva litoral en lado sur del acceso al puerto.

Durante el primer semestre del ejercicio devengó 20,9 millones de pesos.

Organismos Descentralizados

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE continuó durante el primer semestre del ejercicio, con su plan de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014. Para ello trabaja asociada a la contratista INVAP S.E, quien se encarga de la construcción de los satélites del Plan, como así también de las pruebas de ensayo. La CONAE también cuenta con el apoyo de otros entes del Sistema Científico Tecnológico, que cooperan en diferentes desarrollos como son (Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba). También se continuó con la adaptación de los satélites a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias). Con un acuerdo entre CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-B	Científico	USA/Brasil/Italia
SAC-A	Tecnológico	USA
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

**Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)**

En el primer semestre del ejercicio 2006, se trabajó en las líneas: seguir fortaleciendo las áreas de exploración de yacimientos como así también preparar la infraestructura para la explotación que servirá para el abastecimiento de las centrales con uranio nacional. Con este fin profundizó en la exploración de Cerro Solo. También se continuó la línea de investigación aplicada en reactores nucleares, para su utilización nacional y para su exportación como reactores de alta tecnología.

En cuanto a las Centrales Nucleares se está avanzando en los desarrollos y la investigación aplicada vinculados a la construcción de las nuevas centrales.

En cuanto a los proyectos relacionados a residuos radiactivos se avanzó en los componentes de seguridad de los de baja actividad y se continúan los desarrollos para el tratamiento de los de alta.

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de los 38.336 kilómetros de la red vial nacional. Para este fin se han establecido diferentes sistemas de gestión, que obedecen al nivel de tránsito de las rutas

COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM) COMPARATIVO AL II TRIMESTRE 2005/2006

SISTEMA	Ejec. Año 2005- al II	Ejec. Año 2006- al II
	Trimestre	Trimestre
Longitud total de la red	38.336	38.336
Concesión	8.799	8.895
Red Accesos a ciudad Buenos Aires - R.A.B.A.	236	290
Red Accesos a ciudad Córdoba – R.A.C.	270	276
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.	8.229	9.275
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.169	7.303
Sistema Km./Mes	195	195
Sistema Modular	1.611	1.855
Obras (Construcciones)	2.544	4.364
Mantenimiento Administración Propia	8.427	5.257

A continuación se detalla el avance físico al 30 de junio para cada modalidad operativa:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el segundo trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 5.257 kilómetros. Se efectuaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros no incorporados a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

-Mantenimiento de Rutas por Contrato

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el segundo trimestre, incluyen la ejecución de trabajos en 1.855 kilómetros. Comprenden los siguientes tramos:

Provincia	Ruta	Tramo	km
Salta	R.N.Nº34	Empalme R.N.Nº50-Lte.Bolivia/Pluma de Pato	259
	81	Empalme R.N.Nº34	
Chubut	R.N.Nº25	Los Altares-Empalme R.N.N.º40	277,6

Salta	R.N.Nº16	Límite con Chaco-Empalme Rutas Nacionales Nº9 y 34	204,4
Catamarca	R.N.Nº 60	Tinogasta-Límite con Chile	254,2
Chubut	R.N.Nº40S	Empalme R.N.Nº25-Empalme R.P.Nº56 (Río Senguer)	289,1
Chaco	R.N.Nº16	Empalme R.N.Nº95-Límite con Chaco-Salta	326,6
Mendoza	R.N.Nº 40S	Pareditas-Malargüe	229,6
Santa Fe	A007	Av. B. Parera-A Nivel R.N.Nº 11-Calle J. Garay	14,4

-Mantenimiento de Rutas por Convenio con Provincias

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.303 al segundo trimestre.

-Señalamiento de Rutas

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron trabajos en 3.247 kilómetros.

-Obras de Emergencia

Las obras de emergencia realizadas, al cierre del segundo trimestre, comprendieron trabajos menores de 5 kilómetros.

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años. La fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008.

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

En cuanto a los Pasos Fronterizos y Corredores de Integración, al cierre del segundo trimestre del ejercicio, están en ejecución los tramos Malargüe – Barrancas (Secciones I y II) en la R.N.Nº40 con 36 kilómetros, R.N.N.º14 Gualeguaychú - Paso de los Libres (Intersección Empalme R.P.Nº16 – Intersección Empalme R.P.Nº20) con 18,2 kilómetros y R.N.Nº 40 Río Agua Clara km 809-El Eje km 847, con 38 kilómetros (Catamarca).

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizó el tramo R.N.Nº98 Vera-Tostado (Km. 77- Km 123,4) en la provincia de Santa Fe con 46,4 kilómetros y R.N.Nº25 Puente sobre Río Chubut y acceso a Rawson con 140 metros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos R.N.Nº7 Construcción de Cobertizos en Uspallata - Límite c/Chile en provincia de Mendoza con 500 metros, R.N.Nº7 San Martín-Mendoza-Acceso Este ciudad de Mendoza con 3,2 kilómetros, Acceso a Ranchos desde R.P.Nº29 con 1,87 kilómetros, R.N.Nº3 Laguna Khami-Rancho Hambre con 25 kilómetros y rehabilitaciones varias en el territorio nacional en 33 kilómetros.

-Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

El Mejoramiento y Reconstrucción en puentes comprende trabajos de reparación de obnques en puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas con 1.200 metros y puente sobre Río Gallegos en el tramo Río Gallegos - Güer Aike con 90 metros.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprenden la finalización de los siguientes tramos R.N.Nº34 - CVNº 5 - Obra Nº 25 – Empalme R.P.Nº 65 - Empalme R.P.Nº 66 / Sección km 86 - km 129 con 43 kilómetros y R.N.Nº34 - CVNº 5 - Obra Nº 20 – Empalme 2º Circunvalación de Rosario – R.P.Nº 65 / Sección km 13,95 - km 66 con 52,1 kilómetros, ambos en la provincia de Santa Fe.

Están en obra al cierre del segundo trimestre 4.346 kilómetros (508 kilómetros corresponden a obras por convenios con provincias, 2.474 kilómetros a obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 92 kilómetros a obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 14 kilómetros en obras de emergencia en ejecución y 1.290 metros en mejoramiento y reconstrucción en puentes. Asimismo, están en ejecución 745 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 107 A – Chubut	124,5
Malla 107 B – Chubut	140,7
Malla 111 – Neuquén	134,7
Malla 113 – Chubut	201,2
Malla 114 - Río Negro	141,9
Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
Malla 201 B - Buenos Aires	104,8
Malla 206 - Buenos Aires	167,1
Malla 208 - Buenos Aires	258,3
Malla 211 - Buenos Aires	139,9

Malla 401 A - Salta – Tucumán	142,3
Malla 401 B – Salta	114,8
Malla 405 A - Chaco – Sgo. del Estero	178,6
Malla 501 – Corrientes	144,6
Malla 502 - Entre Ríos	271,4
Malla 506 - Entre Ríos	259,2
Malla 508 – Chaco	222,3
Malla 510 - Entre Ríos	173,0
Malla 512 A – Corrientes	84,3
Malla 512 B – Corrientes	113,5
TOTAL	3.301

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzan a 2.283,4 kilómetros. Las mallas en ejecución son los siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	138
Malla 116 B - La Pampa	113,9
Malla 117 A - La Pampa	111,3
Malla 117 B - La Pampa	158,3
Malla 123 B - Río Negro	145,2
Malla 131 - Neuquén	104,5
Malla 202 A - Santa Fe	27,9
Malla 202 B - Santa Fe	95,7
Malla 215 - Buenos Aires	69,2
Malla 216 A - Buenos Aires	72,7
Malla 216 B - Buenos Aires	71,9
Malla 306 - San Juan	313,8
Malla 314 - Mendoza/San Luis	161,5
Malla 338 - Formosa	171,0
Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	114,6
Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	166,7
Malla 408 C - Catamarca	171,9
Malla 409 A - Tucumán	75,3
TOTAL	2.283,4

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzan 3.690,6 kilómetros y son las siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 102 A - Chubut	250,4
Malla 102 B - Chubut	230,4

Malla 103 - Río Negro	163,8
Malla 104 - La Pampa	128,5
Malla 108 A - Río Negro	146,5
Malla 109 - Neuquén	291,2
Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	334
Malla 301 - San Luis	253,8
Malla 302 - San Juan	286,1
Malla 312 - Mendoza	223,3
Malla 332 - San Juan	105,3
Malla 402 A - Sgo. del Estero	96,7
Malla 402 B - Santiago del Estero	120,9
Malla 404 - Jujuy - Salta	148,8
Malla 407- Sgo del Estero – Catamarca - Tucumán	151,9
Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	127,9
Malla 509 - Entre Ríos	151,8
Malla 513 A - Entre Ríos	90,3
Malla 513 B - Entre Ríos	99,9
Malla 606 - Chubut	159,7
TOTAL	3.690,6

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2006

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/2006
(en pesos)


NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	6.535.377.116	7.439.623.967	3.948.063.552	53,1 %
Organismos Descentralizados	98.573.462	260.532.455	123.933.424	47,6 %
TOTAL	6.633.950.578	7.700.156.422	4.071.996.976	52,9 %

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias para la formulación y ejecución de la política energética (932,4 millones de pesos), para acciones de Planes Federales de Vivienda (908,9 millones de pesos), las transferencias realizadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires conforme la Ley N° 24.621 (650,0 millones de pesos), para el Fondo Nacional de la Vivienda (317,5 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (198,0 millones de pesos), Trenes de Buenos Aires S.A. (110,7 millones de pesos), Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (86,1 millones de pesos), a Metrovías S.A. (84,7 millones de pesos), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (75,0 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (71,6 millones de pesos), a gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social (65,4 millones de pesos), para atención de emergencias por inundaciones (61,9 millones de pesos), Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (40,0 millones de pesos), Acciones sobre Emergencia Habitacional (30,4 millones de pesos), Extensión del Proyecto de Protección Social (Préstamo BIRF 7157-AR (30,7 millones de pesos) y la Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos). También fueron importantes las transferencias para infraestructura y equipamiento efectuadas por el Ministerio de Educación (26,3 millones de pesos) y para el Ente Binacional Yacyretá (18,6 millones de pesos).

En cuanto a los organismos descentralizados, las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad para construcción de rutas por convenio con provincias (71,1 millones de pesos) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para obras de saneamiento (39,4 millones de pesos).

Transferencias de Capital - Devengado 1º Semestre

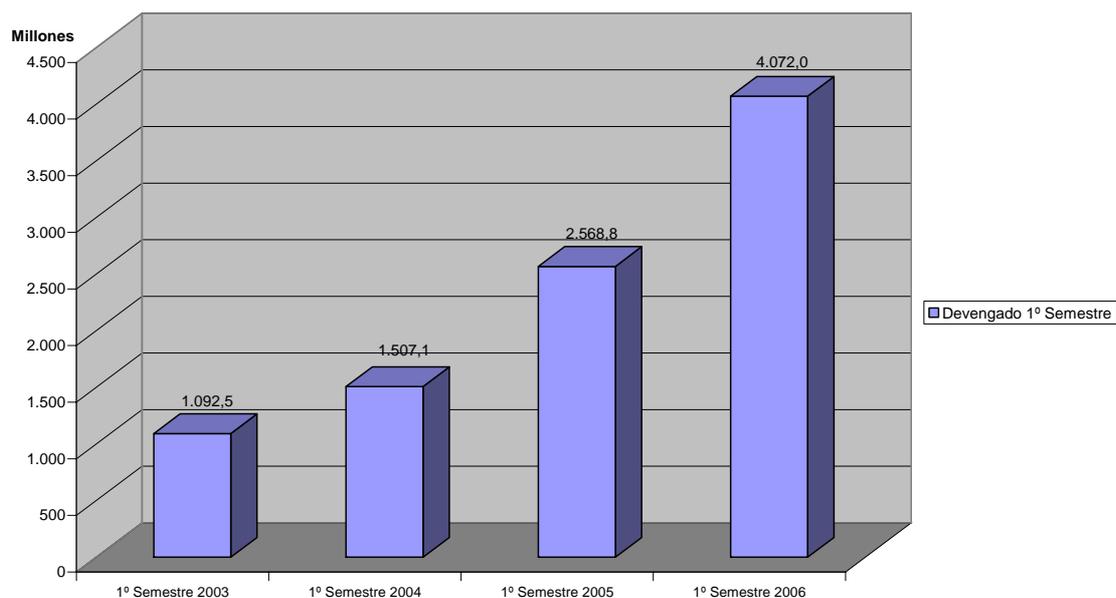

Al igual que en la inversión real directa, las transferencias de capital tuvieron un importante aumento nominal desde el año 2003, según se observa en el gráfico anterior. Las transferencias de capital al cierre del primer semestre de 2006 tuvieron un aumento de 1.503,2 millones de pesos, respecto al mismo período de 2005 (+58,5%). Si se compara el primer semestre de 2006 respecto al primer semestre de 2003 el incremento en las transferencias alcanza a 372,7%.


2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 30/06/2006
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	4.166.695.230	5.228.096.797	2.452.358.239	46,9 %
Recursos con Afectación Específica	1.925.862.000	1.765.778.855	1.259.636.140	71,3 %
Otros recursos internos	29.698.494	194.563.716	174.131.468	89,5 %
Financiamiento Externo	511.694.4	511.717.054	185.871.129	36,3 %
TOTAL	6.633.950.578	7.700.156.422	4.071.996.976	52,9 %

Desde el punto de vista de la clasificación del gasto por fuente de financiamiento los recursos del tesoro nacional financiaron el 60,2% de las transferencias. Este subconjunto comprende, fundamentalmente, las transferencias para Planes Federales de Vivienda (909,0 millones de pesos), para formulación y ejecución de la política energética a agentes privados (350,0 millones de pesos), Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal (312,8 millones de pesos), para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario (247,9 millones de pesos; principalmente a Trenes de Buenos Aires S.A. y Metrovías), para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (75,0 millones de pesos), transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad para obras por convenio con provincias (71,1 millones de

pesos), Asistencia Financiera para Infraestructura Social en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (65,4 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios (44,1 millones de pesos), la Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (40,0 millones de pesos), para acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (39,4 millones de pesos), Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos) y para equipamiento e infraestructura escolar (25,7 millones de pesos).

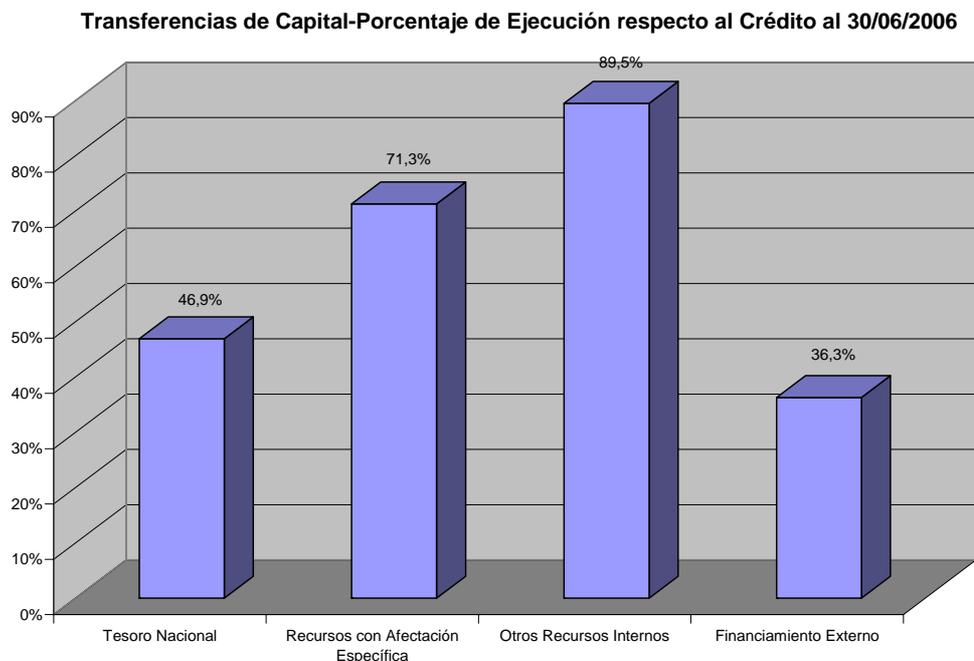

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 30,9% por recursos con afectación específica. Comprenden, principalmente, las destinadas a infraestructura básica y social (a la Provincia de Buenos Aires por 650,0 millones de pesos), las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda (314,2 millones de pesos), al Fondo Vial (198,0 millones de pesos) y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI (91,7 millones de pesos).

El crédito interno financió transferencias al sector privado dentro del programa de Ejecución de Políticas Energéticas (163 millones de pesos).

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para Atención de Emergencias para Inundaciones (49,6 millones de pesos), para acciones de “Más Escuelas, Mejor Educación” (46,7 millones de pesos), para el programa Mejoramiento Barrial -PROMEBA (27,5 millones de pesos), la Extensión del Proyecto de Protección Social (Préstamo BIRF 7157-AR) (23,9 millones de pesos) y para Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado usado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (9,9 millones de pesos).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital, al cierre del primer semestre de 2006, se concentraron, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Santa Fe. Estas cuatro jurisdicciones registraron alrededor del 60% del total de las transferencias realizadas al cierre del primer semestre de 2006.

Las transferencias de capital realizadas en la provincia de Buenos Aires (30,9% del total) comprenden, sobre todo, la Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial (Fondo del Conurbano Bonaerense) por 650,0 millones de pesos, las transferencias realizadas por los Planes Federales de Vivienda por 367,1 millones de pesos, otras obras que gestiona la Subsecretaría de Obras Públicas por 58,7 millones de pesos, transferencias del Fondo Nacional de la Vivienda por 45,8 millones de pesos, acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" por 30,4 millones de pesos y las realizadas para Desarrollo Vial por 26,5 millones de pesos.


En el caso de las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad de Buenos Aires (21,0% del total) debe considerarse que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios. Las transferencias se destinaron para formulación de la política energética por 517,8 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 247,9 millones de pesos, para el programa de mejoramiento de barrios por 20,8 millones de pesos, para Desarrollo Urbano por 16,5 millones de pesos y para el Plan Jefes de Hogar por 12,7 millones de pesos.

Respecto a las transferencias realizadas a la provincia de Santa Cruz (4,8% del total) incluye las realizadas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio por 75,0 millones de pesos, para Obras Viales por convenio con la provincia de Santa Cruz por 42,1 millones de pesos, para Planes Federales de Vivienda por 31,5 millones de pesos y para Fondo Nacional de la Vivienda por 10,1 millones de pesos.

Las transferencias a la provincia de Santa Fe (3,8% del total) en las transferencias para los Planes Federales de Vivienda por 50,8 millones de pesos, asistencia para desarrollo vial por 32,1 millones de pesos, atención de emergencias por inundaciones por 20,6 millones de pesos y para el Fondo Nacional de la Vivienda por 17,9 millones de pesos.

Por su parte, las transferencias a la ubicación geográfica interprovincial, asociadas a dos o más jurisdicciones se concentraron mayoritariamente en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 312,8 millones de pesos.

**GASTO DE CAPITAL POR HABITANTE Y KILOMETRO CUADRADO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (*)**

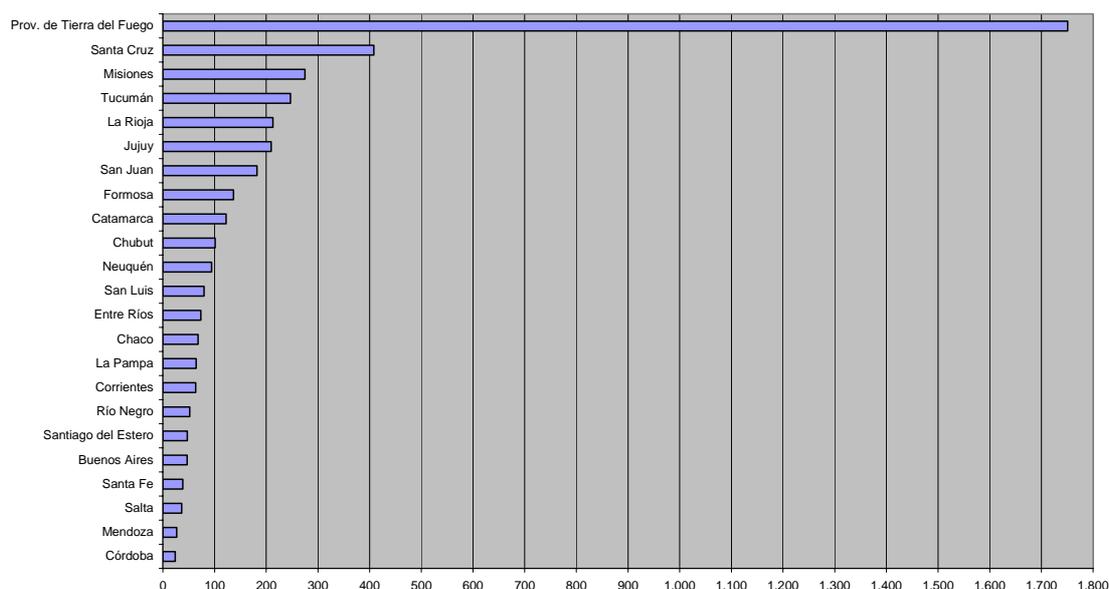

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala.

Si se estima el indicador de transferencias de capital según densidad poblacional, que surge de:

$$= \text{Transferencias de capital} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \text{Habitantes} / \text{Km}^2$$

El indicador muestra que las transferencias de capital son mayores en la provincia de Tierra del Fuego (más de tres veces que las recibidas por la provincia de Santa Cruz, que le sigue en importancia). Las provincias en recibir menores transferencias según el indicador son Córdoba y Mendoza que alcanzan cada una, aproximadamente, 1,5% lo recibido por la provincia de Tierra del Fuego.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/062006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	39.078.839	1.228.000	3,2%
Presidencia de la Nación	22.690.000	26.885.208	4.195.208	18,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	198.369	-5.565.631	-96,6%
Ministerio del Interior	10.366.950	7.408.498	-2.958.452	-28,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	72.315.035	-1.055.000	-1,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	1.070.000	800.000	296,3%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	256.000	0,4%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	30.918.763	19.376.020	167,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.187.563.742	3.334.873.286	147.309.544	4,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	-2.514.000	-97,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.700.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.765.997	6.391.437	-374.560	-5,5%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	3.583.354.418	160.697.129	4,7%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	9.875.499	-364.700	-3,6%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.331.472	-1.800.544	-2,1%
Ministerio Público	5.397.000	7.412.000	2.015.000	37,3%
Presidencia de la Nación	34.448.180	32.512.592	-1.935.588	-5,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.853.000	120.000	3,2%
Ministerio del Interior	107.474.260	134.919.405	27.445.145	25,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	4.606.151	1.755.000	61,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	10.260.616	-673.284	-6,2%
Ministerio de Defensa	75.704.091	89.259.353	13.555.262	17,9%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	139.776.231	-4.111.381	-2,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	86.244.726	88.273.326	2.028.600	2,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	6.835.209	736.209	12,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	44.275.900	3.000.000	7,3%
Ministerio de Salud	49.512.691	55.280.737	5.768.046	11,6%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	10.295.000	4.985.000	93,9%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	722.766.491	52.522.765	7,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.306.120.909	213.219.894	5,2%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	39.078.839	8.261.266	5.221.635	13,4%
Presidencia de la Nación	22.690.000	26.885.208	2.562.736	2.122.523	7,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	198.369	103.445	24.145	12,2%
Ministerio del Interior	10.366.950	7.408.498	1.165.953	399.884	5,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	72.315.035	26.605.311	25.448.984	35,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	1.070.000	63.649	63.649	5,9%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	16.466.470	13.201.102	21,1%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	30.918.763	3.564.986	1.736.510	5,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.187.563.742	3.334.873.286	1.491.901.844	1.446.075.025	43,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	43.138	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.700.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.765.997	6.391.437	1.423.522	939.481	14,7%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	3.583.354.418	1.552.162.319	1.495.232.937	41,7%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	9.875.499	1.844.738	1.289.204	13,1%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.331.472	18.253.579	7.343.367	8,6%
Ministerio Público	5.397.000	7.412.000	4.712.718	4.212.368	56,8%
Presidencia de la Nación	34.448.180	32.512.592	4.814.994	4.036.984	12,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.853.000	641.671	316.685	8,2%
Ministerio del Interior	107.474.260	134.919.405	41.724.241	36.030.628	26,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	4.606.151	1.610.696	1.288.315	28,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	10.260.616	1.202.924	1.055.377	10,3%
Ministerio de Defensa	75.704.091	89.259.353	35.648.666	30.970.483	34,7%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	139.776.231	25.328.327	18.898.887	13,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	86.244.726	88.273.326	7.491.682	4.988.235	5,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	6.835.209	3.074.585	2.277.142	33,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	44.275.900	8.058.299	6.813.945	15,4%
Ministerio de Salud	49.512.691	55.280.737	16.087.668	13.498.273	24,4%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	10.295.000	2.086.235	1.841.814	17,9%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	722.766.491	172.581.025	134.861.707	18,7%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.306.120.909	1.724.743.344	1.630.094.644	37,9%

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO								
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%				
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual				
				18		Area Cámara Tucumán												
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.980.000	1.980.000	0		55,00							
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio Fuero Penal Económico	1.980.000	1.980.000	0		55,00							
				22		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	713.367	700.594	538.983		71,00							
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	713.367	700.594	538.983		71,00							
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)						s/i	s/i				s/i	
				21		Justicia de Máxima Instancia												
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.139.870	3.202.870	1.176.569		75,00							
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	824.373	2.204.373	588.694		25,00							
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	315.943	15.943	0									
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	135.099	135.099	0									
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	126.093	126.093	0		99,00							
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	539.077	19.077	0									
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	113.097	616.097	587.875									
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	86.188	86.188	0									
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.173.303	1.335.303	0									
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolome Mitre 718 - Maipu 92	1.011.270	1.021.270	0									
					58	Obras de adecuac. y Acond. Científico de la Dirección Pericial Junin 760	129.282	129.282	0									
					65	Construcción, Decantación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junin 760	32.751	32.751	0									
					69	Rep. y Mant. de Ascens. de la CSJN, B. Mitre, Maipu y Junin	0	2.000	0									
					70	Adec. de locales para el traslado del Cuerpo Medico Forence	0	150.000	0									
				3		Refacciones Varias	583.692	583.692	2.443		70,00							
					55	Adecuación Integral Edificio Villariño 2010 para el archivo general	574.585	574.585	0		34,00							
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	9.107	9.107	2.443		20,00							
				4		Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	0		25,00							
					51	Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	0		25,00							
				5		Readecuación y refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.188.000	0		30,00							
					51	Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.188.000	0		30,00							
				6		Reciclado de fachadas Tucumán - Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	377.750	0		24,00							
					51	Reciclado de fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	377.750	0		24,00							
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	4.937.385	0		50,00							
					51	Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	4.937.385	0		50,00							
20						Presidencia de la Nación												
						ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES												
				17		Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas												
				2		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.091.646	88.190	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.091.646	88.190	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
						Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR												
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	1.274.714	386.625	0	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	314.178	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					55	Centro de Informes con Biblioteca en El Calafate	240.206	200.206	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					56	Centro Administrativo en El Calafate	180.444	144.011	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					57	Albergue para voluntarios en Glaciar Perito Moreno	329.563	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					58	Centro de Visitantes en Lago Roca	210.323	42.408	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.374.215	1.374.215	955.382	0,00	100,00	30,00	48,00			48,00		
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	644.335	644.335	459.670	0,00	100,00	37,00	51,00			51,00		
					55	Refacción Edificio Histórico y construcción de sanitarios en Hua Hum	194.585	194.585	495.712	0,00	100,00	91,00	s/i			s/i		
					57	Subcentral de Incendios en Ruca Choroí	237.950	237.950	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
					58	Sendero Termas de Epulauquen	297.345	297.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.043.364	1.985.932	235.996	25,25	74,75	12,00	20,00			26,76		
					53	Albergue para voluntarios en Villa La Angostura	34.684	34.684	16.094	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						54 Camino Tronador-Los Rápidos	653.150	653.150	22.241	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	150.198	150.198	111.943	0,00	100,00	36,00	100,00	100,00
						57 Refaccion de dos viviendas en Villa Mascardi	52.539	52.539	25.714	0,00	100,00	17,00	100,00	100,00
						58 Senderos y Miradores en Isla Victoria	79.869	79.869	60.005	0,00	100,00	76,00	100,00	100,00
						59 Infraestructura Isla Victoria Area Central	627.562	600.130	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Ordenamiento Cascada Los Alerces - Estacionamiento, Ctro. de Visit. Baños Públicos	445.362	415.362	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	707.707	1.292.490	53.640	49,56	50,44	0,00	0,00	0,00
						51 Albergue para Voluntarios Villa Futalauquen	0	576.082	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Sendero Chacao Mermoud Menendez	0	551.439	53.640	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción albergue para voluntarios en Lago Verde	105.013	105.013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Saneamiento y servicios en Villa Futalauquen	426.129	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Portada de Acceso en Zona Norte	75.131	15.369	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Acondicionamiento del Centro de Informes	29.946	29.946	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Alambrado Límite Este	71.488	14.641	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21						Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR								
				38		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.113.772	1.113.772	0	14,72	85,28	0,00	0,00	0,00
						52 Obras en Junta de la Palca	173.497	173.497	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obras en Agua del Godo	375.545	375.545	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento camino de acceso	564.730	564.730	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	922.392	922.392	748.034	28,50	71,50	70,00	100,00	139,86
						56 Mejoramiento camino de acceso a Parque Nacional y obras compleplementarias	922.392	922.392	748.034	0,00	100,00	70,00	100,00	100,00
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.128.989	1.178.989	23.021	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						52 Vivienda Intendencia Pampa de Los Guanacos (*****)	0	50.000	23.021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Centro Operativo Area Pobladores	483.158	483.158	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Centro Operativo Area Robles	187.773	187.773	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Alambrado perimetral y senderos	81.572	81.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Centro de Informes con dos viviendas y galpón en Los Pirpintos	376.486	376.486	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.640.847	1.590.847	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras 1º Etapa Infraestructura	497.584	497.584	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación Galpón de esquila como Centro de Informes	357.662	357.662	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Intendencia en Puerto Santa Cruz con albergue para visitantes y vivienda	533.356	483.356	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Vivienda Guardaparques	75.297	75.297	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Casa personal área de la Costa	94.122	94.122	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción senderos y miradores	82.826	82.826	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22						Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004								
				1		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	628.734	1.524.245	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Martín de los Andes	279.701	684.357	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción muelles Hua-Hum y Pucará - San Martín de los Andes	142.069	338.376	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Parque Temático	206.964	501.512	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.968.799	4.927.598	9.130	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sendero Parque Nacional Arrayanes - Villa La Angostura	82.797	291.694	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - Villa La Angostura	72.022	253.733	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Carlos de Bariloche	344.980	869.681	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de 3 Subcentrales de Incendios	313.490	769.295	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Restauración de la Casa de Anchorena, Casa Verde y Casa Roja	552.276	1.358.075	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Senderos a Refugios Red Troncal Catedral	57.753	126.424	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Senderos y miradores en Cascada Los Cántaros	51.191	109.928	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Mirador Co Lemu (Arroyo Cataratas)	26.254	47.240	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						59 Sendero Las Mellizas Cañadon a Verde y Pinturas Rupestres	143.761	342.632	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Senderos a Cascada del Ivínco	324.275	758.896	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	744.149	2.010.159	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción sendero Subcentral de Incendio Zona Norte y Bahía Rosales	238.667	840.824	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						52 Puesto en Valor Museo Los Alerces	88.994	204.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción y reparación de muelles Lagos Krugger, Verde, Rivadavia y Pta. Matos	40.061	81.951	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Grupos Sanitarios Públicos	241.423	580.565	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	135.004	301.863	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	158.318	336.298	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	13.296	32.352	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Portada, Guarda Ganado y obras en el acceso al Parque Nacional	6.037	14.749	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Centro de Atención al Visitante y cobro de Acceso	14.911	36.233	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Riego y parquización zona muelle Parque Nacional	5.636	13.697	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción de rompeolas	6.918	7.713	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción muelle flotante	81.174	172.686	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción muelle flotante Rio Turbio y Los Hitos	30.346	58.868	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
		1				Actividades Centrales								
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00	0,00
				3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa (***)	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
337						SECRETARIA DE CULTURA								
		38				Desarrollo y Acción Cultural								
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.100.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelaciones Varias	1.159.000	1.100.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
		305				DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE								
				23		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento								
						3 Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D.	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
				6		Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	3.678.369	198.369	24.145	23,32	76,68	76,68	76,68	100,00
						52 Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva	1.330.000	0	8.300	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Centro de Transformación de Media Tensión	2.150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoramiento Planta Reductora de Gas	198.369	198.369	15.845	25,15	74,85	74,85	74,85	100,00
30						Ministerio del Interior								
		201				DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
				16		Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional								
						4 Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	282.000	0	90,39	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	282.000	0	90,39	4,00	0,00	0,00	0,00
326						POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
				21		Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
						22 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C						FINANCIERO				FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
				4		Construcción consultorios externos para ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
375					51	Construcción consultorios externos para ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						GENDARMERIA NACIONAL								
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional								
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00	0,00
				19		Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	32.175	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	32.175	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa I	2.850.000	1.188.671	146.700	9,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	2.500.000	660.571	0	3,40	21,90	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Guardia de Prevencion Jefatura Región I	0	102.050	70.650	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Caniles Jefatura Región I	0	76.050	76.050	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto	350.000	350.000	0	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	128.200	128.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Instalación Rampa Edificio Centinela	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Instalaciones y Depósitos - Agrupación Salta	40.000	40.000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción Pabellón Carcelario - Escuadrón 20 "Oran"	28.200	28.200		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Mercadería - Escuadrón 52 Tartagal	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
380						PREFECTURA NAVAL ARGENTINA								
		31				Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad y Judicial								
				1		Construcción del destacamento Chana Mini y Luis Braga en zonas inundables	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del destacamento Chana Mini	450.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción del destacamento Cabo Primero Luis Braga	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				1		Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	221.008	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00
					51	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	221.008	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto								
		106				COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
				1		Actividades Centrales								
				3		Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	0	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	0	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
				1		Infraestructura Terrestre	20.700.000	21.191.000	5.448.984	49,34	26,00	1,68	6,16	23,69
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	93.000	62.641					
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	13.260.000	16.664.000	5.236.501	76,55	55,88	5,73	21,73	38,89
					52	Construcción del Instituto Gulich	1.134.000	1.134.000	0	20,35	28,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito Nº 3	5.000	5.000	91.925	9,64	26,67	1,17	2,05	7,69
					56	Construcción Antena Multipropósito Nº 4	4.392.000	1.742.000	0	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.336.000	1.033.000	57.918	0,16	9,00	0,17	0,39	4,33
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	510.000	510.000	0	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales	41.206.400	40.195.400	19.922.100	61,58	4,00	0,42	3,70	92,50
					0	Misiones Satelitales	497.000	1.347.000	998.907					
					52	Misión SAOCOM	36.957.400	30.906.550	6.375.266	64,29	5,00	0,65	3,26	65,20
					53	Misión SABIA	2.652.000	3.221.850	1.909.406	14,19	13,00	0,00	0,00	0,00
					54	Misión CESAR	1.100.000	4.720.000	10.638.521	8,61	15,63	1,20	9,50	60,78

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
					4	Infraestructura terrestre Etapa II	4.013.000	3.778.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Antena Multipropósito N° 5	4.008.000	3.773.000	0	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
					52	Antena Multipropósito N° 6	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
					5	Subsistemas de propulsión de satélites	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites calificados en tierra	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	21.000	221.000	76.425	0,74	0,44	0,08	0,09	20,45
					0	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	247					
					51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	14.000	214.000	76.178	8,51	5,81	1,13	1,23	21,17
					52	Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
					0	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0					
					51	Reconversioón Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		307				MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
					1	Actividades Centrales								
					2	Remodelación Palacio San Martín	156.000	156.000	0	0,00	100,00	6,00	46,00	46,00
					51	Remodelación Palacio San Martín	156.000	156.000	0	0,00	100,00	6,00	46,00	46,00
					6	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	2.959.325	0	0,00	80,00	0,00	15,00	18,75
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	2.959.325	0	0,00	80,00	0,00	15,00	18,75
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	1.476	10,00	43,00	0,00	20,00	46,51
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	1.476	10,00	43,00	0,00	20,00	46,51
		40				Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
						MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS								
					1	Actividades Centrales								
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	1.070.000	63.649	75,11	11,00	3,00	10,00	90,91
					51	Reparaciones Varias	180.000	920.000	55.372	81,40	18,60	3,00	10,00	53,76
					52	Equipamientos Varios	45.000	45.000	1.325	83,00	7,00	0,00	3,00	42,86
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	105.000	6.953	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45				Ministerio de Defensa								
						ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
					16	Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército								
					44	Construcciones de Polvorines	3.045.730	3.045.730	250.000	40,00	60,00	8,00	8,00	13,33
					71	Construcción Dep. Mun. M8 - Gral San Lorenzo	3.045.730	3.045.730	250.000	40,00	60,00	8,00	8,00	13,33
					47	Construcción y Ampliación redes agua, gas y electricidad	450.000	450.000	119.939	0,00	100,00	26,00	26,00	26,00
					59	Instalación red gas natural RI 6-RI 12 Toay	450.000	450.000	119.939	0,00	100,00	26,00	26,00	26,00
		379				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
					16	Capacidad Operacional de la Armada								
					2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	981.035	2,00	66,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	981.035	2,00	66,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	0	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	0	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
					18	Formación y Capacitación								
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	14.050.125	3.862.951	42,71	39,00	4,90	13,02	33,38
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	14.050.125	3.862.951	42,71	39,00	4,90	13,02	33,38
					2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.384.000	208.263	25,85	47,00	4,25	5,41	11,51
					51	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.384.000	208.263	25,85	47,00	4,25	5,41	11,51
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	14.900.000	723.271	5,55	56,00	2,07	3,41	6,09

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	14.900.000	723.271	5,55	56,00	2,07	3,41	6,09
				4		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
				5		Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				9		Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	9.083.039	7.020.400	18,00	44,00	12,00	23,00	52,27
						51 Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	9.083.039	7.020.400	18,00	44,00	12,00	23,00	52,27
450				16		INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
						Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
					3	Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000	35.242	0,00	21,71	2,52	2,52	11,61
						51 Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000	35.242	0,00	21,71	5,81	5,81	26,76
50				357		Ministerio de Economía y Producción								
						MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION								
				1		Actividades Centrales								
					13	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	780.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	780.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					14	Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	841.730	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Completamiento 3er Piso y Sala de servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	841.730	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					15	Restauración Integral del Patio Princ.- Edificio PAHAC	500.000	990.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Trabajos de Rest. Integral 1er piso-Edificio PAHAC-Y.H.250	500.000	990.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					16	Refacción Edificio Alsina 470 - CF	500.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Provisión e Instalación SS1,1 y 2Piso Cielorr. Susp. Circu.	500.000	500.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera								
					1	Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020	0	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
						51 Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020	0	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
602				16		COMISION NACIONAL DE VALORES								
						Control y Fiscalización de la Oferta Pública								
					1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	107.800	107.800	29.763	47,89	17,00	7,04	7,50	44,12
						53 Modernización del Archivo	107.800	107.800	29.763	47,89	17,00	7,04	7,50	44,12
					2	Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	350.320	350.320	1.210	87,19	12,81	0,14	0,14	1,09
						54 Autopista de la Información Financiera	315.320	315.320	0	98,86	1,14	0,00	0,00	0,00
						56 Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	35.000	35.000	1.210	80,00	20,00	4,00	4,00	20,00
606				16		INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA								
						Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas								
					3	Parques de Innovación Tecnológicos	1.011.459	1.011.459	29.137	1,08	86,00	0,00	0,00	0,00
						0 Parques de Innovación Tecnológicos	522.289	522.289	29.137					
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	489.170	489.170	0	9,03	86,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigación-Etapa II	427.003	427.003	128.835	95,40	4,60	1,00	2,00	43,48
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	427.003	427.003	128.835	95,40	4,60	1,00	2,00	43,48
					8	Construcciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)	637.841	637.841	49.000	62,01	37,99	7,68	7,68	20,22
						51 Ampliacion Sala de Proc. Esc. Sat.en Inst. Clima y Agua	240.303	240.303	0	98,32	1,68	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virologia	29.667	29.667	0	54,72	45,28	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Bacterias Inst. de Biotecnología	178.002	178.002	49.000	94,00	6,00	2,00	2,00	33,33
						55 Remodelación Aloj. Pasantes, Bec. Inst.Microbiología y Zoo.	29.667	29.667	0	79,13	20,87	0,00	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de frío en el Inst. de Patob. de Castelar	160.202	160.202	0	94,75	5,25	0,00	0,00	0,00
					12	Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	225.000	99.869	0,00	100,00	17,00	47,00	47,00
						51 Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	225.000	99.869	0,00	100,00	17,00	47,00	47,00
				17		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)								
					4	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	142.333	142.333	0	83,83	16,17	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	142.333	142.333	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
					5	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	574.679	574.679	0	78,95	21,05	0,00	0,00	0,00
					58	Obras en la Estac.Agrop.C. del Uruguay	574.679	574.679	0	31,72	68,28	0,00	0,00	0,00
					9	Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)	1.062.078	1.062.078	33.647	78,46	21,54	3,17	3,18	14,76
					52	Construcciones Oficinas y Galpon en el Campo Exp. Leales	35.600	35.600	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Oficinas, Banos y Salas de Reuniones E.E.A. Ang	504.339	504.339	0	40,16	59,84	0,00	0,00	0,00
					56	Obras en Esta. Exp. Agrop. Balcarce	89.001	89.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Obras en la Estac. Exp. Agrop. La Rioja	296.670	296.670	0	99,92	0,08	0,00	0,00	0,00
					61	Ampliacion Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	29.667	29.667	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Lab.de Aromas y Fit. en Estac. Exp. Agrop. Mendoza	106.801	106.801	33.647	25,26	74,74	2,36	2,37	3,17
					13	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa V	0	5.035.000	351.964	0,00	100,00	15,15	15,23	15,23
					51	Obras Varias C.R. Tucuman - Santiago del Estero	0	200.000	38.539	0,00	100,00	16,50	19,00	19,00
					52	Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	0	2.900.000	153.795	0,00	100,00	11,00	11,00	11,00
					53	Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	0	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obras Varias C.R.Chaco - Formosa	0	1.515.000	128.873	0,00	100,00	7,20	9,60	9,60
					55	Obras Varias C.R. Misiones	0	400.000	30.757	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00
					14	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VI	0	5.040.000	341.239	0,00	100,00	8,80	8,81	8,81
					51	Obras Varias C.R. Corrientes	0	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	0	100.000	103.023	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					53	Obras Varias C.R. Santa Fe	0	4.300.000	150.784	0,00	100,00	2,00	3,57	3,57
					54	Obras Varias C.R.Córdoba	0	210.000	65.917	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00
					55	Obras Varias C.R. Entre Ríos	0	350.000	21.515	0,00	100,00	6,50	6,50	6,50
					15	Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-EtapaVII	0	4.900.000	174.765	0,00	100,00	4,50	4,50	4,50
					51	Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	0	4.900.000	174.765	0,00	100,00	4,50	4,50	4,50
					16	Construc.y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VIII	0	4.800.000	346.109	0,00	100,00	19,03	19,03	19,03
					51	Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	0	2.800.000	193.806	0,00	100,00	18,60	18,60	18,60
					52	Obras Varias C.R. Patagonia Norte	0	100.000	2.668	0,00	100,00	75,00	75,00	75,00
					53	Obras Varias C.R.La Pampa - San Luis	0	1.400.000	69.033	0,00	100,00	9,10	9,10	9,10
					54	Obras Varias C.R.Patagonia Sur	0	500.000	80.603	0,00	100,00	35,40	35,40	35,40
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA								
				16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	44.382	18,82	11,46	5,09	5,09	44,42
				51		Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	44.382	18,82	11,46	5,09	5,09	44,42
				3		Equipamiento Analítico	400.000	400.000	19.468	44,12	11,24	0,50	0,56	4,98
				51		Equipamiento Analítico para Laboratorios	400.000	400.000	19.468	44,12	11,24	0,50	0,56	4,98
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	0	85,13	4,82	0,00	0,00	0,00
				51		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	0	85,13	4,82	0,00	0,00	0,00
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA								
				17		Servicios de Laboratorios								
				14		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	1.917.500	87.120	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				51		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	1.917.500	87.120	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
				105		COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								
				16		Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos								
				1		Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.075.000	883.059	367.506	89,00	1,40	0,51	0,52	37,14
				51		Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.075.000	883.059	367.506	89,00	1,40	0,51	0,52	37,14
				2		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	40.000	40.000	8.545	95,86	2,06	0,44	0,49	23,79
				51		Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	40.000	40.000	8.545	95,86	2,06	0,44	0,49	23,79
				3		Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	450.000	450.000	154.727	77,99	0,13	0,05	0,05	38,46
				52		Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	450.000	450.000	154.727	33,33	7,00	2,44	2,57	36,71
				5		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	950.000	950.000	772.444	66,84	26,60	0,00	20,67	77,71
				52		Laboratorio Calibración en Dosimetría	950.000	950.000	772.444	46,75	44,00	0,00	34,19	77,70
				6		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	490.500	674.500	72.867	61,76	13,00	0,47	1,77	13,62

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						52 Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	328.700	512.700	68.791	47,35	16,00	0,64	2,65	16,56
						53 Laboratorio Control y Verificación de Calidad	161.800	161.800	4.076	87,92	7,00	0,16	0,16	2,29
				7		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.159.600	683.600	150.590	24,77	3,09	0,34	0,49	15,86
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	948.100	472.100	127.870	8,10	13,00	1,14	1,74	13,38
						52 Repositorio Fase 1	211.500	211.500	22.719	26,47	1,00	0,10	0,11	11,00
				8		Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	292.000	79.754	33,70	18,00	0,22	6,19	34,39
						51 Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	292.000	79.754	33,70	18,00	0,22	6,19	34,39
				9		Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	10.364.098	10.364.098	194.655	25,36	15,75	0,22	0,31	1,97
						51 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	8.165.000	8.165.000	116.062	31,95	20,00	0,18	0,30	1,50
						52 Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	1.320.460	1.228.060	46.578	21,47	8,00	0,29	0,39	4,88
						53 Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	878.638	939.838	1.179	7,97	11,00	0,01	0,01	0,09
						54 Remodelación Casa Guayra (*****)	0	31.200	30.836	58,00	14,68	14,68	14,68	100,00
		18				Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas								
				1		Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	72.000	72.000	2.119	70,93	0,32	0,00	0,01	3,13
						53 Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	72.000	72.000	2.119	35,04	4,00	0,00	0,12	3,00
				2		Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.114.000	1.114.000	365.515	89,95	6,71	1,98	2,09	31,15
						51 Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	544.000	544.000	207.074	90,22	9,78	1,56	1,67	17,08
						52 Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	570.000	570.000	158.441	89,38	5,00	2,83	2,95	59,00
				3		Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	410.000	1.183.813	779.482	66,97	3,08	0,21	0,21	6,82
						51 Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	350.000	1.123.813	771.232	91,52	4,00	0,09	0,09	2,25
						52 Ampliación Laboratorio CAB	60.000	60.000	8.250	50,09	5,00	0,30	0,30	6,00
				4		Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	125.000	125.000	105.262	82,79	7,50	4,00	6,44	85,87
						51 Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	125.000	125.000	105.262	82,79	7,50	4,00	6,44	85,87
				5		Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	657.000	657.000	9.928	35,92	4,00	0,05	0,05	1,25
						51 Centro de Aceleración de Iones	600.000	600.000	9.928	32,57	2,00	0,06	0,06	3,00
						53 Laboratorio de Química Analítica	57.000	57.000	0	53,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				6		Infraestructura CAE - FASE 2	711.000	385.232	179.534	84,23	11,59	1,95	2,50	21,57
						51 Saneamiento CAE	711.000	385.232	179.534	48,29	36,00	6,04	7,74	21,50
				7		Infraestructura CAE-FASE 3	120.000	93.896	14.121	26,10	8,00	0,00	0,95	11,88
						51 Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	120.000	93.896	14.121	26,10	8,00	0,00	0,95	11,88
				8		Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	35.000	35.000	7.017	23,60	2,50	0,00	0,50	20,00
						51 Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	35.000	35.000	7.017	23,60	2,50	0,00	0,50	20,00
				9		Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	350.000	350.000	113.591	20,35	22,00	7,19	7,19	32,68
						51 Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Micr	350.000	350.000	113.591	20,35	22,00	7,19	7,19	32,68
		108				INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
						Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	239.034	95,00	3,00	1,00	2,00	66,67
						61 Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	239.034	95,00	3,00	1,00	2,00	66,67
				2		Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		115				COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES								
				1		Actividades Centrales								
						Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	7.480.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	7.480.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		354				MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
				17		Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR								
						Saneamiento Cloacal en La Matanza	7.984.200	7.984.200	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.946.000	3.946.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	2.600.000	2.600.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						53 Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	1.438.200	1.438.200	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	2.286.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	2.286.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	3.549.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	3.549.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construcción Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
19						Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	38.600.000	38.600.000	10.271.751	59,05	20,07	0,02	5,69	28,35
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	26.000.000	26.000.000	2.729.087	96,16	3,84	0,00	2,20	57,29
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	12.600.000	12.600.000	7.542.664	79,85	20,15	0,09	18,54	92,01
					9	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	7.100.000	0	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	7.100.000	0	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					24	Construcción Canal Complejo Las Madedras - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	600.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Complejo Las Madedras - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	600.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
25						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	949.971	37,78	5,00	0,36	0,65	13,00
					51	Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	949.971	37,78	5,00	0,36	0,65	13,00
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	2.600.000	12.105.964	77.553	34,65	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales	2.600.000	12.105.964	77.553	34,65	4,00	0,00	0,00	0,00
					7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.410.000	3.622.000	0	16,14	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	3.710.000	1.710.000	0	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
					52	Defensa Costera	3.700.000	1.912.000	0	49,70	8,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.465.000	643.814	46,21	53,00	0,09	0,43	0,81
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.465.000	643.814	46,21	53,00	0,09	0,43	0,81
					11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	0,00	2,60	21,67
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	0,00	2,60	21,67
					12	Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00	0,00
					51	Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00	0,00
					13	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.888.000	653.506	0,00	100,00	7,62	24,06	24,06
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.888.000	653.506	0,00	100,00	7,62	24,06	24,06
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	28.000.000	9.641.139	0,00	11,29	10,21	11,05	97,87
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	28.000.000	9.641.139	0,00	11,29	10,21	11,05	97,87
					21	Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	6.100.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	6.100.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					22	Restauración y Puesta en valor en el Instituto Saturnino Unzué	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Ex Instituto Saturnino Unzué - MDQ - Cubiertas	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	7.355.000	7.355.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	7.355.000	7.355.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				30	51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						Prevenición Sísmica								
				1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	89.217	54,60	5,00	0,70	1,10	22,00	
				32	51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	89.217	54,60	5,00	0,70	1,10	22,00	
						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
				3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.215.528	3.215.528	2.121.105	35,00	33,00	7,00	10,00	30,30	
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	715.528	24.423	0					
					51	Huellas Varias Misiones	100.000	150.000	150.000	35,00	33,00	7,00	10,00	30,30
					52	Huellas Mineras NOA	600.000	950.000	675.000	35,25	33,00	7,00	10,00	30,30
					53	Huellas Mineras Cuyo	625.000	862.655	592.655	35,00	33,00	7,00	10,00	30,30
					54	Huellas Mineras Comahue	500.000	945.000	495.000	35,00	33,00	7,00	10,00	30,30
					55	Huellas Mineras Patagonia	675.000	283.450	208.450	35,00	33,00	7,00	10,00	30,30
				50	Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas									
					2	Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	1.521.000	521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					52	Puente Encarnación-Posadas	1.521.000	521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	22.308.257	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados (Buenos Aires) -	22.308.257	22.308.257	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
				11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	7.672.000	0	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	7.672.000	0	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
				12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	5.034.784	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	5.034.784	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
				13	Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	5.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	5.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				14	Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	5.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	5.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				15	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	3.867.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	3.867.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
				16	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	5.162.500	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	5.162.500	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
				17	Ampliación Unidad 11	1.900.000	1.900.000	0	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación Unidad 11	1.900.000	1.900.000	0	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
				18	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	1.643.410	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	1.643.410	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
				19	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	2.085.500	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	2.085.500	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
				20	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	2.727.500	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	2.727.500	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				21	Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	1.580.500	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	1.580.500	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
				22	Centro de Drogadependientes	1.118.710	1.118.710	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Centro de Drogadependientes	1.118.710	1.118.710	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
				55	Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario									
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	139.680.099	139.680.099	76.022.117	60,38	39,62	0,64	16,81	42,43
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	6.624.007	7.354.007	4.535.495					
					51	Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	15.505.755	15.445.755	13.897.908	91,59	8,41	0,64	4,03	47,92
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	24.289.000	23.619.000	4.736.763	0,00	90,00	0,77	0,77	0,86
					53	Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	16.800.000	16.800.000	8.010.885	71,23	23,00	0,81	4,62	20,09
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	20.792.900	20.792.900	10.002.905	18,70	77,00	18,83	30,06	39,04
					55	Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.249.789	17.249.789	10.378.628	55,62	23,00	5,59	17,65	76,74
					62	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	318.289	318.289	2.795.457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	1.437.818	1.437.818	2.395.341	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						65 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	2.188.994	2.188.994	8.211.742	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00
						66 Paso a Diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	19.407.339	19.407.339	1.222.191	18,00	50,00	1,53	5,93	11,86
						67 Paso Diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes	5.193.189	5.193.189	4.075.830	50,13	49,87	17,71	24,81	49,75
						68 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	9.873.019	9.873.019	5.758.970	20,39	50,00	14,52	38,00	76,00
				4		0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	64.862.841	12.779.184	0,00	38,00	1,32	1,32	3,47
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	0	0	55.817					
						Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID	52.421.841	64.862.841	12.723.367	0,00	38,00	1,32	1,32	3,47
87						1 Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica (****)	206.925.272	162.343.308	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
						51 Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica	206.925.272	162.343.308	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				2		2 Pavimentación R.N.34 - Provincia de Jujuy	9.082.096	5.582.096	0	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N.34 Provincia de Jujuy	9.082.096	5.582.096	0	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
				3		3 Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.043.515	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.043.515	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				4		4 Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		2 Ampliación Puerto Caleta Paula (**)	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				3		3 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
				4		4 Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				5		5 Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	1.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	1.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				6		6 Reparación de Puente Uriburu	0	1.300.000	846.687	0,00	100,00	60,34	60,34	60,34
						51 Reparación en estructura de tablero y de calzada	0	1.300.000	846.687	0,00	100,00	60,34	60,34	60,34
				7		7 Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				8		8 Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				9		9 Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				10		10 Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				11		11 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
				12		12 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				13		13 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				14		14 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				15		15 Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				16		16 Dragado Río Uruguay	2.500.000	1.200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dragado Río Uruguay	2.500.000	1.200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				17		17 Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				19		19 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
				20		20 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C						FINANCIERO				FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						21 Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
						2 Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	25.120.718	26.000.478	11.390.655	12,96	55,00	18,17	18,17	33,04
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	8.062.405	7.873.080	2.808.615	57,32	43,00	8,19	8,19	19,05
						52 1º Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	10.530.568	10.641.933	8.567.520	1,36	28,00	27,36	27,36	97,71
						53 2º Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Bs As)	6.527.745	7.485.465	14.520	0,00	99,00	2,12	2,12	2,14
						3 Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	15.758.019	19.452.219	7.127.772	7,10	21,00	11,05	11,05	52,62
						51 Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	8.296.532	9.203.132	2.435.662	3,92	95,00	9,98	9,98	10,51
						52 Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Parana-Entre Ríos)	7.461.487	10.249.087	4.692.110	11,48	87,00	13,05	13,05	15,00
						4 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	7.490.689	4.305.744	4,87	58,00	12,09	12,09	20,84
						51 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	7.490.689	4.305.744	4,87	58,00	12,09	12,09	20,84
						5 Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	12.974.430	6.530.596	0,00	33,00	4,36	4,36	13,21
						51 Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	12.974.430	6.530.596	0,00	33,00	4,36	4,36	13,21
						6 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	11.863.595	7.882.316	0,00	100,00	19,42	19,42	19,42
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	11.863.595	7.882.316	0,00	100,00	19,42	19,42	19,42
						8 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	4.340.725	4.079.431	1.662.986	0,00	29,00	7,80	7,80	26,90
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	3.838.743	4.046.331	1.657.486	0,00	58,00	7,60	7,60	13,10
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs As.)	501.982	33.100	5.500	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						9 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	4.597.572	10.282.572	7.256.970	6,63	20,00	9,69	9,69	48,45
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	4.095.591	9.755.591	7.252.570	11,80	30,00	19,48	19,48	64,93
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	501.981	526.981	4.400	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						10 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	400.153	413.167	0	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	200.793	215.793	0	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						52 Perforaciones 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	199.360	197.374	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						11 Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	6.532.270	2.116.409	6,06	79,00	16,92	16,92	21,42
						51 Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	6.532.270	2.116.409	5,96	79,00	16,92	16,92	21,42
						12 Contrucción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	18.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						51 Contrucción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	18.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						13 Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. María de Punillas - Biale Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. María de Punillas - Biale Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	5.038.500	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	5.038.500	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
						16 Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	3.011.891	16.116.891	3.702.748	0,00	15,00	3,45	3,45	23,00
						51 Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	1.000.000	7.045.000	24.750	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización de Sistemas de Provisión de agua potable Formosa	2.011.891	9.071.891	3.677.998	0,00	22,00	5,01	5,01	22,77
						17 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa (*****)	0	1.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	0	1.020.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						19 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	1.210.793	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	1.210.793	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
						20 Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.913.769	1.834.707	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.913.769	1.834.707	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						21 Construcción Planta Depuradora Cloacal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	678.037	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	678.037	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
						22 Construcción Planta Tratamiento Líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	803.287	11.778.287	6.015	0,00	12,00	8,16	8,16	68,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	401.701	5.255.701	0	0,00	24,00	11,92	11,92	49,67

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	6.520.793	6.015	0,00	30,00	5,39	5,39	17,97
						53 Cloaca Maxima y Estación de Bombeo Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	12.355.504	10.450	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	12.355.504	10.450	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
				24		Construcción de Planta Depuradora Norte, Remodelación de Planta Sur y Cañerías Colectoras	600.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs. As.	300.000	15.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación de Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Zona Va. Aguirre Tandil Bs. As.	300.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	1.300.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	1.300.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
				26		Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
				27		Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	400.000	4.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Redes Secundarias Estación de Bombeo e impulsión - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				30		Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	400.000	2.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
						52 Optimización del Sistema de Desagües de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
				31		Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				32		Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				33		Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
				1		Actividades Centrales								
					1	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	0	94,70	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	0	94,70	1,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino Etapa II	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio 25 (IGRM)	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base								
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	1.220.000	161.273	29,45	30,00	0,44	0,85	2,83
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	1.220.000	161.273	29,45	30,00	0,44	0,85	2,83
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
				17		Infraestructura en Concesiones Viales								
					1	Aumento de capacidad en Corredores Viales en Pcia. De Bs. As.	4.600.000	4.600.000	1.414.770	0,00	42,63	6,67	9,95	23,34
						51 Autovía Cañuelas-Mte. Grande - Sección 4 y 5 - RN N° 3 - Km 87,82 a Km 97,561(Buenos Aires)	4.600.000	4.600.000	1.414.770	0,00	42,63	6,67	9,95	23,34
					2	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs. As. I	1.900.000	1.801.000	1.312.872	34,72	65,28	5,97	58,73	89,97
						51 Obra de alteo R.N.3 Km607,5-Km608,5 Cnel. Dorrego-Bs.As.	100.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Intersección RN 3 (650,17) con RN 249 Acc. Punta Alta	1.800.000	1.800.000	1.312.872	37,08	62,72	6,38	62,72	100,00
				3		Aumento de Capac. En C.Viales en Pcia. Bs.As. III	5.000.000	17.000.000	0	0,00	84,99	14,33	14,33	16,86
						51 Autovía Mar Del Plata-Balcarce I Tramo - R.226 - Km 20,5 - Km 31,7 (Buenos Aires)	5.000.000	17.000.000	0	0,00	84,99	14,33	14,33	16,86
					4	Aumento de Capac. en C.Viales en Pcia. Bs.As. III	4.000.000	1.000	0	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo - R.226 - Km 31,7 - Km 64,0 (Buenos Aires)	4.000.000	1.000	0	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
				5		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As II	1.600.000	1.600.000	0	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora en travesía urbana RN 205 Km 66-Cañuelas Bs. As.	1.500.000	1.500.000	0	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora intersección e iluminación RN 5-Km260 9 de julio	100.000	100.000	0	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
					6	Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As III	4.800.000	2.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora intersección RN 7 Km202,16 Chacabuco-Bs. As.	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora en travesía urbana- RN 188 Km 156,80- Junin Bs.As.	2.900.000	1.000	0	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00
					7	Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					8	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. IV	15.714.400	9.001.000	0	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I Ruta nacional Nº 5 Km. 66,10 - Km. 73,40 Buenos Aires	6.714.400	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					52	Autopista Luján- Mercedes Sección III-RN 5 Km 85,78-Km 95,65 (Buenos Aires)	9.000.000	9.000.000	0	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
					9	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. V	6.500.000	50.000.000	0	0,00	10,00	1,47	1,47	14,70
					51	Tramo Campana-Zarate RN 9 e/Km 72,62-Km 85,19	6.500.000	50.000.000	0	0,00	10,00	1,47	1,47	14,70
					10	Seguridad en C. Viales en Pcia. de Santa Fe I	3.000.000	1.000	0	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora en travesía urbana - RN 11 K 787- Reconquista Sta.Fe	3.000.000	1.000	0	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00
					11	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs. As.VI	6.400.000	579.953	0	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
					51	Obra de vincul. Ex RN 193-tramo emp. RN 8-emp. RP 39 Exaltación de la Cruz	6.400.000	579.953	0	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00
					12	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. Córdoba I	6.198.378	96.825	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en RNA005-Tramo emp.RN8-emp.RP36-Sec.Km 0-12 Río Cuarto	6.198.378	96.825	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					13	Seguridad en C. Viales en Pcia.de Sta.Fe II	4.800.000	2.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en intersecciones RN.33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.900.000	1.000	0	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación de accesos RN 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.900.000	1.000	0	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	0	6.215.803	2.588.405	55,33	44,67	2,68	14,93	33,42
					52	Const.pasarelas peat.RNN3Km76,75 Cañuelas(Bs.As)RNN33 Km751	0	58.719	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Santa Fe) RNN8 Km 294,60	0	842.389	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Apertura paso nivel de colectora RN226 Km 166,6 Tandil(BsAs)	0	15.985	15.984	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Trav.urbana Río Cuarto(Cba)RN8 Km598,8;A-005 Km0-11,4;RN36	0	21.045	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Const.pasarelas peat.RN9 Km1349,0 B.Paz(Tuc);RN9 Km1459,80 M	0	20.095	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As.) RN9 Km100	0	50.569	48.589	97,36	2,64	2,64	2,64	100,00
					59	Mejora intersec.y const.colectoras RN3 Km109-110 S.M.Monte	0	255.957	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construc.canal desagües pluv.-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	0	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					62	Mejora Insters.RN19 Km127,2 inters.RN158 S.Fco.(Cba) RN19 Km	0	309.899	311.141	90,10	6,90	6,38	6,90	100,00
					63	Trav.urb.RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerric	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					66	Mejora Acceso a Vedia(Bs.As.) RN7 km312,26 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					67	Mejora acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39(Bs.As.)	0	553.775	303.706	73,95	26,05	0,00	26,05	100,00
					68	Mejora acceso canalizado a la Laguna de Lobos RN205 Km111,45	0	36.573	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Rotonda en intersec.RN7 Km423,32 y RN33 Rufino (Sta Fe)	0	712.638	712.638	59,05	40,95	0,00	40,95	100,00
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque (Corrientes)	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					74	Acceso a Villa Ramallo RN9 Km 207,00 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					76	Mejora Intersección de acceso Hersilia (Sta.Fe)RN34 Km369,88	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Mejora acceso canalizado RN33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					79	Mejora inters.acceso a S.Esteban-Los Cocos (Cba) RN38 Km75,3	0	9.000	0	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN34 Km 496,08	0	1.309.522	1.196.347	9,16	90,84	28,51	90,50	99,63
					81	Adecuación urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes (Salta)	0	1.759.637	0	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00
					82	Construcción intersec.canalizada RN12 KM1383,25 Sta Ana-Misi	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	870.000	0	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
					51	Iluminación intersec. RN19 Int.RP10 - Río Primero (Cba)	0	870.000	0	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
					17	Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	26.829	26.829	95,85	4,15	0,00	4,15	100,00
					55	Construcción pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	0	26.829	26.829	92,25	7,75	0,00	7,75	100,00
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia.Bs.As.	0	669.318	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construc.pasarela peatonal RN8 Km 78 - Exalt.de la Cruz(Bs.As)	0	264.378	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Const. de Colec. RN N3 Km 109/110 - San Miguel del Monte Bs.As.	0	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Iluminación Rotonda RN N3 Km 192,34 - Int. RP N30- Las Flores	0	354.940	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					22	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Mendoza	0	2.100.000	1.503.043	0,00	100,00	52,85	90,87	90,87
					51	Adecuación Acc. Este e Iluminación RN N7 Km 902,15 La Paz Mendoza	0	500.000	205.408	0,00	100,00	67,70	87,88	87,88

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						52 Int. Canalizada Iluminada - Acc. Oeste RN N7 Km 905 La Paz Mendoza	0	500.000	285.711	0,00	100,00	58,92	78,87	78,87
						53 Int. Canalizada Iluminada RN N7 Km 940,41 La Dormida Mendoza	0	500.000	427.401	0,00	100,00	47,95	98,45	98,45
						54 Iluminación Acceso Las Catitas RN N7 Km 954,1 Las Catitas Mendoza	0	600.000	584.523	0,00	100,00	36,57	98,05	98,05
				23		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II	6.783.003	1.003	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha RN8 Sec. Km606-619- Tramo Río IV- Holmberg	6.783.003	1.003	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				24		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Salta I	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción multitrocha RN9 Km 1547-1555 Cabeza de Buey-Salta	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				25		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Constr. Multitrocha RN34 km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				26		Seguridad en C.viales en Provincia de Tucumán I	3.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de puente RN9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	3.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				27		Seguridad en C. Viales en Provincia de Tucumán II	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de acceso RN9 Km 1362 - Trancas - Tucumán	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km.1017,84 - Km 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				30		Obras menores en Ccesiones Viales	7.150.000	1.702.000	0	0,00	13,72	7,06	7,06	51,46
						51 Rotonda en Intersección RN3 Km 448,7-RP75 Gonzalez Chavez - Bs.As.	4.600.000	1.000	0	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora Intersección RN11- Calle Sargento Cabral - San Lorenzo - Santa Fe	1.350.000	1.000	0	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de acceso RN34 Km 252,60 - Sunchales - Santa Fe	1.200.000	1.700.000	0	0,00	32,42	21,19	21,19	65,36
				31		Aumento de Capacidad en C. Viales en Provincia de Misiones I	8.758.350	0	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
						51 Constr. de terceras trochas RN12 Km 1370-1399 Arroyo San Juan - San Ignacio-Misiones	8.758.350	0	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
				32		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones II	14.598.000	0	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1399-1436 San Ignacio-Jardín América	14.598.000	0	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
				33		Aumento de capacidad en C.Viales en provincia de Misiones III	8.758.350	2.989.700	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1442-1470 Jardín América-Puerto Rico	8.758.350	2.989.700	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
				34		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones IV	13.138.200	12.989.245	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
						51 Construcción terceras trochas RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto.Rico-Montecarlo-El Dorado-Misiones	13.138.200	12.989.245	0	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
				35		Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	14.057.800	5.105.733	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
						51 Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	14.057.800	5.105.733	0,00	8,42	0,77	1,85	21,97
				36		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Buenos Aires VII	8.834.650	8.834.650	6.638.093	12,79	87,21	41,19	79,10	90,70
						51 Construcción distribuidor de Bernal-Calle Espora-Quilmes	8.834.650	8.834.650	6.638.093	12,79	87,21	41,19	79,10	90,70
				37		Seguridad en C.Viales en Provincia de La Pampa	821.000	2.721.000	0	0,00	60,09	8,66	8,66	14,41
						51 Readequación acceso planta urbana RN5 Km 605-606- Santa Rosa	821.000	2.721.000	0	0,00	60,09	8,66	8,66	14,41
				38		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Mendoza I	26.012.350	10.012.350	12.078.364	2,23	61,63	13,58	20,29	32,92
						51 Doble vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN7 km 965,51-998,80 Mendoza	26.012.350	10.012.350	12.078.364	2,23	61,63	13,58	20,29	32,92
				39		Autopista Luján - Mercedes Etapa I, seccion II, Jauregui Pje	0	21.000.000	9.417.010	28,35	71,65	31,17	63,55	88,70
						51 Aut. Luján - Mercedes - Etapa I, sección II RN N5 Km 72,42	0	21.000.000	9.417.010	28,35	71,65	31,17	63,55	88,70
				40		Aumento de capacidad en C. Viales - Provincia de Santiago del Estero I	4.185.000	4.185.000	531.707	0,00	92,75	32,63	43,51	46,91
						51 Ensanche de puente sobre Río Dulce RN9 Km 1205 - Termas de Río Hondo	4.185.000	4.185.000	531.707	0,00	92,75	32,63	43,51	46,91
				48		Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Sta. Fe	0	730.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción pasarela peatonal RN N9 Km 376 Cañada de Gomez	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción pasarela RN N33 km 713 Chabas Sta. Fe	0	730.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				63		Iluminación Int. RN N9 Km 227,03 con RN N 188 - San Nicolas	0	100.000	0	0,00	100,00	69,88	74,95	74,95
						51 Iluminación Int. Rn N9 Km 227,03 con RN188 - San Nicolas	0	100.000	0	0,00	100,00	69,88	74,95	74,95
				65		Construcción destacamentos policiales	1.000.000	1.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción destacamentos policiales	1.000.000	1.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				66		Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						Infraestructura en Areas Urbanas								
				1		Obras menores en áreas urbanas	847.800	847.800	0	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						53 Rotonda en inters. RNA-015 y Av. Mons. Roch-Concordia- Entre Ríos	722.800	722.800	0	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00
				2		54 Iluminación en intersec. RN14 y RNA-015- Concordia - Entre Ríos	125.000	125.000	0	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00
						Seguridad en Areas Concesionadas II	0	2.783.965	2.312.387	0,00	86,71	19,34	86,71	100,00
				3		51 Repavimentación de la RP N42 seccion RP 51 Acceso a Rawson	0	2.783.965	2.312.387	0,00	86,71	19,34	86,71	100,00
						Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	825.523	0	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
				4		51 Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	825.523	0	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
						Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.042.300	4.042.300	960.953	0,00	65,00	26,48	35,61	54,78
						51 Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	4.042.300	4.042.300	960.953	0,00	100,00	52,96	71,21	71,21
				5		52 Pavimentación 70 cuadras Santa Rosa - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
						Vinc. y remodel. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	2.722.500	0	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
						51 Vinc. y remodel. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	2.722.500	0	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
				6		Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	2.940.000	0	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00
						51 Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	2.940.000	0	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00
				7		Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	4.600.000	0	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
						51 Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	4.600.000	0	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
				9		Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.600.000	1.001.000	0	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en accesos Sur - RN14 Km 252,60 - Concordia -Entre Ríos	3.600.000	1.001.000	0	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
19						Obras Mejorativas en Corredores Viales Nacionales								
				1		Corredor Vial 2	13.400.000	18.059.037	0	0,00	50,00	1,16	1,16	2,32
						51 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 98 - 107	1.200.000	1.737.454	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						52 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 143 - 150	1.200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 208 - 221	1.200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						54 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 259 - 276	3.000.000	2.865.250	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 399 - 406	1.800.000	1.755.240	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						56 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 457 - 492	3.000.000	11.701.093	0	0,00	50,00	4,66	4,66	9,32
						57 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 424 - 457	2.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				2		Corredor Vial 3	8.000.000	4.106.546	0	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00
						51 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 106 - 206	4.000.000	2.234.479	0	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00
						52 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 96 - 106	4.000.000	1.872.067	0	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00
				3		Corredor Vial 4	8.300.000	19.628.616	0	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00
						51 Corredor Vial 4 - Ruta 8 Km 661 - 695	3.800.000	13.940.000	0	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
						52 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 586 - 616	2.000.000	5.688.616	0	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 673 - 675	2.500.000	0	0	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
				5		Corredor Vial 5	17.685.000	15.591.841	890.509	0,00	25,33	1,41	1,41	5,57
						51 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1215 - 1225	2.500.000	9.700.000	674.184	0,00	29,40	8,50	8,50	28,91
						52 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1315 - 1326	2.500.000	0	216.325	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 596 - 626	2.500.000	2.488.765	0	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00
						54 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 584 - 596 Km 626 - 696	2.500.000	0	0	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 1164 - 1177	3.000.000	1.801.972	0	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00
						56 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 66 - 86	4.685.000	1.601.104	0	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS								
				16		Control del Sistema Nacional de Aeropuertos								
						5 Reacondicionamiento de plataformas, pistas y calles de rodaje en Aeropuertos - Etapa 2	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Nivelación y puesta en norma las franjas de seguridad del Aeropuerto de Villa Gesell	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Reacondicionamiento de Plataformas pistas y calles en Aeropuerto - Etapa 2	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación de estado superficial de pista, calle de rodaje en Aeropuerto de Tandil	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
				350		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
				1		Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (*****)	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
80						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	310					Ministerio de Salud y Ambiente								
		1				MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE								
						Actividades Centrales								
				1		Refuncionalización Edificio Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	902					52 Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL								
		52				Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
				1		Refuncionalización Comedor	700.000	700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Comedor	700.000	700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
				2		Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	903					51 Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
		53				Atención a Enfermos								
				6		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.270.000	475.520	17.736	32,05	67,95	0,00	0,00	0,00
				0		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	20.520	17.736					
						53 Remodelación del Pabellón N°4	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Refacción Integral de Pabellones N° 3,5 y 8	750.000	455.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Reparación y Mantenimiento en Hospital	480.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0		Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	0	0					
						51 Cloacas en Barrios	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	750.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	906					51 Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	750.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN (ANLIS)								
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				0		Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				2		Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoría Interna (*****)	0	53.000	0	0,00		0,00	0,00	
						51 Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoría Interna	0	53.000	0	0,00		0,00	0,00	
				1		Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos	622.400	257.020	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
						59 Remodelación del Bioterio Central	350.400	1	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
						61 Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	272.000	257.019	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
				2		Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos - Etapa II	285.600	578.005	9.980	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de Central de Esterilización, Descontaminación y Elaboración de Medios de Cultivo	183.600	497.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelación del Serpentario	102.000	29.025	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Remodelación del Bioterio de Rabia y Sueros (*****)	0	42.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Remodelación del Area de Procesos (*****)	0	9.980	9.980	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Invest, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virales								
				1		Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	207.919	0	9,83	65,00	0,00	0,00	0,00
						60 Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	0	39,83	35,00	0,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	4.825	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				5		Control de Calidad de Biológicos								
				2		Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	63.500	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						60 Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	63.500	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias								
				1		Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Pintura. Constr. Acceso para personas discapacitadas	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				2		Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II (*****)	0	190.723	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II	0	190.723	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.								
				1		Refuncionalización del Edificio	61.458	61.458	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/06/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado al	%
							Original	Vigente al 30/06/2006	Devengado al 30/06/06	Acumulado al 31/12/2005	anual vigente	en el 2º trim.	30/06/2006	Ejec./Progr. anual
						67 Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	61.458	61.458	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR								
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos								
				1		Contrucción Natatorio	500.000	650.000	53.548	5,00	41,66	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Natatorio	500.000	650.000	53.548	5,00	41,66	0,00	0,00	0,00
				7		Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000	90.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Rampa de Emergencia	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Instalación Generador Eléctrico	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				53		Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Se realizó un anticipo financiero, las obras se iniciarán a fines de julio de 2006.

(***) Este proyecto lo ejecuta la Dirección de Arquitectura dentro del proyecto Monumentos Históricos.

(****) Los proyectos se realizan por transferencias.

(*****) Obra terminada, se están pagando certificaciones atrasadas.

(*****) Proyectos iniciados en el 2º trimestre.

Los proyectos del OCCOVI del 31 al 35, del programa 17, deben de unificarse en un solo proyecto, cuya programación vigente es de 42,11% y la ejecución física acumulada al 2º trim. es de 4,42%.

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION																				
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		33.575	01/01/2006	31/12/2006	10.323.000	39.568.149	32.265.996	25,00%	41,67%	41,67%	6	B
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	DNU	14		88	01/01/2006	31/12/2006	3.088.000	88.000	0	25,00%	42,05%	42,05%	6	B
										33.663	77.436	13.411.000	39.656.149	32.265.996	25,00%	41,67%	41,67%			
MANTENIMIENTO DE RUTAS POR CONTRATO																				
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	15.251	22/08/1995	31/12/2006	584.000	584.000	511.848	2,81%	5,64%	70,57%	6	
16	2	8	51	CHACO	16	Emp Rta.95-Emp Rta.9/34				1.500	01/11/2006	31/10/2008	0	77.867	77.864	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	1488 (Km-Mes)	11	403,4	3.616	29/04/1997	31/07/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
										20.367			684.000	661.868	589.712	2,11%	4,22%	70,59%		
MANTENIMIENTO DE RUTAS POR CONVENIO																				
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	5.707	01/01/2004	31/12/2005	416.000	866.904	570.235	0,00%	6,15%	100,00%	7	
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	4.349	01/01/2004	31/12/2005	397.000	497.891	435.399	0,00%	1,03%	92,80%	7	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	5.257	01/01/2004	31/12/2005	152.000	1.391.487	1.023.627	0,00%	2,00%	100,00%	7	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varias	11	1.840,5	21.272	01/01/2005	31/12/2004	2.768.000	11.992.873	7.698.131	0,00%	7,08%	78,76%	7	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01/01/2004	30/12/2005	100.000	212.000	211.486	0,00%	2,22%	72,07%	7	
16	3	30	51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01/01/2004	31/12/2005	20.000	110.305	110.303	0,00%	22,67%	100,00%	7	
16	3	31	51	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	530,9	2.868	01/01/2003	31/12/2003	613.000	1.549.795	1.156.542	0,00%	0,00%	38,77%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 7	Tramos Varios	11	416,0	4.907	01/01/2004	31/12/2005	178.000	324.714	324.711	0,00%	22,07%	100,00%	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01/09/2004	31/08/2006	224.000	322.356	229.433	15,98%	29,29%	95,04%	6	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza	Tramos varios	11	266,7	4.895	01/04/2004	31/03/2006	511.000	1.380.851	972.118	8,36%	18,88%	53,52%	7	
16	3	36	51	CHUBUT	260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01/01/2004	31/12/2006	50.000	850.941	697.756	21,15%	38,41%	45,55%	6	A
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01/12/2004	30/11/2006	50.000	661.004	661.004	11,25%	24,26%	64,94%	6	A
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio N° 2	Tramos Varios	11	163,4	2.000	01/01/2006	31/12/2007	808.000	558.000	266.737	12,45%	19,55%	19,55%	7	A
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 6	Varias	11	43,5	2.000	01/01/2006	31/12/2007	100.000	404.346	404.344	12,45%	20,25%	20,25%	6	A
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8 : Belen- Lte.c/Tucuman	Km. 798,82 - km 986,82	11	188,0	2.632	01/10/2006	30/09/2007	538.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO - Convenio 2: Emp. RP N°20 - Emp. RP N°17	Km1056,32 - Km1116,96 DNU	11	60,6	850	01/10/2006	30/09/2007	850.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	3		51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio N° 1	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01/01/2004	31/12/2005				0,00%	7,38%	94,50%	7	
16	3		51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	01/01/2004	31/12/2005				0,00%	13,51%	59,32%	7	
										80.921			7.775.000	21.123.469	14.761.827	3,43%	11,45%	71,18%		
SEÑALAMIENTO DE RUTAS																				
16	4	1	51	PAIS		Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		8.108	01/01/2006	31/12/2006	1.022.000	9.525.472	9.525.468	25,01%	41,69%	41,69%	6	B
OBRAS DE EMERGENCIA																				
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		11.786	01/01/2006	31/12/2006	8.250.000	10.786.193	8.716.131	25,00%	41,66%	41,66%	6	B
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		4.612	01/01/2006	31/12/2006	1.635.000	3.711.668	2.712.722	24,98%	41,63%	41,63%	6	B
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		719	01/01/2006	31/12/2006	358.000	741.304	741.302	25,03%	41,72%	41,72%	6	B
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		16.124	01/01/2006	31/12/2006	73.000	18.177.482	17.385.434	25,01%	41,68%	41,68%	6	B
										33.241			10.316.000	33.416.647	29.555.590	25,00%	41,67%	41,67%		
MANTENIMIENTO POR SISTEMA MODULAR																				
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.729	19/07/2004	18/07/2006	449.000	680.059	493.195	17,92%	32,94%	99,78%	6	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.989	03/12/2004	02/12/2006	678.000	2.079.027	2.079.024	19,18%	31,38%	55,31%	6	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	12.460	03/05/2004	31/01/2007	288.000	1.290.568	1.246.495	3,72%	14,74%	55,49%	6	A
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. R.N.N° 25 - Emp. R. P. N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	6.264	07/09/2004	06/09/2006	460.000	2.290.674	2.254.821	11,24%	32,98%	77,08%	6	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile	1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	4.647	01/11/2006	31/10/2008	951.000	51.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
16	6	7	51	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	2.958	01/09/2006	31/10/2007	605.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.589	21/02/2001	30/08/2005	200.000	200.000	149.795	0,00%	0,00%	100,00%	7		
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	9.362	03/02/1997	30/04/2004	100.000	100.000	19.409	0,00%	0,00%	100,00%	7		
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	13.596	03/02/1997	30/04/2004	100.000	100.000	49.136	0,00%	0,00%	100,00%	7		
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814	28/01/1997	31/07/2005	221.000	1	0	0,00%	0,00%	94,34%	7		
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	28.314	21/02/2001	31/01/2005	397.000	467.952	467.950	0,00%	0,00%	94,43%	7		
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	24.210	28/01/1997	31/08/2005	502.000	1	0	0,00%	0,00%	91,88%	8		
						TOTAL CORREDORES VIALES				106.885			1.520.000	867.954	686.290	0,00%	0,00%	95,69%			
						PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION															
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	13	38,0	84.580	17/04/2006	16/04/2008	39.000	39.000	0	4,12%	4,12%	4,12%	6		
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	60.000	01/09/2006	28/02/2009	9.024.000	3.512.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I. Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	34,0	38.757	30/04/2006	30/05/2008	22.141.000	4.811.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	11	51	SALTA	16	Lte.c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698	01/09/2006	30/11/2009	571.000	222.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	12	51	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		5	60,4	13.794	01/09/2006	30/11/2009	1.997.000	1.600.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	6.938	01/11/2006	28/02/2008	961.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	11.969	04/01/2005	03/07/2006	4.753.000	9.503.000	4.035.602	15,04%	29,66%	82,20%	6	A	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.j	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	13.000	01/11/2006	31/10/2007	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	60.000	01/09/2006	30/11/2010	13.375.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	38.200	01/11/2006	30/05/2008	22.881.000	6.404.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01/11/2006	31/10/2010	6.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	96.000	01/11/2006	31/10/2008	20.123.000	5.331.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	28.000	01/11/2006	31/10/2008	5.458.000	3.458.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	7.898	01/09/2006	30/11/2009	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	42	51	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01/06/2006	30/11/2010	1.431.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potreriños - Lte con Chile		5	70,0	24.180	01/11/2006	30/11/2009	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	10.467	04/01/2005	03/06/2006	2.067.000	10.417.000	4.827.706	30,41%	49,69%	98,14%	6	A	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	68.244	01/09/2006	30/11/2010	7.837.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	01/09/2006	30/11/2009	400.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16/12/2002	12/05/2005	1.166.000	100	0	0,00%	0,00%	97,67%	7		
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	33.633	12/05/2003	30/09/2005				0,00%	0,00%	99,14%	7		
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	57.152	01/11/2006	30/11/2009	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	RPN°20	8	18,2	60.340	16/11/2005	31/05/2008	17.762.000	8.804.835	4.401.936	7,95%	11,23%	12,77%	6		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elia)	8	27,7	90.740	01/11/2006	30/04/2009	8.940.000	3.479.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,7	90.000	01/11/2006	30/04/2009	39.640.000	25.018.989	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,5	145.000	01/11/2006	30/04/2009	38.206.000	29.706.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8		145.000	01/11/2006	30/04/2009	7.350.000	7.350.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	145.000	01/11/2006	30/04/2009	23.747.000	13.747.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	183.759	01/11/2006	30/04/2009	8.139.000	8.139.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Ayuí Grande - A°Mandisoví Grande	8	34,7	145.000	01/11/2006	30/04/2009	5.932.000	5.932.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	36,0	145.000	01/11/2006	30/04/2009	5.407.000	5.407.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	145.000	01/11/2006	30/04/2009	6.033.000	3.033.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,2	145.000	01/11/2006	30/04/2009	5.247.000	2.247.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	145.000	01/11/2006	30/04/2009	7.116.000	3.116.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	145.000	01/11/2006	30/04/2009	6.679.000	6.679.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	8,0	145.000	01/11/2006	30/04/2009	5.468.000	5.468.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Aeropuerto)	8	8,0	24.000	01/11/2006	30/04/2009	1.668.000	1.668.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	53	66	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	8.325	01/11/2006	30/04/2009	1.842.000	1.842.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalacion Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01/11/2006	31/10/2007	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
						TOTAL PASOS FRONTERIZOS Y CORREDORES VIALES DE INTEGRACION				2.700.077			310.356.000	177.590.153	13.265.244	0,49%	0,70%	3,55%			

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS																				
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14		5.822	01/01/2006	31/12/2006	1.022.000	5.822.473	3.594.437	24,99%	41,65%	41,65%	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	45.599	04/06/1999	31/03/2007	2.657.000	2.657.000	1.359.514	3,86%	7,80%	34,05%	6	A
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	61.883	17/05/1999	28/02/2008	100.000	7.904.836	0	0,00%	0,00%	10,46%	14	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	61.635	17/05/1999	28/02/2008	100.000	5.600.382	0	0,00%	0,00%	19,68%	6	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	05/07/1999	31/08/2006	398.000	3.090.157	0	12,76%	12,76%	52,16%	6	A
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10/05/1999	28/02/2007	500.000	500.000	59.098	0,00%	0,00%	20,28%	14	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15/09/1999	30/11/2007	10.156.000	100	0	0,00%	0,00%	0,40%	14	
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	30.186	01/07/1999	31/05/2007	972.000	5.720.982	5.720.980	19,18%	25,42%	82,95%	6	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	24.522	03/05/1999	31/08/2006	512.000	5.122.348	5.122.346	37,44%	50,74%	87,05%	6	A
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	8	45,0	32.610	01/05/1992	31/10/2006	861.000	386.463	386.461	0,00%	0,00%	88,16%	6	C
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15/06/1999	28/02/2006	905.000	100	0	0,00%	0,00%	59,80%	14	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	8	40,0	28.524	19/02/2001	08/10/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	97,19%	7	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20/09/1993	31/10/2006	431.000	5.006.000	4.501.968	0,00%	0,00%	99,23%	6	C
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	c/Chile	8	267,0	208.395	08/09/2000	31/10/2005	24.000	24.000	0	0,00%	0,00%	97,08%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	4.309	07/07/1999	30/12/2005	536.000	1	0	0,00%	0,00%	87,56%	14	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía		8		82.236	01/09/2005	30/06/2009	2.044.000	21.498.920	12.932.660	0,00%	0,00%	5,61%	6	S/D
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	11.729	13/10/2004	30/04/2006	381.000	1.535.069	1.535.066	25,20%	36,99%	98,06%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Grande	8	22,9	13.232	20/11/2000	31/10/2006	100.000	1.786.156	962.526	0,00%	0,00%	55,34%	6	
22	3	22	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Lte. C/Salta	DNU	8	74,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	6.564.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	23	51	SALTA	9	Tr. 3 - Acc A Pque Industrial				60.000			0	36.192	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	24	51	CHACO	16	Pte.Roque Saenz Peña - Lte. C/Santiago del Estero		8	0,1	45.000	01/11/2006	31/10/2008	19.088.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	50.000	01/11/2006	31/10/2008	8.546.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	48.544	01/11/2006	31/01/2008	2.044.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Losa s/Ex. Vias FCGBM - Emp. Av. Belgrano	10,125 - DNU	5	29,4	45.686	13/02/2006	30/12/2006	9.683.000	2	0	4,89%	7,81%	7,81%	6	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	61.369	24/09/2001	31/12/2006	4.780.000	17.780.000	11.218.315	0,00%	3,64%	70,96%	6	S/D
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.234	04/10/2004	19/01/2006	258.000	9.083.981	6.372.061	0,00%	23,18%	98,81%	7	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19/08/2003	30/04/2007	4.420.000	12.298.986	9.876.099	0,00%	0,00%	41,64%	6	S/D
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	(Sección I)	8	28,2	19.924	01/12/2004	31/10/2006	7.750.000	9.875.062	4.644.132	20,02%	30,98%	59,23%	6	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	(Sección II)	11	29,0	29.154	23/03/2006	21/09/2007	2.453.000	2.453.000	779.641	7,10%	7,10%	7,10%	6	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	(Sección III)	11	44,0	32.931	21/03/2006	19/03/2008	1.000.000	1.000.000	1.570.031	6,43%	6,43%	6,43%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	(Sección IV)	8	19,6	20.737	23/03/2006	31/07/2007				7,60%	7,60%	7,60%	6	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	225 (Sección V)	8	23,9	21.728	23/03/2006	21/09/2007	0	0	0	6,89%	6,89%	6,89%	6	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Aduana - Limite con Chile		8	7,0	5.500	01/09/2006	30/11/2009	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
TOTAL OBRAS POR CONVENIO CON PROVINCIAS										1.397.906			88.885.000	119.282.215	70.635.336	2,68%	4,06%	39,39%		
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS																				
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		3.833	01/01/2006	31/12/2006	613.000	3.832.625	3.336.135	24,97%	41,61%	41,61%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	9.876	01/11/1996	31/05/2006	1.209.000	100	0	0,00%	0,00%	38,93%	9	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	18.234	14/10/1999	28/02/2006	96.000	96.000	0	0,00%	0,00%	62,74%	14	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	41.000	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	4	
22	4	7	51	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	5.000	01/11/2006	31/10/2007	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	8	51	SALTA	34	Emp Ruta N°81 - General Mosconi - Pcia Salta	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	1.281	14/11/1995	01/07/1997	0	63.362	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrío - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	3.045	22/10/1996	03/12/2004	272.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	16.289	01/02/1999	31/01/2005	732.000	2.732.000	1.872.540	0,00%	0,00%	97,74%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	24.250	16/05/2005	30/04/2007	1.600.000	45.119.100	8.036.980	20,06%	43,05%	97,81%	6	A
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km. 29,2 - Km. 37,86	13	8,7	124.377	30/09/2005	29/09/2007	1.300.000	1.300.000	26.443.031	15,70%	21,55%	26,70%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	62.019	09/09/2005	10/06/2007	185.000	185.000	5.839.979	14,23%	19,39%	26,33%	6	A
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	25.192	12/04/2005	30/08/2009	6.436.000	3.936.000	2.341.546	6,97%	12,10%	27,88%	6	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	56.000	01/11/2006	31/10/2008	1.533.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	8	41,6	106.000	01/11/2006	31/10/2008	470.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	23.681	01/10/2003	31/07/2005	613.000	613.000	281.728	0,00%	0,00%	96,21%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía		5	23,2	1.738	17/12/2003	28/02/2005	1.661.000	100	0	0,00%	0,00%	100,00%	7	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	10/11/2003	08/11/2006	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	24/09/2003	24/11/2006	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	18/09/2003	17/08/2007	844.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	6	S/D
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	8	18,9	40.100	01/11/2006	30/10/2010	7.212.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	(Actual)	8	20,0	79.260	15/10/2004	14/10/2006	6.051.000	16.051.000	10.557.072	9,86%	17,25%	66,27%	6	A
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	0,5	18.444	01/11/2006	30/04/2009	10.412.000	4.052.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	88,0	98.000	01/09/2006	31/08/2009	818.000	14.187.569	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	32.622	01/11/2003	31/05/2007	324.000	9.444.879	9.444.877	18,36%	30,69%	71,27%	6	A
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	7.038	08/09/2003	08/10/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	91,63%	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	13.072	14/05/2004	30/12/2005	427.000	427.000	342.881	0,00%	1,56%	93,45%	7	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	261.857	01/02/2001	31/07/2006	6.987.000	27.229.436	20.287.671	2,27%	8,42%	77,33%	6	A
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	481.838	18/05/2003	31/12/2006	100.000	42.864.906	34.002.621	6,52%	10,48%	58,32%	6	A
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.693	09/09/2003	08/09/2004	262.000	262.000	111.513	0,00%	0,00%	99,32%	7	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	10.479	18/03/2004	17/08/2006	611.000	231.000	194.177	1,41%	2,46%	81,58%	6	A
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	42.735	08/10/2004	08/04/2007	21.334.000	11.334.000	85.159	0,00%	0,28%	24,44%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	32.000	01/11/2006	31/10/2007	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	13.474	20/01/2004	30/12/2006	380.000	1.805.804	1.551.487	2,04%	3,87%	97,48%	6	A
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	1.291	08/10/2004	08/07/2006	304.000	440.730	111.276	0,00%	0,00%	100,00%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	18.800	02/09/2005	03/01/2007	613.000	4.464.316	4.464.314	12,95%	23,86%	33,11%	6	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	4.501	03/06/2003	30/04/2004	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15/10/2003	15/12/2004	256.000	55.332	55.329	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Corrientes	8	0,5	2.782	01/11/2006	31/10/2008	782.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Carumbé - km646/km648	8	1,0	3.979	01/11/2006	31/10/2007	979.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	24.328	17/02/2004	17/02/2007	6.408.000	4.474.341	3.596.746	8,68%	16,16%	42,27%	6	A
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	52.319	18/11/2003	30/11/2006	531.000	9.781.000	5.506.980	8,65%	19,17%	91,47%	6	
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Zamora	8	2,9	33.318	18/11/2003	26/09/2006	500.000	7.608.387	1.976.667	5,14%	8,90%	71,02%	6	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc.Senador Rey, desvio tránsito pesado y	5	1,9	3.497	20/07/2004	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	92,22%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.541	01/01/2003	30/11/2003	847.000	100	0	0,00%	0,00%	87,05%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	22.382	14/10/2004	31/07/2006	7.450.000	7.450.000	26.046.372	3,50%	13,91%	70,89%	6	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Del Mortero	8	25,0	36.151	14/10/2004	12/10/2006	10.343.000	7.343.000	0	0,37%	4,88%	93,92%	6	A
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	36.927	14/10/2004	30/12/2006	9.508.000	3.508.000	0	12,31%	19,26%	51,70%	6	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	38.556	13/10/2004	12/10/2006	10.372.000	9.372.000	0	11,37%	16,39%	52,76%	6	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	45,0	48.414	13/10/2004	13/10/2006	13.104.000	13.104.000	0	6,40%	11,07%	42,11%	6	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	31,5	14.374	13/10/2004	13/10/2006	11.195.000	8.195.000	0	0,19%	12,75%	100,00%	10	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	9.351	13/10/2004	31/10/2006	10.619.000	8.619.000	0	0,00%	-0,95%	100,00%	10	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	27.777	15/07/2005	30/11/2008	11.414.000	11.414.000	0	11,37%	12,68%	21,09%	6	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	22.045	07/06/2005	30/11/2008	10.542.000	8.542.000	0	5,49%	8,22%	29,03%	6	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	8	31,1	25.408	12/07/2005	30/11/2008	10.564.000	10.564.000	0	4,99%	8,20%	21,25%	6	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	12.888	10/04/2006	30/03/2007	3.377.000	3.377.000	0	10,09%	10,09%	10,09%	6	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	19.286	15/04/2006	30/04/2007	6.210.000	6.210.000	0	8,40%	8,40%	8,40%	6	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	18.972	15/04/2006	30/04/2007	5.858.000	5.858.000	0	6,39%	6,39%	6,39%	6	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr. de Las Burras) - Emp. RPN° 12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	5.454	05/05/2004	30/10/2005	1.359.000	1.936.000	1.864.884	0,00%	0,00%	99,01%	7	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	52.190	16/04/2004	31/04/2006	1.412.000	19.112.000	15.818.276	16,84%	29,30%	73,49%	7	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	39.171	22/10/2004	31/10/2006	2.546.000	15.280.459	12.352.956	15,41%	37,31%	94,34%	7	A
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8		9.402	29/05/2003	31/12/2004	199.000	199.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	7	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	27.377	28/10/2003	30/12/2006	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	89,07%	6	S/D	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Miradores	8	29,0	72.931	12/11/2003	12/11/2006	8.232.000	18.791.354	14.360.914	8,28%	22,12%	78,15%	6	A	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	16/02/2004	28/02/2007	4.452.000	11.499.559	6.530.273	0,00%	0,00%	68,94%	6		
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	62.208	27/05/2004	30/11/2007	7.441.000	28.205.430	22.871.966	2,41%	15,31%	83,59%	6	A	
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	49.961	27/05/2004	30/06/2007	5.125.000	22.375.000	16.149.518	18,18%	37,30%	84,07%	6	A	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	32.190	22/11/2003	30/06/2006	444.000	1.944.000	343.518	0,00%	0,00%	85,09%	6		
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	37.081	07/02/2003	30/06/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	66.317	27/10/2000	31/12/2004	1.629.000	2.329.000	0	0,00%	0,00%	80,37%	7		
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	28.335	02/05/2000	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	96,12%	7		
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	19.050	22/08/2001	30/12/2005	291.000	5.091.000	898.819	0,00%	0,13%	100,00%	7		
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8		17.400	01/11/2006	31/10/2009	2.968.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	44.956	01/02/2006	30/10/2007	9.455.000	17.790.100	9.109.266	28,83%	33,69%	33,69%	6		
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Oncativo (O.F.)	8	91,0	288.460	17/04/2006	30/09/2008	57.034.000	161.335.319	130.055.356	6,38%	6,38%	6,38%	6		
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	45.600	01/11/2006	31/10/2008	8.697.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco		8	58,4	35.000	01/11/2006	31/10/2009	981.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN° 34		5	31,0	30.000	01/11/2006	31/10/2009	250.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,87	5	46,1	51.896	21/02/2006	30/05/2010	2.657.000	70.191	0	1,18%	3,35%	3,35%	6		
22	4	87	51	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	18,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte con Neuquen (S III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	18,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	164.000	164.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	121.550	01/11/2006	30/11/2010	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01/11/2006	31/08/2007	400.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17/09/2001	30/06/2005	50.000	50.000	0	0,00%	0,00%	79,94%	7		
22	4	92	51	SANTA FE	34	Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	40.629	03/08/2005	30/11/2008	3.421.000	3.921.000	3.078.740	7,69%	10,54%	13,94%	6		
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	60.000	01/11/2006	31/10/2009	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Piedrabuena	8	305,0	68.499	01/09/2005	30/12/2006	6.746.000	84.867.882	58.373.051	0,00%	4,77%	15,60%	6	S/D	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	105.020	01/09/2005	31/08/2007				20,24%	30,40%	31,27%	6	A	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	95.644	27/12/2005	26/06/2008				6,18%	12,97%	12,97%	6	S/D	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	98.000	01/11/2006	31/10/2009	1.044.000	5.600.002	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	2189,52 - Km. 2215,91	8	26,4	47.000	01/11/2006	31/10/2010	100.000	7.478.002	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	2215,91 - Km. 2289,64	8	73,7	101.000	01/11/2006	31/10/2011	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	49.000	01/11/2006	31/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	II - Sobre RPN° 25	8	66,5	90.000	01/11/2006	31/10/2009	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Sobre RPN° 29	8	57,0	70.000	01/11/2006	31/10/2009	200.000	200.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Tres Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km.	8	116,8	172.000	01/11/2006	31/10/2009	222.000	222.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		8	350,0	69.000	01/11/2006	31/10/2008	1.635.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	de Noviembre	8	13,2	31.650	19/01/2006	18/07/2007	1.738.000	21.538.000	14.714.095	28,28%	45,04%	45,04%	6		
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	49.962	01/11/2006	31/10/2009	1.044.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	S/D	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS				4.806.044			343.560.000	747.411.533	473.008.713	4,65%	8,02%	34,08%			
						CONCESION SIN PEAJE															
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	170.700	01/06/1998	30/11/2008	2.558.000	15.918.757	13.324.859	2,28%	4,56%	50,62%	6		
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	128.611	02/02/1998	30/11/2008	2.350.000	14.331.546	13.034.744	3,03%	6,05%	69,84%	6		
						TOTAL CONCESION SIN PEAJE				299.311			4.908.000	30.250.303	26.359.603	2,60%	5,20%	58,88%			
						MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES															
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	0,0	4.700	01/11/2006	30/10/2007	73.000	73.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	0,0	1.500	01/11/2006	31/05/2007	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	0,2	6.700	01/11/2006	30/04/2008	480.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	0,2	6.344	23/08/2002	31/10/2004	230.000	230.000	98.267	0,00%	0,00%	99,53%	7		
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	0,2	8.112	29/01/2003	31/10/2004	192.000	1	0	0,00%	0,00%	98,87%	7		
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		8	0,1	1.175	01/11/2006	30/10/2007	900.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	0,2	8.307	24/01/2003	15/12/2003	50.000	50.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	8	0,1	16.940	28/06/2005	30/06/2006	705.000	9.881.152	4.054.111	0,00%	12,71%	28,98%	6	S/D
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	0,0	1.700	01/11/2006	31/10/2007	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	0,0	1.200	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	12,0	1.270	01/11/2006	31/10/2007	900.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	0,0	1.250	01/11/2006	31/10/2007	900.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	0,1	2.400	01/11/2006	30/04/2008	750.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	0,0	1.470	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	0,0	1.140	01/11/2006	31/10/2007	800.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	0,0	1.460	01/11/2006	30/10/2007	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	0,0	1.170	01/11/2006	30/10/2007	200.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	0,0	1.500	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo.del Est.(Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	0,0	1.500	01/11/2006	31/10/2007	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	8	0,0	4.700	01/11/2006	30/04/2008	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	0,1	2.100	01/11/2006	30/10/2007	286.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junin de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine)	8	0,0	8.300	01/11/2006	30/04/2008	200.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	0,1	1.900	01/11/2006	30/10/2007	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	0,1	3.000	01/11/2006	30/10/2007	950.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	0,4	11.800	01/11/2006	30/04/2008	73.000	73.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	29	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	8	0,1	3.160	01/09/2006	30/11/2009	600.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	30	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/3º Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	8	0,1	3.160	01/09/2006	30/11/2009	600.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	31	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1207,28	8	0,1	1.350	01/11/2006	30/11/2007	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	0,1	1.800	01/11/2006	30/11/2007	36.000	36.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Montegudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	0,1	3.300	01/11/2006	31/10/2007	491.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	0,0	300	01/11/2006	30/04/2007	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	35	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	8	0,1	4.500	01/11/2006	30/10/2007	600.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	5	1,2	69.497	01/09/2004	31/08/2007	2.928.000	2.928.000	2.831.167	2,28%	29,73%	62,12%	6	A
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5		10.525	29/08/2003	30/06/2004	50.000	50.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	7	
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	1,0	3.500	01/11/2006	31/10/2007	73.000	73.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	1,0	485	01/11/2006	30/04/2007	285.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	1,7	17.400	01/11/2006	31/10/2008	613.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	0,3	12.700	01/11/2006	30/04/2008	437.000	287.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	0,1	1.500	01/11/2006	30/04/2007	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	0,1	2.000	01/11/2006	31/10/2007	500.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	0,0	1.500	01/11/2006	31/10/2007	300.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	0,1	850	01/11/2006	30/10/2007	50.000	50.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	0,0	350	01/11/2006	31/01/2007	350.000		1	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	0,0	1.500	01/11/2006	30/11/2008	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos DNU	8	0,1	11.000	01/11/2006	31/10/2007	4.788.000		10	0,00%	0,00%	0,00%	2	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION EN PUENTES				252.015			23.690.000	14.331.298	6.983.545	0,63%	9,05%	32,24%		
						OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS														
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15/07/2004	28/02/2005	9.000	3.709.000	0	0,00%	0,00%	97,61%	7	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05/08/2004	03/05/2005	972.000	972.000	0	0,00%	0,00%	96,56%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.V. Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	8.135	27/01/2006	28/07/2006	1.705.000	1.705.000	1.170.367	24,11%	28,22%	28,22%	6	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-A.Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.S.Martin-Emp.RPN°	km 500 - km 539	5	39,0	12.738	20/07/2004	30/08/2005	2.600.000	4.600.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13/08/2004	30/04/2006	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	12,68%	10	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cr.FC Sarmiento - Emp.RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	13.066	04/10/2004	31/05/2005	1.165.000	1.165.000	292.376	0,00%	0,00%	99,86%	7	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	13.940	08/10/2004	30/06/2005	219.000	219.000	0	0,00%	0,00%	93,72%	7	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	14.259	23/07/2004	30/04/2006	2.313.000	20.913.000	1.355.956	5,98%	5,98%	95,28%	6	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	41.290	23/07/2004	30/07/2005	1.293.000	1.293.000	0	0,00%	0,00%	94,43%	7	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	10.625	28/09/2005	31/09/2006	1.713.000	1.713.000	8.660.924	34,46%	84,20%	96,38%	6	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	3	54	SANTA FE	A012	Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20/07/2004	30/04/2005	1.422.000	1.422.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	7.316	04/01/2006	30/07/2006	3.281.000	3.281.000	3.507.188	52,45%	64,46%	64,46%	6	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.566	05/08/2004	31/12/2004	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	24.468	06/12/2005	30/08/2006	2.350.000	2.350.000	11.667.075	47,72%	64,26%	64,26%	6	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Ob N°17 - J.A. de la Peña - A.Nivel FFCC GSM	163	5	70,0	18.534	05/08/2004	31/05/2005	2.828.000	2.828.000	0	0,00%	0,00%	99,99%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	16.386	05/08/2004	30/06/2005	1.126.000	1.126.000	347.098	0,00%	0,00%	99,90%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	17.523	23/11/2004	30/11/2005	637.000	13.637.000	0	0,00%	0,00%	99,64%	7	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28/07/2004	31/05/2005	2.239.000	2.239.000	0	0,00%	0,00%	99,37%	7	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	17.943	19/12/2005	30/08/2006	3.524.000	3.524.000	1.638.487	6,44%	12,97%	12,97%	6	C
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-	km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-	5	42,0	21.160	19/05/2005	18/12/2006	703.000	703.000	3.502.196	29,63%	30,20%	32,59%	6	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	23.737	20/07/2004	31/08/2005	3.566.000	12.466.000	0	0,00%	0,00%	99,11%	7	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.626	14/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	7	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	12.706	16/11/2005	31/09/2006	1.973.000	1.973.000	4.776.292	48,89%	58,85%	62,08%	6	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. Est.	km 361 - km 398	5	37,0	2.742	20/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circ.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	29.150	05/01/2005	28/02/2006	100.000	100.000	7.988.200	0,00%	24,32%	99,87%	7	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	23.224	13/01/2005	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	98,30%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	13.136	20/08/2004	31/05/2005	1.711.000	1.711.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	8	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 62 - km 192		5	130,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	51	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		5	11,0	990	01/11/2006	30/09/2007	990.000	4.140.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N°23A - Acc Castellanos-A/N FFCC G.S.M.	km 616	5	7,0	7.544	21/12/2005	30/06/2006	1.553.000	1.553.000	2.273.381	7,87%	30,13%	30,13%	6	
22	7	9	53	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-	Paz)	5	5,0	1.387	06/04/2006	06/08/2006	1.199.000	1.199.000	51.489	11,68%	11,68%	11,68%	6	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - S.Francisco - Emp. RP N° 81A (S)	km247	5	32,0	10.430	24/04/2006	23/12/2006	2.350.000	2.350.000	491.862	5,95%	5,95%	5,95%	6	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S)	- Km 287 / Km 304 - Km 306	5	61,0	22.690	20/04/2006	19/12/2006	1.970.000	1.970.000	350.855	1,65%	1,65%	0,00%	6	
22	7	11	52	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		5	5,0	450	01/11/2006	31/08/2007	450.000	450.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	53	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		5	39,0	3.510	01/11/2006	31/08/2007	3.510.000	3.510.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	11	54	SANTA FE	8	CVN°4 - km304-km723	km304-km306-km442-km468/km475-	5	66,0	30.878	01/11/2006	31/08/2007	3.769.000	3.769.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		5	4,0	7.071	01/11/2006	30/04/2007	3.742.000	3.742.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	1250	5	44,0	30.347	23/01/2006	30/01/2007	4.243.000	4.243.000	8.649.774	22,48%	28,51%	28,51%	6	
22	7	12	52	TUCUMAN	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289	5	34,0	23.072	03/05/2006	30/04/2007				5,13%	5,13%	5,13%	6	
22	7	12	53	SALTA	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		5	9,0	2.520	01/01/2006	30/11/2007	2.520.000	2.520.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	18.488	08/02/2006	30/10/2006	3.519.000	10.219.000	3.184.745	48,75%	53,33%	53,33%	6	
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		5	3,0	840	01/11/2006	30/04/2007	840.000	840.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		5	3,0	251	01/11/2006	30/04/2007	251.000	251.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. N. N° 123 - Emp. R.P.N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	4.363	01/03/2005	15/10/2005	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 -	km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	10.795	01/11/2006	30/04/2007	1.620.000	120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 252 - km 296		5	44,0	16.165	01/11/2006	30/06/2007	2.690.000	190.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	53	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		5	11,0	3.080	01/11/2006	30/09/2007	3.080.000	80.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	54	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		5	4,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	55	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		5	8,0	720	01/11/2006	30/09/2007	720.000	720.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	9.443	07/04/2006	30/11/2008	1.279.000	1.279.000	0	17,57%	17,57%	17,57%	6	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		5	10,0	9.703	01/11/2006	30/04/2007	1.680.000	1.680.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		5	7,0	2.940	01/11/2006	31/10/2007	1.960.000	60.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	55	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		5	3,0	1.260	01/11/2006	31/10/2007	840.000	840.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	56	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		5	18,0	3.920	01/11/2006	30/09/2008	1.040.000	1.040.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	57	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		5	40,0	3.600	01/11/2006	31/10/2007	3.600.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	60	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		5	67,0	6.030	01/11/2006	31/10/2007	1.722.000	22.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	61	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		5	14,0	3.920	01/11/2006	30/09/2007	3.920.000	1.020.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	62	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		5	13,0	1.170	01/11/2006	30/09/2007	1.170.000	1.170.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	15	63	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		5	31,0	2.790	01/11/2006	31/08/2007	2.790.000	2.790.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	16	52	BUENOS AIRES	9	CVN*3 - Asc km 106 - km 206		5	100,0	840	01/11/2006	31/10/2007	3.000.000	1.706.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	53	BUENOS AIRES	9	CVN*3 - Desc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	54	BUENOS AIRES	9	CVN*3 - Desc km 85 - km 91	Desc km 85 - km 91	5	6,0	810	01/11/2006	31/10/2007	540.000	540.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	56	BUENOS AIRES	9	CVN*3 - Desc km 111 - km 125	Desc km 111 - km 125	5	14,0	1.890	01/11/2006	31/01/2008	1.260.000	1.260.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	57	BUENOS AIRES	9	CVN*3 - Desc km 157 - km 188	Desc km 157 - km 188	5	31,0	2.160	01/11/2006	30/10/2009	2.478.000	2.478.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	58	SANTA FE	11	CVN*3 - km 413 - km 425		5	12,0	1.080	01/11/2006	30/09/2007	1.080.000	1.080.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN*3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	22.650	01/03/2006	28/02/2007	3.240.000	3.240.000	1.127.669	9,44%	9,44%	9,44%	6	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN*3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	21.603	14/03/2006	11/02/2007	2.520.000	2.520.000	1.018.465	4,78%	4,78%	4,78%	6	
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN*3 - km 103 - km 107		5	4,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	62	CORDOBA	19	CVN*3 - km 251 - km 253		5	2,0	180	01/11/2006	31/08/2007	180.000	180.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	63	CORDOBA	19	CVN*3 - km 257 - km 263		5	6,0	540	01/11/2006	31/08/2007	540.000	540.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	16	64	LA PAMPA	188	CVN*3 - km 301 - km 315		5	14,0	3.920	01/11/2006	31/01/2008	920.000	920.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN*4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	01/11/2006	31/10/2007	160.000	160.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN*4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	17.701	06/04/2006	30/12/2006	960.000	10.000	870.494	7,88%	7,88%	7,88%	6	
22	7	17	53	CORDOBA	8	CVN*4 - km 635 - km 652		5	17,0	15.642	01/11/2006	31/10/2007	1.530.000	1.530.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	54	CORDOBA	8	CVN*4 - km 662 - km 667		5	5,0	1.400	01/11/2006	31/08/2007	1.400.000	1.400.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN*4 - km 535 - km 539		5	4,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN*4 -Obra N°28 -Acc Amenabar - Cr.FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	11.883	30/12/2004	30/10/2005	487.000	487.000	0	0,00%	0,00%	99,36%	8	
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN*4 - km 732 - km 754		5	22,0	7.840	01/11/2005	30/11/2008	2.239.000	2.239.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	52	TUCUMAN	9	CVN*5 - km 1315 - km 1326		5	11,0	990	01/11/2006	30/09/2007	990.000	990.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN*5 - km 129 - km 151		5	22,0	6.160	01/11/2006	31/08/2009	1.759.000	9.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	56	SGO DEL ESTERO	34	CVN*5 - km 409 - km 442		5	33,0	9.240	01/11/2006	31/08/2009	2.638.000	2.638.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	58	SGO DEL ESTERO	34	CVN*5 - km 846 - km 851		5	5,0	450	01/11/2006	30/09/2007	450.000	450.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	18	59	SGO DEL ESTERO	34	CVN*5 - km 864 - km 896		5	32,0	1.080	01/11/2006	30/09/2007	1.080.000	1.080.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN*6 - km 1130 - km 1170		5	40,0	23.744	01/11/2006	31/08/2007	500.000	500.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN*6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326- km 1336	5	10,0	4.124	04/04/2006	30/09/2006	900.000	900.000	143.466	16,51%	16,51%	16,51%	6	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN*6 - km 68 - km 89 -Emp. RPN°11 - Pcia de la Plaza		5	21,0	13.483	24/04/2006	30/11/2006	1.519.000	1.519.000	0	5,13%	5,13%	5,13%	6	
22	7	19	54	CHACO	16	CVN*6 - km 87 - km 89		5	0,0	180	01/11/2006	31/10/2007	180.000	180.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	19	55	CORRIENTES	12	CVN*6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036		5	6,0	810	01/11/2006	30/09/2007	540.000	540.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	20	51	BUENOS AIRES	3	CVN*1 - Ruta 3 - Km. 176 - 199		5	23,0	2.070	01/11/2006	31/10/2007	70.000	70.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	20	52	BUENOS AIRES	3	CVN° - Ruta 3 - Km 217 - 244		5	27,0	2.430	01/11/2006	31/01/2008	430.000	430.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	20	53	BUENOS AIRES	205	CVN1 - Ruta 205 - Km. 223 - 243		5	20,0	1.215	01/11/2006	30/09/2008	2.600.000	2.600.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	20	54	BUENOS AIRES	226	CVN*1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52	Km 50 - Km 52	5	2,0	5.600	01/11/2006	30/09/2007	560.000	560.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	20	55	BUENOS AIRES	226	CVN*1- Ruta Nacional N° 226 - Km 162 - Km 174	Km 162 - Km 174	5	12,0	2.903	01/11/2006	31/10/2008	1.360.000	1.360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	51	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 65 - Km 87	Km 65 - Km 87	5	22,0	2.903	01/11/2006	31/08/2007	1.935.000	35.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	52	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 120 - Km 129	Km 120 - Km 129	5	9,0	1.215	01/11/2006	31/08/2007	810.000	810.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	53	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 221 - Km 224	Km 221 - Km 224	5	3,0	405	01/11/2006	31/08/2007	270.000	270.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	54	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 354 - Km 369	Km 354 - Km 369	5	15,0	2.025	01/11/2006	31/08/2007	1.350.000	50.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	55	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 453 - Km 470	Km 453 - Km 470	5	17,0	2.295	01/11/2006	31/08/2007	1.530.000	30.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	56	BUENOS AIRES	5	CVN*2- Ruta Nacional N° 5 - Km 480 - Km 504	Km 480 - Km 504	5	24,0	6.720	01/11/2006	31/10/2008	720.000	720.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	57	BUENOS AIRES	7	CVN*2- Ruta Nacional N° 7 - Km 116 - Km 121	Km 116 - Km 121	5	5,0	675	01/11/2006	31/08/2007	450.000	450.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	58	BUENOS AIRES	7	CVN*2- Ruta Nacional N° 7 - Km 147 - Km 153	Km 147 - Km 153	5	6,0	810	01/11/2006	31/08/2007	540.000	540.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	59	BUENOS AIRES	7	CVN*2- Ruta Nacional N° 7 - Km 159 - Km 167	Km 159 - Km 167	5	8,0	1.080	01/11/2006	31/08/2007	720.000	720.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	60	BUENOS AIRES	7	CVN*2- Ruta Nacional N° 7 - Km 181 - Km 185	Km 181 - Km 185	5	4,0	540	01/11/2006	31/08/2007	360.000	360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	61	BUENOS AIRES	7	CVN*2- Ruta Nacional N° 7 - Km 202 - Km 230	Km 202 - Km 230	5	28,0	2.520	01/11/2006	31/10/2008	520.000	520.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	21	62	CORDOBA	7	CVN*2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654		5	38,0	5.130	01/11/2006	30/09/2007	3.420.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	22	51	BUENOS AIRES	11	CVN*3 - Ruta 11 - Km. 485 - 508		5	23,0	2.070	01/11/2006	30/09/2008	1.070.000	1.070.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	22	52	SANTA FE	11	CVN*3 - Ruta N°11 - Km. 675 - 684		5	9,0	850	01/11/2006	30/09/2007	810.000	810.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	22	53	SANTA FE	19	CVN*3 - Ruta N°11 - Km. 730 - 739		5	9,0	850	01/11/2006	30/09/2007	810.000	810.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	22	54	SANTA FE	19	CVN*3 - Ruta N°19 - Km. 93 - 96		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	270.000	270.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	22	55	LA PAMPA		CVN*3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8		5	7,0	945	01/11/2006	30/09/2007	630.000	630.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	23	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - Ruta 8 - Km 146 - 163		5	17,0	2.200	01/11/2006	30/11/2007	530.000	530.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	52	CORDOBA	8	CVN°4 - Ruta Nacional N°8 - Km. 515 - 559		5	44,0	2.500	01/11/2006	30/11/2008	960.000	960.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	53	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km.563 - 580		5	17,0	2.100	01/11/2006	30/11/2008	2.469.000	1.369.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	54	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km. 762 - 765		5	3,0	400	01/11/2006	30/11/2006	270.000	270.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	55	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - Km. 766 - 778		5	12,0	2.000	01/11/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	56	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - km. 94 - 101		5	7,0	950	01/11/2006	28/02/2008	960.000	960.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	57	CORDOBA	A005	CVN°4 - Autopista A005 km. 0 - 12		5	12,0	2.000	01/11/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. RPN° 3 -Emp. RN.N° 148	km600/km695-km723	5	64,0	14.023	01/11/2006	31/10/2009	3.999.000	99.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	51	SANTA FE	34	CVN°5 - Ruta N°34 - Km. 281 - 299		5	18,0	2.200	01/11/2006	28/02/2009	1.439.000	39.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	52	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 520 - km 536		5	16,0	1.900	01/11/2006	31/10/2008	1.280.000	1.280.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	53	SALTA	34	CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1131 - 1134		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	840.000	840.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	54	SALTA		CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1147 - 1161		5	14,0	1.800	01/11/2006	28/02/2009	920.000	920.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	55	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1161 - 1164		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	270.000	270.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	56	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1177 - 1196		5	19,0	2.400	01/11/2006	30/09/2007	1.710.000	1.710.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	7	24	57	CORDOBA	9	CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615		5	20,0	2.500	01/11/2006	31/10/2007	800.000	800.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
TOTAL OBRAS EN CORREDORES VIALES CONCESIONADOS										890.119			173.758.000	195.414.255	63.068.357	6,96%	9,72%	42,25%		
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		3.000	01/11/2006	30/04/2008	1.412.000	1.262.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8		14.000	01/11/2006	31/10/2009	1.295.000	1.295.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II										17.000			2.707.000	2.557.001	0	0,00%	0,00%	0,00%		
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		8		12.000	01/11/2006	31/10/2008	7.000.000	3.000.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	18.000	01/11/2006	31/10/2008	613.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	7.000	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	28.500	01/11/2006	31/10/2009	500.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	1	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	47.800	01/11/2006	31/10/2009	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	6	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras		8	194,0	11.500	01/11/2006	31/10/2009	800.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	75.000	01/11/2006	31/10/2008	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	10.000	01/11/2006	31/10/2007	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Minapona		8	160,0	200.000	01/11/2006	31/10/2010	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	San Carlos - Cachi y Dársena - Cachi		8	43,0	17.000	01/11/2006	31/10/2009	5.245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	11	51	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		8	35,0	17.200	01/11/2006	31/10/2008	511.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	51	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	20.000	01/11/2005	30/10/2008	3.552.000	52.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8		40.000	01/11/2006	31/10/2010	3.066.000	66.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	14	51	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		8	62,0	5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	15	51	MISIONES		Const.Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		8		5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	16	51	MISIONES		Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		8		5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía N. Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		8	12,0	58.000	01/11/2006	31/10/2010	16.191.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	20.000	01/11/2006	31/10/2010	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8		82.000	01/11/2006	31/10/2010	800.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	20	51	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		8		10.000	01/11/2006	31/10/2008	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	50.000	01/11/2006	31/10/2010	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	46.200	01/11/2006	31/10/2009	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	23	51	TUCUMAN		Valle		8	80,0	5.000	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	80.000	01/11/2006	31/10/2008	409.000	159.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte./Río S.María entre las local. de S. José y Palo Seco		8	0,2	4.000	01/11/2006	31/10/2007	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía RNN°11-Paso p/Resistencia Rotonda c/RNN°16 y		8	35,0	62.000	01/11/2006	31/10/2010	3.066.000	66.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	27	51	CHACO		Obras Empalme Ruta Provincial 12		8		17.000	01/11/2006	30/04/2008	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	620.000	01/11/2006	31/10/2010	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8		5.000	01/11/2006	30/11/2009	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa		5	0,1	5.000	01/11/2006	31/10/2007	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	6.000	01/11/2006	31/10/2007	383.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	5.000	01/11/2006	31/10/2007	613.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	33	51	CHUBUT		Pavimentación Acceso a Cholilla		8	29,0	22.658	01/11/2006	31/10/2008	501.000	3.323.368	3.323.366	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	34	51	CHUBUT		Pavimentación Acceso El Maiten		8	31,0	29.518	22/11/2005	30/11/2007	613.000	8.535.229	6.895.449	14,03%	24,31%	25,87%	6	A
22	9	35	51	CHUBUT		Obra vial Corcovado-Río Pico y Gualjaina - 1ra. Sección		8	60,0	6.000	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	2.956.603	2.956.601	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	36	51	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel		8	0,2	1.800	01/11/2006	31/05/2007	245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154		8	154,0	33.000	01/11/2006	31/10/2008	767.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	700.000	01/11/2006	31/10/2009	9.628.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	96.000	01/11/2006	31/10/2009	327.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	5	2,0	2.749	27/01/2006	25/09/2006	327.000	1	0	33,10%	33,25%	33,25%	6	
22	9	41	51	CORDOBA	10	Adelia Maria - General Levalle y La Cautiva - Jovita		8	57,0	16.000	01/11/2006	31/10/2008	327.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estab. y contención de barrancas - Santa Elena		17		10.000	01/11/2006	31/10/2007	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Ob reasfalt. de los acc norte y sur a la Cdad de Villaguay		5		11.000	01/11/2006	31/10/2007	511.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8		12.500	01/11/2006	31/10/2007	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	45	51	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		8		10.000	01/11/2006	31/10/2007	358.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8		26.000	01/11/2006	31/10/2008	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	47	51	ENTRE RIOS		14 y 16		8		33.000	01/11/2006	31/10/2008	613.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General		8	0,2	7.000	01/11/2006	31/05/2007	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	49	51	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		8	150,0	12.000	01/11/2006	31/10/2008	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO		Rot.en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande		8		5.000	01/11/2006	31/10/2007	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km RNN° 151 Barba del Medio		8		6.000	01/11/2006	31/10/2007	750.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia		8	82,0	150.000	01/11/2006	31/10/2007	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Río Turb		8	860,0	60.000	01/11/2006	31/10/2009	1.022.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8		29.000	01/11/2006	31/10/2008	1.453.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	55	51	SANTA CRUZ	3	km 29 - Monte Aymond		5	30,0	9.000	01/11/2006	31/10/2007	767.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc.	8	2,2	14.090	01/03/2006	28/02/2007	1.875.000	1.875.000	792.241	8,77%	8,77%	8,77%	6	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RP N°19	DNU	8	31,0	62.000	01/11/2006	31/10/2009	14.832.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	DNU	5	0,1	1.280	01/11/2006	31/05/2007	262.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata	DNU	8		20.000	01/11/2006	30/04/2008	2.044.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. P. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	39.454	20/04/2006	18/04/2008	2.044.000	1	0	0,46%	0,46%	0,46%	6	
22	9	61	51	BUENOS AIRES		AV. JUAN XXIII Y ACC. PAQUE. IND. CHACABUCO	DNU	8	2,8	13.659	01/11/2006	30/10/2007	1.574.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	VERGARA	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	DNU - Partido de Berazategui	8	4,6	26.220	24/02/2006	31/05/2010	1.716.000	1.716.000	1.096.061	10,54%	10,54%	10,54%	6	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Bs As - La Plata por Av. Iriarte (España)	DNU - Primera Etapa	8	2,6	19.998	24/01/2005	31/12/2006	532.000	8.710.585	6.889.849	25,10%	43,64%	70,50%	6	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V- DNU	8	16,6	36.484	01/11/2006	31/10/2008	1.022.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas	DNU	8		14.000	01/11/2006	31/10/2007	818.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.N° 6	DNU	8	86,0	79.000	01/11/2006	31/10/2010	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano	DNU	5		36.000	01/11/2006	31/10/2009	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	68	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion I DNU	8	6,8	15.000	01/11/2006	30/04/2008	900.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	69	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion II DNU	8	22,3	20.000	01/11/2006	30/04/2008	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	DNU	5		4.000	01/06/2006	30/11/2008	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RP N°14 - Gualjaina - emp. RN N° 40	DNU	8	62,0	33.780	01/11/2006	31/10/2010	760.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)-DNU	8	62,0	46.254	01/11/2006	31/10/2009	1.454.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RN N°40	Km 0,00 - Km 30,00 - DNU	8	30,0	33.810	01/02/2006	01/02/2008	1.623.000	2	0	6,34%	10,13%	10,13%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguerr - Emp. RP N°20	(P56) - DNU	8	39,0	25.983	09/03/2006	30/08/2010	500.000	1	0	1,50%	1,50%	1,50%	6	A
22	9	75	51	CHUBUT	P70-1S40	El Maiten-Emp.RNN° 40(ex258-Epuyen)-Acc BsAs Chico	28,896 (P70)- DNU	8	31,0	29.518	22/11/2005	30/11/2007	1.698.000	1	0	13,52%	23,80%	25,36%	6	
22	9	76	51	CHUBUT	P71	Emp. RN N°40 (Ex RN N°258) - Cholilla	Km 0,00 - Km 30,00 - DNU	8	30,0	22.658	15/12/2005	30/05/2010	1.636.000	586.328	0	8,86%	17,57%	17,57%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)	DNU	8	6,4	20.000	01/11/2006	30/04/2008	2.044.000	44.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RN N°7 - Emp. RN N°8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87) - DNU	5	0,1	226	27/12/2005	01/06/2006	220.000	268.904	0	9,29%	84,96%	84,96%	6	A
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río san Antonio en Carlos Paz		8	0,3	3.920	01/11/2006	30/04/2007	801.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa María	DNU	5	1,0	2.100	01/11/2006	30/04/2007	429.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	81	51	CORDOBA	P10	Lte. C/Ls Pampa - Gral. Levalle	prog. 18.500 - Jovita	8	36,2	29.615	01/11/2006	31/10/2007	1.588.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	82	51	CORDOBA	PE90	Alcira Gigena - Gral. Cabrera		8	47,8	32.000	01/11/2006	31/10/2007	1.881.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22.900	8	22,9	25.598	01/11/2006	31/10/2007	1.095.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	530.000	01/11/2006	31/10/2011	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RN N°81	Km1167 - Km1184,44 DNU	13	10,9	10.570	01/11/2006	31/10/2007	570.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa	DNU	8	24,0	40.000	01/11/2006	31/10/2008	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laiishi - El Colorado	DNU	5	58,0	12.620	27/06/2005	31/10/2006	1.914.000	10	0	17,00%	32,70%	39,67%	6	A
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RN N°11 - Riacho He-He	DNU - Secciones I, II y III	5	70,0	21.681	20/05/2005	31/10/2006	2.645.000	10	0	9,96%	41,81%	58,51%	6	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	DNU	8	8,0	40.000	01/11/2006	31/10/2009	17.731.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	93	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra	DNU	8	44,0	40.000	01/11/2006	31/10/2009	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Sector Agua de Las Avispas		8		525	01/11/2006	30/04/2007	350.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Emp. RN N°7 - Ugarteche DNU	8	13,6	33.943	25/01/2005	31/12/2006	1.022.000	19.018.856	17.572.737	17,84%	31,98%	77,69%	6	A
22	9	96	51	SANTA FE	A 008	Av. Circunvalación de Rosario	DNU	17	2,8	5.000	01/11/2006	30/04/2007	3.415.000	2.229.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	9	97	51	MENDOZA	145 (exp224)	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	74.000	01/11/2006	31/10/2009	8.899.000	3.891.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	11	
22	9	98	51	MENDOZA	145 (exp224)	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	56.930	01/11/2006	31/10/2009	7.170.000	5.149.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	15	
22	9	99	51	MENDOZA		Paso Hito Pehuenche Seccion III - a	DNU	8	13,6	57.691	01/11/2006	31/10/2008	5.791.000	4.159.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RUTAS FASE II				4.513.032			170.482.000	65.806.569	39.526.304	0,73%	1,33%	1,91%		
						MEJORAMIENTO Y REPOSICION FASE III														
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		25.000	01/11/2006	31/10/2008	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	2	51	MISIONES		Puente Internacional Encarnacion - Posadas	DNU	17	1,0	10.000	01/11/2006	31/10/2007	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	3	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Pino Hachado	DNU	8	30,0	738	01/11/2006	31/08/2007	738.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas	DNU	8	2,5	1.500	01/11/2006	30/04/2007	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Puente sobre Arroyo Pilmatue	DNU	8	1,0	500	01/11/2006	30/04/2007	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura	DNU	8	5,0	12.000	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN N°231	DNU	8	20,6	69.915	21/02/2006	30/11/2008	1.819.000	4.695.315	4.324.624	2,39%	7,29%	7,29%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen	DNU	8	98,0	10.000	01/11/2006	31/10/2007	4.395.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II DNU	8	64,0	115.000	01/11/2006	31/10/2011	2.044.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Ñorquinco	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	797	01/02/2006	30/11/2006	785.000	1	0	56,59%	76,04%	76,04%	6	A
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche	DNU	8		1.000	01/11/2006	30/04/2007	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM 1448 - KM 1462	5	14,0	19.871	01/11/2006	30/06/2007	4.316.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM. 1462 - KM. 1478	5	16,0	29.577	07/04/2006	07/07/2007				1,70%	1,70%	0,00%	6	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	Km 1478 - Km 1500 - DNU	5	22,0	34.862	12/04/2006	12/07/2007				1,60%	1,60%	0,00%	6	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez- DNU	5	1,4	5.000	01/11/2006	31/10/2007	637.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. RNN° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19 - DNU	8	118,9	68.000	01/09/2006	30/08/2010	491.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - RNN°40 -DNU	8	80,0	30.000	01/06/2006	30/05/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100-DNU	8	0,1	15.988	26/10/2005	30/05/2009	1.022.000	255.195	0	1,59%	5,74%	8,94%	6	A
22	10	17	51	SAN LUIS	7	Repavimentacion Via 1	DNU	11		47.800	01/09/2006	30/08/2010	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	19	51	SANTA CRUZ	3	Autovia- Aerop. R. Gallegos- Planta LU 12	DNU	8	2,5	7.182	01/11/2006	31/08/2007	1.468.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Rio Santa Cruz -DNU	5	0,2	1.500	01/11/2006	30/04/2007	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	21	51	SANTA FE	168	B/N RPN°1- Acceso a Tunel Subfluvial	Km. 479,72- km. 488,88-DNU	8	9,2	5.000	01/11/2006	30/04/2007	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hemandarias	DNU	5	3,4	70.000	01/11/2006	31/10/2009	2.044.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hemandarias	Colastiné-DNU	5	3,5	16.654	01/11/2006	31/10/2007	750.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146- DNU	8	31,0	60.000	01/11/2006	31/10/2008	1.012.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	60.000	01/11/2006	31/10/2009	1.380.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55 DNU	5	5,5	350	01/11/2006	30/10/2007	350.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	10	27	51	SANTA FE	A-008	Rio Parana-Autopista Rosario-Córdoba	km 0- km 29,395 (Av.Belgrano)-DNU	8	29,4	45.686	01/06/2006	30/11/2010	1.840.000	2.006.580	2.006.578	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	DNU	8	4,0	2.000	01/11/2006	30/04/2007	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	DNU	8	3,4	1.948	01/11/2006	30/04/2007	398.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional- Bahía Lapataia	DNU	8	16,0	1.500	01/11/2006	30/04/2007	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Aguilares-DNU	8	18,0	90.150	01/11/2006	30/10/2009	1.260.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Autopista-DNU	8	19,5	74.500	01/11/2006	30/10/2009	1.685.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro	DNU	8	1,0	8.000	01/11/2006	31/10/2007	818.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	34	51	ENTRE RIOS	131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	6.500	01/11/2006	30/04/2007	1.329.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°a015 y calle Rösch	DNU	8	1,0	653	01/11/2006	28/02/2007	653.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca	DNU	8	46,0	49.000	01/11/2006	30/10/2009	1.329.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)	DNU	8	0,5	1.200	01/11/2006	30/04/2007	245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	interseccion RN N°22 y RN N°237 DNU	8	1,5	118	01/11/2006	28/02/2007	118.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	DNU	8	5,0	21.687	01/11/2006	31/10/2007	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	pte.S/des.ferrov. - DNU	8		19.765	01/09/2006	31/08/2010	1.022.000	1.976.454	0	0,00%	0,00%	0,00%	4		
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Acc.Pque.Nac. T.del.F-DNU	11	6,0	4.000	01/11/2006	30/04/2007	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3	DNU	8	5,0	4.000	01/11/2006	30/04/2007	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	40.000	01/11/2006	30/10/2009	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	8	111,9	275.740	01/09/2006	31/08/2010	304.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	Km. 176,70 - Km. 221,37	8	44,7	161.340	01/09/2006	31/08/2010	723.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km. 64,50 - Km. 72,00	8	7,5	28.000	01/11/2006	31/10/2008	111.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Seccion I y Seccion II	8	58,0	72.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Seccion I y Seccion II	8	47,0	62.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	60.000	01/09/2006	31/08/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion I	8	30,0	90.000	01/09/2006	31/08/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion II	8	33,0	90.000	01/09/2006	31/08/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	52	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III	8	37,0	90.000	01/09/2006	31/08/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construccion Complejo Terminal de Cargas	DNU	8	1,0	35.563	05/06/2006	30/09/2008	22.787.000	13.563.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	4		
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	20.597	01/11/2006	31/10/2008	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
22	10	56	51	RIO NEGRO	258	Variante RN N°237		8	14,7	3.750	01/11/2006	30/04/2009	1.221.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores- Quines	Km.198,65- Km. 266,41-DNU	8	67,8	25.000	01/11/2006	31/10/2010	767.000	767.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
22	10	61	51	CHACO	89	Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4	Prog. 81,28	8	53,9	55.000	01/11/2006	31/10/2010	800.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo		8	84,0	90.000	01/11/2006	31/10/2010	1.700.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	71	51	MENDOZA	7	Limite San Luis - Mendoza - Acceso a La Paz	Km 866 - Km 871	5	5,0	1.387	06/04/2006	31/08/2006	2.000.000	100	0	11,68%	11,68%	11,68%	6		
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San julian - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55	5	100,0	91.046	20/12/2005	20/12/2007	500.000	26.793.077	22.618.409	5,54%	10,63%	10,63%	6	A	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,4	43.100	01/11/2006	31/10/2010	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Km 113	8	113,0	174.000	01/11/2006	30/04/2008	2.862.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
22	10	94	51	BUENOS AIRES	S/N°	Av. Maipu - Partido de Vicente Lopez	Zufriategui - Parana	5	5,0	29.268	09/01/2006	31/10/2006				27,54%	38,01%	38,01%	6		
22	10	95	51	BUENOS AIRES	S/N°	Av. Libertadores - Partido de Vicente Lopez	Zufriategui - Parana	5		6.549	16/01/2006	16/09/2006				13,86%	27,67%	27,67%	6		
						TOTAL MEJORAMIENTO Y REPOSICION FASE III				2.593.281			94.537.000	59.639.223	28.949.611	0,68%	1,17%	1,19%			
						TOTAL CONSTRUCCIONES				17.575.670			1.214.403.000	1.413.150.504	722.483.002	2,26%	3,85%	17,85%			
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO															
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE I															
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Prog.1971,77	13	111,4	13.947	26/05/1997	30/05/2005	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Emp. R.N.N° 3	13	132,3	13.515	24/04/1997	30/12/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	99,75%	7		
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	9.733	03/07/1997	25/07/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Chemical	13	243,8	11.169	18/06/1997	30/06/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	97,71%	7		
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	40N - Rio Conchas (Pte)	13	142,3	17.317	04/06/1997	30/06/2006	100.000		574.944	546.209	1,14%	2,49%	98,27%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Rio Las Conchas (Pte) - Rio Ancho (Pte)	13	114,8	18.265	30/04/1997	30/06/2006	100.000	584.200	584.198	1,48%	3,22%	91,68%	6	A	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	17.762	04/07/1997	30/09/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	96,72%	7		
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Salta - Jujuy-Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R	13	148,9	12.709	05/04/1997	13/10/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22.231	22/05/1997	31/03/2006	100.000	1.433.071	918.159	2,32%	3,57%	96,26%	7		
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	19.845	10/04/1997	31/01/2006	100000	630.422	494.925	0,00%	1,11%	97,68%	7		
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	27.283	07/07/1997	31/05/2006	100.000	450.712	450.710	0,99%	1,98%	85,10%	6		
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-	13	271,4	22.034	27/08/1997	25/03/2007	100.000	1.017.741	814.186	3,66%	6,43%	95,90%	6	A	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	217,6	20.456	03/11/1997	05/04/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	16.531	10/02/1998	31/07/2007	73.000	949.321	791.099	2,87%	5,74%	87,64%	6		

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07/07/1997	12/09/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp. R.P.N° 20	13	272,6	20.028	14/10/1997	15/10/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	- Lte. C /Bolivia	13	204,7	16.672	18/07/1997	30/11/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15/08/1997	15/08/2003	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Aminga	13	231,6	6.378	02/08/1997	31/12/2002	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Ischigualasto	13	292,0	10.860	13/01/1998	26/01/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	13	327,8	17.876	30/09/1997	30/06/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	17.395	11/11/1997	28/02/2007	100.000	734.248	378.585	2,49%	4,37%	95,56%	6		
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281 - Gran Bajo de San Julián	13	308,0	20.207	25/11/1997	12/02/2005	100.000	1	0	0,00%	0,00%	89,58%	7		
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	21.453	13/01/1998	12/03/2007	100.000	271.190	271.187	0,46%	0,92%	95,12%	6		
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	229/Emp.RNN°3-Pte.S/R.Colorado	13	167,1	20.221	17/07/1997	31/12/2006	100.000	789.502	709.138	2,08%	3,92%	92,09%	6		
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	23.993	09/12/1997	30/12/2005	100.000	1.457.929	1.457.919	0,00%	0,07%	99,50%	7		
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	13	201,2	24.625	01/12/1997	31/12/2006	100.000	1.120.552	998.951	3,36%	5,94%	94,50%	6		
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Pte.S/R.Chubut	13	250,4	20.012	14/11/1997	15/11/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	99,76%	7		
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	17.069	01/08/1997	06/10/2004	100.000	228.582	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Rio Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen-	13	141,9	18.670	01/04/1998	26/11/2006	100.000	745.401	656.743	1,43%	2,72%	81,45%	6	A	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Lte.C/La Rioja	13	187,7	13.993	17/06/1998	10/05/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13/01/1998	15/04/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-	13	309,5	14.742	12/07/1997	31/05/2005	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	14.250	20/06/1997	28/02/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.091	23/06/1997	30/09/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	99,98%	7		
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	21.228	04/03/1998	31/12/2006	100.000	866.160	449.344	2,56%	4,68%	93,54%	6		
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Emp. RNN° 40S / Pte.S/R Diamante - Emp.	13	223,3	15.295	13/08/1997	04/02/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay	13	173,0	11.273	25/10/1997	30/11/2006	100.000	671.536	70.864	3,40%	6,96%	90,06%	6		
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A	13	220,0	18.064	05/09/1997	05/09/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	25.327	03/10/1997	01/05/2007	100.000	1.564.610	737.171	3,03%	5,21%	94,31%	6	A	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	23.447	05/11/1997	02/11/2006	100.000	842.643	842.640	3,13%	5,74%	90,81%	6		
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14/06/1997	31/07/2003	100.000	1	0	0,00%	0,00%	99,79%	7		
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	17.642	31/07/1997	19/09/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	98,65%	7		
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	9.998	29/10/1997	31/08/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	237-Emp.Rn N° 234	13	275,5	15.807	14/11/1997	31/01/2005	100.000	196.000	195.162	0,00%	0,00%	98,92%	7		
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	6.976	03/12/1997	31/12/2002	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8		
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	21.801	31/10/1997	31/12/2006	161.000	518.282	457.074	1,78%	3,56%	94,77%	6	A	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.026	09/10/1997	09/10/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San	13	282,8	13.412	13/11/1997	05/05/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	14.994	25/07/1997	30/04/2004	100.000	1	0	0,00%	0,00%	98,53%	7		
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Emp. Rp N° 20	13	140,7	18.174	23/06/1997	20/11/2006	100.000	566.694	558.900	1,70%	3,93%	97,33%	6		
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	faltantes)	13	104,8	14.584	20/05/1999	19/06/2006	100.000	1.376.249	1.187.248	0,93%	1,85%	93,50%	6	A-C	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	20.165	14/11/1997	14/11/2004	100.000	289.949	289.939	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Tostado	13	209,1	21.313	19/12/1997	30/11/2003	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7		
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	18.183	17/11/1997	30/12/2006	100.000	1.382.862	367.177	0,63%	1,25%	99,58%	6		
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Rio Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	17.411	23/02/1998	14/10/2006	100.000	1.314.574	356.604	11,59%	18,25%	96,04%	6		
						TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE I				957.746			5.634.000	20.577.405	14.584.131	1,04%	1,91%	96,70%			
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE II															
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lli - Collón Curá	13	104,5	34.065	01/12/2004	30/09/2009	11.263.000	18.053.187	14.613.793	24,12%	44,99%	85,09%	6		
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81	13	171,0	47.699	01/01/2005	30/09/2009	12.158.000	14.747.195	10.321.035	12,90%	33,23%	86,94%	6		
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Rio Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	01/12/2004	30/09/2009	12.345.000	17.075.497	12.055.623	10,09%	32,63%	85,42%	6		
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Arrequeñtin (O.faltantes)	13	313,8	19.271	09/09/2003	30/11/2006	2.862.000	4.476.201	1.532.920	4,34%	7,24%	61,75%	6		
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	41.307	01/03/2005	30/09/2009	15.582.000	17.855.059	13.250.765	13,89%	28,82%	74,32%	6	A	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	38.228	01/11/2005	30/10/2010	19.707.000	15.049.497	6.049.939	12,27%	18,73%	24,93%	6		
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	36.296	01/05/2005	30/09/2009	19.759.000	17.410.010	7.532.115	7,11%	20,96%	55,74%	6		

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	37.111	19/11/2003	30/11/2006	1.223.000	9.273.986	5.977.666	1,44%	7,45%	97,57%	6	
26	2	72	51	SANTA FE	A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	24.964	10/01/2004	10/01/2007	1.048.000	3.842.277	295.176	0,71%	1,42%	98,21%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Acc a Frías	13	114,6	32.334	01/02/2005	31/01/2010	11.115.000	15.231.682	11.965.386	18,56%	41,63%	83,16%	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Aimogasta	13	166,7	51.958	03/12/2004	30/09/2009	11.537.000	11.875.705	7.900.305	17,48%	28,73%	61,88%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	42.467	02/05/2005	30/04/2010	23.119.000	17.261.324	13.326.774	19,86%	35,95%	56,40%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	23.586	19/06/2001	30/11/2008	2.072.000	3.219.971	277.600	0,55%	1,09%	90,63%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	30.706	05/06/2001	30/04/2007	3.341.000	3.513.465	416.758	0,59%	1,22%	82,91%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	01/02/2005	30/09/2009	14.960.000	14.873.804	12.173.949	22,60%	30,24%	82,20%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	01/04/2005	30/09/2009	16.543.000	9.329.247	4.526.362	11,36%	18,18%	50,31%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. RP n° 10 - Lte.C / Cba / Emp.RN N° 35	13	158,3	39.546	01/04/2005	31/03/2010	15.934.000	16.468.989	9.554.503	19,59%	35,98%	73,24%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	38.321	01/03/2005	27/02/2010	15.118.000	14.745.587	9.742.841	25,21%	41,04%	87,54%	6	
TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE II										646.821			209.686.000	224.302.683	141.513.508	13,31%	25,68%	73,46%		
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE III																				
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Fe/Chaco	13	79,0	40.807	01/11/2006	30/10/2010	18.917.000	11.916.970	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios	Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	42.961	01/01/2005	30/12/2009	13.759.000	19.259.000	12.613.623	12,52%	26,54%	82,43%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	38.948	01/01/2005	30/09/2009	8.566.000	19.766.000	12.384.288	11,83%	31,90%	92,66%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	36.809	01/10/2005	30/09/2010	14.657.000	16.407.000	9.595.617	14,92%	30,09%	37,30%	6	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte.	13	163,8	37.086	15/01/2005	13/01/2010	13.072.000	19.972.000	14.219.027	26,00%	45,88%	86,06%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	13	149,1	66.037	01/11/2006	31/10/2011	10.672.000	2.172.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. RNN° 20	13	253,8	36.998	01/02/2005	31/01/2010	10.146.000	21.846.000	15.551.137	10,52%	26,27%	86,52%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetruquén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	01/09/2005	30/11/2010	18.416.000	18.416.000	6.174.268	10,37%	21,43%	36,90%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	A.N.RNN° 9	13	179,7	54.970	01/08/2006	30/07/2011	8.155.000	1.355.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	16	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	72.317	01/11/2006	30/10/2011	8.088.000	1.288.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	54.446	02/05/2005	02/04/2010	21.998.000	21.981.300	13.752.096	17,83%	24,40%	56,32%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	(Entrada)	13	120,9	45.700	01/01/2006	30/12/2010	22.197.000	16.197.000	2.680.496	3,95%	7,74%	13,83%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	35.981	01/10/2005	31/10/2010	15.737.000	15.737.000	8.541.059	12,71%	24,77%	33,37%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	43.252	01/08/2005	30/08/2010	17.222.000	16.372.000	8.828.879	11,88%	19,18%	27,11%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	01/04/2005	30/03/2010	13.292.000	20.192.000	13.168.850	12,96%	26,06%	63,21%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12	13	99,9	42.025	01/03/2005	31/03/2010	12.605.000	20.905.000	15.008.081	7,77%	25,88%	69,94%	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Emp. RNN° 3	13	180,1	41.380	01/11/2006	30/10/2011	19.623.000	4.123.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Puente s/Río Chubut	13	250,4	44.769	01/12/2004	29/11/2009	9.579.000	18.479.000	12.315.593	7,71%	22,34%	57,64%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	40.100	01/12/2004	29/11/2009	8.865.000	17.383.000	9.534.323	16,64%	29,37%	66,36%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°	13	128,5	31.195	02/01/2006	30/12/2010	13.868.000	13.868.000	4.289.852	13,13%	22,92%	22,92%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	42.100	01/05/2005	28/04/2010	16.764.000	28.664.000	18.209.684	11,67%	33,55%	60,59%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	38.310	01/02/2005	31/01/2010	12.407.000	20.057.000	14.277.726	9,03%	27,60%	65,47%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	RPN°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	37.552	01/07/2005	29/06/2010	16.875.000	22.375.000	13.991.243	16,32%	35,88%	58,11%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	01/06/2005	30/11/2010	15.051.000	15.051.000	7.703.700	11,36%	20,80%	43,87%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-	13	223,3	32.051	01/03/2005	27/02/2010	12.977.000	20.477.000	15.252.613	25,00%	47,59%	79,06%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	36.740	01/07/2005	30/08/2010	14.926.000	15.388.740	5.608.473	11,61%	24,74%	32,56%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	51.070	01/11/2006	30/10/2011	10.819.000	1.480.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	55.587	01/11/2006	30/10/2011	9.166.000	1.477.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	13	112,8	44.618	01/11/2006	30/10/2011	5.036.000	811.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	s/Río Aluminé	13	140,0	40.733	01/11/2006	30/10/2011	7.242.000	1.167.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Tostado	13	126,0	39.722	01/11/2006	30/10/2011	6.358.000	1.024.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	60.975	01/11/2006	30/10/2011	6.867.000	1.106.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	26.358	01/11/2006	30/10/2011	4.541.000	2.927.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	76.188	01/11/2006	30/10/2011	7.152.000	1.152.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	S.M.Tucumán	13	145,7	67.627	01/11/2006	30/10/2011	7.455.000	1.201.350	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	63,0	18.123	01/11/2006	30/10/2011	3.925.000	2.530.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	13	109,3	32.796	01/11/2006	30/10/2011	6.908.000	1.113.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
26	3	38	51	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN*259 - La Paulina (D)	13	159,6	66.008	01/11/2006	30/10/2011	9.554.000	914.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	69.526	01/11/2006	30/10/2011	6.498.000	1.047.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	31.759	01/11/2006	30/10/2011	4.775.000	1.652.719	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Chimpay / km258-Emp.RNN*22	13	340,7	101.943	01/11/2006	30/10/2011	5.283.000	3.407.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN*65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	33.849	01/11/2006	30/10/2011	4.914.000	3.167.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN* 33	13	104,8	31.455	01/11/2006	30/10/2011	4.316.000	2.782.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN*3-Emp.RNN*229	13	167,7	50.343	01/11/2006	30/10/2011	7.396.000	2.867.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	46.182	01/11/2006	30/10/2011	6.282.000	4.049.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	Ancho (Puente)	13	105,4	31.872	01/11/2006	30/10/2011	5.849.000	3.770.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN*20	13	272,6	78.201	01/11/2006	30/10/2011	5.917.000	3.814.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN* 11 - Emp. RNN* 95	13	181,4	53.800	01/11/2006	30/10/2011	7.142.000	2.614.888	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
TOTAL CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE III										2.208.941			511.829.000	465.725.367	233.700.629	4,84%	10,07%	20,84%			
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FASE IV																					
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	40.122	01/11/2006	30/10/2011	692.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Río Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	47.087	01/11/2006	30/10/2011	9.250.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	66.600	01/11/2006	30/10/2011	575.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	93,2	39.083	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	RPN* 88 - Emp. RNN* 143	13	238,6	34.102	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	2		
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	13	98,0	29.400	01/11/2006	30/10/2011	213.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	N° 12 - Emp. RN N° 32	13	133,3	44.781	01/11/2006	30/10/2011	2.867.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	101,6	30.477	01/11/2006	30/10/2011	4.419.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	33.918	01/11/2006	30/10/2011	8.100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7	39.758	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes	Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	31.609	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2	46.647	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	21.780	01/11/2006	30/10/2011	919.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	43.486	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	41.745	01/11/2006	30/10/2011	6.360.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38	13	102,5	30.753	01/11/2006	30/10/2011	265.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	70.830	01/11/2006	30/10/2011	10.389.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp.	13	171,0	30.689	01/11/2006	30/10/2011	2.146.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	76.467	01/11/2006	30/10/2011	660.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	32.639	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Emp.RPN° 20	13	140,7	58.607	01/11/2006	30/10/2011	351.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	40.422	01/11/2006	30/10/2011	706.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio	13	222,0	49.400	01/11/2006	30/10/2011	2.771.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	59.431	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Ex R.N N° 3	13	259,4	48.824	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4	37.029	01/11/2006	30/10/2011	320.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	83.400	01/11/2006	30/10/2011	520.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	34.335	01/11/2006	30/10/2011	449.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	N° 40N	13	347,5	57.050	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	22.355	01/11/2006	30/10/2011	1.430.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	con Chaco - Emp R.P. N° 116	13	119,6	66.058	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	Jujuy - Emp. R.N. N° 50	13	205,1	48.679	01/11/2006	30/10/2011	1.000.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	33.241	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/Acceso a Yacireta	13	195,0	42.022	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay	13	173,0	51.906	01/11/2006	30/10/2011	448.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	39.961	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	66.089	01/11/2006	30/10/2011	225.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas - Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	36.000	01/11/2006	30/10/2011	233.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0		

**CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD**

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Cod	Long	Inv Total (en miles de \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 30/06/2006	Devengado 30/06/2006	Avance 2° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	310,8 DNU	13	103,5	65.622	01/11/2006	30/10/2011	845.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Km 419,69 DNU	13	107,0	49.620	01/11/2006	30/10/2011	233.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. C/Catamarca DNU	13	154,1	46.236	01/11/2006	30/10/2011	752.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Arminga	13	237,9	41.286	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan DNU	13	122,0	37.452	01/11/2006	30/10/2011	248.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20 DNU	13	78,0	46.692	01/11/2006	30/10/2011	593.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut DNU	13	144,0	42.319	01/11/2006	30/10/2011	2.824.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	250° - Emp. RNN 3° - DNU	13	254,0	76.194	01/11/2006	30/10/2011	378.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. Con SantiagodDel Estero	13	143,0	42.852	01/11/2006	30/10/2011	294.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40(S)	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	23.838	01/11/2006	30/10/2011	845.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatè Porá	13	84,3	25.287	01/11/2006	30/10/2011	311.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguatè Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	34.035	01/11/2006	30/10/2011	223.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	41.028	01/11/2006	30/10/2011	301.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	R.N.N°79 - Lte. C/San Juan	13	212,0	63.666	01/11/2006	30/10/2011	265.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	(S) - Acc. A Tinogasta	13	242,2	72.648	01/11/2006	30/10/2011	962.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Portezuelo	13	307,0	92.025	01/11/2006	30/10/2011	830.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. C/chaco - Coronel Olleros	13	114,0	34.188	01/11/2006	30/10/2011	346.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6-RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.N. N° 14	13	86,0	38.389	01/11/2006	30/10/2011	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	57	51	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		13		35.000	01/11/2006	30/10/2011	4.262.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	58	51	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		13		50.000	01/11/2006	30/10/2011	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	59	51	SALTA		Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N N° 9 y N° 34	13	90,0	27.132	01/11/2006	30/10/2011	370.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	159,0	47.778	01/11/2006	30/10/2011	206.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Lte.C/La Rioja	13	188,0	56.310	01/11/2006	30/10/2011	549.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13		51.000	01/11/2006	30/10/2011	278.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa Maria - Rio Cuarto	13	231,0	41.541	01/11/2006	30/10/2011	486.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	
										2.888.920			76.146.000	1.101.510	0	0,00%	0,00%	0,00%		
										6.702.428			803.295.000	711.706.965	389.798.268	3,03%	6,07%	27,78%		
										24.667.994			2.093.820.000	2.267.186.544	1.209.137.493	2,54%	4,61%	20,83%		

Referencias

- A: Certificación demorada, valor estimado
B: Globales. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del crédito asignado
C: Modificación de Obra en Trámite
S/D: Sin Datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
17	Obras de Seguridad

Código	Tipo de Obra
0	Mejoramiento y enripiado
1	Bacheo y Sellado
2	Bacheo y Lechada
3	Tratamientos
4	Refuerzos
5	Reconstrucciones
6	Reconstrucción de losas de Hormigon
7	Reparación de puentes
8	Obras Nuevas (caminos)
9	Obras Nuevas (puentes)
10	Obras de def. e hidráulicas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
15	Ampliación
16	Fresado de Cresta y Relleno de Huella
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/062006
(en pesos)

Ubicación Geográfica Provincia	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	802.722.024	843.772.210	306.272.360	250.122.324	15,3%
Provincia de Buenos Aires	557.747.722	720.921.710	275.080.481	243.982.601	15,0%
Provincia de Catamarca	52.796.797	25.838.415	33.049.731	33.031.471	2,0%
Provincia de Córdoba	230.790.945	307.553.487	169.675.561	168.896.173	10,4%
Provincia de Corrientes	102.292.088	55.343.233	3.488.813	3.488.813	0,2%
Provincia del Chaco	60.713.195	26.008.389	10.362.287	9.922.578	0,6%
Provincia del Chubut	118.404.460	120.620.613	63.168.415	63.094.794	3,9%
Provincia de Entre Ríos	237.364.707	205.859.931	57.572.752	57.564.364	3,5%
Provincia de Formosa	131.521.556	121.332.080	52.374.774	51.569.523	3,2%
Provincia de Jujuy	94.347.457	44.659.789	11.113.862	11.113.862	0,7%
Provincia de La Pampa	112.065.711	97.638.763	30.397.913	30.364.433	1,9%
Provincia de La Rioja	56.756.399	80.539.042	41.296.215	41.201.215	2,5%
Provincia de Mendoza	117.986.440	116.508.525	66.526.038	64.804.926	4,0%
Provincia de Misiones	104.922.313	81.676.942	33.868.221	33.280.432	2,0%
Provincia del Neuquén	72.244.770	62.254.224	35.967.967	35.892.967	2,2%
Provincia de Río Negro	121.097.375	121.926.428	62.451.659	61.463.770	3,8%
Provincia de Salta	117.850.937	86.824.709	24.547.309	24.383.615	1,5%
Provincia de San Juan	64.642.275	63.671.998	27.231.520	27.059.275	1,7%
Provincia de San Luis	39.092.630	46.195.754	22.348.245	22.242.670	1,4%
Provincia de Santa Cruz	106.074.130	321.149.613	182.198.534	182.127.347	11,2%
Provincia de Santa Fe	194.419.140	181.558.144	75.073.792	73.827.419	4,5%
Provincia de Santiago del Estero	139.279.272	81.480.162	22.749.292	22.749.292	1,4%
Provincia de Tucumán	69.104.336	59.013.650	32.548.812	32.548.812	2,0%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	17.655.136	39.238.687	30.686.226	30.686.226	1,9%
Interprovincial	236.502.519	191.855.579	1.410.571	1.401.191	0,1%
Nacional	68.209.000	126.500.951	40.641.929	40.641.929	2,5%
Binacional	1.526.000	526.000	3.830	3.830	0,0%
No Clasificado	64.771.681	75.651.881	12.636.233	12.628.793	0,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.306.120.909	1.724.743.344	1.630.094.644	100,0%

CUADRO A
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	23.217.855	6.524.225	6.484.225	27,9%
Ministerio del Interior	1.550.000	3.200.000	1.550.000	1.550.000	48,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	400.000	400.000	57,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	96.093.000	43.773.732	43.773.732	45,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	4.618.290.815	5.783.451.661	2.943.067.968	2.942.766.968	50,9%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	354.447.250	80.827.791	80.827.791	22,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	59.573.799	30.079.299	30.079.299	50,5%
Ministerio de Salud	28.294.244	30.254.288	12.792.517	12.772.867	42,2%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	9.178.569	1.755.365	1.755.365	19,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.339.844.000	951.586.729	951.586.729	71,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	7.700.156.422	4.072.357.626	4.071.996.976	52,9%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Economía y Producción				
<i>Formulación y Ejecución de Políticas Económicas</i>				
Asist.Financ.para el Dique y Central Hidroel. Los Caracoles	40.000.000	80.000.000	40.000.000	50,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	56.600.000	56.370.000	12.809.544	22,7%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Fondo Nacional de la Vivienda	582.200.000	582.200.000	317.520.458	54,5%
Mejoramiento Habitacional	16.000.000	16.000.000	6.433.369	40,2%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.736.075.027	2.244.075.027	908.984.486	40,5%
Acciones sobre Emergencia Habitacional	163.355.472	163.355.472	30.366.200	18,6%
<i>Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	15.262.000	14.589.150	5.710.031	39,1%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	112.261.001	112.261.001	71.592.074	63,8%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
<i>Asistencia Financiera para Obras Municipales</i>				
Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia	0	29.259.536	29.259.536	100,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	29.693.285	33.433.749	25.568.040	76,5%
<i>Asistencia Financiera para Infraestructura Social</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	66.936.714	132.206.407	65.407.968	49,5%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
<i>Transferencias a Empresas Privadas</i>				
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	0	0	2.575.365	
Metrovías S.A.	83.944.726	61.944.726	84.680.177	136,7%
Trenes de Buenos Aires S.A.	59.714.000	59.714.000	110.706.757	185,4%
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.	33.879.900	33.879.900	7.044.955	20,8%
Transportes Metropolitanos General San Martin S.A.	6.714.000	6.714.000	7.044.955	104,9%
Ferrovías S.A.	52.776.000	45.776.000	4.625.494	10,1%
America Latina Logística Mesopotamica S.A.	0	0	366.000	
Ferropreso Pampeano S.A.	11.740.893	11.740.893	6.347.373	54,1%
Siemens S.A.	0	0	1.773.809	
Belgrano Cargas S.A.	5.742.357	5.742.357	4.265.172	74,3%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	0	19.502.748	
Mitre - interjurisdiccional	26.832.000	22.391.000	0	0,0%
Sin discriminar	0	0	5.975.228	
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
<i>Transferencias a Empresas Privadas</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	399.706.938	512.965.222	512.964.898	100,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales para financiar gastos de capital	475.737.000	706.313.000	312.814.660	44,3%
Energías Renovables en Mercados Rurales GEF 20548 ARG	0	39.706.938	10.088.002	25,4%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	12.756.000	12.756.000	335.769	2,6%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	18.446.000	18.446.000	4.490.201	24,3%
	156.101.000	156.101.000	91.747.110	58,8%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Obras de Infr.Urbana en Municip.</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	0	40.000.000	3.473.579	8,7%
<i>Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	28.868.692	17.918.692	0	0,0%
<i>Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria</i>				
Transferencias a Universidades Nacionales	22.257.000	41.257.000	16.703.092	40,5%

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	247.082.617	247.082.617	86.109.238	34,9%
<i>Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	114.477.000	114.477.000	61.862.723	54,0%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	0	100.582.200	71.102.208	70,7%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
<i>Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.520.000	2.520.000	0	0,0%
<i>Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.896.193	69.896.193	21.633.991	31,0%
<i>Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.980.000	25.980.000	9.954.534	38,3%
<i>Expansiones de Agua Potable y Cloacas con Cooperativas Trabajo</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	5.000.000	27.000.000	7.860.750	29,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente</i>				
<i>Capacitación BID1345</i>				
United Nations Office for Project Service	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.528.000	25.528.000	3.967.067	15,5%
<i>Obras Escolares</i>				
<i>Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.000.000	35.000.000	20.105.871	57,4%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	2.158.272	2.158.272	103.428	4,8%
<i>Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	8.600.000	36.600.000	1.583.625	4,3%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	28.000.000	0	0	
<i>Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica</i>				
<i>Transformación de la Educación Técnico Profesional - BIRF S/Nº</i>				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	177.485.000	198.464.500	27.765.302	14,0%
<i>Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica No Universitaria</i>				
Transferencias a Instituciones de Enseñanza	14.943.000	14.943.000	3.600.000	24,1%
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.000.000	2.000.000	0	0,0%
United Nations Office for Project Service	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,0%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS				
<i>Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica</i>				
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	15.329.000	17.948.000	8.990.000	50,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social				
<i>Plan Jefes de Hogar</i>				
Extensión Proyecto de Protección Social - Préstamo BIRF 7157-AR	45.000.000	58.573.799	29.599.299	50,5%
Ministerio de Salud				
<i>Atención de la Madre y el Niño</i>				

CUADRO B
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Seguro Universal de Maternidad e Infancia				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.504.437	22.504.437	7.721.296	34,3%
<i>Emergencia Sanitaria</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	0	3.600.700	3.600.700	100,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100,0%
Empresas Públicas Sector Energía y Minería				
Energía Argentina S.A.	107.300.000	107.300.000	0	0,0%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	75.000.000	48,2%
Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital				
Ente Binacional Yacyretá	0	48.000.000	18.600.000	38,8%
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital				
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyreta - UESTY	221.000.000	0	0	
Empresas Públicas Sector Comunicaciones				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	13.500.000	13.500.000	9.999.998	74,1%
<i>Asistencia Financiera a Provincias</i>				
Desarrollo Vial				
Administración central provincial	360.500.000	360.500.000	197.986.731	54,9%
TOTAL	6.541.452.524	7.609.324.788	4.050.823.811	53,2%

CUADRO C
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	828.225.117	616.653.188	854.806.278	854.735.628	21,0%
Provincia de Buenos Aires	1.562.566.122	1.888.995.561	1.258.202.815	1.258.202.815	30,9%
Provincia de Catamarca	117.872.889	115.563.144	41.893.171	41.893.171	1,0%
Provincia de Córdoba	254.910.772	287.432.911	122.361.952	122.361.952	3,0%
Provincia de Corrientes	93.419.102	141.891.651	51.964.233	51.964.233	1,3%
Provincia del Chaco	125.168.705	214.497.982	66.763.072	66.763.072	1,6%
Provincia del Chubut	140.605.400	128.965.370	93.993.808	93.993.808	2,3%
Provincia de Entre Ríos	163.671.133	194.369.852	67.197.155	67.197.155	1,7%
Provincia de Formosa	140.506.058	166.759.723	47.784.559	47.784.559	1,2%
Provincia de Jujuy	166.548.407	177.909.334	68.126.343	68.126.343	1,7%
Provincia de La Pampa	82.813.416	84.992.489	27.680.226	27.680.226	0,7%
Provincia de La Rioja	67.399.915	92.009.026	55.416.723	55.416.723	1,4%
Provincia de Mendoza	125.860.569	159.050.614	62.818.950	62.818.950	1,5%
Provincia de Misiones	128.724.075	163.809.115	79.000.044	79.000.044	1,9%
Provincia del Neuquén	70.771.375	89.506.023	42.056.463	42.056.463	1,0%
Provincia de Río Negro	103.707.632	99.353.654	58.344.095	58.344.095	1,4%
Provincia de Salta	112.761.230	148.577.278	61.005.376	61.005.376	1,5%
Provincia de San Juan	207.103.004	237.046.497	101.790.856	101.500.856	2,5%
Provincia de San Luis	53.061.917	80.307.246	22.501.162	22.501.162	0,6%
Provincia de Santa Cruz	328.865.208	344.490.361	196.493.460	196.493.460	4,8%
Provincia de Santa Fe	328.097.798	358.298.225	153.679.354	153.679.354	3,8%
Provincia de Santiago del Estero	161.177.523	155.154.609	51.922.410	51.922.410	1,3%
Provincia de Tucumán	202.471.865	219.157.579	74.404.216	74.404.216	1,8%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	75.921.369	82.816.762	37.588.707	37.588.707	0,9%
Interprovincial	924.754.188	1.303.854.410	322.902.662	322.902.662	7,9%
Nacional	59.721.789	64.490.282	0	0	0,0%
Binacional	0	77.259.536	47.859.536	47.859.536	1,2%
No Clasificado	7.244.000	6.944.000	3.800.000	3.800.000	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	7.700.156.422	4.072.357.626	4.071.996.976	100,0%
