


INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2006

INTRODUCCION

El presente informe trata de todas aquellas erogaciones realizadas por la Administración Nacional que incrementan los activos del Estado Nacional, Provincias y Municipios, y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios; así como también las transferencias de recursos para agentes públicos o privados para financiar gastos de capital.

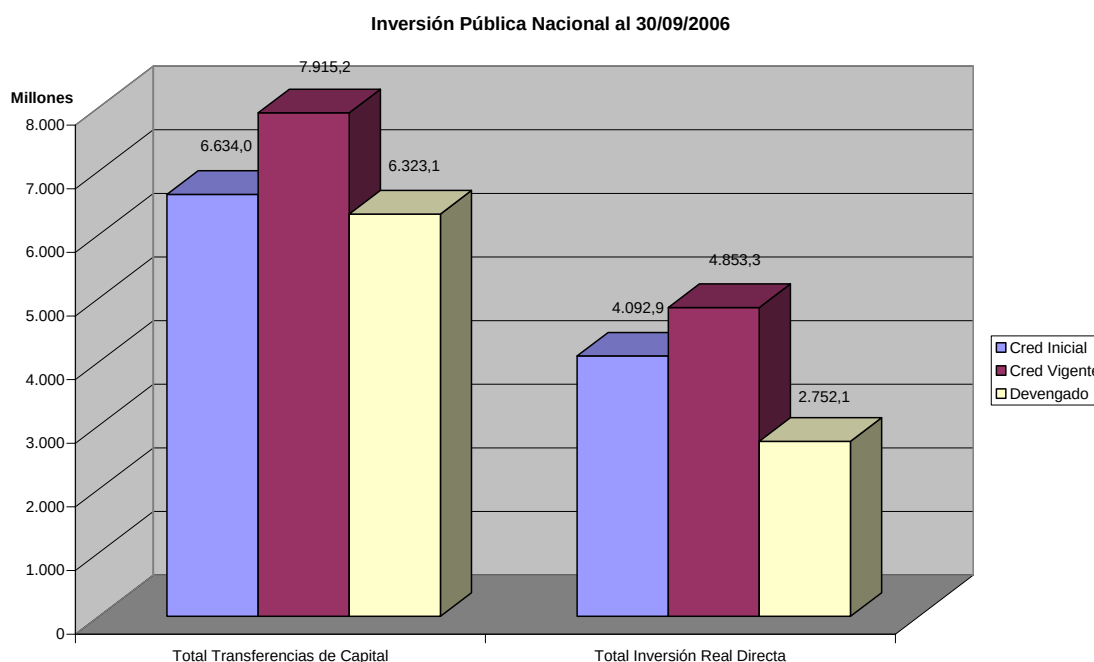


La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. La IRD tuvo un crédito inicial de 4.092,9 millones de pesos en el ejercicio 2006, que se incrementó en 760,4 millones de pesos al cierre del tercer trimestre (+18,6%). Los proyectos de inversión, principal componente de la Inversión Real Directa, dispusieron al 30/09/2006 de una asignación de 4.049,5 millones de pesos; mientras que para Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso se contó con un crédito de 803,8 millones de pesos.


Los proyectos de inversión incluyen los gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 4.049,5 millones de pesos asignados a este fin, 3.883,0 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de 2.430,7 millones de pesos al cierre del tercer trimestre), 45,1 millones de pesos a maquinarias y equipos y 98,8 millones de pesos a servicios no personales, con una ejecución de 21,0 y 65,4 millones de pesos respectivamente.

La Inversión Real Directa incluye también Adquisiciones de Bienes de Capital, categoría que puede desagregarse de la siguiente forma: 650,9 millones de pesos a maquinarias y equipos con una ejecución de 196,7 millones de pesos; 73,3 a edificios e

instalaciones con una ejecución de 1,1 millones de pesos y 62,3 a activos intangibles con una ejecución de 17,2 millones de pesos.

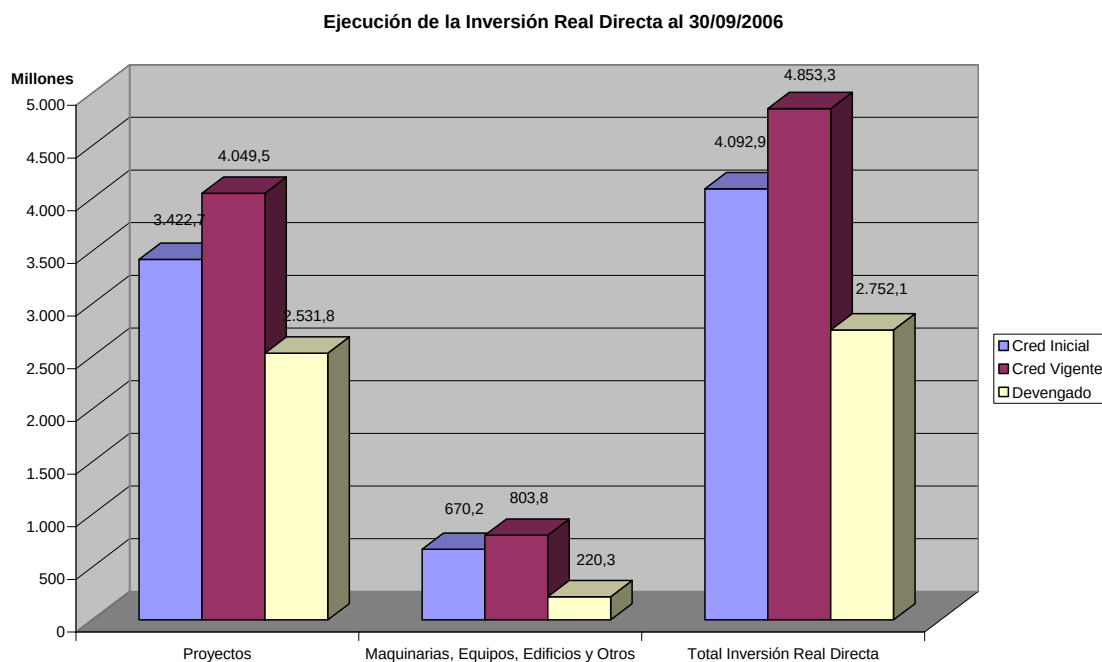

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados para realizar gastos de capital. De los 7.915,2 millones destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del tercer trimestre del ejercicio fue de 6.323,1 millones de pesos.

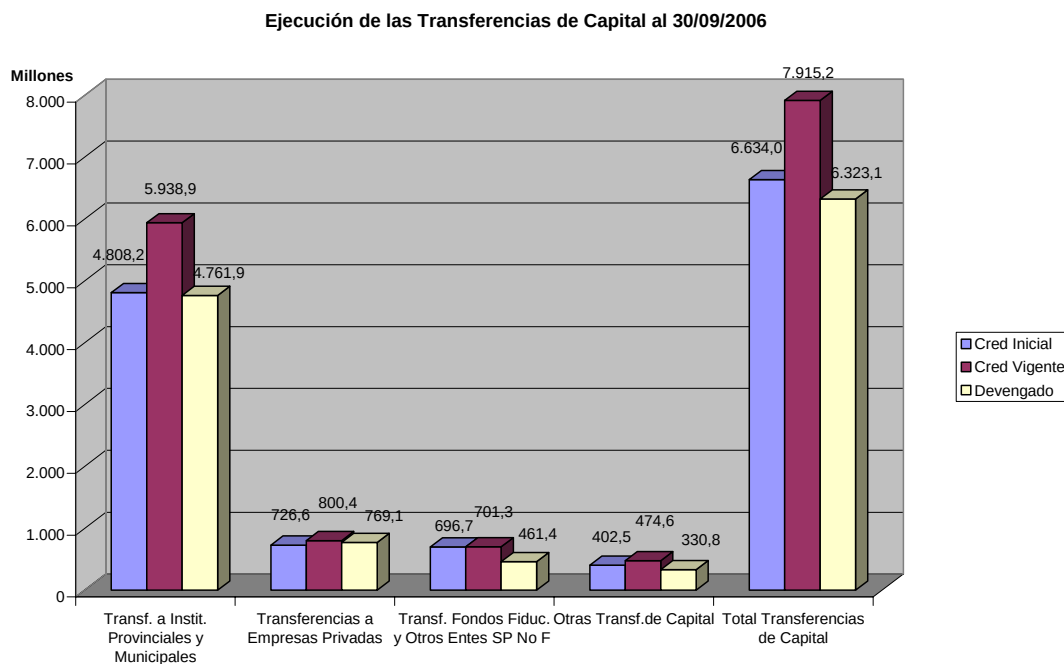


Respecto a las transferencias de capital, 4.761,8 millones de pesos del crédito devengado al 30/09/2006 (75,3% del total) correspondieron a transferencias a instituciones

provinciales y municipales, 769,1 millones de pesos (12,2% del total) fueron transferencias a empresas privadas y 461,4 millones de pesos (7,3% del total) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2006

Al cierre del tercer trimestre de 2006 la ejecución de la inversión real directa alcanzó a 2.752,1 millones de pesos, lo que implica un incremento de 67% respecto a igual período del año anterior. Este aumento, sin embargo, es inferior al observado en años anteriores: si se compara la ejecución al cierre del tercer trimestre de 2005 respecto al mismo período de 2004 el aumento alcanzó al 100%; y este último año respecto al ejercicio 2003 en 71%. El incremento acumulado de la inversión real directa, entre el cierre del tercer trimestre 03 y el mismo período de 06 fue, en consecuencia, de 471%.

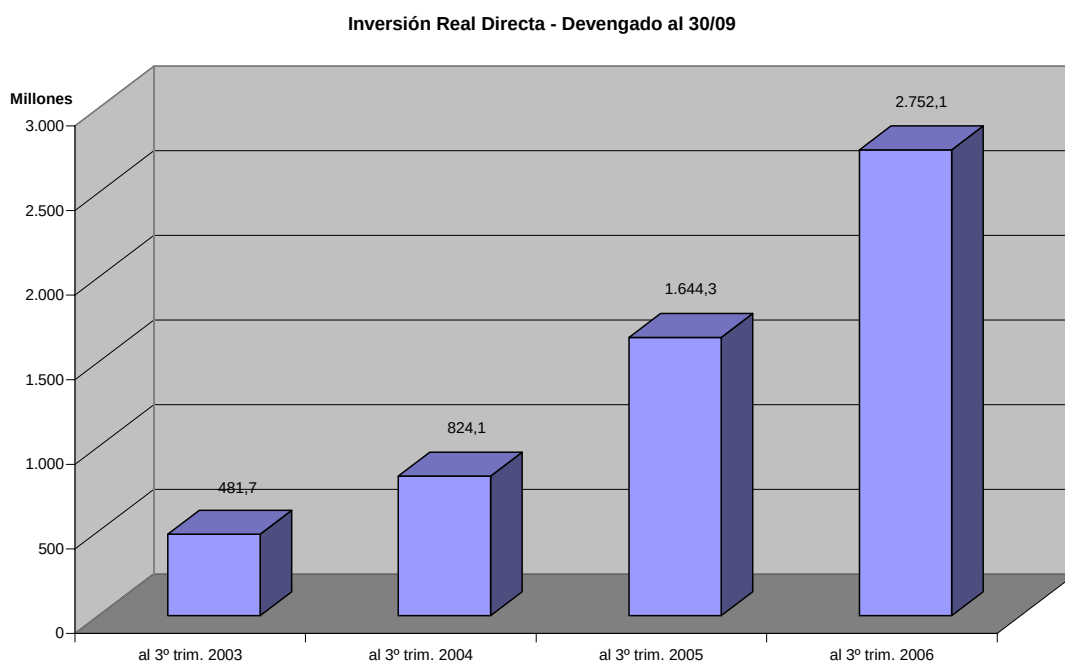

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la Inversión Real Directa al cierre del tercer trimestre semestre de 2006 se incrementó en 760,4 millones de pesos de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el Cuadro N°1.

Cuadro N°1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/2006
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	1.247.802.356	1.284.700.368	373.176.609	29,0%
Organismos Descentralizados	2.819.844.659	3.535.358.341	2.366.306.844	66,9%
Instituciones de Seguridad Social	25.254.000	33.254.000	12.600.735	37,9%
TOTAL	4.092.901.015	4.853.312.709	2.752.084.189	56,7%


El crédito asignado originalmente a los proyectos de inversión, por su parte, registró un aumento de 626,9 millones de pesos (+18,3%) al cierre del tercer trimestre de 2006, mientras que el gasto en adquisición de bienes de uso aumentó en 133,5 millones de pesos (+19,9%).

En la Administración Central, los servicios que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con 190,3 millones de pesos, Estado Mayor General del Ejército con 34,8 millones de pesos y Policía Federal Argentina con 27,5 millones de pesos.

A nivel de Organismos Descentralizados, la inversión se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad con 2.027,0 millones de pesos. También resultó relevante la inversión realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, con 161,7 millones de pesos, el Organo de Control de Concesiones Viales con 81,0 millones de pesos y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 36,4 millones de pesos.

2-Según Fuente de Financiamiento

El financiamiento de la Inversión Real Directa proveniente del Tesoro Nacional aumentó considerablemente al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2006 respecto al mismo período del 2005; mientras que en el presente ejercicio alcanzó al 58% del total de la inversión, al cierre del tercer trimestre del 2005 fue del 36% del total. Por su parte, las transferencias internas pasaron a financiar el 24% de la Inversión Real Directa frente al 43% que alcanzaban al cierre del tercer trimestre de 2005.

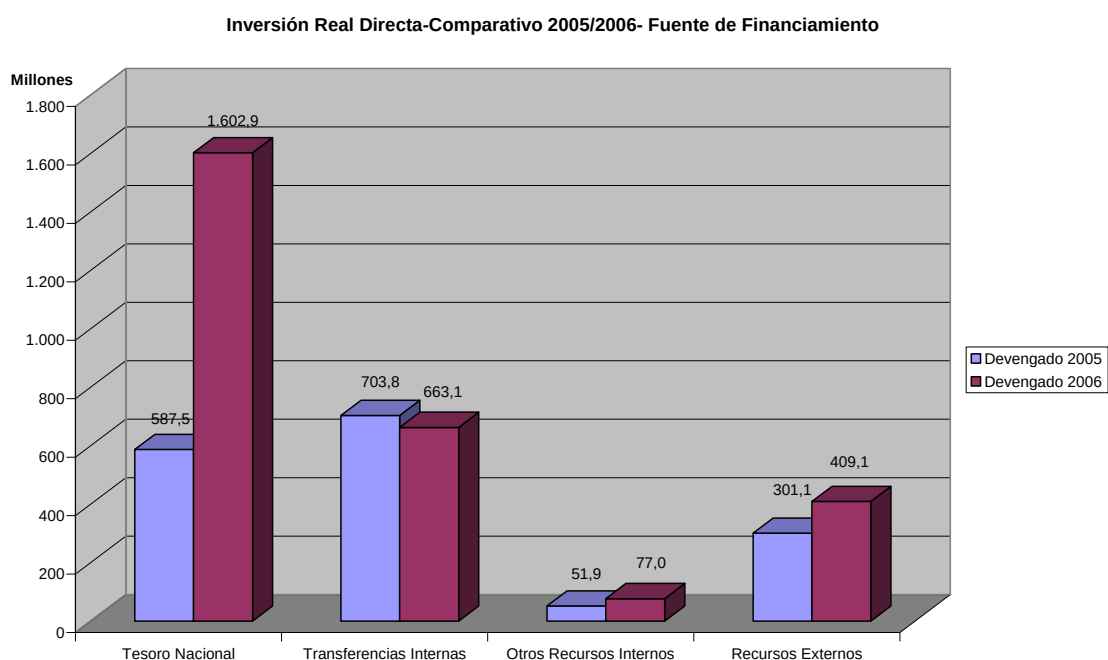

Al cierre del tercer trimestre de 2006 el aumento de los recursos del Tesoro Nacional respecto a 2005 fue de 1.015,3 millones de pesos (+173%). Por su parte, el financiamiento externo se incrementó en 108,0 millones de pesos (+36%), los otros recursos internos en 25,1 millones de pesos (+48%) y las transferencias internas disminuyeron en 40,7 millones de pesos (-6%).

Cuadro N°2
Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/2006
(en pesos)


FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	1.669.596.510	2.373.753.481	1.602.865.719	67,5 %
Transferencias Internas	1.009.911.000	1.017.872.300	663.119.124	65,1 %
Otros Recursos Internos	392.722.842	413.630.081	76.978.838	18,6 %
Financiamiento Externo	1.020.670.663	1.048.056.847	409.120.508	39,0%
TOTAL	4.092.901.015	4.853.312.709	2.752.084.189	56,7%

De los 1.602,9 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional ejecutados al cierre del tercer trimestre de 2006, 1.066,5 millones de pesos financiaron la inversión en la Dirección Nacional de Vialidad (mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 150,0; 823,4 y 90,2 millones de pesos, respectivamente), 63,4 millones de pesos el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II, 21,0 millones de pesos el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula, 14,2 millones de pesos el Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela y 12,6 millones de pesos el proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El Tesoro Nacional también financió la inversión en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por 161,7 millones de pesos, en el Organo de Control de las Concesiones Viales por 52,3 millones de pesos, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por 36,4 millones de pesos, en el Estado Mayor General del Ejército por 29,0 millones de pesos y en la Policía Federal Argentina por 27,0 millones de pesos.

Respecto a la ejecución de la Inversión Real Directa con fuente de financiamiento Transferencias Internas, se incluyen los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organo de Control de Concesiones Viales que recibieron con transferencias provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte en 628,0 millones de pesos y 28,7 millones de pesos, respectivamente.

La fuente de financiamiento externa se concentró en los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad: el programa Construcciones con 68,5 millones de pesos y el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 263,0 millones de pesos, y en menor medida, el financiamiento otorgado al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires (Préstamo BIRF 4163/AR Etapa II) por 42,9 millones de pesos y para la Construcción Alteo Terraplén Viaducto La Picasa por 8,0 millones de pesos.

Inversión Real Directa-Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/09/2006

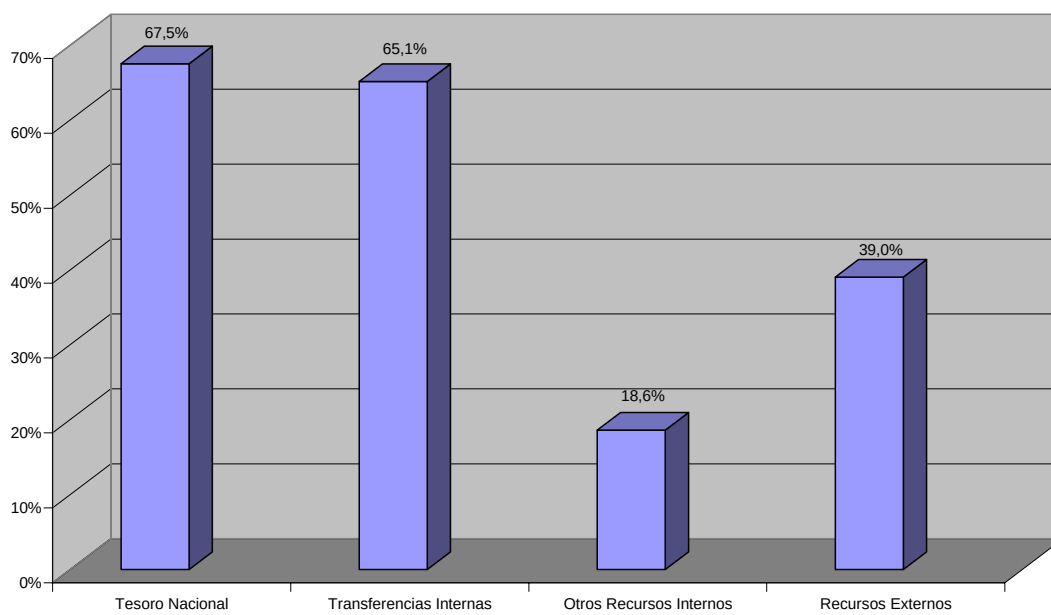

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa se concentró en un 58% en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Río Negro y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los 442,1 millones de pesos incluyendo, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por 266,2 millones de pesos, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento por 62,6 millones de pesos y del Organo de Control de Concesiones Viales por 39,4 millones de pesos. Además, son importantes los proyectos Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal y Hospital El Cruce Florencio Varela por 12,6 y 14,2 millones de pesos, respectivamente.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una inversión de 361,6 millones de pesos; principalmente destinados al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 106,3 millones de pesos. En este caso, en algunas inversiones los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

En la provincia de Santa Cruz se invirtieron 223,1 millones de pesos (8,1% de inversión sobre el total ejecutado), los que se aplicaron, principalmente, en construcciones viales (200,8 millones de pesos) y en mantenimiento vial (22,0 millones de pesos).

En cuanto a la provincia de Córdoba la inversión se concentró, fundamentalmente, a construcciones de rutas por 179,2 millones de pesos; destacándose los montos devengados en la R.N.Nº 9 Autopista Rosario Córdoba por 144,8 millones de pesos y R.N.Nº 9 Villa María por 21,0 millones de pesos. Además, tuvo una importante ejecución el proyecto Colectores Cloacales, Estación de Elevación y Planta Depuradora del Lago San Roque en Carlos Paz (Córdoba) con 16,3 millones de pesos, correspondiente al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento.

En la provincia de Santa Fe, los principales proyectos en ejecución corresponden a construcciones viales por 112,2 millones de pesos. Comprenden las obras del Corredor Vial 3 I y III Etapa en R.N.Nº11 y AOO9 y las obras del Corredor Vial 5 I Etapa en R.N.Nº 34. Asimismo, los proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) ejecutaron 9,3 millones de pesos.

Respecto a la provincia de Formosa la inversión también se concentró en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Fundamentalmente, el proyecto R.N.Nº 81 Las

Lomitas-Límite con Salta-Empalme R.Nº 34 con 39,7 millones de pesos y Corredor Nº 28 en R.N.Nº 11 tramo Resistencia Límite con Paraguay con 21,2 millones de pesos. Asimismo, los proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) ejecutaron 19,1 millones de pesos.


En la provincia de Río Negro la inversión se dirigió, principalmente, a financiar los proyectos de los programas Contratos de Recuperación y Mantenimiento (mallas viales) por 72,3 millones de pesos y construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad por 33,4 millones de pesos; en este último caso fue importante la ejecución en el proyecto R.N.Nº 23 en el tramo Valcheta Pilcaniyeu por 32,0 millones de pesos.

Teniendo en cuenta los datos del Censo Poblacional del año 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la extensión territorial de cada jurisdicción se construyó un indicador de gasto de inversión real directa según densidad poblacional (habitante/km²)

El indicador de inversión real directa según densidad poblacional surge de la fórmula:

$$= \text{Inversión Real Directa} / \text{Densidad} \times 100.000$$

donde Densidad = habitantes/ Km²

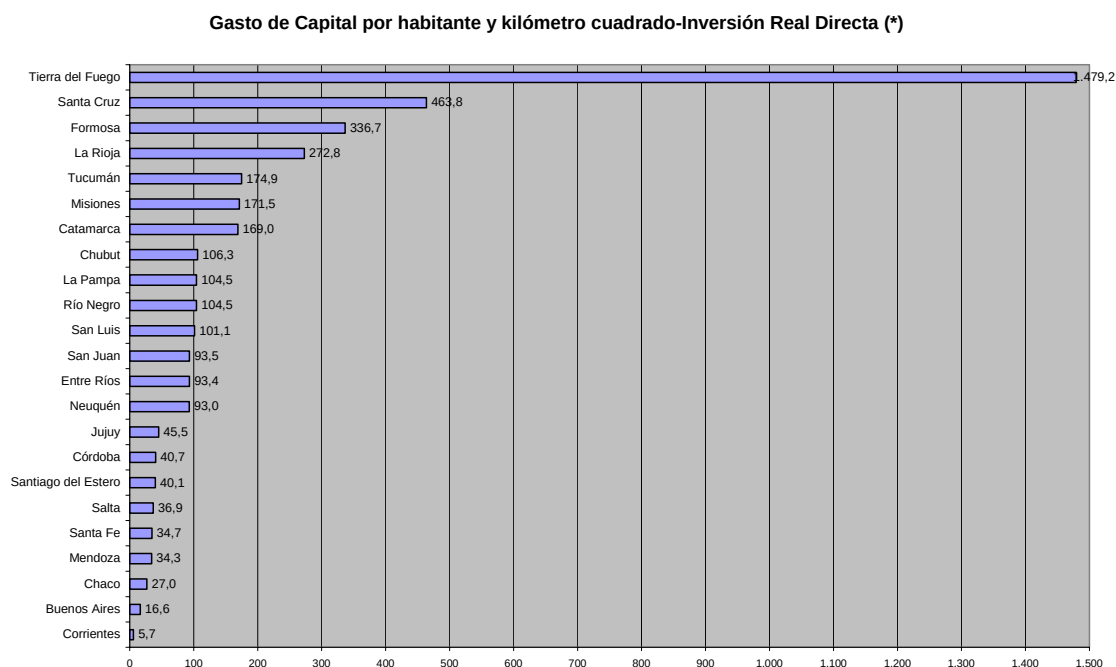

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala (monto del indicador 65.307).

De acuerdo a este indicador la Ciudad de Buenos Aires, con la menor extensión geográfica y la isla de Tierra del Fuego con la menor cantidad de habitantes, presentan los

valores más elevados. Por su parte, la provincia de Corrientes tiene el menor valor seguido por Buenos Aires, provincia que posee el mayor número de habitantes y la mayor extensión geográfica.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este capítulo se hace referencia a la ejecución física de los proyectos de inversión. Para ello se tomó un subconjunto que representa al cierre del tercer trimestre el 81%, aproximadamente, de la ejecución total. Cabe destacar que los proyectos mencionados tienen gran relevancia económica y un importante impacto social. En el Cuadro C se incluyen los datos de ejecución física de la totalidad de los proyectos y las obras de inversión de la Administración Pública Nacional, con excepción de los proyectos y las obras de la Dirección Nacional de Vialidad que se explicitan en el Cuadro D.

Ejecución de los principales proyectos al 30/09/2006			
(en pesos)			
Servicio Administrativo	Proyecto	Crédito Devengado al 30/09/2006	% s/total Inversión Real Directa
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Construcciones de Rutas	1.302.256.527	47,3%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento	570.829.942	20,7%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Mantenimiento de Rutas	150.015.864	5,5%
Secretaría de Transporte	Transporte Urbano de Buenos Aires	106.291.884	3,9%
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	20.974.060	0,8%
CONAE	Misiones Satelitales	27.889.113	1,0%
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	14.181.927	0,5%
Secretaría Obras Públicas	Aliviador Holmberg-Villa Martelli	9.915.474	0,4%
Estado Mayor Gral.Armadada	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.627.006	0,4%
CONAE	Infraestructura Terrestre	6.147.907	0,2%
Estado Mayor Gral.Armadada	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	5.792.643	0,2%
CNEA	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB Etapa 1	829.305	0,0%
CNEA	Instalaciones CAE Fase 2	604.772	0,0%
CNEA	Residuos Radiactivos de Baja Actividad Fase 2	573.911	0,0%
Subtotal		2.225.930.335	80,9%
Total Inversión Real Directa		2.752.084.189	100,0%

Administración Central

Ministerio de Defensa

Estado Mayor General de la Armada

Capacidad Operacional de la Armada

Se continuó con las construcciones referentes al traslado de las diversas dependencias educativas del organismo, como así también con los trabajos en la Fragata Libertad.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

La mayor ejecución comprendió al Aliviador Holmberg – Villa Martelli, una obra del proyecto Desagües Pluviales que está ubicado en el límite de la provincia de Buenos Aires con

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el partido de Vicente López. Al cierre del tercer trimestre devengó 9,9 millones de pesos. Se prevé la inauguración para diciembre de 2006.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El Hospital Interzonal El Cruce, de Florencio Varela, es un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorio externo.

Al tercer trimestre del ejercicio devengó 14,2 millones de pesos.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires registró al tercer trimestre del ejercicio una ejecución física del 16,8%, devengando 106,3 millones de pesos.

Se continuaron con los trabajos de modernización de líneas subterráneas y en distintas líneas ferroviarias, como así también diversas obras de paso a diferente nivel.

Programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y Vías Navegables

El puerto de Caleta Paula se encuentra ubicado próximo a la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

Este proyecto comprende la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste en un frente de 160 mts. medidos en sentido Norte–Sur, y una longitud de 150 mts. medidos en sentido Este–Oeste, y una obra de control de deriva litoral en el lado sur del acceso al puerto.

Al tercer trimestre del ejercicio devengó 21,0 millones de pesos.

Organismos Descentralizados

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE continuó durante el tercer semestre del ejercicio, con su plan de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014. Para ello trabaja asociada a la contratista INVAP S.E, quien se encarga de la construcción de los satélites del Plan, como así también de las pruebas de ensayo. La CONAE también cuenta con el apoyo de otros entes del Sistema Científico Tecnológico, que cooperan en diferentes desarrollos como son: Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de

Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba. También se prosiguió con la adaptación de los satélites a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias), con un acuerdo entre CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

En el tercer trimestre del ejercicio 2006, se trabajó en las líneas: fortalecimiento de las áreas de exploración de yacimientos como así también preparación de la infraestructura para la explotación que servirá para el abastecimiento de las centrales con uranio nacional. Con este fin se profundizó en la exploración de Cerro Solo. También se continuó la línea de investigación aplicada en reactores nucleares, para su utilización nacional y para su exportación como reactores de alta tecnología.

Con respecto a las Centrales Nucleares se está avanzando en los desarrollos y la investigación aplicada vinculados a la construcción de nuevas centrales.

En cuanto a los proyectos relacionados a residuos radiactivos se avanzó en los componentes de seguridad de los de baja actividad y se continúan los desarrollos para el tratamiento de los de alta.

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de los 38.336 kilómetros de la red vial nacional. Para este fin se han establecido diferentes sistemas de gestión, que obedecen al nivel de tránsito de las rutas.

Composición de la Red Vial (Km)
Comparativo al III Trimestre 2005/2006

SISTEMA	Ejec. Año 2005- al III Trimestre	Ejec. Año 2006- al III Trimestre
Longitud total de la red	38.336	38.336
Concesión	8.799	8.601
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	290
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	276
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	8.667	10.218
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.237	6.808
Sistema Km./Mes	195	195
Sistema Modular	1.855	1.855
Obras (Construcciones)	2.609	4.729
Mantenimiento Administración Propia	7.832	5.696

A continuación se detalla el avance físico al 30 de setiembre para cada modalidad operativa:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el tercer trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 5.696 kilómetros. Se realizaron trabajos de mantenimiento en los kilómetros no incorporados a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

-Mantenimiento de Rutas por Contrato

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André con 194,66 kilómetros de longitud.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el segundo trimestre, incluyen la ejecución de trabajos en 1.855 kilómetros. Comprenden los siguientes tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en Kilómetros
Ruta Nacional N° 34/81	Empalme R.N.N° 50 - Límite Bolivia/Pluma de Pato – Empalme R.N.N° 34	Salta	258,9
Ruta Nacional N°25	Los Altares - Empalme Ruta N.N° 40 (S)	Chubut	277,6
Ruta Nacional N°16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
Ruta Nacional N°60	Tinogasta - Límite con Chile	Catamarca	254,2
Ruta Nacional N°40S	Empalme R.N.N° 25 - Empalme R.P.N° 56	Chubut	289,0
Ruta Nacional N°16	Empalme R.N.N° 95 - Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
Ruta Nacional N°40S A007	Pareditas – Malargüe	Mendoza	229,6
	Av.B.Parera- A. Nivel R.N.N°11-A. Nivel R.N.N°11- C.J/Garay	Santa Fe	14,4
Total en Ejecución			1.855

-Mantenimiento de Rutas por Convenio con Provincias

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 6.808 al tercer trimestre.

-Señalamiento de Rutas

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron trabajos en 3.247 kilómetros.

-Obras de Emergencia

Las obras de emergencia realizadas, al cierre del tercer trimestre, comprendieron trabajos menores de 3 kilómetros.

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº 5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al estado establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años. La fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008.

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

En cuanto a los Pasos Fronterizos y Corredores de Integración, al cierre del tercer trimestre del ejercicio, están en ejecución los tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.N.Nº40	Malargüe – Barrancas Sección I y II	Mendoza	36
R.N.Nº14	Gualedaychú-Paso de los Libres Intersección Empalme R.P.Nº16 – Intersección Empalme R.P.Nº20	Entre Ríos	18,2
R.N.Nº40	Río Agua Clara km 809-El Eje km 847	Catamarca	38
Total en Ejecución			92

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizó el tramo R.N.Nº 98 Vera-Tostado (Km. 77- Km 123,4) en la provincia de Santa Fe con 46,4 kilómetros, R.N.Nº 145 Bardas Blancas-Hito Pehuenche con 22,9 kilómetros y R.N.Nº 25 Puente sobre Río Chubut y acceso a Rawson con 140 metros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.P.Nº23	Pte.s/R. Las Vueltas - Va.Tur.El Chaltén; Acc.Bahía Túnel	Santa Cruz	23,2
R.N.Nº143	Emp. RPNº10 - Santa Isabel	La Pampa	14,4
R.N.Nº7	Uspallata - Lte. c/Chile	Mendoza	0,50
S/Nº	Acceso a Ranchos desde RPNº 29	Buenos Aires	1,8
R.N.Nº7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Mendoza	3,2
R.P.Nº43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	Mendoza	90
R.N.Nº81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Formosa	25
R.N.Nº81	Las Lomitas - Emp. RNNº 34	Formosa	25,5
R.P.Nº43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Santa Cruz	78
R.N.Nº3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Tierra del Fuego	25
R.P.Nº510	Valle Fértil - Los Baldecitos	San Juan	54,6
R.N.Nº168	Acc.a Cdad de Sta Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Santa Fe	11
Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	30
Total km finalizados			382

-Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

El Mejoramiento y Reconstrucción en puentes comprende trabajos de reparación de oblenques en puentes sobre Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas con 1.200 metros, puente sobre Río Gallegos en el tramo Río Gallegos - Güer Aike con 90 metros y R.N.Nº 123 Puente nuevo en Tramo Arroyo Batel y Batelito con 70 metros.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprenden la finalización de los siguientes tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.N.Nº34	CVNº 5 - Obra Nº 25 - Emp.R.P.Nº 65 - Emp. R.P.Nº 66	Santa Fe	43
R.N.Nº34	CVNº 5 - Obra Nº 20 - Emp. 2º Circ.de Rosario – R.P.Nº 65	Santa Fe	52,1
R.N.Nº5	CVNº 2 - Obra Nº 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	Buenos Aires	17
R.N.Nº11	CVNº 3 - Obra Nº 15 - Emp. R.N.Nº 168 - Emp. R.P.Nº 39	Santa Fe	131
R.N.Nº9	CVNº 3 - Obra Nº 2 - Ex RNNº 191 - RNNº A012	Santa Fe	90

Al cierre del tercer trimestre están en ejecución 902 kilómetros correspondientes a obras por convenios con provincias, 2.374 kilómetros a obras de mejoramiento y reconstrucción de rutas, 92 kilómetros a obras en pasos fronterizos y corredores de integración/Préstamo BID 202-AR, 13 kilómetros en obras de emergencia en ejecución y 1.360 metros en mejoramiento y reconstrucción en puentes. Asimismo, están en ejecución 782 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 107 A – Chubut	124,5
Malla 107 B – Chubut	140,7
Malla 111 – Neuquén	134,7
Malla 113 – Chubut	201,2
Malla 114 - Río Negro	141,9
Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
Malla 201 B - Buenos Aires	104,8
Malla 206 - Buenos Aires	167,1
Malla 208 - Buenos Aires	258,3
Malla 211 - Buenos Aires	139,9
Malla 401 A - Salta – Tucumán	142,3
Malla 401 B – Salta	114,8
Malla 502 - Entre Ríos	271,4
Malla 506 - Entre Ríos	259,2
Malla 508 – Chaco	222,3
Malla 510 - Entre Ríos	173,0
Malla 512 A – Corrientes	84,3
Malla 512 B – Corrientes	113,5
TOTAL	2.978

En cuanto al C.Re.Ma.I al cierre del tercer trimestre se finalizaron los tramos: R.N.Nº 98 Empalme R.N.Nº 11- km 123,4 correspondiente a la Malla 209 A – Santa Fe con 123,4 kilómetros de extensión, R.N.Nº 89 Yuchán Empalme Ruta Nacional Nº 34 de la Malla 405 B- Santiago del Estero con 79,7 kilómetros, R.N.Nº 123-14-122 Empalme R.N.Nº 117- Empalme R.P.Nº 155- Km139,00- Empalme R.N.Nº 14-Empalme R.N.Nº 14- Yapeyú de la Malla 501- Corrientes con 144,65 kilómetros y R.N.Nº 89 Acceso Gral. Pinedo - Límite con Santiago del Estero / Límite con Chaco – Yuchán de la Malla 405ª - Chaco con 178,63 kilómetros.

Con respecto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzan a 2.284 kilómetros. Las mallas en ejecución son las siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	138,0
Malla 116 B - La Pampa	113,9
Malla 117 A - La Pampa	111,3
Malla 117 B - La Pampa	158,3
Malla 123 B - Río Negro	145,2
Malla 131 - Neuquén	104,5
Malla 202 A - Santa Fe	27,9
Malla 202 B - Santa Fe	95,7

Malla 215 - Buenos Aires	69,2
Malla 216 A - Buenos Aires	72,7
Malla 216 B - Buenos Aires	71,9
Malla 306 - San Juan	313,8
Malla 314 - Mendoza/San Luis	161,5
Malla 338 - Formosa	171,0
Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	114,6
Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	166,7
Malla 408 C - Catamarca	171,9
Malla 409 A - Tucumán	75,3
TOTAL	2.284

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzan 3.690 kilómetros y son las siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 102 A - Chubut	250,4
Malla 102 B - Chubut	230,4
Malla 103 - Río Negro	163,8
Malla 104 - La Pampa	128,5
Malla 108 A - Río Negro	146,5
Malla 109 - Neuquén	291,2
Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	334,0
Malla 301 - San Luis	253,8
Malla 302 - San Juan	286,1
Malla 312 - Mendoza	223,3
Malla 332 - San Juan	105,3
Malla 402 A - Sgo. del Estero	96,7
Malla 402 B - Santiago del Estero	120,9
Malla 404 - Jujuy - Salta	148,8
Malla 407- Sgo del Estero – Catamarca - Tucumán	151,9
Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	127,9
Malla 509 - Entre Ríos	151,8
Malla 513 A - Entre Ríos	90,3
Malla 513 B - Entre Ríos	99,9
Malla 606 - Chubut	159,7
TOTAL	3.690

En el tercer trimestre estuvieron en ejecución las siguientes mallas correspondientes al C.Re.Ma. IV:

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 309 – La Rioja	300,75
Malla 513 C – Entre Ríos	86,0
Malla 501 – Corrientes Yapeyú	144,65
Malla 313 B - Mendoza	238,56
Malla 303 – La Rioja	237,92
TOTAL	863

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2006

1-Según Nivel Institucional

Cuadro N° 1
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/2006
(en pesos)


NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	6.535.377.116	7.613.789.332	6.087.845.190	80,0 %
Organismos Descentralizados	98.573.462	301.431.354	235.290.611	78,1 %
TOTAL	6.633.950.578	7.915.220.686	6.323.135.802	79,9%

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N°1.

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias para acciones de Planes Federales de Vivienda (1.948,2 millones de pesos), para la formulación y ejecución de la política energética (1.157,8 millones de pesos), las transferencias realizadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires conforme la Ley N° 24.621 (650,0 millones de pesos), para el Fondo Nacional de la Vivienda (508,1 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (302,7 millones de pesos), Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (164,4 millones de pesos), a gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social (129,6 millones de pesos), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (114,0 millones de pesos), Trenes de Buenos Aires S.A. (110,7 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (107,6 millones de pesos), Acciones sobre Emergencia Habitacional (89,9 millones de pesos), a Metrovías S.A. (84,7 millones de pesos), para atención de emergencias por inundaciones (84,1 millones de pesos), Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (80,0 millones de pesos), Extensión del Proyecto de Protección Social, Préstamo BIRF 7157-AR (37,5 millones de pesos) y la Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos). También fueron importantes las transferencias para infraestructura y equipamiento y para transformación de la educación técnico profesional efectuadas por el Ministerio de Educación (70,3 y 118,7 millones de pesos, respectivamente) y para el Ente Binacional Yacyretá (30,6 millones de pesos).

En cuanto a los organismos descentralizados, las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad para construcción de rutas por convenio con provincias (123,8 millones de pesos) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para obras de saneamiento (89,5 millones de pesos).

Transferencias de Capital-Devengado al 30/09

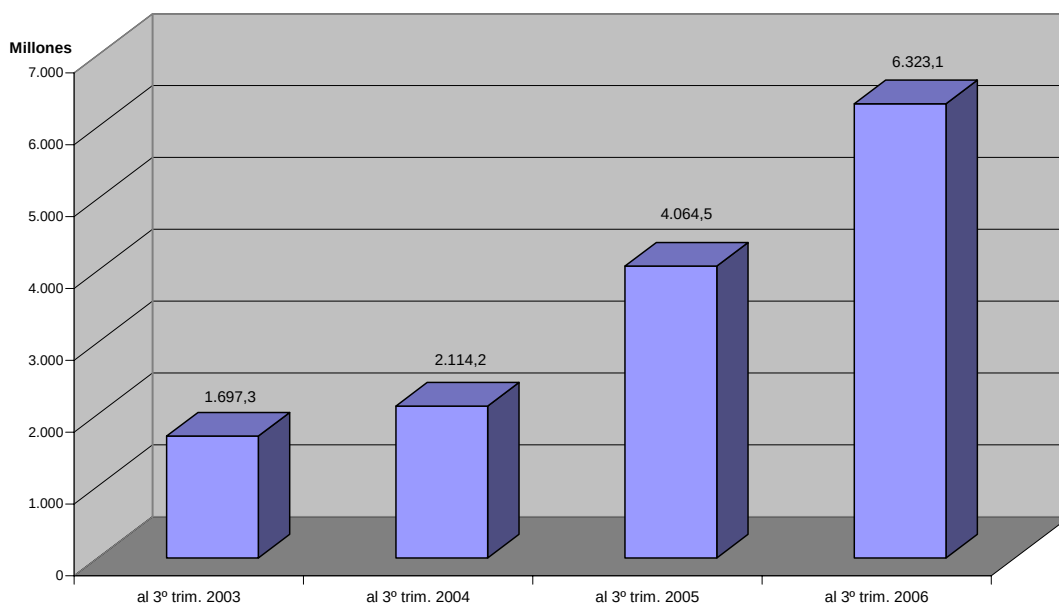

Al igual que en la inversión real directa, las transferencias de capital tuvieron un importante aumento nominal desde el año 2003, según se observa en el gráfico anterior. Las transferencias de capital al cierre del tercer trimestre de 2006 registraron un aumento de 2.258,7 millones de pesos, respecto al mismo período de 2005 (+55,6%). Si se compara el ejercicio 2006 respecto al 2003 el incremento en las transferencias alcanza a 272,5%.


2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 30/09/2006
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	4.166.695.230	5.428.984.591	4.028.496.563	77,5 %
Recursos con Afectación Específica	1.925.862.000	1.768.726.855	1.608.838.860	91,0 %
Otros recursos internos	29.698.494	195.513.716	180.607.672	92,4 %
Financiamiento Externo	511.694.4	521.995.524	325.192.707	62,3 %
TOTAL	6.633.950.578	7.915.220.686	6.323.135.802	79,9 %

Desde el punto de vista de la clasificación del gasto por fuente de financiamiento los recursos del tesoro nacional financiaron el 66,6% de las transferencias. Este subconjunto comprende, fundamentalmente, las transferencias para Planes Federales de Vivienda (1.948,2 millones de pesos), Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal (461,4 millones de pesos), para formulación y ejecución de la política energética a agentes privados (350,0 millones de pesos), para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario (247,9 millones de pesos; principalmente a Trenes de Buenos Aires S.A. y Metrovías), Asistencia Financiera para Infraestructura Social en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (129,8 millones de pesos), transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad para obras por convenio con

provincias (123,8 millones de pesos), para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (114,0 millones de pesos), la Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (80,0 millones de pesos), para acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (64,4 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios (61,4 millones de pesos), para equipamiento e infraestructura escolar (43,4 millones de pesos) y para la Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos).

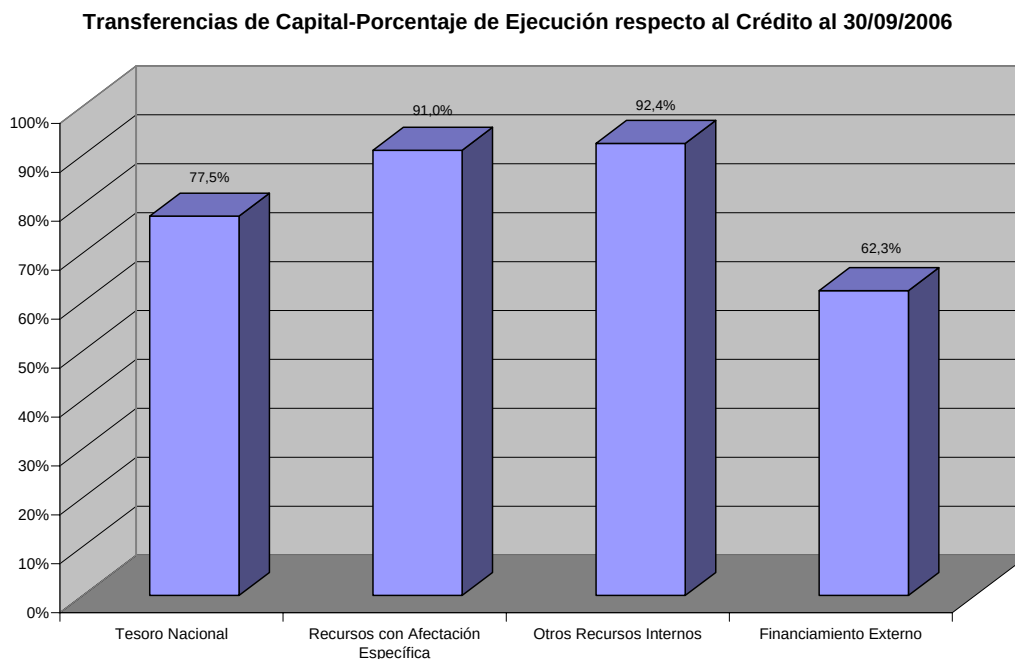

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 25,4% por recursos con afectación específica. Comprenden, principalmente, las destinadas a infraestructura básica y social (a la Provincia de Buenos Aires por 650,0 millones de pesos), las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda (503,8 millones de pesos), al Fondo Vial (302,7 millones de pesos) y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI (143,7 millones de pesos).

El crédito interno financió transferencias al sector privado dentro del programa de Ejecución de Políticas Energéticas para atención de un certificado de obra pendiente, correspondiente a la construcción de Piedra del Aguila (163 millones de pesos).

A su vez, el crédito externo fue usado, principalmente, para acciones de “Más Escuelas, Mejor Educación” (100,0 millones de pesos), para Atención de Emergencias para Inundaciones (68,9 millones de pesos), para el programa Mejoramiento de Barrios -PROMEBA (45,8 millones de pesos), la Extensión del Proyecto de Protección Social (Préstamo BIRF 7157-AR) (23,9 millones de pesos) y para Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado usado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (16,2 millones de pesos).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital, al cierre del tercer trimestre de 2006, se concentraron, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Santa Fe. Estas cuatro jurisdicciones registraron alrededor del 55% del total de las transferencias realizadas.

Las transferencias de capital efectuadas a la provincia de Buenos Aires (29,3% del total) comprenden, sobre todo, las transferencias realizadas para los Planes Federales de Vivienda por 780,8 millones de pesos, la Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial (Fondo del Conurbano Bonaerense) por 650,0 millones de pesos, otras obras que gestiona la Subsecretaría de Obras Públicas por 83,1 millones de pesos, transferencias del Fondo Nacional de la Vivienda por 73,5 millones de pesos, acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” por 61,6 millones de pesos y para Desarrollo Vial por 42,0 millones de pesos.


En el caso de las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad de Buenos Aires (15,0% del total) debe considerarse que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios. Las transferencias se destinaron para formulación de la política energética por 521,2 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 247,9 millones de pesos, para el programa de Mejoramiento de Barrios por 20,8 millones de pesos, para Desarrollo Urbano por 50,3 millones de pesos y para el Plan Jefes de Hogar por 19,5 millones de pesos.

Respecto a las transferencias a la provincia de Santa Cruz (5,6% del total) incluye las realizadas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio por 114,0 millones de pesos, para Obras Viales por convenio con la provincia de Santa Cruz por 69,6 millones de pesos, para Planes Federales de Vivienda por 60,0 millones de pesos, para infraestructura social por 35,2 millones de pesos y para el Fondo Nacional de la Vivienda por 16,2 millones de pesos.

Las transferencias a la provincia de Santa Fe (5,2% del total) comprenden las transferencias para los Planes Federales de Vivienda por 157,0 millones de pesos, asistencia para desarrollo vial por 50,3 millones de pesos, atención de emergencias por inundaciones por 26,8 millones de pesos y para el Fondo Nacional de la Vivienda por 28,6 millones de pesos.

Por su parte, las transferencias correspondientes a la ubicación geográfica interprovincial, asociadas a dos o más jurisdicciones se concentraron mayoritariamente en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 461,4 millones de pesos.

Gasto de Capital por habitante y kilómetro cuadrado-Transferencias de Capital (*)

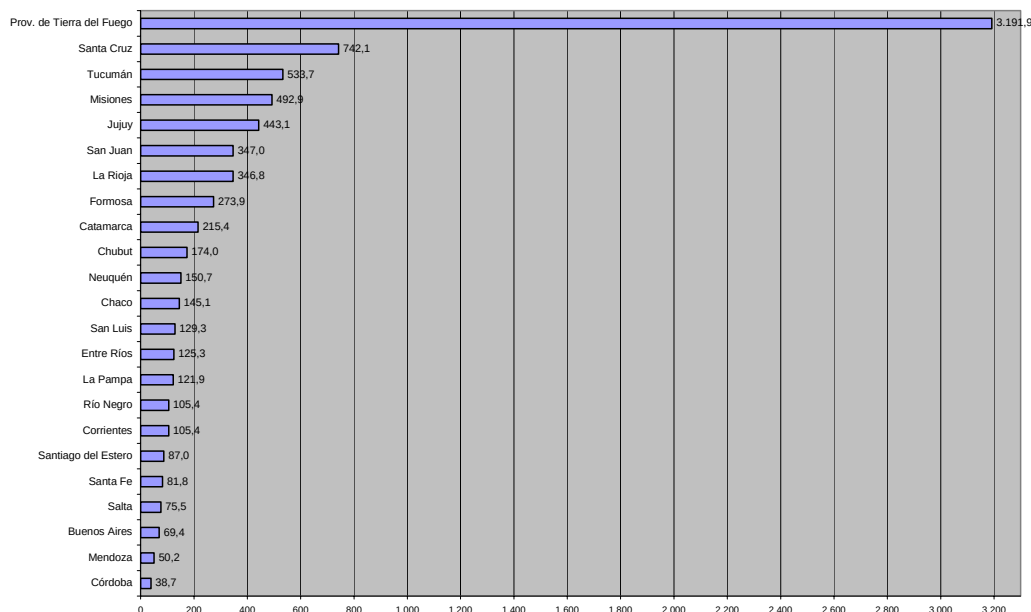

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala (monto del indicador 171.144).

Se estima el indicador de transferencias de capital según densidad poblacional, que surge de:

$$= \text{Transferencias de capital} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \frac{\text{Habitantes}}{\text{Km}^2}$$

El indicador muestra que las transferencias de capital son mayores en la provincia de Tierra del Fuego (más de cuatro veces que las recibidas por la provincia de Santa Cruz, que le sigue en importancia). Las provincias en recibir menores transferencias según el indicador fueron Córdoba y Mendoza que alcanzan cada una, aproximadamente, 1,5% lo recibido por la provincia de Tierra del Fuego.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	37.959.891	109.052	0,3%
Presidencia de la Nación	22.690.000	32.600.208	9.910.208	43,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	198.369	-5.565.631	-96,6%
Ministerio del Interior	10.366.950	7.208.498	-3.158.452	-30,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	68.995.035	-4.375.000	-6,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	56.170.161	55.900.161	20703,8%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	256.000	0,4%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	40.736.273	29.193.530	252,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.187.563.742	3.736.537.957	548.974.215	17,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	-2.514.000	-97,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.200.000	-500.000	-29,4%
Ministerio de Salud	6.765.997	5.427.415	-1.338.582	-19,8%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	4.049.548.790	626.891.501	18,3%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	9.264.822	-975.377	-9,5%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.431.472	-1.700.544	-2,0%
Ministerio Público	5.397.000	7.321.655	1.924.655	35,7%
Presidencia de la Nación	34.448.180	33.698.592	-749.588	-2,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	5.396.074	1.663.074	44,6%
Ministerio del Interior	107.474.260	148.785.905	41.311.645	38,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	7.958.151	5.107.000	179,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	14.489.070	3.555.170	32,5%
Ministerio de Defensa	75.704.091	114.019.694	38.315.603	50,6%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	130.343.721	-13.543.891	-9,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	86.244.726	96.224.279	9.979.553	11,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	21.269.673	15.170.673	248,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	64.006.179	22.730.279	55,1%
Ministerio de Salud	49.512.691	54.659.632	5.146.941	10,4%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	10.895.000	5.585.000	105,2%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	803.763.919	133.520.193	19,9%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.853.312.709	760.411.694	18,6%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	37.959.891	11.501.366	8.160.282	21,5%
Presidencia de la Nación	22.690.000	32.600.208	4.758.668	4.234.271	13,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	198.369	103.445	103.445	52,1%
Ministerio del Interior	10.366.950	7.208.498	1.513.953	1.315.743	18,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	68.995.035	34.990.045	34.300.462	49,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	56.170.161	206.923	206.923	0,4%
Ministerio de Defensa	62.188.983	62.444.983	21.642.612	19.949.746	31,9%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	40.736.273	10.368.908	4.907.469	12,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	3.187.563.742	3.736.537.957	2.507.204.995	2.457.312.762	65,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	47.318	28.138	40,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	1.200.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.765.997	5.427.415	2.495.312	1.264.860	23,3%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	4.049.548.790	2.594.833.544	2.531.784.101	62,5%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	9.264.822	3.905.105	2.556.579	27,6%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	85.431.472	21.698.952	13.620.358	15,9%
Ministerio Público	5.397.000	7.321.655	5.344.176	4.902.550	67,0%
Presidencia de la Nación	34.448.180	33.698.592	10.543.639	8.856.484	26,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	5.396.074	804.917	491.504	9,1%
Ministerio del Interior	107.474.260	148.785.905	59.572.303	42.617.852	28,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	7.958.151	4.511.332	3.724.449	46,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	14.489.070	3.566.962	2.943.850	20,3%
Ministerio de Defensa	75.704.091	114.019.694	58.074.503	49.505.259	43,4%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	130.343.721	51.664.691	28.938.938	22,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	86.244.726	96.224.279	19.463.407	14.227.149	14,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	21.269.673	8.632.398	8.394.102	39,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	64.006.179	21.656.952	20.028.276	31,3%
Ministerio de Salud	49.512.691	54.659.632	20.062.034	17.188.808	31,4%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	10.895.000	3.187.428	2.303.931	21,1%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	803.763.919	292.688.800	220.300.088	27,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.853.312.709	2.887.522.344	2.752.084.189	56,7%

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)						s/i	s/i
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	1.110.000	0	0		24,00		
					51	Adecuación para intalación Subdirección de Notificaciones	1.110.000	0	0		24,00		
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	2.810.000	4.003.636	0		35,00		
					61	Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	2.810.000	4.003.636	0		35,00		
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.250.000	1.250.000	0		48,00		
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.250.000	1.250.000	0		48,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	565.000	876.424	0		91,00		
					52	Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171	565.000	876.424	0		91,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.704.807	1.363.393	1.200.803		34,00		
					52	Lavalle 1220 Capital Federal, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.704.807	1.363.393	1.200.803		34,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.800.000	6.752.632	0		30,00		
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación 6 Juzgados de Ejecución Fiscal	4.800.000	6.752.632	0		30,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.324.203	3.895.691	1.965.536		20,00		
					51	Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Instalación 4 Juzgados y Mesa de Entradas	2.324.203	3.895.691	1.965.536		20,00		
				7		Area Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.770.000	0	0		100,00		
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento en inmueble	870.000	0	0		100,00		
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	900.000	0	0		100,00		
				10		Area Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	930.000	101.489	0		100,00		
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector Electoral	930.000	101.489	0		100,00		
				11		Area Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	2.510.000	0	0		29,00		
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	2.000.000	0	0		29,00		
					52	Edificio Primera Junta 2687, Santa Fe - Adecuación Tribunal Oral y Juzgado N° 2	510.000	0	0		28,00		
				12		Area Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	900.000	0	0		100,00		
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	900.000	0	0		100,00		
				15		Area Cámara Resistencia							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	83.986	1.425.154	748.937		5,00		
					51	Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	83.986	1.425.154	748.937		5,00		
				16		Area Cámara de Córdoba							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	610.000	0	0		100,00		
					51	Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	610.000	0	0		100,00		
				17		Area Cámara San Martín							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.557.476	1.538.392	1.376.988				
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martín y remodelación de planta baja	997.476	1.538.392	1.376.988		27,00		
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, puesta en funcionamiento de inmueble	560.000	0	0		100,00		
				18		Area Cámara Tucumán							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.980.000	2.673.286	0		55,00		
				22	52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio Fuero Penal Económico	1.980.000	2.673.286	0		55,00		
				1		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	713.367	889.794	798.934		71,00		
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	713.367	889.794	798.934		71,00		
335				21		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)						s/i	s/i
						Justicia de Máxima Instancia							
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.139.870	4.262.870	1.352.179		75,00		
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	824.373	3.104.373	736.699		25,00		
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	315.943	15.943	0				
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	135.099	135.099	0				
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	126.093	126.093	0		99,00		
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	539.077	19.077	0				
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	113.097	776.097	615.480				
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	86.188	86.188	0				
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.173.303	1.335.303	0				
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolome Mitre 718 - Maipu 92	1.011.270	1.021.270	0				
					58	Obras de adecuac. y Acond. Científico de la Dirección Pericial Junin 760	129.282	129.282	0				
					65	Construcción, Decantación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junin 760	32.751	32.751	0				
					69	Rep. y Mant. de Ascens. de la CSJN, B. Mitre, Maipu y Junin	0	2.000	0				
					70	Adec. de locales para el traslado del Cuerpo Medico Forence	0	150.000	0				
				3		Refacciones Varias	583.692	583.692	4.053		70,00		
					55	Adecuación Integral Edificio Villariño 2010 para el archivo general	574.585	574.585	0		34,00		
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	9.107	9.107	4.053		20,00		
				4		Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	40.500		25,00		
					51	Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	40.500		25,00		
				5		Readecuación y refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.188.000	672.353		30,00		
					51	Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.188.000	672.353		30,00		
				6		Reciclado de fachadas Tucumán - Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	57.750	0		24,00		
					51	Reciclado de fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	57.750	0		24,00		
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	3.927.385	0		50,00		
					51	Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	3.927.385	0		50,00		
20						Presidencia de la Nación							
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
				17		Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas							
				2		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.191.646	109.990	0,00	100,00	15,00	15,00
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.191.646	109.990	0,00	100,00	15,00	15,00
				20		Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR							
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	1.274.714	344.217	0	100,00	100,00	0,00	0,00
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	314.178	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Centro de Informes con Biblioteca en El Calafate	240.206	200.206	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Centro Administrativo en El Calafate	180.444	144.011	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Albergue para voluntarios en Glaciar Perito Moreno	329.563	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Centro de Visitantes en Lago Roca	210.323	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.374.215	2.341.039	1.646.256	0,00	100,00	77,00	77,00
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	644.335	1.486.159	949.679	0,00	100,00	51,00	51,00
					55	Refacción Edificio Histórico y construcción de sanitarios en Hua Hum	194.585	319.585	689.657	0,00	100,00	s/i	s/i
					57	Subcentral de Incendios en Ruca Choroi	237.950	237.950	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Sendero Termas de Epulauquen	297.345	297.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Centro de Visitantes en Puerto Canoa (*****)	0	0	6.921	0,00	100,00	s/i	s/i
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.043.364	6.301.516	586.181	25,25	74,75	26,00	34,78
					53	Albergue para voluntarios en Villa La Angostura	34.684	64.684	2.218	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						54 Camino Tronador-Los Rápidos	653.150	3.013.150	47.119	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	150.198	180.198	258.622	0,00	100,00	100,00	100,00
						57 Refaccion de dos viviendas en Villa Mascardi	52.539	52.539	55.825	0,00	100,00	100,00	100,00
						58 Senderos y Miradores en Isla Victoria	79.869	1.709.869	188.013	0,00	100,00	100,00	100,00
						59 Infraestructura Isla Victoria Area Central	627.562	925.130	34.384	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Ordenamiento Cascada Los Alerces - Estacionamiento, Ctro. de Visit. Baños Públicos	445.362	355.946	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	707.707	2.467.490	525.843	49,56	50,44	20,00	39,65
						51 Albergue para Voluntarios Villa Futalaufquen	0	551.082	16.094	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción Sendero Chacao Mermoud Menendez	0	551.439	440.121	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción albergue para voluntarios en Lago Verde	105.013	105.013	69.628	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Saneamiento y servicios en Villa Futalaufquen	426.129	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Portada de Acceso en Zona Norte	75.131	369	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Acondicionamiento del Centro de Informes	29.946	1.244.946	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						58 Alambrado Límite Este	71.488	14.641	0	0,00	100,00	0,00	0,00
21						Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
				38		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.113.772	1.113.772	1.113.772	14,72	85,28	0,00	0,00
						52 Obras en Junta de la Palca	173.497	173.497	173.497	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Obras en Agua del Godo	375.545	375.545	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento camino de acceso	564.730	564.730	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	922.392	1.222.392	1.284.391	28,50	71,50	s/i	s/i
						56 Mejoramiento camino de acceso a Parque Nacional y obras compleplementarias	922.392	1.222.392	1.284.391	0,00	100,00	100,00	100,00
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.128.989	1.178.989	63.349	50,00	50,00	3,00	6,00
						52 Vivienda Intendencia Pampa de Los Guanacos (*****)	0	50.000	63.349	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Centro Operativo Area Pobladores	483.158	483.158	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Centro Operativo Area Robles	187.773	187.773	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Alambrado perimetral y senderos	81.572	81.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Centro de Informes con dos viviendas y galpón en Los Pirintos	376.486	376.486	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.640.847	1.290.847	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Obras 1º Etapa Infraestructura	497.584	497.584	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Adecuación Galpón de esquila como Centro de Informes	357.662	357.662	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Intendencia en Puerto Santa Cruz con albergue para visitantes y vivienda	533.356	183.356	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Vivienda Guardaparques	75.297	75.297	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Casa personal área de la Costa	94.122	94.122	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Construcción senderos y miradores	82.826	82.826	0	0,00	100,00	0,00	0,00
22						Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004							
				1		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	628.734	1.404.026	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Martín de los Andes	279.701	604.357	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción muelles Hua-Hum y Pucará - San Martín de los Andes	142.069	308.376	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Parque Temático	206.964	491.293	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.968.799	4.450.585	9.130	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Sendero Parque Nacional Arrayanes - Villa La Angostura	82.797	291.694	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - Villa La Angostura	72.022	253.733	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Carlos de Bariloche	344.980	742.668	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción de 3 Subcentrales de Incendios	313.490	669.295	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Restauración de la Casa de Anchorena, Casa Verde y Casa Roja	552.276	1.138.075	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Senderos a Refugios Red Troncal Catedral	57.753	126.424	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Senderos y miradores en Cascada Los Cántaros	51.191	109.928	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						58 Mirador Co Lemu (Arroyo Cataratas)	26.254	47.240	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						59 Sendero Las Mellizas Cañadon a Verde y Pinturas Rupestres	143.761	312.632	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Senderos a Cascada del Ivinco	324.275	758.896	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	744.149	1.809.287	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción sendero Subcentral de Incendio Zona Norte y Bahía Rosales	238.667	840.824	4.565	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						52 Puesto en Valor Museo Los Alerces	88.994	179.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción y reparación de muelles Lagos Krugger, Verde, Rivadavia y Pta. Matos	40.061	61.951	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Grupos Sanitarios Públicos	241.423	483.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	135.004	242.994	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	158.318	334.402	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	13.296	26.352	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Portada, Guarda Ganado y obras en el acceso al Parque Nacional	6.037	12.749	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Centro de Atención al Visitante y cobro de Acceso	14.911	42.337	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Riego y parquización zona muelle Parque Nacional	5.636	13.697	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Construcción de rompeolas	6.918	7.713	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Construcción muelle flotante	81.174	172.686	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Construcción muelle flotante Río Turbio y Los Hitos	30.346	58.868	0	0,00	100,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION							
		1				Actividades Centrales							
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	99,57	0,43	0,00	0,00
				3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa (***)	6.000.000	5.875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	6.000.000	5.875.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
337						SECRETARIA DE CULTURA							
				38		Desarrollo y Acción Cultural							
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	1.100.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00
						53 Remodelaciones Varias	1.159.000	1.100.000	0	13,00	77,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE							
				23		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
				3		Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D. (*****)	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00
						52 Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00
				6		Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	3.678.369	198.369	103.445	23,32	76,68	76,68	100,00
						52 Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva (*****)	1.330.000	0	8.300	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Centro de Transformación de Media Tensión (*****)	2.150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoramiento Planta Reductora de Gas	198.369	198.369	95.145	25,15	76,68	76,68	100,00
30						Ministerio del Interior							
						DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES							
				16		Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional							
				4		Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	0	0	90,39	4,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	0	0	90,39	4,00	0,00	0,00
				5		Restauración del Ex-Hotel de Inmigrantes (*****)	0	82.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						51 Restauración del Ex-Hotel de Inmigrantes	0	82.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						POLICIA FEDERAL ARGENTINA							
326				21		Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes							
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	240.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				37		Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	200.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				40		Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	233.750	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Edificio Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				47		Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C						FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual		Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
					48	Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
					4	Construcción consultorios externos para ginecologia	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción consultorios externos para ginecologia	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	375					GENDARMERIA NACIONAL							
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
					2	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00
				19		Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	160.351	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logistica	0	160.877	160.351	0,00	100,00	100,00	100,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa I	2.850.000	1.188.671	526.100	9,00	25,00	3,80	15,20
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	2.500.000	660.571	0	3,40	21,90	0,00	0,00
					53	Construcción Guardia de Prevencion Jefatura Región I	0	102.050	102.050	0,00	100,00	99,00	99,00
					54	Construcción Caniles Jefatura Región I	0	76.050	76.050	60,00	40,00	100,00	250,00
					60	Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto	350.000	350.000	348.000	25,00	50,00	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	128.200	128.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación Rampa Edificio Centinela	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Construcción de Instalaciones y Depósitos - Agrupación Salta	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Construcción Pabellón Carcelario - Escuadrón 20 "Oran"	28.200	28.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Mercadería - Escuadrón 52 Tartagal	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	380					PREFECTURA NAVAL ARGENTINA							
					31	Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad y Judicial							
					1	Construcción del destacamento Chana Mini y Luis Braga en zonas inundables	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción del destacamento Chana Mini	450.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción del destacamento Cabo Primero Luis Braga	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					2	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					3	Construccion Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construccion Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				37		Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina							
					1	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	629.292	0,00	100,00	85,00	85,00
					51	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	629.292	0,00	100,00	85,00	85,00
35						Ministerio de Relaiones Exteriores, Comercio Internacional y Culto							
	106					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
				1		Actividades Centrales							
					3	Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	0	0	0,00	1,78	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	0	0	0,00	1,78	0,00	0,00
				16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
					1	Infraestructura Terrestre	20.700.000	20.686.000	6.147.907	49,34	26,00	6,86	26,38
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	93.000	67.245				
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	13.260.000	16.309.000	5.773.438	76,55	55,88	23,83	42,64
					52	Construcción del Instituto Gulich	1.134.000	984.000	0	20,35	28,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	5.000	5.000	91.925	9,64	26,67	2,05	7,69
					56	Construccion Antena Multiproposito N° 4	4.392.000	1.742.000	0	0,00	97,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.336.000	1.033.000	215.300	0,16	9,00	1,39	15,44
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	510.000	510.000	0	2,00	6,00	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales	41.206.400	39.836.400	27.889.113	61,58	4,00	3,90	97,50
					0	Misiones Satelitales	497.000	1.347.000	1.693.891				
					52	Misión SAOCOM	36.957.400	27.247.550	9.182.654	64,29	5,00	3,49	69,80

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						53 Misión SABIA	2.652.000	3.221.850	2.508.739	14,19	13,00	0,00	0,00
						54 Misión CESAR	1.100.000	8.020.000	14.503.828	8,61	15,63	10,46	66,92
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	4.013.000	2.710.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	4.008.000	2.710.000	0	0,00	89,00	0,00	0,00
						52 Antena Multipropósito N° 6	5.000	0	0	0,00	0,11	0,00	0,00
				5		Subsistemas de propulsión de satélites	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites calificados en tierra	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
				1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	21.000	381.000	261.966	0,74	0,44	0,31	70,45
						0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	3.000	3.000	247				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	14.000	374.000	261.719	8,51	5,81	4,22	72,63
						52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	4.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
						51 Reconversioón Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
		1				Actividades Centrales							
				2		Remodelación Palacio San Martín	156.000	685.663	0	0,00	100,00	48,00	48,00
						51 Remodelación Palacio San Martín	156.000	685.663	0	0,00	100,00	48,00	48,00
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	3,00	4,00
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	2.798.960	0	2,15	75,00	3,00	4,00
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	604.662	0	0,00	80,00	32,00	40,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	604.662	0	0,00	80,00	32,00	40,00
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	1.476	10,00	43,00	30,00	69,77
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	1.476	10,00	43,00	30,00	69,77
		16				Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
				12		Remodelacion de la Embajada en Francia (*****)	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
						51 Remodelacion de la Embajada en Francia	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos							
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS							
		1				Actividades Centrales							
				3		Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	1.070.000	206.923	75,11	11,00	10,00	90,91
						51 Reparaciones Varias	180.000	920.000	180.085	81,40	18,60	10,00	53,76
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	5.153	83,00	7,00	3,00	42,86
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	105.000	21.685	100,00	0,00	0,00	0,00
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria (*****)							
				10		Construccion Complejo Federal de Condenados - Mercedes BA.	0	55.100.161	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construccion Complejo Federal de Condenados - Mercedes BA.	0	55.100.161	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construccion Centro Federal del Noroeste - Guemes - Salta	0	22.308.257	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construccion Centro Federal del Noroeste - Guemes - Salta	0	22.308.257	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construccion Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	7.672.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcion Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	7.672.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Ampliacion Unidad 31 - Ezeiza	0	5.034.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliacion Unidad 31 - Ezeiza	0	5.034.784	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Ampliacion Unidad 3 - Ezeiza	0	3.013.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliacion Unidad 3 - Ezeiza	0	3.013.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				17		Ampliacion Unidad 11	0	5.162.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliacion Unidad 11	0	5.162.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
					18	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	0	2.754.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	0	2.754.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	0	1.643.410	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	0	1.643.410	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					20	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	0	2.085.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	0	2.085.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					21	Carcel Federal de Candelaria	0	2.727.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Carcel Federal de Candelaria	0	2.727.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					22	Centro de Drogadependientes	0	1.580.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Centro de Drogadependientes	0	1.580.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa							
	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
		16				Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército							
					44	Construcciones de Polvorines	3.045.730	3.045.730	1.250.000	40,00	60,00	40,83	68,05
					71	Construcción Dep. Mun. M8 - Gral San Lorenzo	3.045.730	3.045.730	1.250.000	40,00	60,00	40,83	68,05
					47	Construcción y Ampliación redes agua, gas y electricidad	450.000	450.000	350.657	0,00	100,00	67,31	67,31
					59	Instalación red gas natural RI 6-RI 12 Toay	450.000	450.000	350.657	0,00	100,00	67,31	67,31
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
		16				Capacidad Operacional de la Armada							
					2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	981.888	2,00	66,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	981.888	2,00	66,00	0,00	0,00
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	150.159	0,00	39,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	150.159	0,00	39,00	0,00	0,00
					18	Formación y Capacitación							
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	10.808.620	5.792.643	42,71	39,00	18,06	46,31
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	10.808.620	5.792.643	42,71	39,00	18,06	46,31
					2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.034.734	432.838	25,85	47,00	8,69	18,49
					51	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	2.034.734	432.838	25,85	47,00	8,69	18,49
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	12.200.000	1.265.031	5,55	56,00	6,02	10,75
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	12.200.000	1.265.031	5,55	56,00	6,02	10,75
					4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	3.081.089	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					5	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00
					51	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	0	0,90	99,00	0,00	0,00
					7	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					9	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	15.024.544	9.627.086	18,00	44,00	33,00	75,00
					51	Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	15.024.544	9.627.086	18,00	44,00	33,00	75,00
					10	Reubicación Batallón de Seg.del Est.Mayor Gral.de la Armada (*****)	0	349.266	1.092	0,00	s/i	s/i	s/i
					51	Reubicación Batallón de Seg.del Est.Mayor Gral.de la Armada	0	349.266	1.092	0,00	s/i	s/i	s/i
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
					3	Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000	98.352	0,00	21,71	2,52	11,61
					51	Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000	98.352	0,00	21,71	5,81	26,76
50						Ministerio de Economía y Producción							
	357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
		1				Actividades Centrales							
					13	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					14	Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	600.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Completamiento 3er Piso y Sala de servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	600.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					15	Restauración Integral del Patio Princ.- Edificio PAHAC	500.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
						51 Trabajos de Rest. Integral 1er piso-Edificio PAHAC-Y.H.250	500.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					16	Refacción Edificio Alsina 470 - CF	500.000	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Provisión e Instalación SS1,1 y 2Piso Cielorr. Susp. Circu.	500.000	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					17	Refaccion Sala Servidores-Centro de Computos-Balcarce 186 7P					s/i	s/i	s/i
						51 Refaccion Sala Servidores-Centro de Computos-Balcarce 186 7P							
		26				Administración Financiera							
					1	Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020,00	94.764,85	0,00	100,00	20,00	20,00
						51 Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020,00	94.764,85	0,00	100,00	20,00	20,00
602						COMISION NACIONAL DE VALORES							
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública							
					1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	107.800	107.800	80.676	47,89	17,00	20,45	120,29
						53 Modernización del Archivo	107.800	107.800	80.676	47,89	17,00	20,45	120,29
					2	Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	350.320	350.320	18.028	87,19	12,81	2,10	16,39
						54 Autopista de la Información Financiera	315.320	315.320	16.147	98,86	1,14	0,06	5,26
						56 Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	35.000	35.000	1.881	80,00	20,00	4,30	21,50
606						INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas							
					3	Parques de Innovación Tecnológicos	1.011.459	2.437.015	52.862	1,08	86,00	0,00	0,00
						0 Parques de Innovación Tecnológicos	522.289	1.947.845	52.862				
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	489.170	489.170	0	9,03	86,00	0,00	0,00
					5	Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigación-Etapa II	427.003	427.003	137.497	95,40	4,60	19,37	421,09
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	427.003	427.003	137.497	95,40	4,60	19,37	421,09
					8	Construcciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)	637.841	637.841	49.000	62,01	37,99	15,36	40,43
						51 Ampliacion Sala de Proc. Esc. Sat.en Inst. Clima y Agua	240.303	240.303	0	98,32	1,68	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virologia	29.667	29.667	0	54,72	45,28	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Bacterias Inst. de Biotecnología	178.002	178.002	49.000	94,00	6,00	29,53	492,17
						55 Remodelación Aloj. Pasantes, Bec. Inst.Microbiología y Zoo.	29.667	29.667	0	79,13	20,87	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de frío en el Inst. de Patob. de Castelar	160.202	160.202	0	94,75	5,25	0,00	0,00
					12	Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	385.000	157.351	0,00	100,00	76,24	76,24
						51 Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	385.000	157.351	0,00	100,00	76,24	76,24
					17	Ampliacion Laboratorio Biotec. Ccias. Veterinarias y Agron. (*****)	0	1.500.000	149.800	0,00	s/i	2,70	
						51 Ampliacion Laboratorio Biotec. Ccias Veter. y Agronomicas	0	1.500.000	149.800	0,00	s/i	2,70	
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)							
					4	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	142.333	142.333	0	83,83	16,17	0,00	0,00
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	142.333	142.333	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					5	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	574.679	574.679	0	78,95	21,05	0,00	0,00
						58 Obras en la Estac.Agrop.C. del Uruguay	574.679	574.679	0	31,72	68,28	0,00	0,00
					9	Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)	1.062.078	1.062.078	33.647	78,46	21,54	3,18	14,76
						52 Construcciones Oficinas y Galpon en el Campo Exp. Leales	35.600	35.600	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construccioón Oficinas, Banos y Salas de Reuniones E.E.A. Ang	504.339	504.339	0	40,16	59,84	0,00	0,00
						56 Obras en Esta. Exp. Agrop. Balcarce	89.001	89.001	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Obras en la Estac. Exp. Agrop. La Rioja	296.670	296.670	0	99,92	0,08	0,00	0,00
						61 Ampliacion Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	29.667	29.667	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Lab.de Aromas y Fit. en Estac. Exp. Agrop. Mendoza	106.801	106.801	33.647	25,26	74,74	2,37	3,17
					13	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa V	0	5.295.000	804.035	0,00	100,00	38,94	38,94
						51 Obras Varias C.R. Tucuman - Santiago del Estero	0	260.000	84.838	0,00	100,00	36,81	36,81
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	0	2.900.000	304.505	0,00	100,00	12,48	12,48
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	0	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R.Chaco - Formosa	0	1.515.000	280.799	0,00	100,00	79,96	79,96
						55 Obras Varias C.R. Misiones	0	600.000	133.894	0,00	100,00	63,50	63,50
					14	Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VI	0	5.270.000	624.754	0,00	100,00	18,90	18,90
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	0	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	0	130.000	149.507	0,00	100,00	s/i	s/i
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	0	4.300.000	284.123	0,00	100,00	8,16	8,16
						54 Obras Varias C.R.Córdoba	0	210.000	109.461	0,00	100,00	35,55	35,55
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	0	550.000	81.663	0,00	100,00	19,50	19,50
				15		Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-EtapaVII	0	4.900.000	161.953	0,00	100,00	14,05	14,05
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	0	4.900.000	161.953	0,00	100,00	14,05	14,05
				16		Construc.y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VIII	0	4.950.000	1.025.465	0,00	100,00	37,01	37,01
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	0	2.800.000	505.765	0,00	100,00	26,18	26,18
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	0	200.000	43.967	0,00	100,00	s/i	s/i
						53 Obras Varias C.R.La Pampa - San Luis	0	1.400.000	366.113	0,00	100,00	46,39	46,39
						54 Obras Varias C.R.Patagonia Sur	0	550.000	109.619	0,00	100,00	35,41	35,41
				18		Constr. Edif. Estacion Experimental Agrop. Agron. San Juan. (*****)	0	900.000	0	0,00	s/i	5,50	
						51 Constr. Edif. Estacion Expeimental Agrop. Agronomia San Juan	0	900.000	0	0,00	s/i	5,50	
				19		Constr. y Ampliac. Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte (*****)	0	1.000.000	148.711	0,00	s/i	2,65	
						51 Constr. y Ampliac. Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	0	1.000.000	148.711	0,00	s/i	2,65	
				20		Construccion Edificio Agronomia Estacion Agrop. Balcarce (*****)	0	3.500.000	4.345	0,00	s/i	0,01	
						51 Construccion Edificio Agronomia Estacion Agrop. Balcarce	0	3.500.000	4.345	0,00	s/i	0,01	
				21		Construccion Laboratorios y Oficinas Estacion Agrop. Rafaela (*****)	0	800.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Construccion Laboratorios y Oficinas Estacion Agrop. Rafaela	0	800.000	0	0,00	s/i	s/i	
				22		Construcciones y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy (*****)	0	800.000	7.089	0,00	s/i	0,01	
						51 Laboratorio, Ofic. y Viv. Ag. Ext. Rur. Posta de Hornillos.	0	0	0	0,00	s/i	0,01	
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	0	800.000	7.089	0,00	s/i	0,01	
				23		Construccion Laboratorios y Ofic. Estacion Agrop. Manfredi (*****)	0	1.000.000	509.071	0,00	s/i	9,86	
						51 Construccion Laboratorios y Ofic. Estacion Agrop. Manfredi	0	1.000.000	509.071	0,00	s/i	9,86	
				24		Construccion Edificio Agencia Expension Rural Bandera (*****)	0	175.800	58.368	0,00	s/i	0,52	
						51 Construccion Edificio Agencia Extension Rural Bandera	0	175.800	58.368	0,00	s/i	0,52	
609				16		INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	100.000	59.278	18,82	11,46	6,80	59,34
						51 Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	100.000	59.278	18,82	11,46	6,80	59,34
				3		Equipamiento Analítico	400.000	400.000	115.739	44,12	11,24	3,27	29,09
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	400.000	400.000	115.739	44,12	11,24	3,27	29,09
				4		Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	12.150	85,13	4,82	0,59	12,24
						51 Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	100.000	12.150	85,13	4,82	0,59	12,24
623				17		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
						Servicios de Laboratorios							
				14		Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	1.149.740	607.120	10,00	40,00	0,00	0,00
						51 Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	1.149.740	607.120	10,00	40,00	0,00	0,00
56				105		Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA							
				16		Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos							
				1		Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.075.000	1.123.059	493.495	89,00	1,40	0,68	48,57
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.075.000	1.123.059	493.495	89,00	1,40	0,68	48,57
				2		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	40.000	40.000	12.297	95,86	2,06	0,68	33,01
						51 Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	40.000	40.000	12.297	95,86	2,06	0,68	33,01
				3		Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	450.000	650.000	325.018	77,99	0,13	2,83	2176,92
						52 Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	450.000	650.000	325.018	33,33	7,00	5,35	76,43
				5		Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	950.000	1.339.675	846.168	66,84	26,60	23,13	86,95
						52 Laboratorio Calibración en Dosimetría	950.000	1.339.675	846.168	46,75	44,00	36,65	83,30
				6		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	490.500	681.100	163.690	61,76	13,00	1,77	13,62
						52 Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	328.700	525.200	147.185	47,35	16,00	5,50	34,38
						53 Laboratorio Control y Verificación de Calidad	161.800	155.900	16.505	87,92	7,00	0,69	9,86

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
					7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.159.600	520.000	175.643	24,77	3,09	0,49	15,86
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	948.100	369.100	130.570	8,10	13,00	1,78	13,69
					52	Repositorio Fase 1	211.500	150.900	45.073	26,47	1,00	0,22	22,00
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	372.000	125.177	33,70	18,00	9,66	53,67
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	372.000	125.177	33,70	18,00	6,19	34,39
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	10.364.098	7.914.198	573.911	25,36	15,75	0,31	1,97
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	8.165.000	5.999.000	442.325	31,95	20,00	0,47	2,35
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	1.320.460	1.085.260	69.008	21,47	8,00	0,58	7,25
					53	Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	878.638	798.738	31.742	7,97	11,00	0,28	2,55
					54	Remodelación Casa Guayra (*****)	0	31.200	30.836	58,00	14,68	14,68	100,00
				18		Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas							
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	72.000	72.000	2.542	70,93	0,32	0,01	3,13
					53	Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	72.000	72.000	2.542	35,04	4,00	0,14	3,50
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.114.000	1.029.000	575.231	89,95	6,71	3,41	50,82
					51	Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	544.000	544.000	335.371	90,22	9,78	2,89	29,55
					52	Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	570.000	485.000	239.861	89,38	5,00	4,46	89,20
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	410.000	1.547.000	829.305	66,97	3,08	1,62	52,60
					51	Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	350.000	1.325.000	791.001	91,52	4,00	2,63	65,75
					52	Ampliación Laboratorio CAB	60.000	222.000	38.304	50,09	5,00	0,61	12,20
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	125.000	440.750	134.274	82,79	7,50	7,14	95,20
					51	Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	125.000	440.750	134.274	82,79	7,50	7,14	95,20
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	657.000	657.000	78.938	35,92	4,00	0,31	7,75
					51	Centro de Aceleración de Iones	600.000	600.000	62.151	32,57	2,00	0,32	16,00
					53	Laboratorio de Química Analítica	57.000	57.000	16.787	53,00	4,00	0,30	7,50
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	711.000	718.295	604.772	84,23	11,59	9,77	84,30
					51	Saneamiento CAE	711.000	718.295	604.772	48,29	36,00	29,61	82,25
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	120.000	14.121	14.121	26,10	8,00	0,95	11,88
					51	Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	120.000	14.121	14.121	26,10	8,00	0,95	11,88
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	35.000	505.000	7.017	23,60	2,50	0,50	20,00
					51	Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	35.000	505.000	7.017	23,60	2,50	0,50	20,00
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	350.000	730.000	298.517	20,35	22,00	18,81	85,50
					51	Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Micr	350.000	730.000	298.517	20,35	22,00	18,81	85,50
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	268.992	95,00	3,00	3,00	100,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	268.992	95,00	3,00	3,00	100,00
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
115						COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES							
				1		Actividades Centrales							
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	580.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	580.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
				17		Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR							
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	7.984.200	5.984.200	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.946.000	2.446.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	2.600.000	2.100.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	1.438.200	1.438.200	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	1.786.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	1.786.200	0	0,00	50,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	1.008.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Construcción Puente Roca-Patricos	3.721.600	2.049.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricos	3.721.600	2.049.600	0	0,00	41,00	0,00	0,00
				6		Construccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	400.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
19						Recursos Hídricos							
				2		Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	38.600.000	38.600.000	12.644.562	59,05	20,07	8,20	40,86
					56	Aliviador Cildañes - Etapa II	26.000.000	23.281.813	2.729.087	96,16	3,84	2,20	57,29
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	12.600.000	15.318.187	9.915.474	79,85	20,15	27,79	137,92
				9		Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tafí Viejo	400.000	400.000	0	99,00	1,00	0,00	0,00
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	700.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	4.706.912	0	0,00	86,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	4.706.912	0	0,00	86,00	0,00	0,00
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	4.515.088	1.220.000	0,00	0,40	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	4.515.088	1.220.000	0,00	0,40	0,00	0,00
				23		Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				24		Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
25						Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	1.621.223	37,78	5,00	1,41	28,20
					51	Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.896.000	1.621.223	37,78	5,00	1,41	28,20
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	2.600.000	15.105.964	4.784.828	34,65	4,00	3,58	89,50
					51	Edificios Fiscales	2.600.000	15.105.964	4.784.828	34,65	4,00	3,58	89,50
				7		CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.410.000	4.522.000	2.736.362	16,14	10,00	0,00	0,00
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	3.710.000	2.710.000	2.616.590	0,00	56,00	0,00	0,00
					52	Defensa Costera	3.700.000	1.812.000	119.773	49,70	8,00	0,00	0,00
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.465.000	643.814	46,21	53,00	0,43	0,81
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	1.465.000	643.814	46,21	53,00	0,43	0,81
				11		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	2,60	21,67
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	2,60	21,67
				12		Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00
					51	Protección Cueva de las Manos	704.000	704.000	110.580	79,48	20,52	0,00	0,00
				13		Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.888.000	1.375.500	0,00	100,00	43,77	43,77
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	1.888.000	1.375.500	0,00	100,00	43,77	43,77
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	25.000.000	14.181.927	0,00	11,29	15,60	138,18
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	25.000.000	14.181.927	0,00	11,29	15,60	138,18
				21		Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	4.100.000	320.658	0,00	34,00	3,50	10,29
					51	Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	4.100.000	320.658	0,00	34,00	3,50	10,29
				22		Restauración y Puesta en valor en el Instituto Saturnino Unzué	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Restauración Ex Instituto Saturnino Unzué - MDQ - Cubiertas	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	7.355.000	7.355.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004 (*****)	0	3.629.031	0				
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	7.355.000	3.725.969	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	1.150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				29		Construcción Edificio del Instituto de Física de Rosario (*****)	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	
				30		51 Construcción Edificio del Instituto de Física de Rosario	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	
						Prevención Sísmica							
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	146.399	54,60	5,00	1,90	38,00
				32		51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	146.399	54,60	5,00	1,90	38,00
						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera							
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.215.528	4.054.528	2.436.105	35,00	33,00	22,00	66,67
						0 Construcción Huellas Mineras Etapa II	715.528	24.423	0				
						51 Huellas Varias Misiones	100.000	150.000	150.000	35,00	33,00	24,00	72,73
						52 Huellas Mineras NOA	600.000	1.200.000	675.000	35,25	33,00	24,00	72,73
						53 Huellas Mineras Cuyo	625.000	1.201.655	907.655	35,00	33,00	24,00	72,73
						54 Huellas Mineras Comahue	500.000	1.195.000	495.000	35,00	33,00	19,00	57,58
				50		55 Huellas Mineras Patagonia	675.000	283.450	208.450	35,00	33,00	19,00	57,58
						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
				2		Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	1.521.000	521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						52 Puente Encarnación-Posadas	1.521.000	521.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	0	0	0,00	48,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	0	0	0,00	48,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00
				13		Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	4.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	4.797.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	4.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	4.071.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00
				16		Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				17		Ampliación Unidad 11	1.900.000	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 11	1.900.000	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00
				18		Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00
				19		Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00
				20		Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				21		Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00
				22		Centro de Drogadependientes	1.118.710	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Centro de Drogadependientes	1.118.710	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				55		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario							
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	139.680.099	139.680.099	106.291.884	60,38	39,62	16,81	42,43
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	6.624.007	8.714.007	6.372.967				
						51 Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	15.505.755	15.445.755	15.423.272	91,59	8,41	4,03	47,92
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	24.289.000	22.259.000	5.024.605	0,00	90,00	0,77	0,86
						53 Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	16.800.000	16.800.000	10.817.846	71,23	23,00	4,62	20,09
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	20.792.900	20.792.900	18.273.524	18,70	77,00	30,06	39,04
						55 Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.249.789	17.249.789	14.925.397	55,62	23,00	17,65	76,74
						62 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	318.289	318.289	3.698.725	100,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
						64 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	1.437.818	1.437.818	2.803.066	99,99	0,01	0,00	0,00
						65 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	2.188.994	2.188.994	9.790.501	99,99	0,01	0,00	0,00
						66 Paso a Diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	19.407.339	19.407.339	3.328.861	18,00	50,00	5,93	11,86
						67 Paso Diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes	5.193.189	5.193.189	7.701.943	50,13	49,87	24,81	49,75
						68 Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	9.873.019	9.873.019	8.131.177	20,39	50,00	38,00	76,00
				4		Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	64.862.841	14.835.834	0,00	38,00	5,92	15,58
						0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	0	8.216.857	745.248				
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	56.645.984	14.090.586	0,00	38,00	5,92	15,58
		87				Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID							
				1		Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica (****)	206.925.272	123.186.730	0	0,00	24,00	0,00	0,00
						51 Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica	206.925.272	123.186.730	0	0,00	24,00	0,00	0,00
				2		Pavimentación R.N.34 - Provincia de Jujuy	9.082.096	5.445.290	0	0,00	9,50	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N.34 Provincia de Jujuy	9.082.096	5.445.290	0	0,00	9,50	0,00	0,00
				3		Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.043.515	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	5.043.515	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				4		Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	6.469.283	0	0,00	13,00	0,00	0,00
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula (**) (1)	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	3,00	3,54	118,00
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	11.172.000	26.172.000	20.974.060	0,00	3,00	3,54	118,00
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	700.000	700.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	825.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	825.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				6		Reparacion de Puente Uriburu	0	1.300.000	846.687	0,00	100,00	60,34	60,34
						51 Reparacion en estructura de tablero y de calzada	0	1.300.000	846.687	0,00	100,00	60,34	60,34
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	1.400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				8		Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	600.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	800.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	240.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	825.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	825.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Puente Pueyrredón	600.000	600.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	2.500.000	1.200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Dragado Río Uruguay	2.500.000	1.200.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	200.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual		
							Original	30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
613	20				20	Ampliación Complejo Portuario Bahia Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahia Ushuaia	300.000	300.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					21	Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO							
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlinghan-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	25.120.718	45.752.202	33.965.944	12,96	55,00	41,95	76,27
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlinghan-Moron-Ituzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	8.062.405	13.274.211	11.555.464	57,32	43,00	9,15	21,28
					52	1° Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	10.530.568	23.467.796	22.347.670	1,36	57,00	54,60	95,79
					53	2° Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Moron-Ituzaingo-Bs As)	6.527.745	9.010.195	62.810	0,00	99,00	29,85	30,15
					3	Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	15.758.019	34.354.887	22.870.168	7,10	48,00	31,94	66,54
					51	Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	8.296.532	16.833.769	13.666.155	3,92	95,00	33,23	34,98
					52	Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Parana-Entre Ríos)	7.461.487	17.521.118	9.204.013	11,48	87,00	31,35	36,03
					4	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	10.553.660	6.808.633	4,87	58,00	23,07	39,78
					51	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	10.553.660	6.808.633	4,87	58,00	23,07	39,78
					5	Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	19.029.341	16.320.242	0,00	33,00	9,05	27,42
					51	Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	19.029.341	16.320.242	0,00	33,00	9,05	27,42
					6	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	25.793.778	20.269.976	0,00	100,00	50,31	50,31
					51	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	25.793.778	20.269.976	0,00	100,00	50,31	50,31
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs. As.)	4.340.725	9.257.937	6.151.520	0,00	54,00	36,13	66,91
					51	Contrucción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	3.838.743	9.237.587	6.118.520	0,00	58,00	35,93	61,95
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs As.)	501.982	20.350	33.000	0,00	1,00	0,00	0,00
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	4.597.572	22.172.742	15.606.856	6,63	20,00	12,45	62,25
					51	Contrucción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	4.095.591	20.712.732	15.596.846	11,80	30,00	25,02	83,40
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	501.981	1.460.010	10.010	0,00	1,00	0,00	0,00
					10	Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	400.153	697.374	0	0,00	49,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	200.793	500.000	0	0,00	49,00	0,00	0,00
					52	Perforaciones 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	199.360	197.374	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					11	Construccion de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	7.057.525	4.605.747	6,06	79,00	20,87	26,42
					51	Construccion de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	7.057.525	4.605.747	5,96	79,00	20,87	26,42
					12	Contrucción Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					51	Contrucción Planta de Tratamiento de Liquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					13	Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Bialet Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Bialet Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			15	Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	915.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00		
			51	Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	915.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00		
			16	Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	3.011.891	23.833.058	14.707.426	0,00	15,00	9,44	62,93		
			51	Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	1.000.000	10.086.725	3.881.508	0,00	8,00	2,34	29,25		
			52	Optimización de Sistemas de Provisión de agua potable Formosa	2.011.891	13.746.333	10.825.918	0,00	22,00	12,90	58,64		
			17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa (*****)	0	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	0	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
			51	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00		
			19	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	198.793	0	0,00	36,00	0,00	0,00		
			51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	198.793	0	0,00	36,00	0,00	0,00		
			20	Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	34.707	0	0,00	43,00	0,00	0,00		
			51	Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	34.707	0	0,00	43,00	0,00	0,00		
			21	Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	1.152.533	0	0,00	42,00	0,00	0,00		
			51	Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	1.152.533	0	0,00	42,00	0,00	0,00		
			22	Construcción Planta Tratamiento líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	803.287	20.396.848	10.362.708	0,00	40,00	20,56	51,40		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						51 Construcción Planta Tratamiento Líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	401.701	9.828.376	5.018.439	0,00	24,00	20,81	86,71
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	10.566.679	5.344.269	0,00	30,00	15,54	51,80
						53 Cloaca Maxima y Estación de Bombeo Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	14.168.637	7.625.263	0,00	53,00	3,25	6,13
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	14.168.637	7.625.263	0,00	53,00	3,25	6,13
				24		Construcción de Planta Depuradora Norte, Remodelación de Planta Sur y Cañerías Colectoras	600.000	32.964	10.450	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs. As.	300.000	27.964	10.450	0,00	2,00	0,00	0,00
						52 Remodelación de Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Zona Va. Aguirre Tandil Bs. As.	300.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				25		Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	4.556.584	2.348.839	0,00	58,00	38,09	65,67
						51 Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	4.556.584	2.348.839	0,00	58,00	38,09	65,67
				26		Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				27		Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				29		Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	400.000	4.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				30		52 Ampliación Redes Secundarias Estación de Bombeo e impulsión - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	400.000	2.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00
						52 Optimización del Sistema de Desagües de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00
				31		Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				32		Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				33		Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
		1				Actividades Centrales							
				1		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	97.250	94,70	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	97.250	94,70	1,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino Etapa II	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio 25 (IGRM)	1.176.390	1.176.390	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	970.000	272.915	29,45	30,00	1,28	4,27
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	970.000	272.915	29,45	30,00	1,28	4,27
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
			17			Infraestructura en Concesiones Viales							
				1		Aumento de capacidad en Corredores Viales en Pcia. De Bs. As.	4.600.000	12.719.123	5.053.386	0,00	42,63	23,86	55,97
						51 Autovía Cañuelas-Mte. Grande - Sección 4 y 5 - RN N° 3 - Km 87,82 a Km 97,561(Buenos Aires)	4.600.000	12.719.123	5.053.386	0,00	42,63	23,86	55,97
				2		Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs. As. I	1.900.000	1.374.476	1.311.941	34,72	65,28	58,73	89,97
						51 Obra de alteo R.N.3 Km607,5-Km608,5 Cnel. Dorrego-Bs.As.	100.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Intersección RN 3 (650,17) con RN 249 Acc. Punta Alta	1.800.000	1.373.476	1.311.941	37,08	62,72	62,72	100,00
				3		Aumento de Capac. En C.Viales en Pcia. Bs.As. III	5.000.000	12.183.901	3.063.467	0,00	84,99	58,65	69,01
						51 Autovía Mar Del Plata-Balcarce I Tramo - R.226 - Km 20,5 - Km 31,7 (Buenos Aires)	5.000.000	12.183.901	3.063.467	0,00	84,99	58,65	69,01
				4		Aumento de Capac. en C.Viales en Pcia. Bs.As. III	4.000.000	1.000	0	0,00	1,85	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo - R.226 - Km 31,7 - Km 64,0 (Buenos Aires)	4.000.000	1.000	0	0,00	1,85	0,00	0,00
				5		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As II	1.600.000	2.419.509	0	0,00	26,36	0,00	0,00
						51 Mejora en travesía urbana RN 205 Km 66-Cañuelas Bs. As.	1.500.000	2.418.509	0	0,00	21,17	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						52 Mejora intersección e iluminación RN 5-Km260 9 de julio	100.000	1.000	0	0,00	34,93	0,00	0,00
				6		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As III	4.800.000	2.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Mejora intersección RN 7 Km202,16 Chacabuco-Bs. As.	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Mejora en travesía urbana- RN 188 Km 156,80- Junin Bs.As.	2.900.000	1.000	0	0,00	25,86	0,00	0,00
				7		Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección Ruta Nacional Nº 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				8		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. IV	15.714.400	6.749.687	0	0,00	10,16	2,71	26,67
						51 Autopista Lujan-Mercedes Sección I Ruta nacional Nº 5 Km. 66,10 - Km. 73,40 Buenos Aires	6.714.400	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Autopista Luján- Mercedes Sección III-RN 5 Km 85,78-Km 95,65 (Buenos Aires)	9.000.000	6.748.687	0	0,00	10,25	5,42	52,88
				9		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. V	6.500.000	8.003.190	1.182.366	0,00	10,00	5,78	57,80
						51 Tramo Campana-Zarate RN 9 e/Km 72,62-Km 85,19	6.500.000	8.003.190	1.182.366	0,00	10,00	5,78	57,80
				10		Seguridad en C. Viales en Pcia. de Santa Fe I	3.000.000	1.118.000	0	0,00	10,55	0,00	0,00
						52 Mejora en travesía urbana - RN 11 K 787- Reconquista Sta.Fe	3.000.000	1.118.000	0	0,00	10,55	0,00	0,00
				11		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs. As.VI	6.400.000	1.000	0	0,00	4,83	0,00	0,00
						51 Obra de vincul. Ex RN 193-tramo emp. RN 8-emp. RP 39 Exaltación de la Cruz	6.400.000	1.000	0	0,00	4,83	0,00	0,00
				12		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. Córdoba I	6.198.378	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Obra en RNA005-Tramo emp.RN8-emp.RP36-Sec.Km 0-12 Río Cuarto	6.198.378	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				13		Seguridad en C. Viales en Pcia.de Sta.Fe II	4.800.000	2.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en intersecciones RN.33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.900.000	1.000	0	0,00	11,07	0,00	0,00
						52 Adecuación de accesos RN 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.900.000	1.000	0	0,00	9,44	0,00	0,00
				14		Seguridad en Corredores Viales I	0	7.821.398	2.649.907	55,33	44,67	14,93	33,42
						52 Const.pasarelas peat.RNN3Km76,75 Cañuelas(Bs.As)RNN33 Km751	0	58.719	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						53 Rotonda Acceso a Wheelwright (Santa Fe) RNN8 Km 294,60	0	842.439	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						54 Apertura paso nivel de colectora RN226 Km 166,6 Tandil(BsAs)	0	15.985	15.984	100,00	0,00	0,00	100,00
						55 Trav.urbana Río Cuarto(Cba)RN8 Km598,8;A-005 Km0-11,4;RN36	0	21.045	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						56 Const.pasarelas peat.RN9 Km1349,0 B.Paz(Tuc);RN9 Km1459,80 M	0	20.095	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						58 Mejora de colectora Lima-Zarate (Bs.As.) RN9 Km100	0	50.569	48.589	97,36	2,64	2,64	100,00
						59 Mejora intersec.y const.colectoras RN3 Km109-110 S.M.Monte	0	255.957	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						61 Construc.canal desagües pluv.-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	0	10.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						62 Mejora Insters.RN19 Km127,2 inters.RN158 S.Fco.(Cba) RN19 Km	0	309.899	311.141	90,10	6,90	6,90	100,00
						63 Trav.urb.RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerric	0	602.471	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						66 Mejora Acceso a Vedia(Bs.As.) RN7 km312,26 (Bs.As.)	0	926.033	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						67 Mejora acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39(Bs.As.)	0	553.775	303.706	73,95	26,05	26,05	100,00
						68 Mejora acceso canalizado a la Laguna de Lobos RN205 Km111,45	0	36.573	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						69 Rotonda en intersec.RN7 Km423,32 y RN33 Rufino (Sta Fe)	0	712.638	712.638	59,05	40,95	40,95	100,00
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque (Corrientes)	0	182.534	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN9 Km 207,00 (Bs.As.)	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						76 Mejora Intersección de acceso Hersilia (Sta.Fe)RN34 Km369,88	0	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Mejora acceso canalizado RN33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	0	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Mejora inters.acceso a S.Esteban-Los Cocos (Cba) RN38 Km75,3	0	1.000	0	0,00	30,60	0,00	0,00
						80 Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN34 Km 496,08	0	1.309.522	1.257.849	9,16	90,84	90,84	100,00
						81 Adecuación urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes (Salta)	0	971.319	0	0,00	33,05	0,00	0,00
						82 Construcción intersec.canalizada RN12 KM1383,25 Sta Ana-Misi	0	919.825	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	615.518	0	0,00	10,40	0,00	0,00
						51 Iluminación intersec. RN19 Int.RP10 - Río Primero (Cba)	0	615.518	0	0,00	10,40	0,00	0,00
				17		Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	87.829	26.829	95,85	4,15	4,15	100,00
						55 Construcción pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	0	87.829	26.829	92,25	7,75	7,75	100,00
				21		Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia.Bs.As.	0	1.375.092	0	0,00	100,00	22,85	22,85
						51 Construc.pasarela peatonal RN8 Km 78 - Exalt.de la Cruz(Bs.As)	0	369.546	0	0,00	100,00	68,58	68,58
						52 Const. de Colec. RN N3 Km 109/110 - San Miguel del Monte Bs.As.	0	650.606	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Rotonda RN N3 Km 192,34 - Int. RP N30- Las Flores	0	354.940	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Mendoza	0	4.247.086	3.789.423	0,00	100,00	100,00	100,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

CUADRO C							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
						Descripción		Vigente al	Devengado	Acumulado	anual		
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra		Original	30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente	al 30/09/2006	anual
						51 Adecuación Acc. Este e Iluminación RN N7 Km 902,15 La Paz Mendoza	0	1.017.879	894.512	0,00	100,00	100,00	100,00
						52 Int. Canalizada Iluminada - Acc. Oeste RN N7 Km 905 La Paz Mendoza	0	1.432.133	1.129.524	0,00	100,00	100,00	100,00
						53 Int. Canalizada Iluminada RN N7 Km 940,41 La Dormida Mendoza	0	846.171	833.259	0,00	100,00	100,00	100,00
						54 Iluminación Acceso Las Catitas RN N7 Km 954,1 Las Catitas Mendoza	0	950.903	932.128	0,00	100,00	100,00	100,00
				23		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II	6.783.003	1.003	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha RN8 Sec. Km606-619- Tramo Río IV- Holmberg	6.783.003	1.003	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				24		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Salta I	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción multitrocha RN9 Km 1547-1555 Cabeza de Buey-Salta	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				25		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Constr. Multitrocha RN34 km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito	1.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				26		Seguridad en C.viales en Provincia de Tucumán I	3.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de puente RN9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	3.900.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				27		Seguridad en C. Viales en Provincia de Tucumán II	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de acceso RN9 Km 1362 - Trancas - Tucumán	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				28		Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km.1017,84 - Km 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				30		Obras menores en Ccesiones Viales (1)	7.150.000	1.636.750	348.293	0,00	13,72	20,92	152,48
						51 Rotonda en Intersección RN3 Km 448,7-RP75 Gonzalez Chavez - Bs.As.	4.600.000	1.000	0	0,00	4,09	0,00	0,00
						54 Mejora Intersección RN11- Calle Sargento Cabral - San Lorenzo - Santa Fe	1.350.000	1.000	0	0,00	4,97	0,00	0,00
						55 Adecuación de acceso RN34 Km 252,60 - Sunchales - Santa Fe (1)	1.200.000	1.634.750	348.293	0,00	32,42	63,12	194,69
				31		Aumento de Capacidad en C. Viales en Provincia de Misiones I	8.758.350	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
						51 Constr. de terceras trochas RN12 Km 1370-1399 Arroyo San Juan - San Ignacio-Misiones	8.758.350	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
				32		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones II	14.598.000	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1399-1436 San Ignacio-Jardín América	14.598.000	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
				33		Aumento de capacidad en C.Viales en provincia de Misiones III	8.758.350	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
						51 Construcción terceras trochas RN12 km 1442-1470 Jardín América-Puerto Rico	8.758.350	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
				34		Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones IV	13.138.200	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
						51 Construcción terceras trochas RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto.Rico-Montecarlo-El Dorado-Misiones	13.138.200	0	0	0,00	8,42	3,52	41,76
				35		Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	22.199.644	9.295.092	0,00	8,42	3,52	41,76
						51 Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	22.199.644	9.295.092	0,00	8,42	3,52	41,76
				36		Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Buenos Aires VII	8.834.650	8.834.650	7.667.310	12,79	87,21	88,01	100,92
						51 Construcción distribuidor de Bernal-Calle Espora-Quilmes	8.834.650	8.834.650	7.667.310	12,79	87,21	88,01	100,92
				37		Seguridad en C.Viales en Provincia de La Pampa	821.000	2.731.388	810.312	0,00	60,09	32,29	53,74
						51 Readecuación acceso planta urbana RN5 Km 605-606- Santa Rosa	821.000	2.731.388	810.312	0,00	60,09	32,29	53,74
				38		Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Mendoza I	26.012.350	66.838.340	16.039.884	2,23	61,63	38,97	63,23
						51 Doble vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN7 km 965,51-998,80 Mendoza	26.012.350	66.838.340	16.039.884	2,23	61,63	38,97	63,23
				39		Autopista Luján - Mercedes Etapa I, seccion II, Jauregui Pje	0	20.838.738	18.143.082	28,35	71,65	67,49	94,19
						51 Aut. Luján - Mercedes - Etapa I, sección II RN N5 Km 72,42	0	20.838.738	18.143.082	28,35	71,65	67,49	94,19
				40		Aumento de capacidad en C. Viales - Provincia de Santiago del Estero I	4.185.000	4.333.840	3.360.774	0,00	92,75	88,18	95,07
						51 Ensanche de puente sobre Río Dulce RN9 Km 1205 - Termas de Río Hondo	4.185.000	4.333.840	3.360.774	0,00	92,75	88,18	95,07
				48		Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Sta. Fe	0	731.000	272.824	0,00	100,00	24,60	24,60
						51 Construcción pasarela peatonal RN N9 Km 376 Cañada de Gomez	0	1.000	0	0,00	100,00	49,20	49,20
						52 Contrucción pasarela RN N33 km 713 Chabas Sta. Fe	0	730.000	272.824	0,00	100,00	0,00	0,00
				63		Iluminación Int. RN N9 Km 227,03 con RN N 188 - San Nicolas	0	992.019	118.942	0,00	100,00	100,00	100,00
						51 Iluminación Int. Rn N9 Km 227,03 con RN188 - San Nicolas	0	992.019	118.942	0,00	100,00	100,00	100,00
				65		Construcción destacamentos policiales	1.000.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción destacamentos policiales	1.000.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				66		Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				67		Seguridad en Corredores Viales - Tucuman III (*****)	0	2.205.616	0	0,00	69,97	21,96	31,38

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						51 Pavimentacion colectora, constr. e ilum. pasarelas RN9-Tucuman	0	2.205.616	0	0,00	69,97	21,96	31,38
					68	Iluminacion Autopista Rosario-Armstrong-Santa Fe (*****)	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Ilum.Distrib.Funes-Aut.Rosario-Armstrong inters.RPN34s-Funes	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					69	Construccion en R.N. N 188 y R.N. N 33-Santa Fe (*****)	0	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Intersecc. canalizada para giro de cam.RN 33Km 711-Chabas	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						52 Interseccion canalizada p/giro de camiones RN 33 Km711 Chaba	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					70	Construc. Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco (*****)	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construc. Pasarela Peatonal RN11Km.1005,70 Barrio Toba Resis	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					71	Construccion en Autopista Richieri (*****)	0	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Rama de salida Km.21 Autopista Richieri-Buenos Aires	0	1.000	0	1,00	1,00	0,00	0,00
18						Infraestructura en Areas Urbanas							
					1	Obras menores en áreas urbanas	847.800	2.000	0	0,00	39,71	0,00	0,00
						53 Rotonda en inters. RNA-015 y Av. Mons. Roch-Concordia- Entre Ríos	722.800	1.000	0	0,00	39,71	0,00	0,00
						54 Iluminación en intersec. RN14 y RNA-015- Concordia - Entre Ríos	125.000	1.000	0	0,00	39,71	0,00	0,00
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II	0	2.783.965	2.312.387	0,00	86,71	86,71	100,00
						51 Repavimentación de la RP N42 seccion RP 51 Acceso a Rawson	0	2.783.965	2.312.387	0,00	86,71	86,71	100,00
					3	Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	1.000	0	0,00	5,15	0,00	0,00
						51 Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	1.000	0	0,00	5,15	0,00	0,00
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.042.300	5.266.683	3.750.698	0,00	65,00	68,71	105,71
						51 Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	4.042.300	5.266.683	3.750.698	0,00	100,00	87,39	87,39
						52 Pavimentación 70 cuadras Santa Rosa - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					5	Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	14.670.908	0	0,00	2,59	5,88	227,03
						51 Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	14.670.908	0	0,00	2,59	5,88	227,03
					6	Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	1.000	0	0,00	39,59	0,00	0,00
						51 Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	1.000	0	0,00	39,59	0,00	0,00
					7	Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	1.782.885	0	0,00	12,27	0,00	0,00
						51 Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	1.782.885	0	0,00	12,27	0,00	0,00
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.600.000	1.001.000	0	0,00	6,47	0,00	0,00
						51 Mejoras en accesos Sur - RN14 Km 252,60 - Concordia -Entre Ríos	3.600.000	1.001.000	0	0,00	6,47	0,00	0,00
					10	Obra Basica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00
						51 Obra Basica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					11	Obras Menores en Areas Urbanas (*****)	0	719.437	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Pavimentación tramos urbanos RN Nº9 Km 100,49 Lima (Bs.As.)	0	719.437	0	0,00	s/i	s/i	
					12	Seguridad en Areas No Concesionadas (*****)	0	424.182	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Repavimentación y desagües - Magdalena (Buenos Aires)	0	424.182	0	0,00	s/i	s/i	
					13	Repavimentación e Iluminación-Camino al Centro Atómico Ezeiza (*****)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Repavimentación e iluminación-Camino al Centro Atómico Ezeiza	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
19						Obras Mejorativas en Corredores Viales Nacionales							
					1	Corredor Vial 2	13.400.000	12.067.437	664.970	0,00	50,00	11,40	22,80
						51 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 98 - 107	1.200.000	4.367.437	0	0,00	50,00	11,96	23,92
						52 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 143 - 150	1.200.000	2.400.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 208 - 221	1.200.000	3.500.000	664.970	0,00	50,00	59,79	119,58
						54 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 259 - 276	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 399 - 406	1.800.000	1.800.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						56 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 457 - 492	3.000.000	0	0	0,00	50,00	4,66	9,32
						57 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 424 - 457	2.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Corredor Vial 3	8.000.000	3.700.000	0	0,00	11,19	0,00	0,00
						51 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 106 - 206	4.000.000	1.800.000	0	0,00	11,19	0,00	0,00
						52 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 96 - 106	4.000.000	1.900.000	0	0,00	11,19	0,00	0,00
					3	Corredor Vial 4	8.300.000	2.700.000	0	0,00	10,01	0,00	0,00
						51 Corredor Vial 4 - Ruta 8 Km 661 - 695	3.800.000	1.500.000	0	0,00	8,70	0,00	0,00
						52 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 586 - 616	2.000.000	1.200.000	0	0,00	11,57	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						53 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 673 - 675	2.500.000	0	0	0,00	11,57	0,00	0,00
					5	Corredor Vial 5	17.685.000	15.349.310	1.127.558	0,00	25,33	9,61	37,94
						51 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1215 - 1225	2.500.000	8.649.310	1.127.558	0,00	29,40	57,72	196,33
						52 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1315 - 1326	2.500.000	2.000.000	0	0,00	29,40	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 596 - 626	2.500.000	1.900.000	0	0,00	15,51	0,00	0,00
						54 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 584 - 596 Km 626 - 696	2.500.000	2.800.000	0	0,00	15,51	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 1164 - 1177	3.000.000	0	0	0,00	37,86	0,00	0,00
						56 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 66 - 86	4.685.000	0	0	0,00	24,35	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS							
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos							
					5	Reacondicionamiento de plataformas, pistas y calles de rodaje en Aeropuertos - Etapa 2	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Nivelación y puesta en norma las franjas de seguridad del Aeropuerto de Villa Gesell	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reacondicionamiento de Plataformas pistas y calles en Aeropuerto - Etapa 2	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00
75						51 Bacheo, Reparación de estado superficial de pista, calle de rodaje en Aeropuerto de Tandil	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
					350	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
					1	Actividades Centrales							
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (*****)	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	1.200.000	1.200.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
80						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Ministerio de Salud y Ambiente							
					310	MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE							
					1	Actividades Centrales							
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
902						52 Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL							
					1	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción							
					1	Refuncionalización Comedor	700.000	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Comedor	700.000	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
903						51 Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
						Atención a Enfermos							
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.270.000	345.536	17.736	32,05	67,95	0,00	0,00
					0	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	20.520	17.736				
						53 Remodelación del Pabellón Nº4	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Refacción Integral de Pabellones Nº 3,5 y 8	750.000	325.016	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	480.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	0	0				
						51 Cloacas en Barrios	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Reparación de Usina	0	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					9	Readecuación del Lavadero	0	273.960	228.960	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Readecuación del Lavadero	0	273.960	228.960	0,00	100,00	0,00	0,00
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	1.500.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	1.500.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					11	Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilización (*****)	0	849.984	517.236	0,00	s/i	30,00	
						51 Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilización	0	849.984	517.236	0,00	s/i	30,00	
					12	Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha (*****)	0	348.435	348.200	0,00	s/i	0,00	
						51 Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha	0	348.435	348.200	0,00	s/i	0,00	
					13	Construcción de Quirófano (*****)	0	650.000	0	0,00	s/i	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 30/09/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	al 30/09/2006	Ejec./Progr.
								30/09/2006	al 30/09/06	al 31/12/2005	vigente		anual
						51 Construcción de Quirófano	0	650.000	0	0,00	s/i	0,00	
	906					ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN (ANLIS)							
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
				2		Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoria Interna (*****)	0	63.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoria Interna	0	63.000	0	0,00	s/i	s/i	
				1		Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos	622.400	257.020	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					59	Remodelación del Bioterio Central	350.400	1	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	272.000	257.019	0	0,00	70,00	0,00	0,00
				2		Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos - Etapa II	285.600	412.005	51.980	0,00	100,00	s/i	
					51	Remodelación de Central de Esterilización, Descontaminación y Elaboración de Medios de Cultivo	183.600	331.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Remodelación del Serpentario	102.000	29.025	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Remodelación del Bioterio de Rabia y Sueros (*****)	0	42.000	42.000	0,00	100,00	100,00	100,00
					55	Remodelación del Area de Procesos (*****)	0	9.980	9.980	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Invest, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virales							
				1		Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	207.919	0	9,83	65,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	203.094	0	39,83	35,00	0,00	0,00
					62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	4.825	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				5		Control de Calidad de Biológicos							
				2		Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	63.500	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	63.500	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				8		Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
				1		Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	s/i	
					51	Reparación y Pintura. Constr. Acceso para personas discapacitadas	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	s/i	
				2		Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II (*****)	0	290.723	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II	0	290.723	0	0,00	s/i	s/i	
				9		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.							
				1		Refuncionalización del Edificio	61.458	61.458	0	0,00	80,00	s/i	
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	61.458	61.458	0	0,00	80,00	s/i	
	910					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR							
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos							
				1		Contrucción Natatorio	500.000	689.408	53.548	5,00	41,66	17,06	40,95
					51	Construcción Natatorio	500.000	689.408	53.548	5,00	41,66	17,06	40,95
				7		Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000	102.570	35.304	0,00	100,00	67,16	67,16
					51	Construcción de Rampa de Emergencia	40.000	52.570	35.304	0,00	100,00	67,16	67,16
					52	Instalación Generador Eléctrico	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Se realizó un anticipo financiero, las obras se iniciaron a fines de septiembre de 2006.

(****) Este proyecto lo ejecuta la Dirección de Arquitectura dentro del proyecto Monumentos Históricos.

(*****) Los proyectos se realizan por transferencias.

(*****) Obra terminada, se estan pagando certificaciones atrasadas.

(*****) Proyectos iniciados en el 2º trimestre.

(*****) Proyectos iniciados en el 3º trimestre.

(*****) Proyecto y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

(*****) Los créditos del programa 18 fueron transferidos del Ministerio de Infraestructura durante el 3º trim. No se prevee ejecución para el ejercicio 2006.

(1) No reprogramaron

s/i Sin información

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
						MANTENIMIENTO														
						Mantenimiento por Administración														
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		44.818	01/12/2005	30/11/2006	10.323.000	50.318.149	46.233.961	25,0%	66,7%	66,7%	6	B
16	1	2	51	PAIS	VS	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		88	01/12/2005	30/11/2006	3.088.000	88.000	0	23,9%	63,6%	63,6%	6	B
						Total Mantenimiento por Administración				44.906			13.411.000	50.406.149	46.233.961	25,0%	66,7%	66,7%		
						Mantenimiento por Contrato														
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Moza-Lte.c/S.Juan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	15.251	22/08/1995	31/12/2006	584.000	1.302.248	1.302.246	2,8%	8,5%	73,4%	6	
16	2	8	51	CHACO	16	Emp Rta.95-Emp Rta.9/34		11	348,8	1.500	15/09/1995	31/07/2002	0	77.867	77.864	0,0%	0,0%	100,0%	8	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 - Emp. R11 - V.Gral Guemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488	11	403,4	3.616	29/04/1997	31/07/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
						Total Mantenimiento por Contrato				20.367			684.000	1.380.116	1.380.110	2,1%	6,3%	72,7%		
						Mantenimiento por Convenio con Provincias														
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 10	Varias	11	633,3	8.571	01/01/2006	31/12/2007	416.000	1.526.813	1.193.544	10,1%	14,3%	14,3%	6	A
16	3	25	51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 10	Varias	11	619,7	7.489	01/01/2006	31/12/2007	397.000	990.120	663.836	16,6%	23,0%	23,0%	6	F
16	3	26	51	RIO NEGRO	22 - 40 - 234	TFO Río Negro - Convenio 10	Varias	11	1.136,5	8.482	01/01/2006	31/12/2007	152.000	1.023.629	1.023.627	13,5%	34,9%	34,9%	6	H
16	3	27		SANTA CRUZ	293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)	Tramos Varios	11	1.714,9	22.829	01/01/2006	31/12/2006	2.768.000	20.733.747	20.733.733	21,4%	82,3%	82,3%	6	A
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-m-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 9	Varias	11	520,5	10.191	01/01/2006	30/12/2007	100.000	654.001	572.162	15,1%	23,9%	23,9%	6	A
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy - Convenio 10	KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98	11	322,8	3.495	01/01/2006	31/12/2007	20.000	297.509	215.263	12,9%	31,0%	31,0%	6	A
16	3	31	51	SALTA	40N-51-86	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	530,9	2.868	01/01/2003	31/12/2003	613.000	1.553.795	1.553.793	0,0%	0,0%	38,8%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO Formosa - Convenio 8	Tramos Varios	11	416,0	4.907	01/01/2006	30/11/2007	178.000	324.714	324.711	8,6%	22,4%	22,4%	6	A
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Flin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01/09/2004	31/09/2006	224.000	1.211.222	344.539	4,5%	28,4%	94,1%	6	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	4.895	01/04/2004	31/03/2006	511.000	1.380.851	1.380.848	0,0%	18,9%	56,6%	7	E
16	3	36	51	CHUBUT	40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01/01/2004	31/12/2006	50.000	697.758	697.756	21,1%	59,6%	78,9%	6	A-I
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01/12/2004	30/11/2006	50.000	826.431	826.429	15,5%	41,3%	84,4%	6	A
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 2	Tramos Varios	11	163,4	1.864	01/01/2000	31/12/2007	808.000	624.089	443.006	10,0%	26,4%	26,4%	6	A
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 6	Varias	11	67,4	2.558	01/01/2006	30/12/2006	100.000	404.346	404.344	9,7%	25,8%	25,8%	6	A-D
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8:Belen- Lte.c/Tucuman	Km. 798,82- km 986,82	11	188,0	2.632	01/11/2006	31/10/2007	538.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO - Convenio2° Emp. RP N°20 - Emp. RP N°17	Km1056,32 - Km1116,96	11	60,6	850	01/11/2006	31/10/2007	850.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
16	3			SANTA CRUZ	293	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	11	1.840,5	21.272	01/01/2005	31/12/2005				0,0%	3,7%	99,6%	7	
16	3		51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 1	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01/01/2004	31/12/2005				0,0%	7,4%	94,5%	7	
16	3		51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01/01/2004	30/12/2005				0,0%	22,7%	100,0%	7	
16	3		51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	5.707	01/01/2004	31/12/2005				0,0%	6,2%	100,0%	7	
16	3		51	NEUQUEN	22-40S-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	4.349	01/01/2004	31/12/2005				0,0%	1,0%	92,8%	7	
16	3		51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	5.257	01/01/2004	31/12/2005				0,0%	2,0%	100,0%	7	
16	3		51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01/01/2004	30/12/2005				0,0%	2,2%	72,1%	7	E
16	3		51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	43,5	1.888	01/01/2004	30/12/2005				0,0%	13,5%	59,3%	7	E
						Total Mantenimiento por Convenio				142.400			7.775.000	32.249.027	30.377.591	9,1%	27,4%	63,0%		
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		9.525	01/12/2005	30/11/2006	1.022.000	11.668.505	11.668.502	25,0%	66,6%	66,6%	6	B
						Obras de Emergencia														
16	5	1	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		12.373	01/12/2005	30/11/2006	8.250.000	15.530.841	15.530.841	25,0%	66,7%	66,7%	6	B
16	5	2	51	PAIS	VS	Obras en Puentes	Nacional	14		5.174	01/01/2006	31/12/2006	1.635.000	11.137.106	8.418.964	25,0%	66,6%	66,6%	6	B
16	5	3	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		741	01/12/2005	30/11/2006	358.000	741.304	741.302	25,1%	66,9%	66,9%	6	B
16	5	4	51	PAIS	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		21.377	01/12/2005	30/11/2006	73.000	22.038.445	21.831.043	25,0%	66,7%	66,7%	6	B
						Total Obras de Emergencia				39.665			10.316.000	49.447.696	46.522.150	25,0%	66,7%	66,7%		
						Mantenimiento por Sistema Modular														
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile		11	254,2	2.729	19/07/2004	18/07/2006	449.000	982.428	805.609	0,2%	33,1%	100,0%	7	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.989	03/12/2004	02/12/2006	678.000	3.240.114	3.151.668	11,7%	43,1%	67,0%	6	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	9.090	03/05/2004	31/01/2007	288.000	2.036.200	1.357.998	2,6%	21,8%	77,8%	6	A
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	6.264	07/09/2004	06/09/2006	460.000	3.150.112	2.254.821	2,7%	35,7%	81,2%	6	A
16	6	6		CHUBUT	40-260	Emp RPN°20-Emp.RNN°40S/Emp.RPN°56-Emp.RPN°22/Emp.RNN°40S-		11	147,1	4.647	01/11/2006	31/10/2008	951.000	51.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	4	
16	6	7	51	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40S - Limite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	2.958	01/11/2006	31/10/2008	605.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	G.Andre -Emp.RNN°20/Mdza-Lte S.Juan/ S.Martin - Mdza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	194,7	7.260	01/11/2005	31/05/2007	266.000	666.309	0	0,0%	0,0%	0,0%	15	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	9.279	17/03/2005	31/05/2007	332.000	2.219.863	1.644.087	4,0%	22,8%	55,5%	6	A
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B.Parera -A Nivel RNN° 11 -A Nivel RNN° 11- J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.901	21/07/2005	31/05/2007	678.000	2.334.452	2.334.452	9,2%	36,2%	52,9%	6	A
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nac. 9 y 34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	9.048	14/07/2004	13/10/2006	921.000	1.689.774	1.034.323	4,8%	19,7%	54,4%	6	A
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50- Lte con Bolivia / P.de Pato- Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	259,0	6.592	15/04/2004	31/10/2006	100.000	1.456.168	1.250.591	10,8%	35,3%	75,9%	6	
16	6	13	51	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios		11	26,9	1.611	01/11/2006	31/10/2008	900.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
16	6	14	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	2.700	01/11/2006	31/10/2008	266.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vlg. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01/11/2006	31/10/2009	6.000.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	96.000	01/11/2006	30/09/2009	20.123.000	2.831.010	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	28.000	01/11/2006	28/02/2008	5.458.000	2.658.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	7.898	01/11/2006	28/02/2009	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	42	51	SANTA CRUZ	40S	Lte con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01/11/2006	30/11/2010	1.431.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		5	70,0	24.180	01/11/2006	30/11/2008	164.000	164.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	12.705	04/01/2005	04/10/2006	2.067.000	9.889.896	5.510.846	9,3%	49,6%	91,0%	6		
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	68.244	01/11/2006	30/11/2010	7.837.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	01/11/2006	30/11/2009	400.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16/12/2002	12/05/2005	1.166.000	100	0	0,0%	0,0%	97,7%	7		
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	33.633	12/05/2003	30/09/2005			0	0,0%	0,0%	99,1%	7		
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	57.152	01/11/2006	30/11/2008	164.000	64.001		0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	60.340	16/11/2005	31/05/2008	17.762.000	68.177.427	9.208.652	7,9%	19,2%	20,7%	6		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elia)	8	27,7	90.740	01/11/2006	30/05/2009	8.940.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	53	ENTRE RIOS		Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,7	145.000	01/11/2006	31/10/2008	39.640.000	989	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,5	145.000	01/11/2006	31/10/2008	38.206.000	8.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8		145.000	01/11/2006	31/10/2008	7.350.000	10.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	145.000	01/11/2006	31/10/2008	23.747.000	18.200	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayui Grande	8	32,7	183.759	01/11/2006	30/11/2008	8.139.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Ayui Grande - A°Mandisoví Grande	8	34,7	145.000	01/11/2006	31/10/2008	5.932.000	3.182.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	36,0	145.000	01/11/2006	31/10/2008	5.407.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	145.000	01/11/2006	31/10/2008	6.033.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,2	145.000	01/11/2006	31/10/2008	5.247.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	145.000	01/11/2006	31/10/2008	7.116.000	15	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	145.000	01/11/2006	31/10/2008	6.679.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	8,0	145.000	01/11/2006	31/10/2008	5.468.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeduaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°117 - Av.Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	24.000	01/11/2006	31/10/2007	1.668.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	66	CORRIENTES		Gualeduaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	8.325	01/11/2006	31/08/2007	1.842.000	94.930	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01/11/2006	31/10/2008	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
						Total Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración				2.758.251			310.356.000	115.710.549	30.126.149	0,6%	1,4%	4,2%			
						Obras por Convenio con Provincias															
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14		4.322	01/12/2005	30/11/2006	1.022.000	4.528.545	4.513.808	25,0%	66,6%	66,6%	6	B	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A°Vinchina-A Jague y B°Acc a Alto Jague	8	39,0	45.599	04/06/1999	31/03/2007	2.657.000	2.305.861	2.305.860	1,6%	8,0%	34,3%	6	A	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras	Sección I: Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	61.883	17/05/1999	28/02/2008	100.000	925.474	0	0,0%	0,0%	0,0%	14		
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras	Sección II: Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	75.051	17/05/1999	28/02/2008	100.000	6.425.854	5.500.381	8,3%	8,3%	24,4%	6		
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras	Sección III: Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	46.571	05/07/1999	31/12/2006	398.000	2.746.565	1.821.091	0,0%	0,0%	18,7%	6	J	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10/05/1999	28/02/2007	500.000	59.100	59.098	0,0%	0,0%	0,0%	14		
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chileito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15/09/1999	30/11/2007	10.156.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	14		
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	30.186	01/07/1999	31/10/2006	972.000	9.141.804	8.685.388	17,5%	39,9%	92,7%	6		
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	27.669	03/05/1999	31/12/2006	512.000	12.120.051	12.119.759	9,0%	58,1%	90,4%	6		
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua - I - Deseado	8	45,0	32.610	01/05/1992	31/12/2006	861.000	386.463	386.461	0,0%	0,0%	88,2%	6	C	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15/06/1999	28/02/2007	905.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	14		
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	28.524	19/02/2001	31/10/2005	100.000	800.000	445.932	0,0%	0,0%	99,2%	7		
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20/09/1993	31/12/2006	431.000	5.006.000	4.501.968	0,0%	0,0%	99,2%	6	C	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Rio Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	208.395	08/09/2000	31/10/2005	24.000	24.000	0	0,0%	0,0%	97,1%	7		
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (O. F.)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	4.309	07/07/1999	28/02/2007	536.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	14		
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía		8	6,4	98.654	01/09/2005	30/06/2009	2.044.000	28.578.678	28.578.640	20,1%	37,5%	48,1%	6	A	
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Rio Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	11.729	13/10/2004	08/04/2006	381.000	4.439.162	4.421.928	0,0%	37,0%	98,2%	7		
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : B.Blancas - Acc. Cajón Grande	8	22,9	13.939	20/11/2000	31/05/2006	100.000	4.063.710	3.895.383	0,0%	11,4%	94,3%	7	A	
22	3	22	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Lte. C/Salta		8	74,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	6.564.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Tr. 3 - Acc A Pque Industrial	8	11,0	60.000	25/02/1997	31/08/2000		0	140.383	113.520	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	3	24	51	CHACO	16	Pte.R. Saenz Peña - Lte. C/Sigo del Estero		8	0,1	45.000	01/11/2006	31/10/2008	19.088.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	84.500	01/11/2006	31/10/2008	8.546.000	16.899.268	16.899.267	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	48.544	25/08/2006	24/11/2007	2.044.000	1	0	3,2%	3,2%	3,2%	6		
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Autopista Rosario-Córdoba - Emp. Av. Belgrano	km 10,125 - km 29,395 (Av.Belgrano)	5	19,3	37.564	01/11/2006	31/10/2008	9.683.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	0		
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	61.369	24/09/2001	31/12/2006	2.453.000	19.780.000	18.911.293	0,0%	0,0%	67,3%	6	S/D	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.036	04/10/2004	28/02/2006	258.000	6.372.063	6.372.061	0,0%	23,5%	100,0%	8		
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19/08/2003	30/04/2007	4.420.000	15.459.976	12.967.190	0,0%	0,0%	41,6%	6	S/D	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	23.611	01/12/2004	31/10/2006	7.750.000	28.560.309	21.197.681	15,1%	41,3%	65,1%	6		
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	11	29,0	29.154	23/03/2006	21/09/2007	2.453.000	2.453.000	4.163.633	11,2%	18,3%	18,3%	6</		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vig. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Aduana - Limite con Chile		8	7,0	5.500	01/11/2006	31/01/2008	500.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
						Total Obras por Convenio con Provincias				1.523.423			88.885.000	172.216.473	164.501.335	3,5%	8,3%	41,3%		
						Mejoramiento y Reposición de Rutas														
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		3.833	01/12/2005	30/11/2006	613.000	3.832.625	3.699.888	25,0%	66,6%	66,6%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	3.845	01/11/1996	28/02/2002	1.209.000	100	0	0,0%	0,0%	100,0%	10	
22	4	2	52		40	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y IIb	8	51,1	42.668	01/11/2006	31/08/2008			0	0,0%	0,0%	0,0%	3	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	18.234	14/10/1999	30/12/2006	96.000	96.000	0	12,6%	16,5%	79,3%	6	A
22	4	4	51	LA RIOJA	40	Lte. C/San Juan - Villa Unión	Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes)	8	58,1	5.728	22/10/1999	31/07/2001	0	120.254	0	0,0%	0,0%	97,2%	7	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	6.000	01/09/2006	31/05/2009	1.000.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	4	
22	4	7	51	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	5.000	01/11/2006	31/05/2009	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	8	51	SALTA	34	Emp. R.N. N° 81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	1.281	14/11/1995	01/07/1997	0	63.362	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	3.045	22/10/1996	03/12/2004	272.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	16.289	01/02/1999	31/01/2005	732.000	2.672.540	1.872.540	0,0%	0,0%	97,7%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	41.899	16/05/2005	31/10/2006	1.600.000	79.137.263	12.860.810	15,3%	39,3%	71,0%	6	A
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86	13	8,7	124.377	30/09/2005	29/09/2007	1.300.000	1.300.000	58.072.150	9,6%	31,2%	36,4%	6	A
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	62.019	09/09/2005	30/11/2007	185.000	185.000	9.689.303	21,6%	45,4%	58,7%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	25.720	12/04/2005	30/08/2009	6.436.000	3.892.600	3.892.597	9,4%	22,4%	38,1%	6	A
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	56.000	01/11/2006	30/11/2009	1.533.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	8	41,6	106.000	01/11/2006	30/11/2009	470.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	23.681	01/10/2003	31/07/2005	613.000	281.730	281.728	0,0%	0,0%	96,2%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/R. Las Vueltas - Va.Tur.El Chaltén; Acc.Bahia Túnel		5	23,2	1.738	17/12/2003	28/02/2005	1.661.000	100	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	10/11/2003	31/01/2006	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	24/09/2003	24/04/2006	1.022.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	7	
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	---	---	844.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	12	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	8	18,9	40.100	01/11/2006	30/11/2010	7.212.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38	8	20,0	79.260	15/10/2004	14/10/2006	6.051.000	17.757.851	14.465.528	8,6%	26,8%	77,9%	6	A
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	0,5	18.444	01/11/2006	30/05/2008	10.412.000	4.052.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno		8	88,0	48.400	01/11/2006	30/11/2009	818.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conex.Vial R.N.38 y 75 Circunv.de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	32.622	01/11/2003	31/05/2007	324.000	9.445.195	9.444.877	15,1%	45,9%	86,5%	6	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	7.038	08/09/2003	08/10/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	13.072	14/05/2004	30/12/2005	427.000	427.000	342.881	0,0%	1,6%	93,5%	7	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	261.857	01/02/2001	31/12/2006	6.987.000	27.077.755	20.975.267	0,6%	8,7%	77,6%	6	A
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Cámpaña - La Plata		8	187,0	481.838	18/05/2003	31/12/2006	100.000	58.154.328	51.281.432	1,9%	12,3%	60,2%	6	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127		5	11,3	7.693	09/09/2003	08/09/2004	262.000	111.515	111.513	0,0%	0,0%	99,3%	7	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acc.a Cdad de Sta Fe - Acceso al Tunel Subfluvial		5	11,0	10.479	18/03/2004	31/07/2006	611.000	1.212.905	256.246	13,1%	16,2%	95,3%	7	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Secciones I y II	8	25,9	42.735	08/10/2004	08/04/2007	21.334.000	10.657.808	553.976	0,0%	0,3%	24,4%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	32.000	01/11/2006	30/11/2009	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	52	51	SAN JUAN	PS10	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	13.954	20/01/2004	20/07/2006	380.000	2.483.783	2.483.782	3,9%	7,9%	98,3%	7	A
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	1.291	08/10/2004	31/07/2005	304.000	111.278	111.276	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	20.572	02/09/2005	03/01/2007	613.000	5.727.759	5.727.754	25,9%	54,1%	64,8%	6	A
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Limite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	4.717	03/06/2003	30/04/2004	200.000	100.000	0	0,0%	0,0%	95,4%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15/10/2003	15/12/2004	256.000	55.332	55.329	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	2.782	01/11/2006	30/04/2009	782.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648	8	1,0	3.979	01/11/2006	30/01/2007	979.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapla I y Etapla II	8	7,4	24.328	19/02/2004	31/10/2006	6.408.000	5.349.850	4.474.339	4,6%	20,5%	46,6%	6	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conex. Vial Sudoeste Camino Secund. 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	57.834	18/11/2003	30/11/2006	531.000	11.619.167	11.619.166	6,3%	23,7%	89,1%	6	C
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conex. Vial Sudoeste Camino Secund. 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	33.318	18/11/2003	31/10/2006	500.000	6.358.387	3.963.245	21,8%	30,7%	92,8%	6	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Sdor Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	3.497	20/07/2004	31/10/2005	100.000	198.740	0	0,0%	0,0%	92,2%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.541	01/01/2003	30/11/2003	847.000	100	0	0,0%	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	22.382	14/10/2004	31/10/2006	7.450.000	2.150.000	58.466.626	14,2%	28,1%	85,1%	6	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	36.151	14/10/2004	28/02/2006	10.343.000	143.000	0	0,0%	4,5%	93,5%	7	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	36.927	14/10/2004	30/12/2006	9.508.000	3.508.000	0	22,6%	41,9%	74,3%	6	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	38.556	13/10/2004	12/10/2006	10.372.000	9.272.000	0	13,8%	30,2%	66,5%	6	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	45,0	48.414	13/10/2004	13/10/2006	13.104.000	13.104.000	0	7,8%	18,9%	49,9%	6	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	31,5	14.374	13/10/2004	31/05/2008	11.195.000	8.195.000	0	0,0%	12,7%	100,0%	14	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	9.950	13/10/2004	31/03/2006	10.619.000	7.719.000	0	0,0%	5,1%	100,0%	8	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	28.323	15/07/2005	30/11/2008	11.414.000	11.414.000	0	16,7%	30,4%	38,8%	6	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	22.045	07/06/2005	30/11/2008	10.542.000	8.542.000	0	22,3%	31,4%	52,5%	6	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	8	31,1	25.902	12/07/2005	30/11/2008	10.564.000	10.564.000	0	22,8%	31,7%	44,9%	6	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	12.888	01/04/2006	30/03/2007	3.377.000	3.377.000	0	63,7%	73,8%	73,8%	6	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	19.286	15/04/2006	30/04/2007	6.210.000</							

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/09/06 (en \$)	Devengado 30/09/06 (en \$)	Avance 3° Trim.	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	39.171	22/10/2004	31/10/2006	2.546.000	14.726.874	12.726.874	0,1%	37,4%	95,4%	6	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8	8,0	9.402	29/05/2003	31/12/2004	199.000	100.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	43.296	28/10/2003	30/12/2006	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	56,3%	6	S/D
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12/11/2003	12/11/2006	8.232.000	20.791.354	18.722.278	1,0%	21,8%	77,8%	6	A
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	16/02/2004	16/02/2007	4.452.000	14.530.274	12.155.608	0,4%	18,2%	90,7%	6	A
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	64.201	27/05/2004	31/10/2006	7.441.000	32.871.967	22.871.966	1,7%	31,6%	97,8%	6	A-C
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	49.910	27/05/2004	27/12/2006	5.125.000	25.776.658	21.176.657	0,7%	44,5%	91,4%	6	A
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	32.190	22/11/2003	30/12/2006	444.000	1.343.519	343.518	0,0%	85,1%	6	S/D	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	37.081	07/02/2003	30/06/2005	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapí Aike - Cancha Carrera		8	40,3	66.317	27/10/2000	31/12/2004	1.629.000	1.000.001	0	0,0%	0,0%	80,4%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio		8	25,0	28.335	02/05/2000	31/12/2005	100.000	1	0	0,0%	0,0%	96,1%	7	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21.252 - km 28.740	8	7,5	19.050	22/08/2001	30/12/2005	291.000	1.398.820	898.819	0,0%	0,1%	100,0%	7	A
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8	24,0	17.400	01/11/2006	31/10/2008	2.968.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	72.109	01/02/2006	01/02/2007	9.455.000	23.435.936	15.147.990	19,5%	40,5%	40,5%	6	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Itb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	288.460	17/04/2006	17/04/2008	57.034.000	275.968.421	275.968.417	9,6%	16,0%	16,0%	6	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	361.816	16/05/2006	16/04/2008				4,6%	4,6%	4,6%	6	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	45.600	01/11/2006	30/11/2009	8.697.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco		8	58,4	58.380	01/11/2006	30/11/2009	981.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. RN. 81 - Lte. c/Chaco	Prog. Km. 29.800 - EMP. R.N. R.P. N° 81	13	25,0	83.905	09/05/2006	07/05/2008				10,9%	11,2%	11,2%	6	A
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN° 34		8	31,0	30.000	01/11/2006	30/11/2010	250.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,67	5	46,1	51.896	21/02/2006	30/05/2010	2.657.000	2.999.271	2.999.270	9,5%	12,8%	12,8%	6	
22	4	87	51	MENDOZA	40S	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - km 393 - Km 445	8	18,0	31.325	01/11/2006	31/10/2008	164.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (S III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	18,0	37.990	01/11/2006	31/10/2008	164.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	121.550	01/11/2006	30/11/2010	818.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01/11/2006	30/04/2009	400.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17/09/2001	30/06/2005	50.000	1	0	0,0%	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ Cdad Rafaela - Cr.Urb.por Cdad Rafaela	Km 217 - Km 225	5	8,0	40.629	03/08/2005	30/11/2008	3.421.000	5.121.000	4.281.478	14,5%	25,0%	28,4%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	70.400	01/11/2006	30/11/2010	818.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena	8	305,0	68.499	01/09/2005	30/12/2006	6.746.000	94.899.608	94.899.581	0,0%	4,8%	15,6%	6	S/D
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	105.288	01/09/2005	31/03/2007				1,8%	22,8%	30,8%	6	A
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	112.207	27/12/2005	27/12/2007				18,1%	38,4%	38,4%	6	A
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	98.000	01/11/2006	31/10/2009	1.044.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olmie- Km. 2189,52 - Km. 2215,91	8	26,4	47.000	01/11/2006	31/10/2008	100.000	255.276	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas - Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	73,7	101.000	01/11/2006	31/10/2008	200.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. s/Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	49.000	01/11/2006	31/10/2008	100.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - Sobre RPN° 25	8	66,5	90.000	01/11/2006	31/10/2008	200.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	8	57,0	70.000	01/11/2006	31/10/2008	200.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -Km 2	8	116,8	172.000	01/11/2006	31/10/2009	222.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		8	350,0	69.000	01/11/2006	31/10/2008	1.635.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	13,2	31.650	19/01/2006	30/11/2007	1.738.000	18.920.062	18.920.052	0,4%	45,5%	45,5%	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	60.389	01/11/2006	31/05/2010	1.044.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas				5.272.696			343.560.000	896.532.806	793.497.922	4,5%	12,4%	36,6%		
						Obras por Concesión sin Peaje COT														
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	13	297,3	170.700	01/06/1998	30/11/2008	2.558.000	27.682.228	27.682.222	1,9%	6,5%	52,5%	6	A
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	128.611	02/02/1998	30/11/2008	2.350.000	27.795.087	27.795.078	3,0%	9,1%	72,9%	6	
						Total Obras por Concesión sin Peaje COT				299.311			4.908.000	55.477.315	55.477.300	2,4%	7,6%	61,3%		
						Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes														
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	0,01	3.300	01/11/2006	31/10/2008	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batellito)	Prog. 735,68	8	0,03	900	01/11/2006	30/04/2007	200.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	0,15	5.000	01/11/2006	30/11/2008	480.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	0,20	6.344	23/08/2002	31/10/2004	230.000	98.269	98.267	0,0%	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	0,20	8.112	29/01/2003	31/10/2004	192.000	1	0	0,0%	0,0%	98,9%	7	
22	6	8	51	SAN JUAN	p510	Pte. s/Río del Valle		8	0,08	1.175	01/11/2006	30/11/2008	900.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	0,20	8.307	24/01/2003	15/12/2003	50.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	8	0,09	16.940	28/06/2005	30/09/2006	705.000	6.016.392	6.016.388	8,9%	33,4%	49,6%	6	A
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	0,03	1.700	01/11/2006	30/08/2007	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	0,01	1.200	01/11/2006	30/10/2007	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	12,00	1.270	01/11/2006	28/02/2007	900.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	0,04	1.250	01/11/2006	30/08/2007	900.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	0,08	2.400	01/11/2006	30/11/2007	750.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	0,04	1.470	01/11/2006	30/10/2007	100.000	1	0					

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim.	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	0,03	1.170	01/11/2006	30/10/2007	200.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	0,03	1.500	01/11/2006	31/10/2008	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° S.Miguel)	Prog. 898,61	8	0,03	1.500	01/11/2006	31/10/2008	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pitui (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	8	0,01	4.700	01/11/2006	30/11/2009	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	0,08	2.100	01/11/2006	30/11/2008	286.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine)	8	0,01	7.000	01/11/2006	30/11/2009	200.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	0,05	1.900	01/11/2006	30/11/2008	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	0,09	3.000	01/09/2006	30/11/2008	950.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	0,40	11.800	30/11/2006	30/11/2009	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	29	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	8	0,09	3.160	01/11/2006	30/11/2009	600.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	30	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/3° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	8	0,09	3.160	01/11/2006	30/11/2009	600.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	31	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1207,28	8	0,05	1.350	01/11/2006	30/11/2008	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	0,06	1.800	01/11/2006	30/11/2009	36.000	36.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	0,09	3.300	01/11/2006	30/11/2008	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	0,01	300	01/11/2006	30/09/2007	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	35	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	8	0,10	4.500	01/11/2006	30/11/2008	600.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las F	5	1,20	69.497	01/09/2004	31/08/2007	2.928.000	15.328.000	15.260.049	1,7%	29,2%	60,1%	6	A
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5		10.525	29/08/2003	30/06/2004	50.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	1,00	3.500	01/11/2006	30/04/2007	73.000	73.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	1,00	485	01/11/2006	30/09/2007	285.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	1,67	17.400	01/11/2006	30/04/2010	613.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Pte s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	0,31	10.500	01/11/2006	30/11/2009	437.000	287.001	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	0,06	1.500	01/11/2006	30/10/2007	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	0,08	2.000	01/11/2006	30/11/2008	500.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A° Las Tunas)	Prog. 447,34	8	0,03	1.500	01/11/2006	30/08/2007	300.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	0,07	850	01/11/2006	30/10/2007	50.000	50.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	0,02	350	01/11/2006	28/02/2007	350.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	0,01	1.500	01/11/2006	30/11/2008	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos DNU	8	0,07	12.300	27/06/2006	30/05/2009	4.788.000	10	0	8,6%	8,6%	8,6%	6	A
						Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes				246.115			23.690.000	22.034.815	21.374.705	1,5%	11,0%	34,3%		
						Obras en Corredores Viales Concesionados														
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acc. Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15/07/2004	28/02/2005	9.000	2.500.000	0	0,0%	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N°10A -Emp.RPN° 6 -Acc.V. Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05/08/2004	03/05/2005	972.000	591.140	0	0,0%	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	8.135	27/01/2006	30/09/2006	1.705.000	1.705.000	3.623.374	50,0%	78,2%	78,2%	6	A
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-A.Nivel RP4 y FFCC GSM-Emp.RPN10	km 500 - km 539	5	39,0	12.738	20/07/2004	30/08/2005	2.600.000	4.600.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13/08/2004	30/04/2006	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	11,1%	10	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cru. FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	13.066	04/10/2004	31/05/2005	1.165.000	1.165.000	292.376	0,0%	0,0%	99,9%	7	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N°13 -Emp.RPN°3 -Emp.RNN°35	km 568 - km 606,65	5	39,0	13.940	08/10/2004	30/06/2005	219.000	219.000	0	0,0%	0,0%	95,5%	7	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	14.259	23/07/2004	31/12/2006	2.313.000	30.336.943	1.372.018	0,2%	6,2%	95,4%	6	A
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	41.290	23/07/2004	30/04/2006	1.293.000	1.293.000	3.346.807	0,0%	3,1%	99,8%	7	A
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	12.625	28/09/2005	30/09/2006	1.713.000	1.713.000	8.945.382	2,4%	73,2%	83,5%	6	A
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N°14 -A Nivel S/RNN°-Emp.RNN°9 (Sal.Cba)	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20/07/2004	30/04/2005	1.422.000	1.422.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	7.316	04/01/2006	30/09/2006	3.281.000	3.281.000	4.716.349	34,4%	98,8%	98,8%	7	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.566	05/08/2004	31/12/2004	100.000	100.000	24.273	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	24.468	06/12/2005	31/10/2006	2.350.000	2.350.000	20.167.118	33,4%	97,7%	97,7%	6	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 -Obra N°17- J.A.de la Peña-A.Nivel FFCC GSM	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	18.534	05/08/2004	31/05/2005	2.828.000	2.828.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	16.386	05/08/2004	30/06/2005	1.126.000	1.126.000	347.098	0,0%	0,0%	99,9%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	17.523	23/11/2004	30/11/2005	637.000	12.137.000	0	0,0%	0,0%	99,6%	7	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28/07/2004	31/05/2005	2.239.000	239.000	0	0,0%	0,0%	99,4%	7	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	17.943	19/12/2005	30/09/2006	3.524.000	2.024.000	2.326.941	0,4%	13,3%	13,3%	6	A
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005Emp.RNN°8-	km596-km606,30;km331,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-k	5	42,0	21.160	19/05/2005	18/12/2006	703.000	703.000	8.410.067	33,4%	63,6%	66,0%	6	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	24.083	20/07/2004	31/07/2005	3.566.000	16.003.635	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.626	14/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	12.706	16/11/2005	30/09/2006	1.973.000	1.973.000	10.343.070	34,8%	93,7%	96,9%	6	A
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp.RPN° 23 -Lte.c/Sgo.Estero	km 361 - km 398	5	37,0	2.742	20/07/2004	28/02/2005	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circ.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	29.150	05/01/2005	28/02/2006	100.000	100.000	7.988.200	0,0%	24,3%	99,9%	7	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	23.224	13/01/2005	31/12/2005	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	98,3%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	13.136	20/08/2004	31/05/2005	1.711.000	6.711.000	2.304.433	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	8																		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vóg. 30/09/06 (en \$)	Devengado 30/09/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / Km 304 - Km 306	5	61,0	22.690	20/04/2006	31/12/2006	1.970.000	1.562.496	1.092.495	4,1%	5,7%	5,7%	6	
22	7	11	52	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 233 - km 238		5	5,0	450	01/11/2006	31/08/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	53	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 248 - km 287		5	39,0	3.510	01/11/2006	31/08/2007	3.510.000	1.274.372	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	11	54	SANTA FE	8	CVN°4	km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	66,0	30.878	01/11/2006	30/11/2009	3.769.000	3.769.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		5	4,0	7.071	01/11/2006	31/10/2007	3.742.000	11.342.183	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	30.347	23/01/2006	30/01/2007	4.243.000	4.243.000	14.058.615	31,1%	59,6%	59,6%	6	
22	7	12	52	TUCUMAN	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289	5	34,0	23.072	03/05/2006	30/04/2007				8,1%	13,2%	13,2%	6	
22	7	12	53	SALTA	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		5	9,0	2.520	01/11/2006	30/09/2007	2.520.000	2.520.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	18.488	08/02/2006	30/10/2006	3.519.000	20.190.231	13.155.974	36,3%	89,6%	89,6%	6	
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		5	3,0	840	01/11/2006	31/05/2007	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		5	3,0	251	01/11/2006	31/05/2007	251.000	251.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R.N.N° 123 - Emp. R.P. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	4.363	01/03/2005	15/10/2005	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217	<Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 >	5	18,0	1.620	18/09/2006	28/03/2007	1.620.000	4.183.653	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	16.165	01/06/2006	31/01/2007	2.690.000	0	945.025	43,0%	43,0%	43,0%	6	
22	7	14	53	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		5	11,0	3.080	01/11/2006	31/08/2007	3.080.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	54	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 483 - km 487		5	4,0	1.120	01/11/2006	31/08/2007	1.120.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	55	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 669 - km 677		5	8,0	720	01/11/2006	31/08/2007	720.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°4 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	9.443	07/04/2006	30/11/2006	1.279.000	0	2.238.624	22,4%	40,0%	40,0%	6	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135		5	6,0	9.703	01/11/2006	31/10/2007	1.680.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		5	7,0	2.940	01/11/2006	31/10/2007	1.960.000	60.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	55	BUENOS AIRES	5	CVN°2 - km 327 - km 330		5	3,0	1.260	01/11/2006	31/10/2007	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	56	LA PAMPA	5	CVN°2 - km 550 - km 568		5	18,0	3.920	01/11/2006	30/11/2007	1.040.000	1.040.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	57	BUENOS AIRES	7	CVN°2 - km 63 - km 103		5	40,0	3.600	01/11/2006	31/10/2007	3.600.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	60	CORDOBA	7	CVN°2 - km 424 - km 491		5	67,0	6.030	01/11/2006	30/11/2008	1.722.000	22.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	61	CORDOBA	7	CVN°2 - km 543 - km 557		5	14,0	3.920	01/11/2006	30/09/2007	3.920.000	1.020.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	62	CORDOBA	7	CVN°2 - km 592 - km 605		5	13,0	1.170	01/11/2006	30/09/2007	1.170.000	1.170.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	15	63	MENDOZA	7	CVN°2 - km 878 - km 909		5	31,0	2.790	01/11/2006	31/08/2007	2.790.000	2.790.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	7.822.590	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	52	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 106 - km 206		5	100,0	840	01/11/2006	31/10/2007	3.000.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	53	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 73 - km 77		5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	54	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 85 - km 91	Desc km 85 - km 91	5	6,0	810	01/11/2006	31/10/2007	540.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	56	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 111 - km 125	Desc km 111 - km 125	5	14,0	1.890	01/11/2006	31/10/2007	1.260.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	57	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Desc km 157 - km 188	Desc km 157 - km 188	5	31,0	2.160	01/11/2006	31/10/2007	2.478.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	58	SANTA FE	11	CVN°3 - km 413 - km 425		5	12,0	1.080	01/11/2006	30/09/2007	1.080.000	924.255	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	22.650	01/03/2006	28/02/2007	3.240.000	3.240.000	6.770.413	41,8%	51,3%	51,3%	6	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	21.603	14/03/2006	11/02/2007	2.520.000	1.020.000	1.052.175	0,3%	5,1%	5,1%	6	
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		5	4,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	62	CORDOBA	19	CVN°3 - km 251 - km 253		5	2,0	180	01/11/2006	30/09/2007	180.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	63	CORDOBA	19	CVN°3 - km 257 - km 263		5	6,0	540	01/11/2006	30/09/2007	540.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	16	64	LA PAMPA	188	CVN°3 - km 301 - km 315		5	14,0	3.920	01/11/2006	30/11/2008	920.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	01/11/2006	31/10/2007	160.000	1.484.043	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	17.701	06/04/2006	30/12/2006	960.000	10.000	1.394.042	45,6%	53,5%	53,5%	6	A
22	7	17	53	CORDOBA	8	CVN°4 - km 635 - km 652		5	17,0	15.642	01/11/2006	30/11/2007	1.530.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	54	CORDOBA	8	CVN°4 - km 662 - km 667		5	5,0	1.400	01/11/2006	30/09/2007	1.400.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		5	4,0	1.120	01/11/2006	30/09/2007	1.120.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC GBM	km 631 - km 673	5	42,0	11.883	30/12/2004	30/10/2005	487.000	487.000	0	0,0%	0,0%	99,4%	8	
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		5	22,0	7.840	01/11/2006	30/11/2008	2.239.000	2.239.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	52	TUCUMAN	9	CVN°5 - km 1315 - km 1326		5	11,0	990	01/11/2006	30/09/2007	990.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		5	22,0	6.160	01/11/2006	31/10/2009		9.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	56	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 409 - km 442		5	33,0	9.240	01/11/2006	30/09/2008	2.638.000	628.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	58	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 846 - km 851		5	5,0	450	01/11/2006	30/09/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	18	59	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 864 - km 896		5	32,0	1.080	01/11/2006	30/09/2007	1.080.000	1.080.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	23.744	26/06/2006	28/02/2007	500.000	1.959.471	0	7,1%	7,1%	7,1%	6	A
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	4.124	04/04/2006	31/10/2006	900.000	900.000	681.630	4,2%	20,7%	20,7%	6	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	13.483	24/04/2006	30/11/2006	1.519.000	1.519.000	214.490	9,0%	14,2%	14,2%	6	
22	7	19	54	CHACO	16	CVN°6 - km 87 - km 89		5	0,0	180	01/11/2006	31/10/2007	180.000	180.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	19	55	CORRIENTES	12	CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036		5	6,0	810	01/11/2006	30/09/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Ruta 3 - Km. 176 - 199		5	23,0	2.070	01/11/2006	31/10/2007	70.000	70.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Ruta 3 - Km 217 - 244		5	27,0	2.430	01/11/2006	31/10/2007	430.000	430.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	20	53	BUENOS AIRES	205	CVN1 - Ruta 205 - Km. 223 - 243		5	20,0	1.215	01/11/2006	31/10/2008	2.600.000	2.600.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vig. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim.	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	7	21	54	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 354 - Km 369	Km 354 - Km 369	5	15,0	2.025	01/11/2006	31/10/2007	1.350.000	50.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	55	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 453 - Km 470	Km 453 - Km 470	5	17,0	2.295	01/11/2006	31/10/2007	1.530.000	30.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	56	BUENOS AIRES	5	CVN°2- Ruta Nacional N° 5 - Km 480 - Km 504	Km 480 - Km 504	5	24,0	6.720	01/11/2006	31/10/2007	720.000	720.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	57	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 116 - Km 121	Km 116 - Km 121	5	5,0	675	01/11/2006	31/10/2007	450.000	450.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	58	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 147 - Km 153	Km 147 - Km 153	5	6,0	810	01/11/2006	31/10/2007	540.000	540.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	59	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 159 - Km 167	Km 159 - Km 167	5	8,0	1.080	01/11/2006	31/10/2007	720.000	720.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	60	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 181 - Km 185	Km 181 - Km 185	5	4,0	540	01/11/2006	31/10/2007	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	61	BUENOS AIRES	7	CVN°2- Ruta Nacional N° 7 - Km 202 - Km 230	Km 202 - Km 230	5	28,0	2.520	01/11/2006	31/10/2008	520.000	520.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	21	62	CORDOBA	7	CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654		5	38,0	5.130	01/11/2006	30/11/2007	3.420.000	1.120.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	51	BUENOS AIRES	11	CVN°3 - Ruta 11 - Km. 485 - 508		5	23,0	2.070	01/11/2006	31/10/2008	1.070.000	1.070.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	52	SANTA FE	11	CVN°3 - Ruta N°11 - Km. 675 - 684		5	9,0	850	01/11/2006	30/09/2007	810.000	810.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	53	SANTA FE		CVN°3 - Ruta N°11 - Km. 730 - 739		5	9,0	850	01/11/2006	30/09/2007	810.000	810.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	54	SANTA FE	19	CVN°3 - Ruta N°19 - Km. 93 - 96		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	22	55	LA PAMPA	188	CVN°3 - Ruta Nacional 188	Km. 1 - Km. 8	5	7,0	945	01/11/2006	30/09/2007	630.000	630.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - Ruta 8 - Km 146 - 163		5	17,0	2.200	01/11/2006	31/05/2007	530.000	530.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	52	CORDOBA	8	CVN°4 - Ruta Nacional N°8 - Km. 515 - 559		5	44,0	2.500	01/11/2006	30/11/2008	960.000	960.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	53	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km.563 - 580		5	17,0	2.100	01/11/2006	30/11/2008	2.469.000	1.369.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	54	SANTA FE		CVN°4 - Ruta N°33 - Km. 762 - 765		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	55	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - Km. 766 - 778		5	12,0	2.000	01/11/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	56	CORDOBA	36	CVN°4 - Ruta Nacional N°36 - km. 94 - 101		5	7,0	950	01/11/2006	28/02/2008	960.000	960.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	57	CORDOBA	A005	CVN°4 - Autopista A005 km. 0 - 12		5	12,0	2.000	01/11/2006	30/11/2008	360.000	360.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	14.023	01/05/2006	31/03/2007	3.999.000	99.000	0	16,5%	20,9%	20,9%	6	A
22	7	24	51	SANTA FE	34	CVN°5 - Ruta N°34 - Km. 281 - 299		5	18,0	2.200	01/11/2006	30/11/2008	1.439.000	39.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	52	SGO DEL ESTERO	34	CVN°5 - km 520 - km 536		5	16,0	1.900	01/11/2006	30/09/2007	1.280.000	1.280.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	53	SALTA	34	CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1131 - 1134		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	840.000	840.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	54	SALTA		CVN°5 - Ruta N°34 - km. 1147 - 1161		5	14,0	1.800	01/11/2006	30/11/2008	920.000	920.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	55	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1161 - 1164		5	3,0	400	01/11/2006	30/09/2007	270.000	270.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	56	JUJUY	34	CVN°5 - Ruta Nacional N°34 - km. 1177 - 1196		5	19,0	2.400	01/11/2006	30/09/2007	1.710.000	1.710.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	7	24	57	CORDOBA	9	CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - Km. 595- 615		5	20,0	2.500	01/11/2006	31/07/2008	800.000	800.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
						Total Obras en Corredores Viales Concesionados				905.636			173.758.000	216.677.726	118.867.111	8,9%	18,7%	50,8%		
						Obras en Circuitos Turísticos														
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		3.000	01/11/2006	30/01/2008	1.412.000	1.262.001	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8		14.000	01/11/2006	30/08/2009	1.295.000	1.295.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
						Total Obras en Circuitos Turísticos				17.000			2.707.000	2.557.001	0	0,0%	0,0%	0,0%		
						Mejoramiento y Reconstrucción de Rutas - Fase II														
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Callegua		8		12.000	01/11/2006	30/11/2009	7.000.000	3.000.010	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	18.000	01/11/2006	30/11/2009	613.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Emp.RNN°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	7.000	01/11/2006	30/11/2009	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	28.500	01/11/2006	30/11/2011	500.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	1	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	37.000	01/11/2006	30/11/2010	1.022.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	6	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras		8	194,0	11.500	01/11/2006	30/11/2009	800.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	75.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	C. Quijano-El Tunal-Chorillos-S.A.los Cobres-Minapona		8	160,0	73.000	01/11/2006	30/11/2010	500.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SI	La Dársena - Angastaco	8	43,0	17.000	01/11/2006	30/11/2011	5.245.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	11	51	SALTA	86	Empalme RNN° 34 - Tartagal - Tonono		8	35,0	17.200	01/11/2006	30/11/2008	511.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	20.000	01/11/2006	30/10/2008	3.552.000	52.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8		40.000	01/11/2006	30/11/2009	3.066.000	66.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	14	51	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		8	62,0	5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	15	51	MISIONES		Construcc.Acc.a Campo Grande y San José - Misiones		8	4,0	5.500	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES		Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		8		5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Aut. N. Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano		8	12,0	58.000	01/11/2006	30/06/2010	16.191.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	20.000	01/11/2006	30/08/2010	409.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	82.000	01/11/2006	30/08/2010	800.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	20	51	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		8	8,0	10.000	01/11/2006	30/11/2008	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	50.000	01/11/2006	30/11/2010	1.022.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	46.200	01/11/2006	30/05/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre S P Colalao y C.del Valle		8	80,0	5.000	01/11/2006	30/11/2008	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	80.000	01/11/2006	30/11/2008	409.000	101	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	4.000	01/11/2006	30/11/2008	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	60.000	01/11/2006	30/11/2010	3.066.000	66.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	9	27	51	CHACO		Obras Empalme Ruta Provincial 12		8		17.000	01/11/2006	31/08/2009	500.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	620.000	01/11/2006	30/11/2010	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vig. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8	513,0	5.000	01/11/2006	30/11/2009	1.000.000		10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina		5	0,1	5.000	01/11/2006	30/11/2008	500.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	6.000	01/11/2006	30/11/2009	383.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	5.000	01/11/2006	30/11/2009	613.000	10	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 - Chollila	Km 0 - Km 30	8	30,0	22.658	15/12/2005	30/11/2008	501.000	4.381.220	4.381.219	3,8%	21,3%	21,3%	6	A	
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten-Emp.RN Nº40(ex258-Epuyen)-Acc BsAs Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)- DNU	8	44,8	29.518	22/11/2005	30/11/2007	613.000	8.581.073	8.535.229	7,1%	30,9%	32,4%	6		
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. R.N. N° 40	1ra. Sección Km 0 - Km 30	8	30,0	33.810	01/02/2006	30/09/2006	1.000.000	3.520.951	3.467.971	0,4%	10,5%	10,5%	6		
22	9	36	51	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel		8	0,2	1.800	01/11/2006	30/08/2007	245.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154		8	154,0	33.000	01/11/2006	30/11/2010	767.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	88.000	01/11/2006	30/11/2010	9.628.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	16.000	01/11/2006	30/11/2010	327.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	5	2,0	2.749	27/01/2006	27/11/2006	327.000	1	0	35,6%	68,9%	68,9%	6	A	
22	9	41	51	CORDOBA	10	Adelia Maria - General Levalle y La Cautiva - Jovita		8	57,0	16.000	01/11/2006	30/11/2010	327.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabiliz.y contención de barrancas - S.Elena		17		10.000	01/11/2006	30/08/2009	200.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfalt.de los Acc. Norte y Sur a Cdad de Villaguay		5		11.000	01/11/2006	30/08/2009	511.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	12.500	01/11/2006	30/08/2009	200.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	45	51	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		8		10.000	01/11/2006	30/08/2009	358.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8		26.000	01/11/2006	30/08/2009	100.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	47	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualaguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		8		33.000	01/11/2006	30/08/2009	613.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Pte S.Juan, Ros.Sta Fé, Damas Patricias en Gral Roca		8	0,2	7.000	01/11/2006	30/11/2009	500.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	49	51	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		8	150,0	12.000	01/11/2006	30/11/2009	1.000.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO		Rot.en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151- Campo Grande		8		5.000	01/11/2006	30/11/2009	100.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio		8		6.000	01/11/2006	30/11/2009	750.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia		8	82,0	150.000	01/11/2006	31/08/2009	500.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-Rio Turb		8	860,0	60.000	01/11/2006	31/05/2010	1.022.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8	51,0	29.000	01/11/2006	31/10/2008	1.453.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	55	51	SANTA CRUZ	3	km 29 - Monte Aymond		8	30,0	9.000	01/11/2006	31/08/2009	767.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	14.090	01/03/2006	28/02/2007	1.875.000	1.693.798	1.236.140	21,6%	31,6%	31,6%	6		
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RP Nº19		8	31,0	62.000	01/11/2006	30/11/2011	14.832.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza		5	0,1	1.280	01/11/2006	31/05/2007	262.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Rio de la Plata		8		20.000	01/11/2006	31/05/2009	2.044.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	39.454	20/04/2006	18/04/2008	2.044.000	645.562	645.560	8,1%	8,5%	8,5%	6	A	
22	9	61	51	BUENOS AIRES		Av Juan XXIII Y Acc Parque Industrial Chacabuco		8	2,8	13.659	01/11/2006	30/10/2007	1.574.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	AV. VERGARA	Av Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	26.220	24/02/2006	31/05/2010	1.716.000	3.930.427	3.930.426	20,5%	31,0%	31,0%	6		
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Bs As - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	21.618	24/01/2005	30/11/2006	532.000	12.233.312	11.392.455	14,4%	50,1%	79,6%	6		
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V	8	16,6	30.000	01/11/2006	30/05/2010	1.022.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas		8	6,0	14.000	01/11/2006	31/08/2009	818.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.N° 6		8	86,0	45.000	01/11/2006	30/08/2010	307.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5		36.000	01/11/2006	30/05/2010	1.000.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	68	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion I	8	6,8	15.000	01/11/2006	30/08/2009	900.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	69	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion II	8	22,3	20.000	01/11/2006	30/10/2011	100.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque		5		4.000	01/11/2006	30/11/2008	1.000.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RP Nº14 - Gualjaina - emp. RN Nº 40		8	62,0	33.780	01/11/2006	30/08/2010	760.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)	8	62,0	46.254	01/11/2006	31/10/2009	1.454.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Emp RN N° 40 - Rio Pico	2ra. Sección Km 30 - Km 60	8	30,0	6.000	01/11/2006	31/10/2007	1.623.000	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Rio Senguerr - Emp. RP Nº20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56)	8	39,0	25.983	09/03/2006	28/02/2008	500.000	1	0	1,2%	2,7%	2,7%	6	A	
22	9	75	51	CHUBUT	P70-1S40	El Maiten-Emp.RN Nº40(ex258-Epuyen)-Acc BsAs Chico		8	31,0	29.518	01/11/2006	30/11/2008	1.698.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	76	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 - Chollila	Km 30 - Km 60	8	30,0	22.658	01/11/2006	31/10/2008	1.636.000	2	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	20.000	01/11/2006	30/05/2010	2.044.000	44.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RN Nº7 - Emp. RN Nº8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87)	5	0,1	238	27/12/2005	30/09/2006	220.000	2	0	0	0,0%	95,8%	95,8%	7	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Rio San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	3.920	01/11/2006	30/11/2008	801.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa Maria		5	1,0	2.100	01/11/2006	30/11/2007	429.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	81	51	CORDOBA	P10	Lte. C/Ls Pampa - Gral. Levalle	prog. 18.500 - Jovita	8	36,2	29.615	01/11/2006	30/05/2010	1.588.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	82	51	CORDOBA	PE90	Alcira Gigena - Gral. Cabrera		8	47,8	32.000	01/11/2006	30/05/2010	1.881.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22.900	8	22,9	25.598	01/11/2006	30/05/2010	1.095.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	1,0	530.000	01/11/2006	30/08/2011	409.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RN Nº81	Km1167 - Km1184,44	13	10,9	10.570	01/11/2006	31/10/2007	570.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	24,0	29.000	01/11/2006	30/05/2010	1.000.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado		5	58,0	12.620	27/06/2005	30/09/2006	1.914.000	5.043.988	5.043.987	1,6%	34,6%	41,5%	6	A	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RN Nº11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	21.681	20/05/2005	30/09/2006	2.645.000	11.486.645	10.526.745	8,6%	50,4%	67,1%	6	A	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy		8	8,0	40.000	01/11/2006	30/10/2010	17.731.000	1	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	93	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra		8	44,0	40.000	01/11/2006	30/									

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	9	97	51	MENDOZA	145 (exP224)	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	74.000	01/01/2006	30/10/2009	8.899.000	101	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145 (exP224)	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	56.930	01/11/2006	30/10/2009	7.170.000	101	0	0,0%	0,0%	0,0%	4	
22	9	99	51	MENDOZA	145 (exP224)	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte. c/Chile (Km0 - Km13,6)	8	13,6	16.320	01/11/2006	30/11/2008	5.791.000	101	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II				3.585.009			170.482.000	74.977.173	67.162.245	0,6%	1,8%	2,5%		
						Mejoramiento y Reconstrucción de Rutas - Fase III														
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		25.000	01/11/2006	31/10/2008	1.022.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES		Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0	10.000	01/11/2006	30/11/2009	1.022.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	3	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Pino Hachado		8	30,0	738	01/11/2006	30/11/2007	738.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta rangul y Barrancas		8	2,5	1.500	01/11/2006	30/08/2007	500.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Puente sobre Arroyo Pímatue		8	1,0	500	01/11/2006	30/11/2007	500.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura		8	5,0	9.000	01/11/2006	30/05/2009	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN N°231	Sección IV: Acc. Villa Trafal - Emp. RN N°231 DNU	8	20,6	69.915	21/02/2006	30/11/2008	1.819.000	5.153.062	5.153.061	1,1%	8,4%	8,4%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen		8	98,0	10.000	01/11/2006	30/11/2010	4.395.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II	8	64,0	86.400	01/11/2006	30/11/2011	2.044.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Norquino	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	947	01/02/2006	30/11/2006	785.000	1	0	6,3%	92,8%	92,8%	6	A
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche		8		1.000	01/11/2006	30/11/2007	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1.Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM 1448 - KM 1462	5	14,0	19.871	01/11/2006	30/06/2007	4.316.000	2.264.478	2.264.477	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3.Emp. RPN°3- Emp RNN°34	Km 1478 - Km 1500	5	22,0	34.862	12/04/2006	12/07/2007				11,7%	13,3%	13,3%	6	
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2. Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM. 1462 - KM. 1478	5	16,0	29.577	07/04/2006	07/07/2007				6,4%	8,1%	8,1%	6	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	3.118	01/11/2006	30/11/2008	637.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. RNN° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	8	118,9	68.000	01/11/2006	30/08/2010	491.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Emp. R.N. N° 40	8	48,4	40.000	01/11/2006	30/05/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100	8	0,1	15.988	26/10/2005	30/05/2009	1.022.000	2	0	0,0%	1,0%	4,2%	6	S/D
22	10	17	51	SAN LUIS	7	Repavimentacion Via 1		11		47.800	01/11/2006	30/08/2010	307.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	19	51	SANTA CRUZ	3	Autovia- Aerop. R. Gallegos- Planta LU 12		8	2,5	7.182	01/11/2006	30/11/2008	1.468.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Rio Santa Cruz	5	0,2	1.500	01/11/2006	30/08/2007	307.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	21	51	SANTA FE	168	B/N RPN°1- Acceso a Tunel Subfluvial	Km. 479,72- km. 488,88	8	9,2	5.000	01/11/2006	30/11/2008	1.022.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hernandarias		5	3,4	60.001	01/11/2006	30/11/2010	2.044.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. S/Rio Colastiné	5	3,5	16.654	01/09/2006	31/08/2007	750.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146	8	31,0	38.400	01/11/2006	30/11/2011	1.012.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	43.000	01/11/2006	30/11/2011	1.380.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55c	5	5,5	350	01/11/2006	30/10/2007	350.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 0,00 - Km 10,125	8	10,1	45.686	13/02/2006	30/12/2006	1.840.000	5.675.181	5.675.180	19,3%	27,1%	27,1%	6	
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso alternativo transito pesado desde RNN°9	8	4,0	2.000	01/11/2006	30/11/2008	409.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	pavimentacion urbana- 34 arterias urbanas	8	3,4	1.948	01/11/2006	30/08/2007	398.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional- Bahía Lapataia		8	16,0	1.500	01/11/2006	30/11/2007	307.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa(Alberdi) - Principio Autopista	seccion I:Rio Marapa(Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	18,0	90.150	01/11/2006	30/10/2009	1.260.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	seccion V: Emp. Traza actual - Principio Autopista	8	19,5	22.275	01/11/2006	30/11/2011	1.685.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro		8	1,0	8.000	01/11/2006	31/08/2009	818.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	6.500	01/11/2006	30/11/2008	1.329.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°015 y calle Rösch	Conexion acceso a Salto Grande y RN N°14	8	1,0	653	01/11/2006	30/11/2006	653.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	49.000	01/11/2006	30/05/2010	1.329.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)		8	0,5	1.200	01/11/2006	30/11/2007	245.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Interseccion RN N°22 y RN N°237	8	1,5	118	01/11/2006	30/11/2007	118.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Interseccion Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP N°13	8	5,0	8.000	01/11/2006	30/05/2009	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio ferroviario	8	235,0	19.765	01/09/2006	31/08/2009	1.022.000	1.976.454	1.976.451	0,0%	0,0%	0,0%	4	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac. T. del F.	11	6,0	4.000	01/11/2006	30/11/2008	818.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3		8	5,0	4.000	01/11/2006	30/11/2008	818.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	40.000	01/11/2006	31/05/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fátima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	8	111,9	275.740	01/11/2006	31/08/2011	304.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	Km. 176,70 - Km. 221,37	8	44,7	162.340	01/11/2006	31/08/2011	723.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km. 64,50 - Km. 72,00	8	7,5	28.000	01/11/2006	31/10/2010	111.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Seccion I y Seccion II	8	58,0	72.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Seccion I y Seccion II	8	47,0	62.000	01/11/2006	30/10/2009	4.791.000	4.791.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	60.000	01/11/2006	30/05/2011	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion I	8		90.000	01/11/2006	31/10/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion II	8		90.000	01/11/2006	31/10/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	52	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III	8		90.000	01/11/2006	31/10/2010	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al C.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	35.563	05/06/2006	30/04/2008	22.787.000	13.563.010	0	4,6%	4,6%	4,6%	6	A
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	23.209	19/05/2006	31/10/2007	200.000	702.204	376.532	5,1%	5,7%	5,7%	6	
22	10	56	51	RIO NEGRO	258	Variante RN N°237		8	14,7	3.750	01/11/2006	30/03/2008	1.221.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores- Quines	Km.198,65- Km. 266,41	8	67,8	3.750	01/11/2006	30/05/2009	767.000	2	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
22	10	61	51																	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Vig. 30/09/06 (en \$)	Devengado 30/09/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
22	10	71	51	MENDOZA	7	Limite San Luis - Mendoza - Acceso a La Paz	Km 866 - Km 871	5	5,0	1.387	01/11/2006	28/02/2007	2.000.000	100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San Julian - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55	5	100,0	91.046	20/12/2005	20/12/2007	500.000	33.707.797	33.707.223	0,0%	9,0%	9,0%	6	S/D
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	100.000	01/11/2006	01/11/2008				0,0%	0,0%	0,0%	6	S/D
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,4	43.100	01/11/2006	01/11/2009	1.000.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Km 113	8	113,0	174.000	01/11/2006	31/10/2009	2.862.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	5		1.281	28/06/2006	30/09/2006				66,7%	66,7%	66,7%	6	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III				2.537.264			94.537.000	102.624.771	49.152.924	0,8%	1,5%	1,5%		
						Total Construcciones				17.251.590			1.214.403.000	1.661.183.921	1.302.256.527	2,6%	6,6%	21,1%		
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO (C.Re.Ma.)														
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I														
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	13.947	26/05/1997	30/05/2005	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	132,3	13.515	24/04/1997	30/12/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	99,7%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharamendi	13	127,8	9.733	03/07/1997	25/07/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A.C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 - Chemical	13	243,8	11.169	18/06/1997	30/06/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	97,7%	8	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	17.317	04/06/1997	30/09/2006	100.000	796.594	796.592	0,6%	3,1%	99,8%	8	A
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	18.265	30/04/1997	30/09/2006	100.000	797.709	797.707	1,2%	3,2%	91,7%	6	A
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	17.762	04/07/1997	30/09/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	96,7%	7	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pie)/Emp.R	13	148,9	12.709	05/04/1997	13/10/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22.231	22/05/1997	31/07/2006	100.000	1.433.071	1.433.069	1,2%	7,0%	99,7%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	19.845	10/04/1997	30/06/2006	100.000	494.927	494.925	1,1%	2,2%	98,7%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Y	13	144,7	27.283	07/07/1997	31/07/2006	100.000	721.137	721.136	0,7%	2,6%	85,8%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp.	13	271,4	23.850	27/08/1997	30/09/2006	100.000	1.738.793	1.738.792	3,3%	8,6%	91,3%	6	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	217,6	20.456	03/11/1997	05/04/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	17.433	10/02/1998	31/07/2007	73.000	1.265.759	1.265.758	3,3%	9,8%	91,7%	6	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Guay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	15.340	07/07/1997	12/09/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	20.028	14/10/1997	15/10/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C /Bolivia	13	204,7	16.672	18/07/1997	30/11/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,8	16.006	15/08/1997	15/08/2003	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	6.378	02/08/1997	31/12/2002	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	10.860	13/01/1998	26/01/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp. RNN° 60 / Patquia - Emp.	13	327,8	17.876	30/09/1997	30/06/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	18.395	11/11/1997	28/02/2007	100.000	2.078.578	1.183.450	1,9%	6,0%	97,3%	6	A-C
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	20.207	25/11/1997	12/02/2005	100.000	1	0	0,0%	0,0%	89,6%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pie. Iguatú Porá	13	84,3	21.453	13/01/1998	12/03/2007	100.000	336.766	336.764	0,2%	1,2%	95,4%	6	A
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Emp. RNN°3-Emp.RNN° 229/Emp.RNN°3-Pte.S/R. Colora	13	167,1	20.221	17/07/1997	14/04/2007	100.000	1.099.189	851.437	1,7%	5,6%	93,8%	6	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	23.872	09/12/1997	30/12/2005	100.000	1.457.929	1.457.919	0,0%	0,0%	99,9%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Rio Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s T	13	201,2	25.527	01/12/1997	31/12/2006	100.000	2.487.912	1.981.321	3,1%	8,8%	94,2%	6	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	13	250,4	21.472	14/11/1997	25/11/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	17.069	01/08/1997	06/10/2004	100.000	228.582	176.118	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	13	141,9	18.670	01/04/1998	26/11/2006	100.000	935.749	935.748	1,2%	3,9%	82,7%	6	A
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	187,7	13.993	17/06/1998	10/05/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13.029	13/01/1998	15/04/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. Rn N° 9-Lte.C/Catamarca	13	309,5	15.095	12/07/1997	31/05/2005	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R.N.N° 20	13	245,6	14.250	20/06/1997	28/02/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	18.091	23/06/1997	30/09/2004	100.000	1	0	0,0%	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	21.228	04/03/1998	31/12/2006	100.000	1.534.008	1.534.006	2,8%	7,5%	96,3%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 3														

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/09/06 (en \$)	Devengado 30/09/06 (en \$)	Avance 3° Trim.	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	18.183	17/11/1997	30/12/2006	100.000	872.456	872.455	0,1%	1,4%	99,7%	6	A-C
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	19.342	23/02/1998	14/10/2006	100.000	3.533.746	3.230.742	1,6%	18,0%	88,0%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I				969.357			5.634.000	34.383.947	29.915.157	0,9%	2,7%	96,7%		
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II														
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán LII - Collón Curá	13	104,5	34.065	01/12/2004	30/09/2009	11.263.000	21.465.276	20.465.272	0,7%	45,7%	85,8%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	47.699	01/01/2005	30/09/2009	12.158.000	23.496.385	18.964.657	2,1%	35,3%	89,0%	6	A
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	37.121	01/12/2004	30/09/2009	12.345.000	23.400.385	18.916.002	1,0%	34,9%	87,7%	6	A
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequeintín (O.faltantes)	13	313,8	19.509	09/09/2003	30/11/2006	2.862.000	4.476.201	1.811.499	11,1%	23,1%	76,9%	6	A
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Bs As	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	41.307	01/03/2005	30/09/2009	15.582.000	19.123.149	16.843.396	14,2%	48,2%	95,0%	6	A
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	42.231	01/11/2005	30/10/2010	19.707.000	15.049.497	7.160.262	18,5%	40,6%	48,0%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	39.112	01/05/2005	30/09/2009	19.759.000	20.190.755	11.914.279	12,7%	32,2%	64,5%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	37.360	19/11/2003	30/11/2006	1.223.000	9.273.986	6.237.391	1,3%	8,7%	98,9%	6	C
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	26.549	10/01/2004	10/01/2007	1.048.000	3.842.277	413.246	0,7%	2,0%	93,0%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	114,6	32.334	01/02/2005	31/01/2010	11.115.000	19.675.610	18.379.724	7,1%	47,4%	88,9%	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimogasta	13	166,7	51.958	03/12/2004	30/09/2009	11.537.000	23.407.236	20.980.846	9,9%	38,6%	71,8%	6	A
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	50.192	02/05/2005	30/04/2010	23.119.000	18.819.416	18.019.413	16,4%	57,3%	82,0%	6	A
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	24.284	19/06/2001	30/11/2008	2.072.000	3.219.971	364.026	0,5%	1,4%	91,2%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	30.706	05/06/2001	30/04/2007	3.341.000	6.309.059	416.758	0,6%	1,8%	83,5%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	35.851	01/02/2005	30/09/2009	14.960.000	14.873.804	13.822.953	8,8%	39,1%	91,0%	6	A
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	35.990	01/04/2005	30/09/2009	16.543.000	13.502.002	9.847.768	32,7%	50,8%	83,0%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc. Quetquequén	13	158,3	39.546	01/04/2005	31/03/2010	15.934.000	18.383.943	11.387.623	13,3%	49,3%	86,6%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	43.028	01/03/2005	27/02/2010	15.118.000	19.327.776	14.918.368	8,4%	44,9%	86,3%	6	C
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II				668.842			209.686.000	277.836.728	210.863.482	9,4%	35,8%	82,9%		
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III														
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	40.807	01/11/2006	30/10/2010	18.917.000	11.916.970	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uruguay	13	151,8	44.641	01/01/2005	30/12/2009	13.759.000	20.259.000	13.434.126	4,3%	32,6%	87,4%	6	A
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	38.948	01/01/2005	30/09/2009	8.566.000	20.766.000	13.623.806	1,6%	33,5%	94,3%	6	A
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineraleiro	13	159,7	36.809	01/10/2005	30/09/2010	14.657.000	19.167.204	14.845.439	2,3%	32,4%	39,6%	6	A
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	37.086	15/01/2005	13/01/2010	13.072.000	30.338.665	25.851.345	0,9%	46,8%	87,0%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	13	149,1	66.037	01/11/2006	31/10/2008	10.672.000	2.172.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp. RNN° 20	13	253,8	36.998	01/02/2005	31/01/2010	10.146.000	23.982.034	20.058.793	0,8%	27,0%	87,3%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetquequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	33.900	01/09/2005	30/11/2010	18.416.000	18.416.000	7.266.368	24,8%	46,3%	61,7%	6	A
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - A Nivel RNN° 9	13	179,7	54.970	01/11/2006	30/07/2011	8.155.000	1.355.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chile	13	182,5	72.317	01/11/2006	30/10/2010	8.088.000	1.288.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	54.446	02/05/2005	02/04/2010	21.998.000	28.625.094	25.102.395	16,9%	44,5%	76,4%	6	A
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	52.800	01/01/2006	30/12/2010	22.197.000	16.469.864	3.537.625	6,9%	14,7%	20,9%	6	A
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.	13	148,9	35.961	01/10/2005	31/10/2010	15.737.000	18.431.673	14.306.334	15,8%	45,6%	55,7%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	46.167	01/08/2005	30/08/2010	17.222.000	19.004.048	14.252.286	15,7%	43,0%	50,0%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del EsteroB	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	35.975	01/04/2005	30/03/2010	13.292.000	27.187.507	19.623.620	8,3%	34,4%	71,5%	6	A
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp.R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	42.025	01/03/2005	31/03/2010	12.605.000	25.505.000	20.272.574	13,0%	48,6%	92,7%	6	A
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN° 3	13	180,1	42.371	01/11/2006	31/08/2010	19.623.000	4.123.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	44.769	01/12/2004	29/11/2009	9.579.000	20.479.000	14.116.508	0,9%	23,2%	58,5%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	40.100	01/12/2004	29/11/2009	8.865.000	18.280.549	12.980.546	1,1%	30,5%	67,5%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	128,5	31.195	02/01/2006	30/12/2010	13.868.000	14.327.855	8.917.608	14,2%	37,2%	37,2%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	42.100	01/05/2005	28/04/2010	16.764.000	29.828.862	23.322.153	5,7%	39,3%	66,3%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A/La Teresa-Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lt	13	291,2	38.310	01/02/2005	31/01/2010	12.407.000	23.642.191	14.520.359	1,8%	29,4%	67,3%	6	A
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chimical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Cerrillo	13	334,0	37.552	01/07/2005	29/06/2010	16.875.000	27.625.716	21.952.197	11,2%	47,0%	69,3%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN° 20	13	286,1	37.797	01/06/2005	30/11/2010	15.051.000	17.023.454	13.004.164	9,6%	31,8%	54,9%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.RNN°40S/Pte.s/R Diamante-Emp.	13	223,3	37.474	01/03/2005	27/02/2010	12.977.000	21.477.000	15.477.654	2,8%	54,1%	84,7%	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	36.740	01/07/2005	30/08/2010	14.926.000	19.965.584	13.585.402	12,1%	36,8%	44,6%	6	A
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	45.885	01/11/2006	30/08/2010	10.819.000	1.480.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 106 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	35.536	01/09/2006	31/08/2010	9.166.000	1.600.101	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	13	112,8	26.115	01/11/2006	30/10/2010	5.036.000	811.600	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Traful y nuevo puente s/Río Aluminé	13	140,0	37.552	01/11/2006	30/10/2010	7.242.000	1.167.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN° 2 - Emp. R													

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/09/06 (en \$)	Devengado 30/09/06 (en \$)	Avance 3° Trim	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	24.759	01/11/2006	30/10/2010	4.775.000	1.000.101	0	0,0%	0,0%	0,0%	2	
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°	13	340,7	27.370	01/11/2006	31/10/2010	5.283.000	3.407.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	33.849	01/11/2006	30/04/2010	4.914.000	3.167.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	104,8	22.382	01/11/2006	30/08/2010	4.316.000	2.782.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.RNN°3	13	167,7	39.200	01/11/2006	30/08/2010	7.396.000	2.867.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	32.647	01/11/2006	30/10/2010	6.282.000	4.049.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	105,4	30.322	01/11/2006	30/10/2010	5.849.000	3.770.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. RPN°20	13	272,6	30.681	01/11/2006	30/10/2010	5.917.000	3.814.100	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	13	181,4	37.035	01/11/2006	31/10/2010	7.142.000	2.614.888	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III				1.883.440			511.829.000	527.205.010	330.051.304	3,6%	16,4%	29,2%		
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV														
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	36.110	01/11/2006	30/11/2009	692.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	47.087	01/11/2006	30/11/2009	9.250.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	59.940	01/11/2006	30/11/2009	575.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	93,2	47.087	01/11/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 - Emp. RNN° 143	13	238,6	43.479	01/08/2006	01/08/2012	100.000	100.000	0	1,4%	1,4%	1,4%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	13	98,0	26.460	01/11/2006	30/11/2009	213.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127 / Emp. RN N° 12 - Emp. RN N° 32	13	133,3	77.854	01/11/2006	30/11/2012	2.867.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiyral - Cuay Grande	13	101,6	62.200	01/11/2006	30/08/2010	4.419.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	33.918	01/11/2006	30/10/2012	8.100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7	39.758	01/11/2006	30/08/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-N	8	144,7	47.315	01/08/2006	30/04/2012	100.000	100.000	0	2,6%	2,6%	2,6%	6	A
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2	46.647	01/11/2006	30/08/2010	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	19.602	01/11/2006	30/11/2009	919.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	36.622	01/11/2006	30/11/2008	491.000	10	0				0	
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	41.745	01/11/2006	30/10/2011	6.360.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38	13	102,5	27.678	01/11/2006	30/11/2009	265.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	70.830	01/11/2006	30/10/2011	10.389.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0	30.689	01/11/2006	30/11/2009	2.146.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	68.820	01/11/2006	30/08/2010	660.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	20.047	01/11/2006	30/11/2009	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN° 20	13	140,7	58.607	01/11/2006	30/05/2011	351.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	36.380	01/11/2006	30/11/2009	706.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San An	13	222,0	37.963	01/11/2006	30/08/2010	2.771.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	32.764	01/11/2006	30/11/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N N° 3	13	259,4	60.000	01/11/2006	30/08/2010	100.000	1	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4	37.029	01/11/2006	30/10/2011	320.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	278,0	36.380	01/11/2006	30/11/2009	520.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	114,5	30.901	01/11/2006	30/11/2009	449.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	300,8	68.138	01/06/2006	30/11/2009	100.000	100.000	0	5,4%	5,4%	5,4%	6	A
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	22.355	01/11/2006	30/11/2010	1.430.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116	13	119,6	66.058	01/11/2006	30/08/2010	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50	13	205,1	48.679	01/11/2006	30/11/2011	1.000.000	1.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	33.241	01/11/2006	30/08/2010	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 - Emp. R.N.N N° 12/Acce	13	195,0	42.022	01/11/2006	30/08/2010	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	173,0	46.715	01/11/2006	28/06/2012	448.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	36.925	01/11/2006	31/08/2010	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536 - I	Emp. RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	66.089	01/11/2006	30/10/2011	225.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537 - I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	36.000	01/11/2006	30/10/2011	233.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. RP N°62/Km 207,27 - Km 310,8 DNU	13	103,5	65.622	01/11/2006	30/08/2011	845.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RN N°62 - Km 310,80 - Km 419,69 DNU	13	107,0	49.620	01/11/2006	30/10/2011	233.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. C/Catamarca DNU	13	154,1	46.236	01/11/2006	30/08/2011	752.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	47.395	01/08/2006	01/08/2011	100.000	100.000	0	5,7%	5,7%	5,7%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan DNU	13	122,0	30.769	01/11/2006	30/11/2010	248.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20 DNU	13	78,0	65.383	01/11/2006	30/11/2010	593.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut DNU	13	144,0	25.985	01/11/2006	30/08/2010	2.824.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 - I	Emp. RNN 251*- Pasaje A Verde- Emp. RNN 250*- Emp. RNN 3*- DNU	13	254,0	76.194	01/11/2006	30/10/2011	378.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. Con SantiagodoDel Estero	13	143,0	42.852	01/11/2006	30/10/2011	294.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40(S)	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	61.539	01									

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2006
(en pesos)

PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Invers.Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial (en \$)	Crédito Víg. 30/9/06 (en \$)	Devengado 30/9/06 (en \$)	Avance 3° Trim.	Avance Año 06	Avance Total	Est	Obs
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina - Patquia - Portezuelo	13	307,0	92.025	01/11/2006	30/08/2011	830.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. C/chaco - Coronel Olleros	13	114,0	34.188	01/11/2006	30/10/2011	346.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Emp. RP 6	13	86,0	43.558	01/06/2006	28/06/2012	100.000	100.000	0	4,0%	4,0%	4,0%	6	A
26	4	57	51	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		13		35.000	01/11/2006	30/10/2011	4.262.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	58	51	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		13		39.960	01/11/2006	30/11/2010	491.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	59	51	SALTA		Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N N° 9 y N° 34	13	90,0	27.132	01/11/2006	30/10/2011	370.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	159,0	47.778	01/11/2006	30/10/2011	206.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	13	188,0	56.310	01/11/2006	30/08/2011	549.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13		51.000	01/11/2006	31/10/2008	278.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	41.541	01/11/2006	30/08/2011	486.000	10	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	
										2.860.505			76.146.000	901.512	0	0,3%	0,3%	0,3%		
										6.382.144			803.295.000	840.327.197	570.829.942	2,3%	9,2%	32,1%		
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD										24.124.974			2.094.913.000	2.691.476.760	2.023.102.333	2,6%	7,7%	24,4%		

Referencias

- A
- Certificación demorada. Valor estimado
- Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional
- B
- del Crédito Vigente
- C
- Modificación de Obra en trámite
- D
- Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E
- Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F
- Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H
- Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto
- I
- de contrato
- J
- Reinicio de obra en estudio
- S/D
- Sin datos

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida
17	Obras de Seguridad

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2006
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	802.722.024	892.666.958	444.994.685	361.641.111	13,1%
Provincia de Buenos Aires	557.747.722	822.023.267	478.524.607	442.117.297	16,1%
Provincia de Catamarca	52.796.797	27.339.877	57.862.087	57.862.087	2,1%
Provincia de Córdoba	230.790.945	376.974.945	207.194.063	206.136.191	7,5%
Provincia de Corrientes	102.292.088	42.381.298	4.809.553	4.679.230	0,2%
Provincia del Chaco	60.713.195	41.595.517	27.146.658	26.458.597	1,0%
Provincia del Chubut	118.404.460	137.598.772	99.033.137	98.705.145	3,6%
Provincia de Entre Ríos	237.364.707	125.451.111	85.353.504	85.156.515	3,1%
Provincia de Formosa	131.521.556	144.089.234	118.483.339	117.858.020	4,3%
Provincia de Jujuy	94.347.457	45.500.961	14.801.476	14.801.476	0,5%
Provincia de La Pampa	112.065.711	105.114.409	45.573.982	44.756.336	1,6%
Provincia de La Rioja	56.756.399	99.617.916	71.035.753	70.910.753	2,6%
Provincia de Mendoza	117.986.440	154.055.355	82.087.562	80.587.906	2,9%
Provincia de Misiones	104.922.313	77.989.086	49.892.968	49.248.432	1,8%
Provincia del Neuquén	72.244.770	65.908.513	41.496.771	41.421.581	1,5%
Provincia de Río Negro	121.097.375	155.891.332	119.093.290	117.263.552	4,3%
Provincia de Salta	117.850.937	87.060.913	62.265.036	61.940.426	2,3%
Provincia de San Juan	64.642.275	79.097.862	52.836.201	52.130.924	1,9%
Provincia de San Luis	39.092.630	47.926.788	28.599.867	28.471.627	1,0%
Provincia de Santa Cruz	106.074.130	252.924.419	223.239.078	223.108.364	8,1%
Provincia de Santa Fe	194.419.140	240.140.758	140.844.649	138.333.776	5,0%
Provincia de Santiago del Estero	139.279.272	87.496.444	44.070.768	44.070.768	1,6%
Provincia de Tucumán	69.104.336	73.958.733	52.669.900	52.654.043	1,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	17.655.136	33.049.721	31.753.867	31.753.867	1,2%
Interprovincial	236.502.519	247.222.863	140.469.758	136.797.291	5,0%
Nacional	68.209.000	320.620.006	137.664.647	137.656.247	5,0%
Binacional	1.526.000	6.070.029	8.962.221	8.962.221	0,3%
No Clasificado	64.771.681	63.545.622	16.762.915	16.600.405	0,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	4.853.312.709	2.887.522.344	2.752.084.189	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	25.876.855	16.360.855	171,9%
Ministerio del Interior	1.550.000	3.250.000	1.700.000	109,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	73.793	73.793	
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	96.893.000	41.200.000	74,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	4.618.290.815	6.068.237.944	1.449.947.129	31,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	355.109.720	3.116.470	0,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	60.323.799	14.323.799	31,1%
Ministerio de Salud	28.294.244	28.574.213	279.969	1,0%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	12.441.362	3.568.093	40,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.263.544.000	-249.300.000	-16,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	7.915.220.686	1.281.270.108	19,3%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	25.876.855	10.010.307	10.016.475	38,7%
Ministerio del Interior	1.550.000	3.250.000	3.235.818	3.235.818	99,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	550.000	550.000	78,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	73.793	73.793	73.793	100,0%
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	96.893.000	85.878.732	85.878.732	88,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	4.618.290.815	6.068.237.944	4.814.337.946	4.812.975.908	79,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	355.109.720	223.329.442	223.329.442	62,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	60.323.799	38.188.139	38.188.139	63,3%
Ministerio de Salud	28.294.244	28.574.213	23.489.324	23.489.324	82,2%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	12.441.362	4.138.852	4.138.852	33,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.263.544.000	1.121.259.319	1.121.259.319	88,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	7.915.220.686	6.324.491.672	6.323.135.802	79,9%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30//09/2006
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Economía y Producción				
<i>Formulación y Ejecución de Políticas Económicas</i>				
Asist.Financ.para el Dique y Central Hidroel. Los Caracoles	40.000.000	80.000.000	80.000.000	100,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	56.600.000	50.848.000	29.747.970	58,5%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Fondo Nacional de la Vivienda	582.200.000	580.200.000	508.100.826	87,6%
Mejoramiento Habitacional	16.000.000	31.400.000	9.210.044	29,3%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.736.075.027	2.317.175.027	1.948.200.592	84,1%
Acciones sobre Emergencia Habitacional	163.355.472	163.355.472	89.970.280	55,1%
<i>Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	15.262.000	13.917.800	7.635.544	54,9%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	112.261.001	131.761.001	107.259.152	81,4%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Obras Municipales				
Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia	0	29.259.536	29.259.536	100,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	29.693.285	45.933.749	34.751.107	75,7%
Asistencia Financiera para Infraestructura Social				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	66.936.714	187.206.407	129.562.031	69,2%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Transferencias a Empresas Privadas				
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	0	0	2.575.365	
Metrovías S.A.	83.944.726	61.944.726	84.709.257	136,7%
Trenes de Buenos Aires S.A.	59.714.000	59.714.000	110.706.757	185,4%
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.	33.879.900	33.879.900	7.044.955	20,8%
Transportes Metropolitanos General San Martin S.A.	6.714.000	6.714.000	0	0,0%
Ferrovías S.A.	52.776.000	45.776.000	4.625.494	10,1%
America Latina Logística Mesopotamica S.A.	0	0	366.000	
Ferroexpreso Pampeano S.A.	11.740.893	11.740.893	6.347.373	54,1%
Siemens S.A.	0	0	1.773.809	
Belgrano Cargas S.A.	5.742.357	5.742.357	4.265.172	74,3%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	0	19.502.748	
Mitre - interjurisdiccional	26.832.000	22.391.000	0	0,0%
Sin discriminar	0	0	5.975.228	
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Transferencias a Empresas Privadas	399.706.938	512.965.222	512.964.898	100,0%
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	475.737.000	701.313.000	461.396.660	65,8%
Transferencias a Gobiernos Provinciales para financiar gastos de capital	0	62.883.322	31.531.503	50,1%
Energías Renovables en Mercados Rurales GEF 20548 ARG	12.756.000	12.756.000	453.037	3,6%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.446.000	18.446.000	7.812.071	42,4%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	156.101.000	156.101.000	143.694.301	92,1%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Obras de Infr.Urbana en Municip.</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	0	90.000.000	11.082.399	12,3%
<i>Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	28.868.692	17.918.692	0	0,0%
<i>Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria</i>				
Transferencias a Universidades Nacionales	22.257.000	47.257.000	29.419.528	62,3%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	247.082.617	247.082.617	164.390.159	66,5%
<i>Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	114.477.000	114.477.000	84.096.583	73,5%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	0	147.414.099	123.816.807	84,0%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.520.000	2.520.000	0	0,0%
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.896.193	62.596.193	56.824.727	90,8%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.980.000	25.980.000	16.224.534	62,5%
Expansiones de Agua Potable y Cloacas con Cooperativas Trabajo				
Transferencias a Gobiernos Municipales	5.000.000	27.000.000	15.989.838	59,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente</i>				
Capacitación BID1345				
United Nations Office for Project Service	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Infraestructura y Equipamiento				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.528.000	25.528.000	8.765.417	34,3%
<i>Obras Escolares</i>				
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.000.000	35.000.000	32.272.138	92,2%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	2.158.272	2.158.272	302.042	14,0%
<i>Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	8.600.000	18.912.000	3.737.003	19,8%
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	28.000.000	0	0	
Transferencias al exterior United Nations Office for Project Service	0	25.466.470	24.210.263	95,1%
<i>Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica</i>				
Transformación de la Educación Técnico Profesional - BIRF S/Nº				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	177.485.000	187.764.500	115.983.248	61,8%
<i>Fortalecimiento de la Educación Básica, Polimodal y Superior Técnica No Universitaria</i>				
Transferencias a Instituciones de Enseñanza	14.943.000	14.943.000	5.180.240	34,7%
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	2.000.000	0	0	
United Nations Office for Project Service	4.500.000	9.000.000	4.500.000	50,0%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS				
<i>Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica</i>				
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	15.329.000	15.146.000	11.377.000	75,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social				
<i>Plan Jefes de Hogar</i>				
Extensión Proyecto de Protección Social - Préstamo BIRF 7157-AR	45.000.000	58.573.799	37.508.138	64,0%
Ministerio de Salud				

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30//09/2006
(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
<i>Atención de la Madre y el Niño</i>				
Seguro Universal de Maternidad e Infancia				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.504.437	21.914.690	17.618.103	80,4%
<i>Emergencia Sanitaria</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	0	3.600.700	3.600.700	100,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100,0%
<i>Empresas Públicas Sector Energía y Minería</i>				
Energía Argentina S.A.	107.300.000	28.000.000	8.941.667	31,9%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	155.549.000	114.000.000	73,3%
<i>Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital</i>				
Ente Binacional Yacyretá	0	48.000.000	30.600.000	63,8%
<i>Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital</i>				
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá - UESTY	221.000.000	0	0	
<i>Empresas Públicas Sector Comunicaciones</i>				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0%
<i>Asistencia Financiera a Provincias</i>				
Desarrollo Vial				
Administración central provincial	360.500.000	360.500.000	302.717.652	84,0%
TOTAL	6.541.452.524	7.807.226.444	6.274.099.896	80,4%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA/
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	828.225.117	543.292.794	947.950.989	947.883.839	15,0%
Provincia de Buenos Aires	1.562.566.122	2.229.244.130	1.854.390.125	1.854.008.954	29,3%
Provincia de Catamarca	117.872.889	124.151.060	73.760.895	73.755.412	1,2%
Provincia de Córdoba	254.910.772	281.474.927	195.739.683	195.632.623	3,1%
Provincia de Corrientes	93.419.102	141.696.933	86.394.291	86.386.169	1,4%
Provincia del Chaco	125.168.705	201.485.023	142.170.233	142.170.233	2,2%
Provincia del Chubut	140.605.400	124.597.096	161.579.368	161.534.765	2,6%
Provincia de Entre Ríos	163.671.133	196.600.833	114.197.643	114.169.748	1,8%
Provincia de Formosa	140.506.058	159.297.659	95.857.772	95.857.772	1,5%
Provincia de Jujuy	166.548.407	194.105.085	144.136.831	144.189.431	2,3%
Provincia de La Pampa	82.813.416	83.313.867	52.339.561	52.175.270	0,8%
Provincia de La Rioja	67.399.915	109.998.416	90.134.954	90.129.581	1,4%
Provincia de Mendoza	125.860.569	171.946.666	117.846.112	117.801.120	1,9%
Provincia de Misiones	128.724.075	175.486.510	141.578.516	141.568.626	2,2%
Provincia del Neuquén	70.771.375	89.191.557	67.124.785	67.112.246	1,1%
Provincia de Río Negro	103.707.632	102.042.130	118.348.354	118.293.975	1,9%
Provincia de Salta	112.761.230	150.694.540	126.913.496	126.728.541	2,0%
Provincia de San Juan	207.103.004	224.794.922	193.573.914	193.551.303	3,1%
Provincia de San Luis	53.061.917	72.885.952	36.395.552	36.395.552	0,6%
Provincia de Santa Cruz	328.865.208	316.642.223	357.115.324	356.990.067	5,6%
Provincia de Santa Fe	328.097.798	338.832.728	326.092.230	326.062.876	5,2%
Provincia de Santiago del Estero	161.177.523	139.176.235	95.793.535	95.706.942	1,5%
Provincia de Tucumán	202.471.865	231.439.094	160.713.217	160.686.466	2,5%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	75.921.369	68.176.778	68.521.214	68.521.214	1,1%
Interprovincial	924.754.188	1.294.292.710	490.852.724	490.852.724	7,8%
Nacional	59.721.789	65.757.282	0	0	0,0%
Binacional	0	77.259.536	59.859.536	59.859.536	0,9%
No Clasificado	7.244.000	7.344.000	5.110.818	5.110.818	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	7.915.220.686	6.324.491.672	6.323.135.802	100,0%
