


INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2006

INTRODUCCION


La Inversión Pública Nacional comprende todas aquellas erogaciones que realiza la Administración Nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

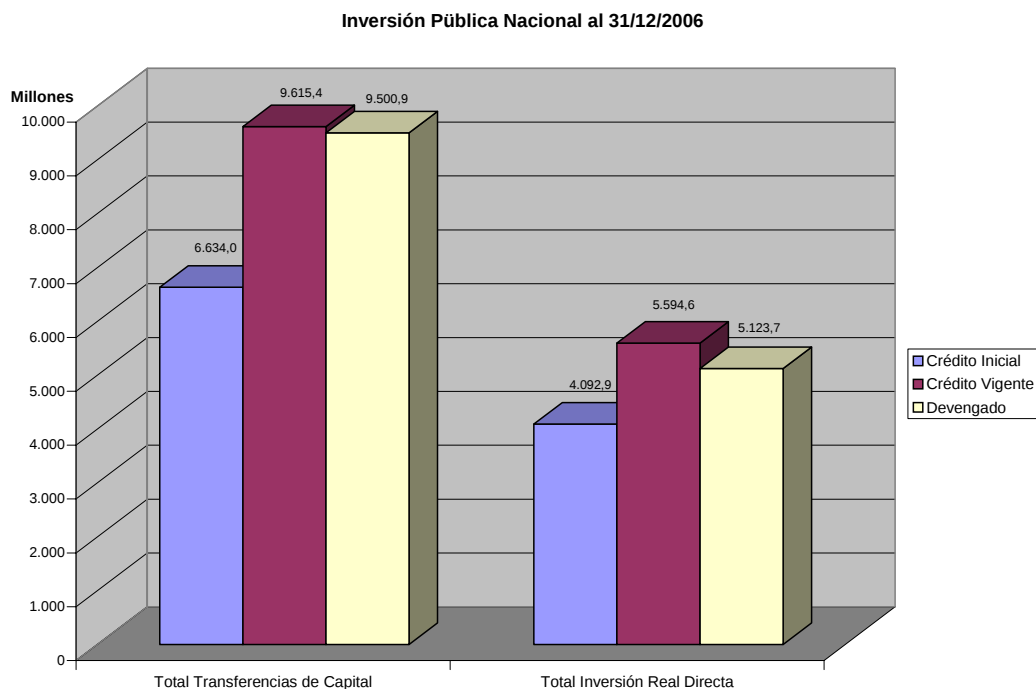

La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. La IRD tuvo un crédito inicial de 4.092,9 millones de pesos en el ejercicio 2006, que se incrementó en 1.945,6 millones de pesos al cierre del ejercicio (+47,5%). Los proyectos de inversión, principal componente de la Inversión Real Directa, dispusieron al 31/12/2006 de una asignación de 4.614,0 millones de pesos; mientras que para Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso se contó con un crédito de 980,6 millones de pesos.


Los proyectos de inversión incluyen los gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De los 4.614,0 millones de pesos asignados a este fin, 4.429,7 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de 4.238,9 millones de pesos al cierre del ejercicio), 52,9 millones de pesos a maquinarias y equipos y 109,3 millones de pesos a servicios no personales, con una ejecución de 51,1 y 96,1 millones de pesos respectivamente.

La Inversión Real Directa incluye también Adquisiciones de Bienes de Capital, categoría que puede desagregarse de la siguiente forma: 814,9 millones de pesos a maquinarias y equipos con una ejecución de 625,5 millones de pesos; 67,6 a edificios e instalaciones con una ejecución de 26,0 millones de pesos y 54,7 a activos intangibles con una ejecución de 30,6 millones de pesos.

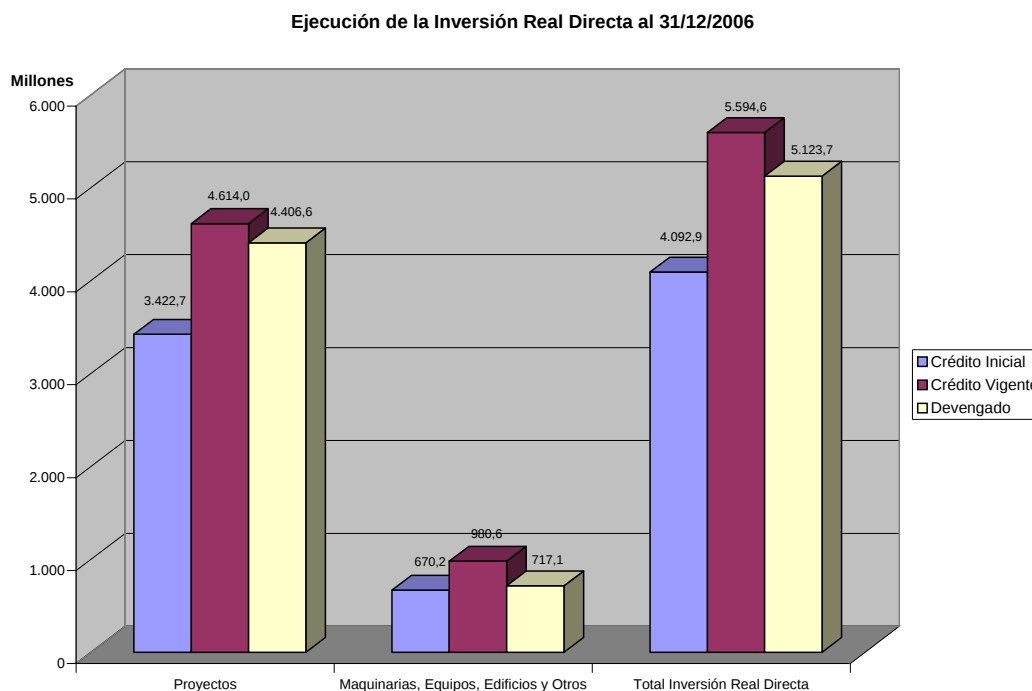

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). De los 9.615,4 millones de pesos destinados a transferencias de capital, la ejecución financiera al cierre del ejercicio fue de 9.500,9 millones de pesos.

Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/2006

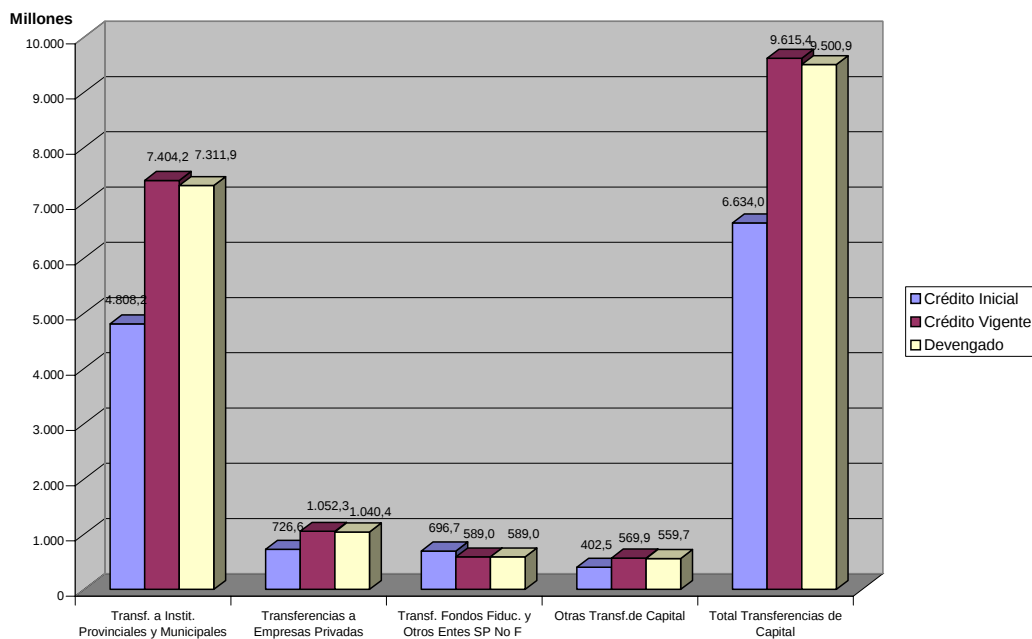


Respecto a las transferencias de capital, 7.311,9 millones de pesos del crédito devengado al 31/12/2006 (77,0% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, 1.040,4 millones de pesos (11,0% del total) fueron transferencias a empresas privadas, 589,0 millones de pesos (6,2% del total) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y el resto, 559,7 millones de pesos (5,8%) corresponden a otros tipos de transferencias.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2006

Al cierre del ejercicio 2006 la ejecución de la inversión real directa alcanzó a 5.123,7 millones de pesos, lo que implica un incremento de 80,1% respecto a igual período del año anterior. Si se compara la ejecución al cierre del 2005 respecto al mismo período de 2004 el aumento alcanzó al 70,7%; y este último año respecto al ejercicio 2003 en 108,4%. El incremento acumulado de la inversión real directa, entre el cierre del 2003 y el mismo período de 2006 fue, en consecuencia, de 540,6%.

Inversión Real Directa - Devengado al 31-12-2006

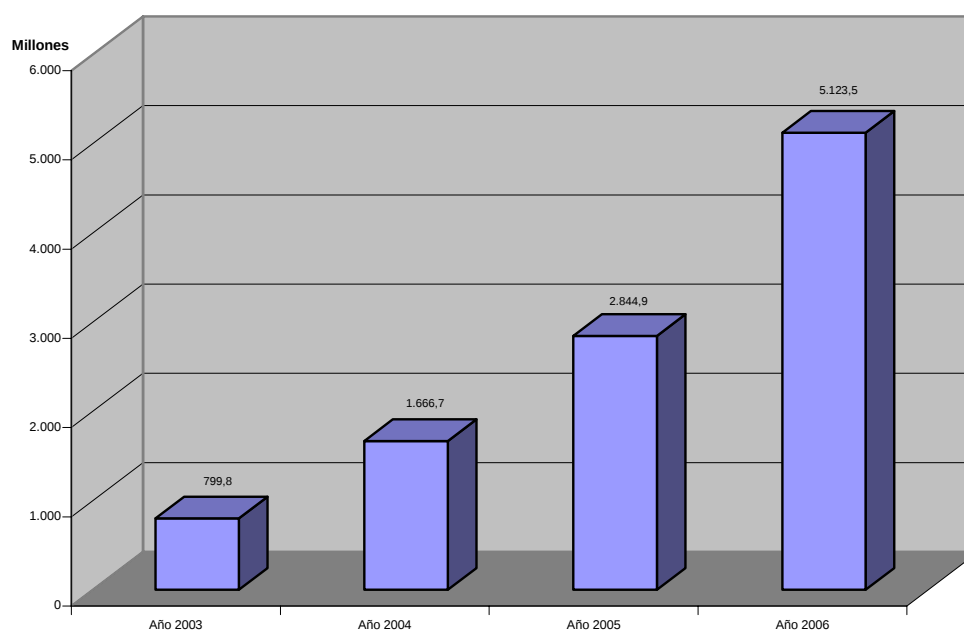

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la Inversión Real Directa al cierre del ejercicio 2006 se incrementó en 1.501,7 millones de pesos de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el Cuadro N° 1, lo que representa un incremento de 36,7 % del total.

Cuadro N° 1
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/2006
(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	1.247.802.356	1.142.806.761	885.763.070	77,5%
Organismos Descentralizados	2.819.844.659	4.418.508.103	4.219.807.012	95,5%
Instituciones de Seguridad Social	25.254.000	33.254.000	18.122.974	54,5%
TOTAL	4.092.901.015	5.594.568.864	5.123.693.056	91,6%

El crédito asignado originalmente a los proyectos de inversión, por su parte, registró un aumento de 1.181,3 millones de pesos (+34,6%) al cierre del ejercicio 2006, mientras que el gasto en adquisición de bienes de uso aumentó en 320,4 millones de pesos (+47,1%).


En la Administración Central, los servicios que concentraron la mayor ejecución de la inversión fueron: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con 418,1 millones de pesos, Estado Mayor General del Ejército con 59,6 millones de pesos, Estado Mayor General de la Armada con 56,4 millones de pesos, Policía Federal Argentina con 38,5 millones de pesos y Ministerio del Interior con 55,4 millones de pesos (administración civil de las fuerzas de seguridad con 53,0 millones de pesos).

A nivel de Organismos Descentralizados la inversión se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad con 3.440,0 millones de pesos. También resultó relevante la inversión realizada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, con 308,8 millones de pesos, el Órgano de Control de Concesiones Viales con 209,1 millones de pesos y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con 36,4 millones de pesos.

2-Según Fuente de Financiamiento

El financiamiento de la Inversión Real Directa proveniente del Tesoro Nacional aumentó considerablemente al cierre del ejercicio 2006 respecto al mismo período del 2005; mientras que en el presente ejercicio alcanzó al 64% del total de la inversión, al cierre del ejercicio 2005 fue del 41% del total. Por su parte, las transferencias internas pasaron a financiar el 18% de la Inversión Real Directa frente al 36% que alcanzaban al cierre del ejercicio 2005.

Inversión Real Directa-Comparativo 2005/2006-Fuente de Financiamiento

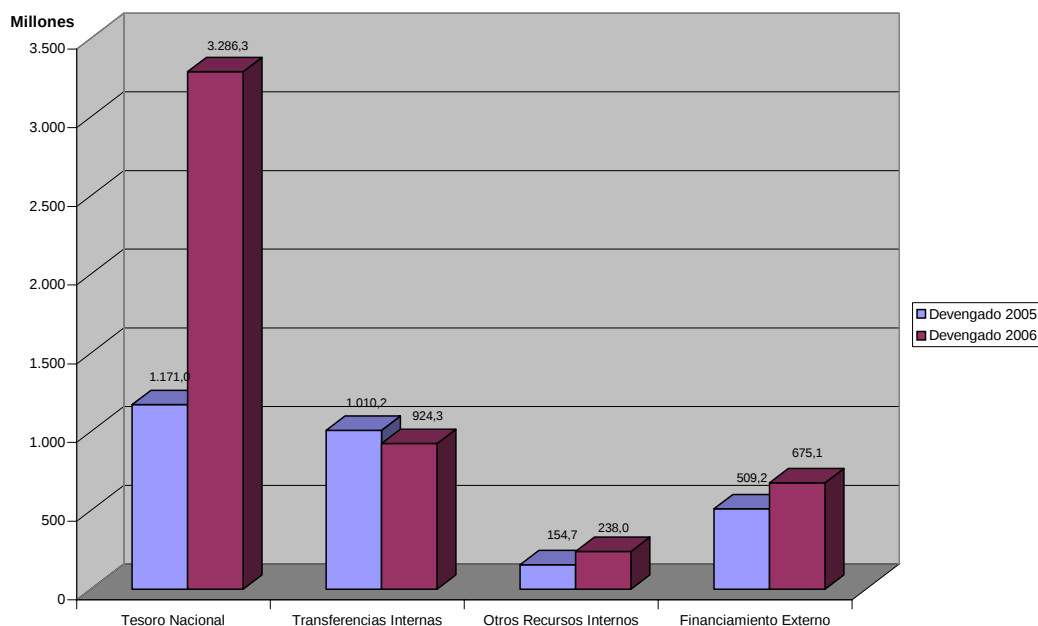

Al cierre del ejercicio 2006 el aumento del financiamiento del Tesoro Nacional respecto 2005 fue de 2.115,4 millones de pesos (+181%). Por su parte, el financiamiento externo se incrementó en 165,9 millones de pesos (+33%), los otros recursos internos en 83,3 millones de pesos (+54%) y las transferencias internas disminuyeron en 85,8 millones de pesos (-8%).

Cuadro N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/2006
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	1.669.596.510	3.371.558.910	3.286.335.381	97,5%
Transferencias Internas	1.009.911.000	1.017.375.300	924.349.774	90,9%
Otros Recursos Internos	392.722.842	400.302.619	237.955.963	59,4%
Financiamiento Externo	1.020.670.663	805.332.035	675.051.938	83,8%
TOTAL	4.092.901.015	5.594.568.864	5.123.693.056	91,6%


De los 3.286,3 millones de pesos correspondientes al Tesoro Nacional ejecutados al cierre del ejercicio 2006, 2.048,3 millones de pesos financiaron la inversión en la Dirección Nacional de Vialidad (actividades de conducción y administración, mantenimiento, construcciones y contratos de recuperación y mantenimiento por 5,7; 246,3; 1.554,1 y 242,2 millones de pesos, respectivamente), 80,7 millones de pesos el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II, 26,9 millones de pesos el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula, 28,4 millones de pesos el Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela y 15,1 millones de pesos el proyecto Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El Tesoro Nacional también financió la inversión en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento por 308,7

millones de pesos, en el Organo de Control de las Concesiones Viales por 150,2 millones de pesos, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales por 47,4 millones de pesos, en el Estado Mayor General del Ejército por 47,1 millones de pesos y en la Policía Federal Argentina por 36,1 millones de pesos.

Respecto a la ejecución de la Inversión Real Directa con fuente de financiamiento Transferencias Internas, se incluyen los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organo de Control de Concesiones Viales, que se ejecutaron con transferencias provenientes del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte de 852,8 millones de pesos y 58,8 millones de pesos, respectivamente.

La Inversión Real Directa con fuente de financiamiento externa se concentró en los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad: el programa Construcciones con 171,0 millones de pesos, el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento con 366,2 millones de pesos, y en menor medida, el financiamiento otorgado al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires (Préstamo BIRF 4163/AR Etapa II) por 55,5 millones de pesos y para la Construcción Alteo Terraplén Viaducto La Picasa por 15,9 millones de pesos.

Inversión Real Directa- Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 31/12/2006

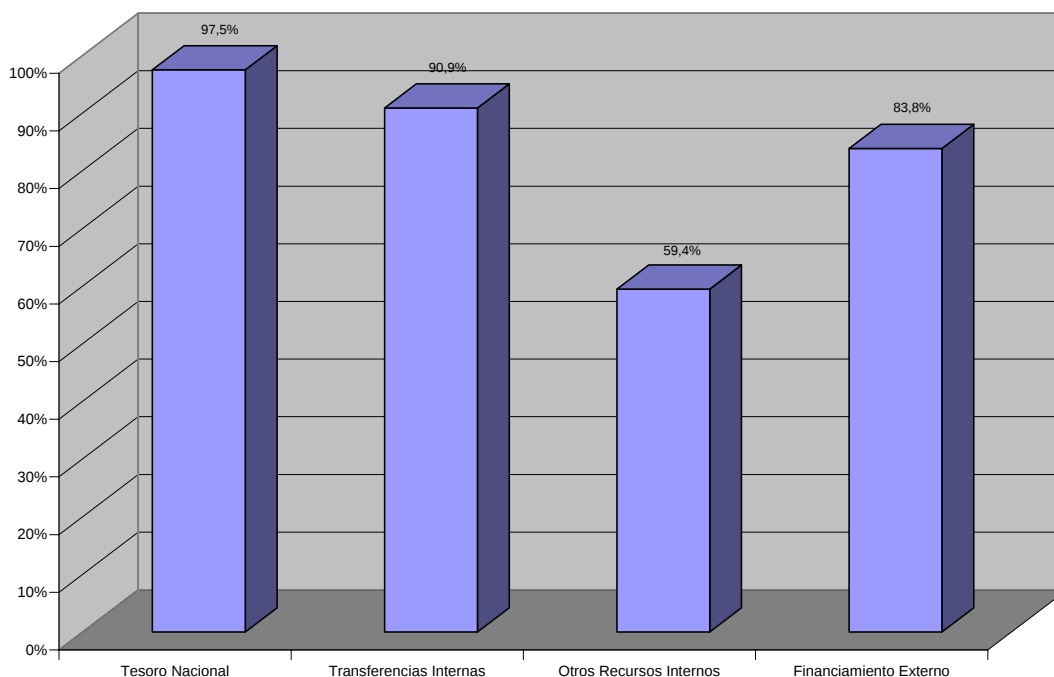

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa se concentró, aproximadamente, en un 52% en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba, Santa Fe, Formosa, Río Negro y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los 820,9 millones de pesos incluyendo, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por 419,5 millones de pesos, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento por 128,9 millones de pesos y del Organo de Control de Concesiones Viales por 99,5 millones de pesos. Además, son importantes los proyectos Desagües Pluviales Red de Accesos a Capital Federal y Hospital El Cruce Florencio Varela por 16,3 y 28,3 millones de pesos, respectivamente.

La ciudad de Buenos Aires tuvo una inversión de 695,6 millones de pesos; principalmente destinados al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II por 173,1 millones de pesos. En esta jurisdicción debe aclararse que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados de esa manera debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

En la provincia de Santa Cruz se invirtieron 232,7 millones de pesos (4,5% de inversión sobre el total ejecutado), los que se aplicaron, principalmente, en construcciones viales (202,2 millones de pesos) y en mantenimiento vial (28,1 millones de pesos).

En cuanto a la provincia de Córdoba la inversión se concentró, fundamentalmente, en construcciones de rutas por 221,7 millones de pesos; destacándose los montos devengados en la R.N.Nº 9 Autopista Rosario Córdoba por 144,8 millones de pesos y R.N.Nº 9 Villa María-Pilar por 24,6 millones de pesos. Además, tuvo una importante ejecución el proyecto Colectores Cloacales, Estación de Elevación y Planta Depuradora del Lago San Roque en Carlos Paz (Córdoba) con 24,5 millones de pesos, correspondiente al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento.

En la provincia de Santa Fe, los principales proyectos en ejecución corresponden a construcciones viales por 196,7 millones de pesos. Comprenden las obras del Corredor Vial 3 I y III Etapa en R.N.Nº 11, AOO9 y A012 (40,1 millones de pesos), las obras del Corredor Vial 5 I Etapa en R.N.Nº 34 (22,1 millones de pesos), Variante Laguna La Picasa (40,0 millones de pesos) y R.N.Nº 34 Cruce Urbano Ciudad de Rafaela (15,3 millones de pesos). Asimismo, los proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) ejecutaron 13,8 millones de pesos.

Respecto a la provincia de Formosa la inversión se concentró en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Fundamentalmente, el proyecto R.N.Nº 81 Las Lomitas-Límite con Salta-Empalme R.N.Nº 34 con 75,8 millones de pesos, Corredor Nº 28 en R.N.Nº 11 tramo Resistencia Límite con Paraguay con 25,0 millones de pesos y R.P.Nº 2 –Empalme R.N.Nº 11 Riacho He He con 19,2 millones de pesos. Asimismo, los proyectos correspondientes a contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (mallas viales) ejecutaron 22,2 millones de pesos.


En la provincia de Río Negro la inversión se dirigió, principalmente, a financiar los proyectos de los programas Contratos de Recuperación y Mantenimiento (mallas viales) por 87,9 millones de pesos y construcciones de la Dirección Nacional de Vialidad por 60,4 millones de pesos; en este último caso fue importante la ejecución en el proyecto R.N.Nº 23 en el tramo Valcheta Pilcaniyeu por 56,2 millones de pesos.

Teniendo en cuenta los datos del Censo Poblacional del año 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la extensión territorial de cada jurisdicción se construyó un indicador de gasto de inversión real directa según densidad poblacional (habitante/km²)

El indicador de inversión real directa según densidad poblacional surge de la fórmula:

$$= \text{Inversión Real Directa} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \text{habitantes} / \text{Km}^2$$

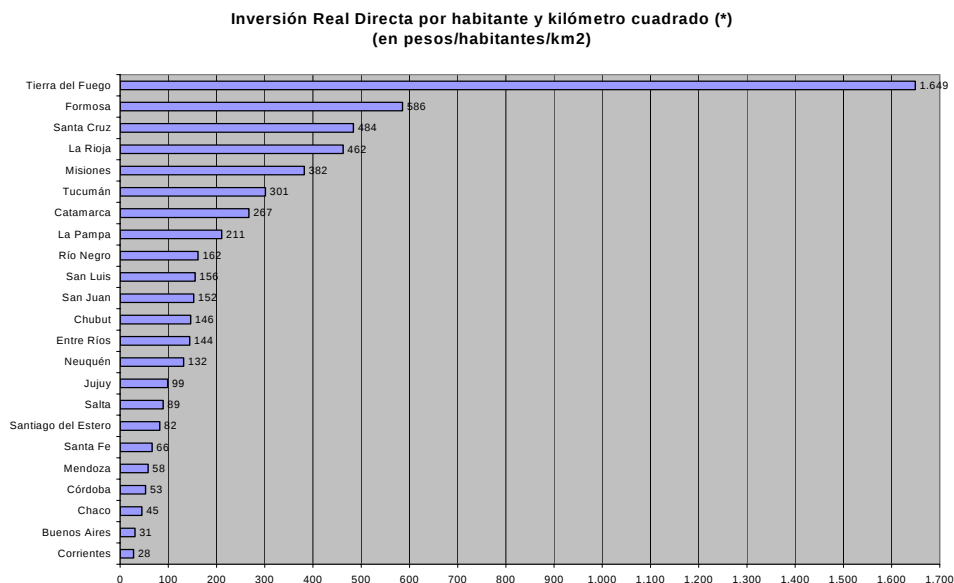

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala

De acuerdo a este indicador la Ciudad de Buenos Aires y la isla de Tierra del Fuego presentan los valores más elevados. Por su parte, la provincia de Corrientes tiene el menor valor seguido por Buenos Aires, provincia que posee el mayor número de habitantes y la mayor extensión geográfica.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este capítulo se hace referencia a la ejecución física de proyectos de inversión. Para ello se tomó un subconjunto que representa el 93,8 % del costo total de la cartera de inversión y 72,88%, aproximadamente, de la ejecución total al cierre del ejercicio. Cabe destacar que los proyectos mencionados tienen gran relevancia económica y un importante impacto social.

Servicio Administrativo	Programas/Proyectos	Costo Total	Crédito Devengado al 31/12/2006	% s/total Inversión Real Directa
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Construcciones de Rutas	13.336.832.000	2.328.566.817	45,45%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento	5.659.489.000	857.703.696	16,74%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Mantenimiento de Rutas	618.109.000	246.324.761	4,81%
Secretaría de Transporte	Transporte Urbano de Buenos Aires	4.361.904.566	164.384.793	3,21%
CONAE	Misiones Satelitales	458.011.350	57.356.194	1,12%
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	116.400.000	29.915.682	0,58%
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	80.000.000	28.372.756	0,55%
Secretaría Obras Públicas	Alviador Holmberg-Villa Martelli	164.865.000	12.326.042	0,24%
CONAE	Infraestructura Terrestre	76.464.782	6.736.183	0,13%
CNEA	Residuos Radiactivos de Baja Actividad Fase 2	58.123.000	2.256.642	0,04%
Subtotal		24.930.198.698	3.733.943.566	72,88%
Total Inversión Real Directa		26.587.012.691	5.123.500.000	100,00%

Organismos Descentralizados

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tuvo a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional. Para este fin se han establecido diferentes sistemas de gestión que obedecen al nivel de tránsito de las rutas:

COMPOSICION DE LA RED VIAL (KM) COMPARATIVO AL IV TRIMESTRE 2005/2006

SISTEMA	Ejec. Año 2005- al IV Trimestre	Ejec. Año 2006- al IV Trimestre
Longitud total de la red	38.336	38.154
Contratos Recup. y Manten. C.Re.Ma.	9.350	9.817
Concesión	8.799	8.895
Transf. Funciones Operativas (TFO)	7.202	7.145
Mantenimiento Administración Propia (*)	7.248	6.525
Obras (Construcciones)	2.556	5.168
Sistema Modular	1.855	1.601
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626
Red Accesos a ciud. Bs.As - R.A.B.A.	236	290
Red Accesos a ciud. Córdoba – R.A.C.	270	276
Sistema Km./Mes	195	195

(*) se incluyen en el año 2006 intervenciones en rutas provinciales por 696 km.

A continuación se detalla el avance físico al 31 de diciembre para cada programa y subprograma presupuestario:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad, durante el cuarto trimestre, efectuó mantenimiento de rutas en forma directa, en 6.525 kilómetros. Se efectuaron trabajos en la Red Vial no incorporados a los otros sistemas de gestión. En este sistema la Dirección Nacional de Vialidad utiliza equipos y mano de obra propia.

-Mantenimiento Sistema Km/mes

Por medio del sistema kilómetro-mes (km-mes) está en ejecución el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André en Rutas N.º 40N-7-142 con 194,66 kilómetros de longitud.

-Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (T.F.O)

En el sistema Transferencia de Funciones Operativas (T.F.O.) se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros bajo esta modalidad alcanzaron los 7.145 al cuarto trimestre. Finalizó el tramo El Remanso-El Solitario y Acceso al Remanso en la R.N.º 86 con 144,6 km en la provincia de Formosa.

-Señalamiento de Rutas

En el subprograma Señalamiento Horizontal se finalizaron trabajos en 3.247 kilómetros.

-Obras de Emergencia

Se realizaron 5 obras de emergencia al cierre del cuarto trimestre; mientras que están en ejecución trabajos en 16 obras.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el cuarto trimestre, incluyen la ejecución de trabajos en 1.601 kilómetros. Comprenden los siguientes tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en Kilómetros
Ruta Nacional N° 34/81	Empalme R.N.º 50 - Límite Bolivia/Pluma de Pato – Empalme R.N.º 34	Salta	258,9
Ruta Nacional N° 25	Los Altares - Empalme Ruta N.º 40 (S)	Chubut	277,6
Ruta Nacional N° 16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
Ruta Nacional N° 40S	Empalme R.N.º 25 - Empalme R.P.º 56	Chubut	289,0
Ruta Nacional N° 16	Empalme R.N.º 95 - Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
Ruta Nacional N° 40S	Pareditas – Malargüe	Mendoza	229,6

A007	Av.B.Parera- A. Nivel R.N.Nº 11-A. Nivel Santa Fe	14,4
	R.N.Nº 11- C.J/Garay	
Total en Ejecución		1.600,5

Durante el año 2006 se finalizó el tramo Tinogasta-Límite con Chile en la R.N.Nº 60 con 254,2 kilómetros en la provincia de Catamarca.

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

En cuanto a los Pasos Fronterizos y Corredores de Integración, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio, están en ejecución los tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.N.Nº 40	Malargüe – Barrancas Sección I y II	Mendoza	36
R.N.Nº 14	Guauguaychú-Paso de los Libres Sección Intersección Empalme R.P.Nº 16 – Intersección Empalme R.P.Nº 20 y Sección Empalme R.P.Nº 20 – Empalme R.P."J" (Colonia Elía)	Entre Ríos	46
R.N.Nº 40	Río Agua Clara km 809-El Eje km 847	Catamarca	38
R.N.Nº 16	Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos-El Caburé	Santiago del Estero	29
Total en Ejecución			149

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizó el tramo R.N.Nº 98 Vera-Tostado (Km. 77- Km 123,4) en la provincia de Santa Fe con 46,4 kilómetros, R.N.Nº 145 Bardas Blancas-Hito Pehuenche con 22,9 kilómetros y R.N.Nº 25 Puente sobre Río Chubut y acceso a Rawson con 140 metros. Al cierre del ejercicio 2006 están en ejecución obras en 636 kilómetros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.P.Nº 23	Pte.s/R. Las Vueltas - Va.Tur.El Chaltén; Acc.Bahía Túnel	Santa Cruz	23,2
R.N.Nº 143	Emp. RPNº 10 - Santa Isabel	La Pampa	14,4
R.N.Nº 7	Uspallata - Lte. c/Chile	Mendoza	0,5
S/N	Acceso a Ranchos desde RPNº 29	Buenos Aires	1,8
R.N.Nº 7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Mendoza	3,2
R.P.Nº 43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	Santa Cruz	90
R.N.Nº 81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Formosa	25
R.P.Nº 43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Santa Cruz	78
R.N.Nº 3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Tierra del Fuego	25

R.P.Nº 510	Valle Fértil - Los Baldecitos	San Juan	54,6
R.N.Nº 168	Acc.a Cdad de Sta Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Santa Fe	11
Varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	104
Total km finalizados			430,7

Además, están en ejecución 2.693 kilómetros correspondientes a obras de mejoramiento y reposición de rutas.

-Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

El Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes comprende trabajos de reparación de obenques en puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas con 1.200 metros en R.N.Nº 12, puente sobre Río Gallegos en el tramo Río Gallegos - Güer Aike con 90 metros en R.N.Nº 3, R.N.Nº 123 Puente nuevo en Tramo Arroyo Batel y Batelito con 70 metros y R.N.Nº 34 San Pedro-Calilegua Puente sobre Río San Lorenzo con 330 metros.

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Lte.c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Emp.R.N.Nº 5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al nivel establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años. La fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2008.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprenden la finalización de los siguientes tramos:

Ruta	Tramo	Provincia	Km
R.N.Nº 34	CVN 5 - Obra Nº 25 - Emp.R.P.Nº 65 - Emp. R.P.Nº 66	Santa Fe	43
R.N.Nº 34	CVN 5 - Obra Nº 20 - Emp. 2 Circ.de Rosario – R.P.Nº 65	Santa Fe	52
R.N.Nº 5	CVNº 2 - Obra Nº 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	Buenos Aires	17
A009	CVNº 3 – Obra Nº 12 Puerto Reconquista Empalme R.N.Nº11	Santa Fe	12
R.N.Nº 11	CVNº 3 - Obra Nº 15 - Emp. R.N.Nº 168 - Emp. R.P.N 39	Santa Fe	131
R.N.Nº 9	CVNº 3 - Obra N 2 - Ex RNN 191 – R.N.Nº A012	Santa Fe	90
R.N.Nº 11	CVNº 3 – Obra N 16B Empalme R.N.Nº 98- Empalme R.P.Nº40	Santa Fe	50
Total km finalizados			395

Asimismo, al cierre del ejercicio están en ejecución 962 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

- Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.):

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 107 A – Chubut	124,5
Malla 107 B – Chubut	140,7
Malla 111 – Neuquén	134,7
Malla 113 – Chubut	201,2
Malla 114 - Río Negro	141,9
Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
Malla 201 B - Buenos Aires	104,8
Malla 206 - Buenos Aires	167,1
Malla 208 - Buenos Aires	258,3
Malla 211 - Buenos Aires	139,9
Malla 401 B – Salta	114,8
Malla 502 - Entre Ríos	271,4
Malla 506 - Entre Ríos	259,2
Malla 508 – Chaco	222,3
Malla 510 - Entre Ríos	173,0
Malla 512 A – Corrientes	84,3
Malla 512 B – Corrientes	113,5
TOTAL	2.835,2

En cuanto al C.Re.Ma.I al cierre del ejercicio se finalizaron los tramos: R.N.º 98 Empalme R.N.º 11- km 123,4 correspondiente a la Malla 209 A – Santa Fe con 123,4 kilómetros de extensión, R.N.N 89 Yuchán Empalme R.N.º 34 de la Malla 405 B- Santiago del Estero con 79,7 kilómetros, R.N.º 123-14-122 Empalme R.N.º 117- Empalme R.P.º 155- Km139,00- Empalme R.N.º 14-Empalme R.N.º 14- Yapeyú de la Malla 501- Corrientes con 144,65 kilómetros, R.N.º 89 Acceso Gral. Pinedo - Límite con Santiago del Estero / Límite con Chaco – Yuchán de la Malla 405^a - Chaco con 178,63 kilómetros y R.N.º 40N-68 Empalme R.P.º 307-San Carlos/Empalme R.N.º 40N de la Malla 401 A Salta Tucumán con 142,27 kilómetros.

En cuanto al C.Re.Ma. II las obras en ejecución alcanzan a 2.284 kilómetros. Las mallas en ejecución son los siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	138,0
Malla 116 B - La Pampa	113,9
Malla 117 A - La Pampa	111,3
Malla 117 B - La Pampa	158,3
Malla 123 B - Río Negro	145,2
Malla 131 - Neuquén	104,5
Malla 202 A - Santa Fe	27,9
Malla 202 B - Santa Fe	95,7
Malla 215 - Buenos Aires	69,2
Malla 216 A - Buenos Aires	72,7
Malla 216 B - Buenos Aires	71,9
Malla 306 - San Juan	313,8
Malla 314 - Mendoza/San Luis	161,5
Malla 338 - Formosa	171,0
Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	114,6
Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	166,7
Malla 408 C - Catamarca	171,9
Malla 409 A - Tucumán	75,3
TOTAL	2.283,4

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzan 3.690 kilómetros y son las siguientes:

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III	
Malla	Longitud en kilómetros
Malla 102 A - Chubut	250,4
Malla 102 B - Chubut	230,4
Malla 103 - Río Negro	163,8
Malla 104 - La Pampa	128,5
Malla 108 A - Río Negro	146,5
Malla 109 - Neuquén	291,2
Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	334,0
Malla 301 - San Luis	253,8
Malla 302 - San Juan	286,1
Malla 312 - Mendoza	223,3
Malla 332 - San Juan	105,3
Malla 402 A - Sgo. del Estero	96,7
Malla 402 B - Santiago del Estero	120,9
Malla 404 - Jujuy - Salta	148,8
Malla 407- Sgo del Estero – Catamarca - Tucumán	151,9
Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	127,9
Malla 509 - Entre Ríos	151,8
Malla 513 A - Entre Ríos	90,3
Malla 513 B - Entre Ríos	99,9
Malla 606 - Chubut	159,7
TOTAL	3.690,6

En el cuarto trimestre estuvieron en ejecución las siguientes mallas correspondientes al C.Re.Ma. IV:

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 309 – La Rioja	300,8
Malla 513 C – Entre Ríos	86,0
Malla 501 – Corrientes Yapeyú	144,7
Malla 313 B - Mendoza	238,6
Malla 303 – La Rioja	237,9
TOTAL	1.008

Administración Central

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires devengó al cierre del ejercicio 136,2 millones de pesos, un 35,5% del costo total, la ejecución física acumulada es del 60,4% y la ejecución física al final de ejercicio fue de 16,8%.

Se continuaron con los trabajos de modernización de líneas subterráneas y en distintas líneas ferroviarias, como así también diversas obras de paso a diferente nivel.

Programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y Vías Navegables

El puerto de Caleta Paula se encuentra ubicado próximo a la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

Este proyecto comprende la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste en un frente de 160 mts medidos en sentido Norte–Sur, y una longitud de 150 mts medidos en sentido Este–Oeste, y una obra de control de deriva litoral en lado sur del acceso al puerto.

Al cierre del ejercicio devengó 27,6 millones de pesos, un 23,1% del costo total y el 97,2% del crédito vigente. La ejecución física al cierre del ejercicio fue del 3,5%.

Organismos Descentralizados

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE continuó durante el ejercicio, con su plan de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014. Para ello trabaja asociada a la contratista INVAP S.E, quien se encarga de la construcción de los satélites del Plan, como así también de las pruebas de ensayo. La CONAE también cuenta con el apoyo de otros entes del Sistema Científico Tecnológico, que cooperan en diferentes desarrollos tales como: Comisión Nacional de Energía Atómica, Instituto Argentino de Radioastronomía, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A., de Córdoba. También se continuó con la adaptación de los satélites a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) con un acuerdo entre CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI).

Los proyectos relevantes de la CONAE son Infraestructura Terrestre con una ejecución física acumulada del 49,3% y una ejecución al cierre del ejercicio 2006 de 10,1%, y Misiones Satelitales con un avance físico acumulado de 61,6% y una ejecución física al cierre del ejercicio de 7%.

Se observó un incremento del gasto como consecuencia de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Nº 1.777) destinado al financiamiento parcial del proyecto satelital SAOCOM 1-A y B y a la misión SAC-D / Aquarius.

Las misiones satelitales en curso son:

	MISION	SOCIOS
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/ Francia
CESAR	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

CONAE ha definido dos familias de misiones satelitales, según los instrumentos argentinos principales que llevan a bordo:

- Serie SAC con instrumentos argentinos centrados en el rango óptico.

Han cumplido su misión los satélites SAC A (Misión tecnológica) y SAC B (Astrofísica), encontrándose en operación el satélite SAC C.

Se encuentran en desarrollo los satélites SAC D /Acuarius, SAC E /SABIA y SAC-F/ALSAT-2.

- Serie SAOCOM con instrumentos argentinos centrados en el rango de microondas (radar).

La misión SAOCOM contempla 4 plataformas, 1 A/B y 2 A/B, donde las componentes A/B son básicamente similares mientras que la serie 2 tiene los correspondientes avances tecnológicos como resultado de las misiones anteriores. Se encuentra en desarrollo el SAOCOM 1.

Los satélites SAC-A, SAC-B y SAC-C fueron concebidos por la CONAE y construidos totalmente en nuestro país con la participación de la empresa INVAP SE, como contratista principal. Los satélites SAOCOM y SAC-D, actualmente en construcción, también cuentan con INVAP como contratista principal.

Organismos Descentralizados

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Al cierre del ejercicio 2006, se fortalecieron las áreas de exploración de yacimientos y la infraestructura para la explotación que servirá para el abastecimiento de las centrales con uranio nacional. Con este fin se profundizó en la exploración de Cerro Solo. También se continuó la línea de investigación aplicada en reactores nucleares, para su utilización nacional y para su exportación como reactores de alta tecnología.

Se está avanzando en los desarrollos y la investigación aplicada vinculados a la construcción de las nuevas centrales nucleares.

Se avanzó en los componentes de seguridad de los proyectos relacionados a residuos radiactivos de baja actividad y se continúan los desarrollos para el tratamiento de los de alta.

Administración Central

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Programa Recursos Hídricos

Se inauguró la Obra Aliviador Holmberg Villa Martelli y se culminaron los trabajos en la Obra Aliviador Cildañez, debiendo realizarse una redeterminación de precios que quedará para ejecutarse financieramente durante el ejercicio 2007.

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El Hospital Interzonal El Cruce, de Florencio Varela, es un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorio externo.

El programa médico asistencial que se propone ha sido diseñado como un establecimiento polivalente de agudos con posibilidad de dar respuesta a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondiente al 3° nivel de atención de salud, de la población de su área programática: los distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.

Al cierre del ejercicio devengó 28,4 millones de pesos.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2006

1-Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/12/2006


(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Administración Central	6.535.377.116	9.178.041.968	9.064.909.229	98,8%
Organismos Descentralizados	98.573.462	437.400.424	435.993.874	99,7%
TOTAL	6.633.950.578	9.615.442.392	9.500.903.103	98,8%

Dentro de la Administración Central, fueron relevantes las transferencias para acciones de Planes Federales de Vivienda (3.036,8 millones de pesos), para la formulación y ejecución de la política energética (1.518,5 millones de pesos), las transferencias realizadas al gobierno de la provincia de Buenos Aires conforme la Ley N° 24.621 (650,0 millones de pesos), para el Fondo Nacional de la Vivienda (693,9 millones de pesos), las transferencias a los gobiernos provinciales para desarrollo vial (415,9 millones de pesos), Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (320,7 millones de pesos), a gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social (261,5 millones de pesos), asistencia financiera para obras municipales (50,6 millones de pesos), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (185,5 millones de pesos), Trenes de Buenos Aires S.A. (218,5 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios- PROMEBA (158,5 millones de pesos), Acciones sobre Emergencia Habitacional (146,6 millones de pesos), a Metrovías S.A. (156,6 millones de pesos), para atención de emergencias por inundaciones (122,9 millones de pesos), Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (155,4 millones de pesos), Extensión del Proyecto de Protección Social (Préstamo BIRF 7157-AR) (23,6 millones de pesos) y la Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos). También fueron importantes las transferencias para infraestructura y equipamiento y para transformación de la educación técnico profesional efectuadas por el Ministerio de Educación (137,6 y 186,7 millones de pesos, respectivamente) y para el Ente Binacional Yacyretá (48,0 millones de pesos).

En cuanto a los organismos descentralizados, las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad para construcción de rutas por convenio

con provincias (247,7 millones de pesos) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento para obras de saneamiento (145,7 millones de pesos).

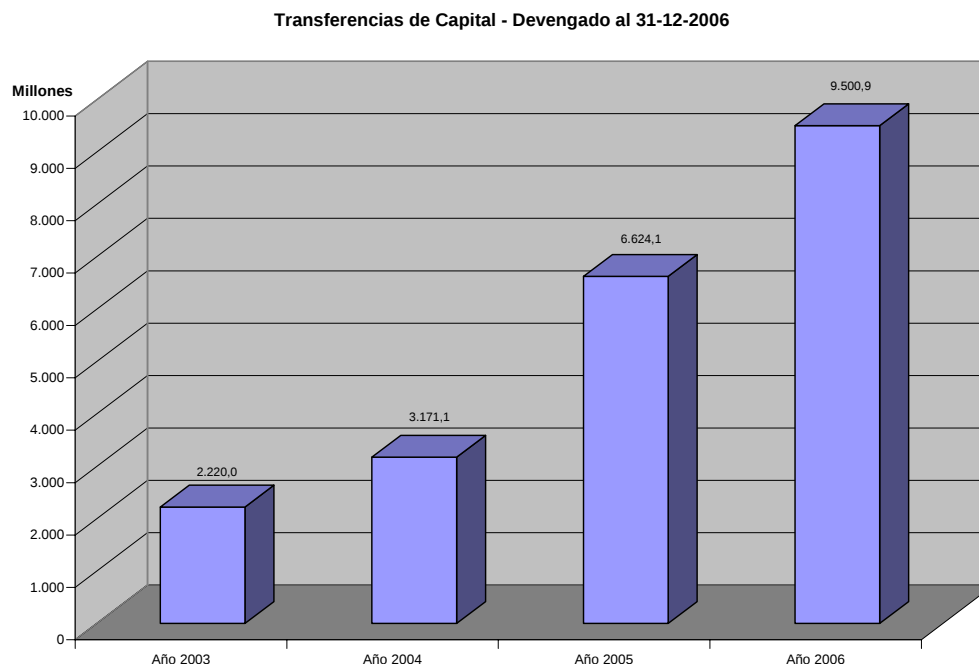

Al igual que en la inversión real directa, las transferencias de capital tuvieron un importante aumento nominal desde el año 2003, según se observa en el gráfico anterior. Las transferencias de capital al cierre del ejercicio 2006 tuvieron un aumento de 2.876,8 millones de pesos, respecto al mismo período de 2005 (+43,4%). Si se compara el ejercicio 2006 respecto al 2003 el incremento en las transferencias alcanza a 328,0%.


2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 2
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/12/2006
(en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Tesoro Nacional	4.166.695.230	6.252.413.643	6.241.062.341	99,8%
Recursos con Afectación Específica	1.925.862.000	2.005.467.115	1.964.058.916	97,9%
Otros recursos internos	29.698.494	209.473.716	208.184.651	99,4%
Financiamiento Externo	511.694.854	1.148.087.918	1.087.597.195	94,7%
TOTAL	6.633.950.578	9.615.442.392	9.500.903.103	98,8%

Desde el punto de vista de la clasificación del gasto por fuente de financiamiento los recursos del tesoro nacional financiaron el 66% de las transferencias. Este subconjunto comprende, fundamentalmente, las transferencias para Planes Federales de Vivienda (2.752,1 millones de pesos), Fondo Fiduciario para Transporte Eléctrico Federal (539,0 millones de

pesos), para formulación y ejecución de la política energética a agentes privados (350,0 millones de pesos), para gobiernos provinciales para el mismo concepto anterior (182,7 millones de pesos), para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario (414,4 millones de pesos; principalmente a Trenes de Buenos Aires S.A. y Metrovías), Asistencia Financiera para Infraestructura Social en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (261,5 millones de pesos), transferencias de la Dirección Nacional de Vialidad para obras por convenio con provincias (247,7 millones de pesos), para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (185,5 millones de pesos), la Asistencia Financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (104,2 millones de pesos), para acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (108,5 millones de pesos), para Mejoramiento de Barrios (91,0 millones de pesos), para equipamiento e infraestructura escolar (73,8 millones de pesos), para la Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia (29,3 millones de pesos) y acciones sobre Emergencia Habitacional (122,9 millones de pesos).

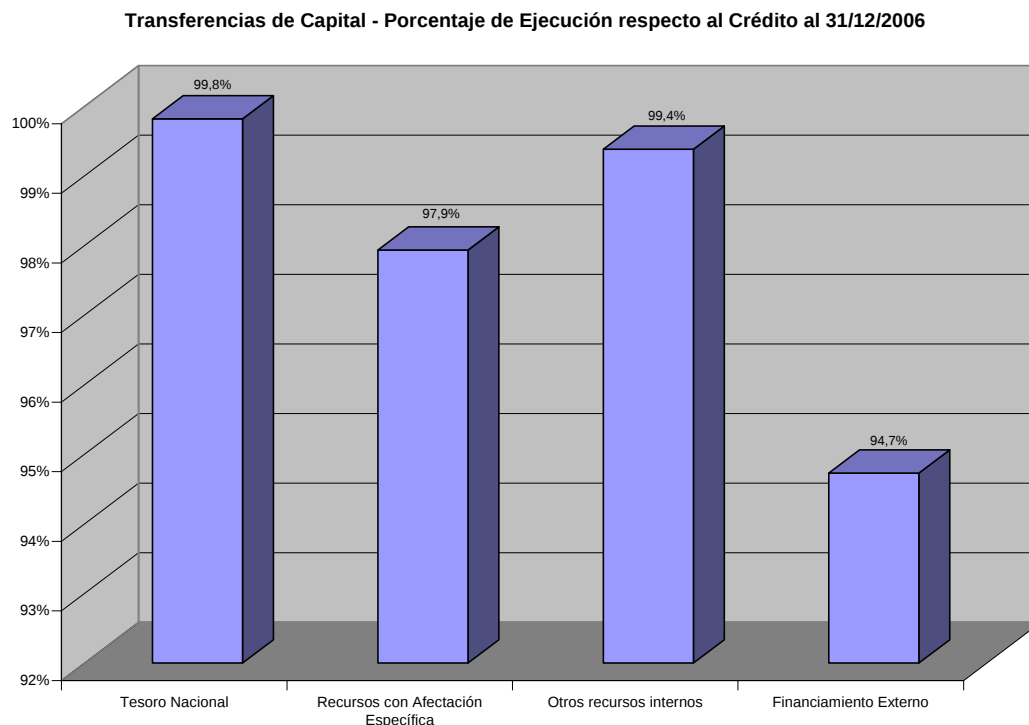

Las transferencias de capital fueron financiadas en un 21% por recursos con afectación específica. Comprenden, principalmente, las destinadas a infraestructura básica y social (a la Provincia de Buenos Aires por 650,0 millones de pesos), las transferencias para el Fondo Nacional de la Vivienda (675,1 millones de pesos), al Fondo Vial (415,9 millones de pesos) y al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI (200,9 millones de pesos).

El crédito interno financió transferencias al sector privado dentro del programa de Ejecución de Políticas Energéticas (163 millones de pesos).

A su vez, el crédito externo fue aplicado, principalmente, para Acciones para Planes Federales de Vivienda (284,5 millones de pesos), para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario (279,3 millones de pesos), para acciones de “Más Escuelas, Mejor Educación” (212,2 millones de pesos), para Atención de Emergencias para Inundaciones (102,3 millones de pesos), para el programa Mejoramiento Barrial -PROMEBA (67,5 millones de pesos), a provincias para infraestructura y equipamiento escolar (22,4 millones de pesos) y para Reforma del Sector Agua Potable y Alcantarillado usado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (34,0 millones de pesos).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital, al cierre del ejercicio 2006, se concentraron, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Santa Fe. Estas cuatro jurisdicciones registraron alrededor del 54% del total de las transferencias realizadas al cierre del ejercicio 2006.

Las transferencias de capital realizadas en la provincia de Buenos Aires (27,6% del total) comprenden, sobre todo, las transferencias realizadas por los Planes Federales de Vivienda por 1.229,3 millones de pesos, la Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial (Fondo del Conurbano Bonaerense) por 650,0 millones de pesos, otras obras que gestiona la Subsecretaría de Obras Públicas por 108,5 millones de pesos, transferencias del Fondo Nacional de la Vivienda por 111,4 millones de pesos, acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” por 107,8 millones de pesos y las realizadas para Desarrollo Vial por 66,7 millones de pesos.


En el caso de las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad de Buenos Aires (15,2% del total) debe considerarse que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en ese ámbito geográfico, pero son registrados en esa jurisdicción debido a que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios. Las transferencias se destinaron para formulación de la política energética por 575,5 millones de pesos, para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario por 507,1 millones de pesos, para infraestructura y equipamiento realizadas por el Ministerio de Educación por 67,1 millones de pesos) y para Desarrollo Urbano por 63,4 millones de pesos.

Respecto a las transferencias realizadas a la provincia de Santa Cruz (5,9% del total) incluye las realizadas para Yacimientos Carboníferos Río Turbio por 185,5 millones de pesos, para infraestructura social por 91,1 millones de pesos, para Obras Viales por convenio con la provincia de Santa Cruz por 78,7 millones de pesos, para Planes Federales de Vivienda por 69,9 millones de pesos, y para el Fondo Nacional de la Vivienda por 21,7 millones de pesos.

Las transferencias a la provincia de Santa Fe (5,6% del total) incluye las realizadas a través de los Planes Federales de Vivienda por 210,1 millones de pesos, del programa Desarrollo Vial por 67,3 millones de pesos, para el Fondo Nacional de la Vivienda por 38,4 millones de pesos y para el Programa Atención de Emergencias por Inundaciones por 36,1 millones de pesos

Por su parte, las transferencias a la ubicación geográfica interprovincial, asociadas a dos o más jurisdicciones se concentraron mayoritariamente en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal por 539,0 millones de pesos.

Transferencias de Capital por habitante y kilómetro cuadrado (*)

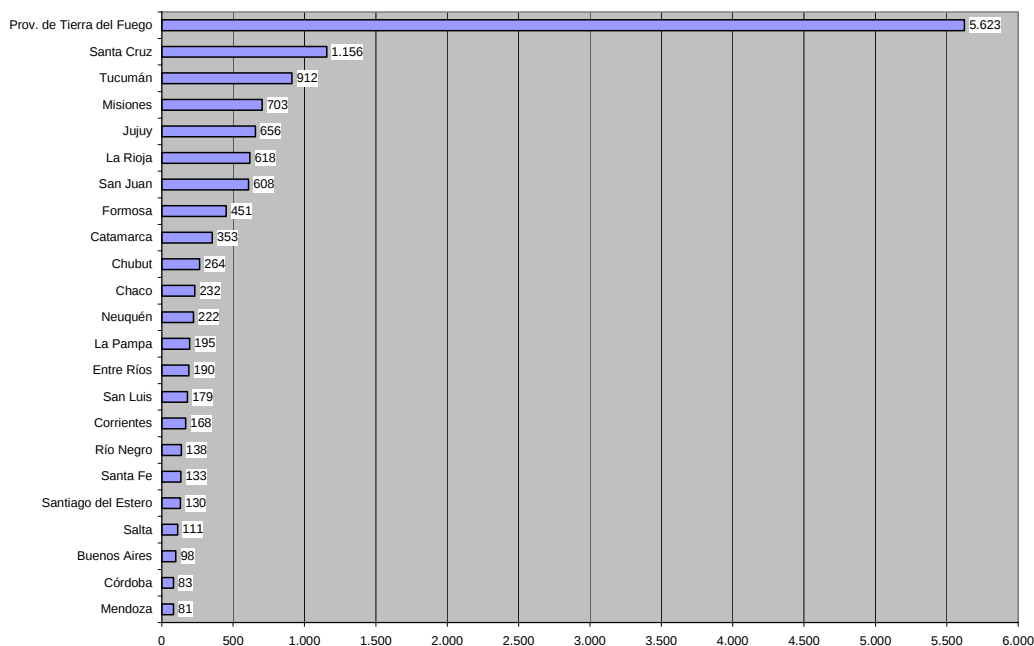

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires por razones de escala

Se estima el indicador de transferencias de capital según densidad poblacional, que surge de:

$$= \text{Transferencias de capital} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \frac{\text{Habitantes}}{\text{Km}^2}$$

El indicador muestra que las transferencias de capital son mayores en la provincia de Tierra del Fuego (casi cinco veces más que las recibidas por la provincia de Santa Cruz, que le sigue en importancia). Las provincias en recibir menores transferencias según el indicador son Córdoba y Mendoza que alcanzan cada una, aproximadamente, 1,5% de lo recibido por la provincia de Tierra del Fuego.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	23.906.414	-13.944.425	-36,8%
Presidencia de la Nación	22.690.000	29.874.621	7.184.621	31,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	119.369	-5.644.631	-97,9%
Ministerio del Interior	10.366.950	3.151.748	-7.215.202	-69,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	66.943.868	-6.426.167	-8,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	11.055.500	10.785.500	3994,6%
Ministerio de Defensa	62.188.983	68.222.983	6.034.000	9,7%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	25.803.973	14.261.230	123,6%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.187.563.742	4.381.798.263	1.194.234.521	37,5%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	-2.514.000	-97,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	0	-1.700.000	-100,0%
Ministerio de Salud	6.765.997	3.014.499	-3.751.498	-55,4%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	4.613.961.238	1.191.303.949	34,8%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	35.815.309	25.575.110	249,8%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	73.638.149	-13.493.867	-15,5%
Ministerio Público	5.397.000	11.861.585	6.464.585	119,8%
Presidencia de la Nación	34.448.180	49.171.819	14.723.639	42,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.796.074	63.074	1,7%
Ministerio del Interior	107.474.260	162.762.773	55.288.513	51,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	13.771.518	10.920.367	383,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	14.564.070	3.630.170	33,2%
Ministerio de Defensa	75.704.091	123.792.411	48.088.320	63,5%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	148.504.946	4.617.334	3,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	86.244.726	202.924.440	116.679.714	135,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	20.043.518	13.944.518	228,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	63.456.649	22.180.749	53,7%
Ministerio de Salud	49.512.691	46.689.365	-2.823.326	-5,7%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	9.815.000	4.505.000	84,8%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	980.607.626	310.363.900	46,3%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	5.594.568.864	1.501.667.849	36,7%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	37.850.839	23.906.414	10.918.472	10.918.472	45,7%
Presidencia de la Nación	22.690.000	29.874.621	16.412.415	15.455.480	51,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.764.000	119.369	103.445	103.445	86,7%
Ministerio del Interior	10.366.950	3.151.748	2.198.578	1.727.833	54,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	73.370.035	66.943.868	66.180.872	66.107.446	98,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	270.000	11.055.500	395.692	395.692	3,6%
Ministerio de Defensa	62.188.983	68.222.983	54.324.840	54.324.746	79,6%
Ministerio de Economía y Producción	11.542.743	25.803.973	23.123.384	20.985.199	81,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.187.563.742	4.381.798.263	4.235.631.855	4.233.935.697	96,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	2.584.000	70.000	47.318	47.318	67,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.700.000	0	0	0	
Ministerio de Salud	6.765.997	3.014.499	2.671.761	2.623.000	87,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	3.422.657.289	4.613.961.238	4.412.008.632	4.406.624.328	95,5%
Poder Legislativo Nacional	10.240.199	35.815.309	33.539.631	33.234.048	92,8%
Poder Judicial de la Nación	87.132.016	73.638.149	40.121.440	40.121.440	54,5%
Ministerio Público	5.397.000	11.861.585	9.226.274	8.709.726	73,4%
Presidencia de la Nación	34.448.180	49.171.819	37.451.886	21.166.441	43,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.733.000	3.796.074	1.836.140	1.836.140	48,4%
Ministerio del Interior	107.474.260	162.762.773	137.187.372	129.118.758	79,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	2.851.151	13.771.518	5.986.804	5.639.023	40,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	10.933.900	14.564.070	7.369.454	7.305.263	50,2%
Ministerio de Defensa	75.704.091	123.792.411	115.952.108	107.469.715	86,8%
Ministerio de Economía y Producción	143.887.612	148.504.946	108.041.682	107.134.516	72,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	86.244.726	202.924.440	171.819.840	171.783.290	84,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	6.099.000	20.043.518	16.853.088	16.758.400	83,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	41.275.900	63.456.649	39.208.374	38.874.716	61,3%
Ministerio de Salud	49.512.691	46.689.365	23.826.343	23.561.875	50,5%
Ministerio de Desarrollo Social	5.310.000	9.815.000	5.841.351	4.355.377	44,4%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	670.243.726	980.607.626	754.261.787	717.068.728	73,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	5.594.568.864	5.166.270.419	5.123.693.056	91,6%

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

CUADRO C							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4º		Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
5	320					Poder Judicial de la Nación								
		4				CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)						s/í	s/í	s/í
				1		Mandamientos y Notificaciones								
					51	Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	1.110.000	0	0		24,00			
		7				Adecuación para intalación Subdirección de Notificaciones	1.110.000	0	0		24,00			
				3		Archivo General								
					61	Refacciones Varias	2.810.000	1.003.636	0		35,00			
		22				Adecuación Sala de Subastas - Edificio Hipólito Yrigoyen 2041 -	2.810.000	1.003.636	0		35,00			
				1		Justicia de Casación Penal								
					51	Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.250.000	0	0		48,00			
		23				Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.250.000	0	0		48,00			
			1			Justicia Ordinaria de la Capital Federal								
				1		Fuero Criminal y Correccional								
					52	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	565.000	198.026	0		91,00			
				2		Construcción Sala de Audiencias y adecuacion 1er piso Lavalle 1171	565.000	198.026	0		91,00			
				1		Fuero Civil								
					52	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	1.704.807	1.429.803	1.251.143		34,00			
		24				Lavalle 1220 Capital Federal, Reparación cubiertas, fachadas, medianera	1.704.807	1.429.803	1.251.143		34,00			
						Justicia Federal								
			3			Fuero Contencioso Administrativo Federal								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.800.000	1.052.632	0		30,00			
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación 6 Juzgados de Ejecución Fiscal	4.800.000	1.052.632	0		30,00			
			4			Fuero Federal de la Seguridad Social								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.324.203	3.895.691	2.620.671		20,00			
					51	Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Instalación 4 Juzgados y Mesa de Entradas	2.324.203	3.895.691	2.620.671		20,00			
		7				Area Cámara de la Plata								
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.770.000	0	0		100,00			
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento en inmueble	870.000	0	0		100,00			
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	900.000	0	0		100,00			
		10				Area Cámara Mendoza								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	930.000	0	0		100,00			
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan. Adecuación general para sector Electoral	930.000	0	0		100,00			
		11				Area Cámara Rosario								
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	2.510.000	0	0		29,00			
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción edificio calle Garibaldi	2.000.000	0	0		29,00			
					52	Edificio Primera Junta 2687, Santa Fe - Adecuación Tribunal Oral y Juzgado N° 2	510.000	0	0		28,00			
		12				Area Cámara General Roca								
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	900.000	0	0		100,00			
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	900.000	0	0		100,00			
		15				Area Cámara Resistencia								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	83.986	1.425.154	748.937		5,00			
					51	Carpintería externa, fachadas y obras del Juzgado Federal de Formosa	83.986	1.425.154	748.937		5,00			
		16				Area Cámara de Córdoba								
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	610.000	0	0		100,00			
					51	Reparación del edificio ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	610.000	0	0		100,00			
		17				Area Cámara San Martín								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.557.476	1.918.392	1.751.797					
					51	Adecuación del edificio de Cámara de San Martín y remodelación de planta baja	997.476	1.918.392	1.751.797		27,00			
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, puesta en funcionamiento de inmueble	560.000	0	0		100,00			
		18				Area Cámara Tucumán								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.980.000	573.286	0		55,00			
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	1.980.000	573.286	0		55,00			

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
			22			Fuero Penal Económico								
				1		Remodelación y adecuación de Sede Judicial	713.367	889.794	822.009		71,00			
					52	Adecuación del Juzgado Penal Económico - Avenida de los Inmigrantes 1950	713.367	889.794	822.009		71,00			
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)						s/í	s/í	s/í
		21				Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.139.870	4.262.870	1.954.240		75,00			
					51	Reciclado de Fachadas y Patios interiores	824.373	3.104.373	1.240.246		25,00			
					52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	315.943	15.943	0					
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	135.099	135.099	0					
					57	Reparación Integral de la terraza del Palacio de Justicia	126.093	126.093	0		99,00			
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia - Talcahuano 550	539.077	19.077	0					
					63	Reforma de la Instalación Eléctrica del Palacio de Justicia. Talcahuano 550	113.097	776.097	713.994					
					72	Sala de Audiencia, Reparación Estructura y Cambio Vidrios Palacio Justicia	86.188	86.188	0					
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.173.303	1.335.303	0					
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolome Mitre 718 - Maipu 92	1.011.270	1.021.270	0					
					58	Obras de adecuac. y Acond. Científico de la Dirección Pericial Junin 760	129.282	129.282	0					
					65	Construcción, Decantadación y Efluentes Industriales y Contaminantes - Junín 760	32.751	32.751	0					
					69	Rep. y Mant. de Ascens. de la CSJN, B. Mitre, Maipu y Junin	0	2.000	0					
					70	Adec. de locales para el traslado del Cuerpo Medico Forence	0	150.000	0					
				3		Refacciones Varias	583.692	583.692	4.053		70,00			
					55	Adecuación Integral Edificio Villariño 2010 para el archivo general	574.585	574.585	0		34,00			
					73	Reparación y Mantenimiento del ascensor del edificio Lavalle 1250	9.107	9.107	4.053		20,00			
				4		Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	40.500		25,00			
					51	Reforma instalacines eléctricas Palacio de Justicia y Talcahuano 550	785.000	835.000	40.500		25,00			
				5		Readecuación y refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.338.000	1.725.122		30,00			
					51	Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.710.000	2.338.000	1.725.122		30,00			
				6		Reciclado de fachadas Tucumán - Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	57.750	0		24,00			
					51	Reciclado de fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	902.750	57.750	0		24,00			
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	2.107.385	0		50,00			
					51	Mejoras en el Palacio de Justicia	4.937.385	2.107.385	0		50,00			
20						Presidencia de la Nación								
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES								
		17				Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas								
				2		Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.630.882	1.563.865	0,00	100,00	81,00	96,00	96,00
					51	Mejoras e Infraestructura varias en Parques	1.775.000	1.630.882	1.563.865	0,00	100,00	81,00	96,00	96,00
		20				Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR								
				35		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Glaciares	1.274.714	309.217	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Centro de Visitantes en el Calafate	314.178	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Centro de Informes con Biblioteca en El Calafate	240.206	165.206	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Centro Administrativo en El Calafate	180.444	144.011	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Albergue para voluntarios en Glaciár Perito Moreno	329.563	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Centro de Visitantes en Lago Roca	210.323	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.374.215	3.854.039	3.714.381	0,00	100,00	19,00	96,00	96,00
					53	Centro de Interpretación en San Martín de los Andes	644.335	2.454.350	2.886.940	0,00	100,00	49,00	100,00	100,00
					55	Refacción Edificio Histórico y construcción de sanitarios en Hua Hum	194.585	829.394	792.837	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					57	Subcentral de Incendios en Ruca Choroi	237.950	237.950	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Sendero Termas de Epulauquen	297.345	297.345	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Centro de Visitantes en Puerto Canoa (*****)	0	35.000	34.604	0,00	100,00	s/í	s/í	
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	2.043.364	5.925.516	3.282.767	25,25	74,75	55,00	81,00	108,36
					53	Albergue para voluntarios en Villa La Angostura	34.684	174.684	105.930	0,00	100,00	61,00	61,00	61,00
					54	Camino Tronador-Los Rápidos	653.150	2.503.150	1.661.714	0,00	100,00	66,00	66,00	66,00
					55	Reparación Senderos y Miradores Cascada Los Alerces	150.198	285.198	272.559	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					57	Refaccion de dos viviendas en Villa Mascaridi	52.539	76.539	55.825	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					58	Senderos y Miradores en Isla Victoria	79.869	1.729.869	278.671	0,00	100,00	0,00	100,00	100,0

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						59 Infraestructura Isla Victoria Area Central	627.562	1.156.076	908.068	0,00	100,00	79,00	79,00	79,00
						60 Ordenamiento Cascada Los Alerces - Estacionamiento, Ctro. de Visit. Baños Públicos	445.362	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					42	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	707.707	1.965.490	754.611	49,56	50,44	38,00	58,00	114,99
						51 Albergue para Voluntarios Villa Futalaufquen	0	443.082	16.094	0,00	100,00	95,00	95,00	95,00
						52 Construcción Sendero Chacao Mermoud Menendez	0	551.439	447.417	0,00	100,00	87,00	87,00	87,00
						54 Construcción albergue para voluntarios en Lago Verde	105.013	165.013	291.100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						55 Saneamiento y servicios en Villa Futalaufquen	426.129	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Portada de Acceso en Zona Norte	75.131	369	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Acondicionamiento del Centro de Informes	29.946	794.946	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Alambrado Límite Este	71.488	10.641	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR								
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.113.772	1.049.042	363.331	14,72	85,28	35,00	35,00	41,04
						52 Obras en Junta de la Palca	173.497	173.497	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción de dos viviendas para guardaparques en Rodeo (#)	0	500.000	363.331	0,00	100,00	73,00	73,00	73,00
						54 Obras en Agua del Godo	375.545	375.545	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento camino de acceso	564.730	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					39	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	922.392	2.455.278	1.784.964	28,50	71,50	86,00	86,00	120,28
						56 Mejoramiento camino de acceso a Parque Nacional y obras complementarias	922.392	2.455.278	1.784.964	0,00	100,00	86,00	86,00	86,00
					40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.128.989	902.010	63.349	50,00	50,00	75,00	78,00	156,00
						52 Vivienda Intendencia Pampa de Los Guanacos (*****)	0	356.179	63.349	0,00	100,00	19,00	19,00	19,00
						53 Centro Operativo Area Pobladores	483.158	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						54 Centro Operativo Area Robles	187.773	187.773	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						55 Alambrado perimetral y senderos	81.572	81.572	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Centro de Informes con dos viviendas y galpón en Los Pirpintos	376.486	276.486	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.640.847	1.290.847	193.463	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00
						51 Obras 1º Etapa Infraestructura	497.584	497.584	193.463	0,00	100,00	39,00	39,00	39,00
						52 Adecuación Galpón de esquila como Centro de Informes	357.662	357.662	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Intendencia en Puerto Santa Cruz con albergue para visitantes y vivienda	533.356	183.356	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Vivienda Guardaparques	75.297	75.297	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Casa personal área de la Costa	94.122	94.122	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción senderos y miradores	82.826	82.826	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004								
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	628.734	1.264.026	453.133	0,00	100,00	36,00	36,00	36,00
						51 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Martín de los Andes	279.701	735.672	288.478	0,00	100,00	36,00	36,00	36,00
						52 Construcción muelles Hua-Hum y Pucará - San Martín de los Andes	142.069	328.676	164.655	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
						53 Construcción Parque Temático	206.964	199.678	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.968.799	4.149.585	332.022	0,00	100,00	8,00	8,00	8,00
						51 Sendero Parque Nacional Arrayanes - Villa La Angostura	82.797	920.874	169.962	0,00	100,00	17,00	17,00	17,00
						52 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - Villa La Angostura	72.022	253.733	39.149	0,00	100,00	15,00	15,00	15,00
						53 Construcción Grupo Sanitarios Públicos - San Carlos de Bariloche	344.980	1.108.668	97.154	0,00	100,00	13,00	13,00	13,00
						54 Construcción de 3 Subcentrales de Incendios	313.490	639.295	25.757	0,00	100,00	4,00	4,00	4,00
						55 Restauración de la Casa de Anchorena, Casa Verde y Casa Roja	552.276	122.895	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Senderos a Refugios Red Troncal Catedral	57.753	96.424	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Senderos y miradores en Cascada Los Cántaros	51.191	89.928	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Mirador Co Lemu (Arroyo Cataratas)	26.254	30.240	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						59 Sendero Las Mellizas Cañadon a Verde y Pinturas Rupestres	143.761	278.632	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Senderos a Cascada del Ivinco	324.275	608.896	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	744.149	1.778.287	591.958	0,00	100,00	33,00	33,00	33,00
						51 Construcción sendero Subcentral de Incendio Zona Norte y Bahía Rosales	238.667	1.310.386	591.958	0,00	100,00	41,00	41,00	41,00
						52 Puesto en Valor Museo Los Alerces	88.994	161.956	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción y reparación de muelles Lagos Krugger, Verde, Rivadavia y Pta. Matos	40.061	58.951	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Grupos Sanitarios Públicos	241.423	4.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	135.004	242.994	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	158.318	250.402	548	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						51 Mejoramiento de caminos turísticos interiores	13.296	21.352	548	0,00	100,00	3,00	3,00	3,00
						52 Portada, Guarda Ganado y obras en el acceso al Parque Nacional	6.037	10.249	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Centro de Atención al Visitante y cobro de Acceso	14.911	37.837	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Riego y parquización zona muelle Parque Nacional	5.636	11.297	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción de rompeolas	6.918	1.113	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción muelle flotante	81.174	128.686	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción muelle flotante Río Turbio y Los Hitos	30.346	39.868	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
		1				Actividades Centrales								
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	9.855	99,57	0,43	0,09	0,09	20,93
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	9.855	99,57	0,43	0,09	0,09	20,93
				3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa (***)	6.000.000	2.860.000	2.215.451	0,00	100,00	36,90	36,90	36,90
						51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	6.000.000	2.860.000	2.215.451	0,00	100,00	36,90	36,90	36,90
337						SECRETARIA DE CULTURA								
		38				Desarrollo y Acción Cultural								
				1		Remodelación de Edificios Culturales	1.159.000	0	0	13,00	77,00	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelaciones Varias	1.159.000	0	0	13,00	77,00	0,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
		305				DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE								
			23			Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento								
				3		Remodelación de Instalaciones del Ce.N.A.R.D. (*****)	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación Hotel Lugones en el Ce.N.A.R.D.	2.085.631	0	0	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
				6		Infraestructura en Ce.N.A.R.D.	3.678.369	119.369	103.445	23,32	76,68	0,00	76,68	100,00
						52 Ampliación del Centro Argentino de Información Deportiva (*****)	1.330.000	0	8.300	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Centro de Transformación de Media Tensión (*****)	2.150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30						54 Mejoramiento Planta Reductora de Gas	198.369	119.369	95.145	25,15	76,68	0,00	76,68	100,00
		201				Ministerio del Interior								
				16		DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES								
						Control de Ingresos, Egresos y Permanencia de Personas en el Territorio Nacional								
				4		Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	0	0	90,39	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio del Predio de la Sede Central de la Dirección Nacional de Migraciones	1.782.000	0	0	90,39	4,00	0,00	0,00	0,00
				5		Restauración del Ex-Hotel de Inmigrantes (*****)	0	82.000	31.412	0,00	s/í	s/í	s/í	
		326				51 Restauración del Ex-Hotel de Inmigrantes	0	82.000	31.412	0,00	s/í	s/í	s/í	
				21		POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
						Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	240.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de vestuarios, baños y habitaciones en Cuerpo de Sistema de Tránsito	200.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la División Laboratorio Químico	233.750	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edilicia Casino - Oficina Dirección General Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción viviendas estatales de tránsito para uso y habitación del personal en actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				22		Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
				4		Construcción consultorios externos para ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción consultorios externos para ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
375						GENDARMERIA NACIONAL								
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional								

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					2	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadron 54 Pocitos	250.000	450.000	0	15,00	43,30	0,00	0,00	0,00
					19	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logística	0	160.877	160.351	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					51	Construcción Pavimento Playa de Estacionamiento Dirección de Logística	0	160.877	160.351	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					20	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional 2005 Etapa I	2.850.000	1.188.671	610.151	9,00	25,00	7,90	11,70	46,80
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	2.500.000	660.571	84.051	3,40	21,90	14,60	14,60	66,67
					53	Construcción Guardia de Prevencion Jefatura Región I	0	102.050	102.050	0,00	100,00	1,00	100,00	100,00
					54	Construcción Caniles Jefatura Región I	0	76.050	76.050	60,00	40,00	0,00	100,00	250,00
					60	Construcción cuadra, baños y ampliación Casinos Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto	350.000	350.000	348.000	25,00	50,00	45,00	45,00	90,00
					21	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	128.200	128.200	98.943	0,00	100,00	62,40	62,40	62,40
					51	Instalación Rampa Edificio Centinela	40.000	40.000	39.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					57	Construcción de Instalaciones y Depósitos - Agrupación Salta	40.000	40.000	40.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					58	Construcción Pabellón Carcelario - Escuadrón 20 "Oran"	28.200	28.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción Depósito de Mercadería - Escuadrón 52 Tartagal	20.000	20.000	19.943	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
380						PREFECTURA NAVAL ARGENTINA								
		31				Servicio de Seguridad de la Navegación y de Policía de Seguridad y Judicial								
				1		Construcción del destacamento Chana Mini y Luis Braga en zonas inundables	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del destacamento Chana Mini	450.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción del destacamento Cabo Primero Luis Braga	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del centro de control de Tráfico Rosario	1.300.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construccion Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construccion Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	0	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina								
				1		Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	826.976	0,00	100,00	15,00	100,00	100,00
					51	Construcción de aulas en la Escuela Superior de Capacitación de Oficiales	800.000	827.000	826.976	0,00	100,00	15,00	100,00	100,00
35						Ministerio de Relaiones Exteriores, Comercio Internacional y Culto								
	106					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES								
			1			Actividades Centrales								
				3		Remodelación de la Sede Central de la CNAE	13.000	0	0	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	0	0	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos								
		16			1	Infraestructura Terrestre	20.700.000	6.792.055	6.736.183	49,34	26,00	3,20	10,06	38,69
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	47.000	67.382					
					51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	13.260.000	5.080.906	6.184.915	76,55	55,88	11,09	34,92	62,49
					52	Construcción del Instituto Gulich	1.134.000	236.000	0	20,35	28,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	5.000	5.000	108.585	9,64	26,67	0,36	2,41	9,04
					56	Construccion Antena Multiproposito N° 4	4.392.000	1.036.149	0	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
					57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00	0,00
					58	Construcción de Antenas Educativas	1.336.000	223.000	375.301	0,16	9,00	1,10	2,49	27,67
					59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	510.000	154.000	0	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	5.000	0	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales	41.206.400	57.592.831	57.356.194	61,58	4,00	3,07	6,97	174,25
					0	Misiones Satelitales	497.000	1.347.000	1.999.967					
					52	Misión SAOCOM	36.957.400	44.422.439	33.104.585	64,29	5,00	2,20	5,69	113,80
					53	Misión SABIA	2.652.000	3.143.392	2.519.003	14,19	13,00	0,00	0,00	0,00
					54	Misión CESAR	1.100.000	8.680.000	19.732.639	8,61	15,63	3,77	14,23	91,04
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	4.013.000	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Antena Multipropósito N° 5	4.008.000	0	0	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
					52	Antena Multipropósito N° 6	5.000	0	0	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
				5		Subsistemas de propulsión de satélites	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites calificados en tierra	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Satélite "SARE - 1"	5.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
		17			1	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio								
						0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	21.000	365.347	365.328	0,74	0,44	0,13	0,44	100,00
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	3.000	3.000	247					
						52 Configuración de Vehículo Espacial	14.000	358.347	365.082	8,51	5,81	1,59	5,81	100,00
						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		18			1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	0	0					
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
		1				Actividades Centrales								
					2	Remodelación Palacio San Martín	156.000	430.663	358.941	0,00	100,00	2,00	50,00	50,00
						51 Remodelación Palacio San Martín	156.000	430.663	358.941	0,00	100,00	2,00	50,00	50,00
					6	Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	435.960	62.530	2,15	75,00	3,00	6,00	8,00
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	0	73.500	62.530					
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia (República Federal de Brasil)	2.798.960	362.460	0	2,15	75,00	3,00	6,00	8,00
					8	Remodelacion Embajada en Roma	0	40.300	36.338					
						0 Remodelacion Embajada en Roma	0	40.300	36.338					
						51 Remodelacion Embajada en Roma								
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	4.362	0	0,00	80,00	3,00	35,00	43,75
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	3.459.325	4.362	0	0,00	80,00	3,00	35,00	43,75
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	982.350	910.217	10,00	43,00	5,00	35,00	81,40
						0 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	0	934.000	908.742					
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	982.350	48.350	1.476	10,00	43,00	5,00	35,00	81,40
16						Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
					12	Remodelacion de la Embajada en Francia (*****)	0	300.000	281.712	0,00	s/í	s/í	s/í	
						0 Remodelacion de la Embajada en Francia	0	300.000	281.712					
						51 Remodelacion de la Embajada en Francia	0	0	0	0,00	s/í	s/í	s/í	
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS								
		1				Actividades Centrales								
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	1.070.000	395.693	75,11	11,00	11,00	11,00	100,00
						51 Reparaciones Varias	180.000	920.000	298.370	81,40	18,60	18,60	18,60	100,00
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	27.441	83,00	7,00	7,00	7,00	100,00
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	105.000	69.881	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18						Política e Infraestructura Penitenciaria (*****)								
					10	Construccion Complejo Federal de Condenados - Mercedes BA.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construccion Complejo Federal de Condenados - Mercedes BA.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Construccion Centro Federal del Noroeste - Guemes - Salta	0	1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construccion Centro Federal del Noroeste - Guemes - Salta	0	1.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Construccion Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	4.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Construccion Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	0	4.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Ampliacion Unidad 31 - Ezeiza	0	700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliacion Unidad 31 - Ezeiza	0	700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16	Ampliacion Unidad 3 - Ezeiza	0	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliacion Unidad 3 - Ezeiza	0	1.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Ampliacion Unidad 11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliacion Unidad 11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	0	2.085.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Carcel Federal de Salta - Unidad 34	0	2.085.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

CUADRO C							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
45	374	16			21	51 Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Carcel Federal de Candelaria	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Carcel Federal de Candelaria	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Centro de Drogadependientes	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Centro de Drogadependientes	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Ministerio de Defensa								
						ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
						Capacidad Operacional del Estado Mayor General del Ejército								
					44	Construcciones de Polvorines	3.045.730	3.045.730	3.045.574	40,00	60,00	59,17	100,00	166,67
					71	Construcción Dep. Mun. M8 - Gral San Lorenzo	3.045.730	3.045.730	3.045.574	40,00	60,00	59,17	100,00	166,67
					46	Construccion y/o Conexion Redes Cloacales (#)	0	560.000	559.956	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Constr. Nueva Red Puesto Comando GA 16 y B. Mil. Zapala	0	560.000	559.956	1,00	s/i	s/i	s/i	
	379	16			47	Construcción y Ampliación redes agua, gas y electricidad	450.000	750.000	748.999	0,00	100,00	32,69	100,00	100,00
					59	Instalación red gas natural RI 6-RI 12 Toay	450.000	450.000	449.796	0,00	100,00	32,69	100,00	100,00
					60	Contr. Red Abastecimiento Agua B. Mil. GA 16 Zapala (#)	0	300.000	299.203	0,00	s/i	s/i	s/i	
						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
						Capacidad Operacional de la Armada								
					2	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	988.822	2,00	66,50	66,50	66,50	100,00
					51	Recuperación Muelle Bravo Base Naval Puerto Belgrano	990.000	990.000	988.822	2,00	66,50	66,50	66,50	100,00
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	515.000	0,00	39,00	29,22	29,22	74,92
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	515.000	515.000	515.000	0,00	39,00	29,22	29,22	74,92
						Formación y Capacitación								
	450	16			1	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	9.908.620	9.908.285	42,71	39,00	8,90	26,96	69,13
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	14.050.125	9.908.620	9.908.285	42,71	39,00	8,90	26,96	69,13
					2	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	6.069.734	6.063.606	25,85	47,00	13,31	22,00	46,81
					51	Adecuación de Instalaciones del Edificio Libertad	2.384.000	6.069.734	6.063.606	25,85	47,00	13,31	22,00	46,81
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	7.846.000	6.964.560	5,55	56,00	1,28	7,30	13,04
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	14.900.000	7.846.000	6.964.560	5,55	56,00	1,28	7,30	13,04
					4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	4.300.089	4.300.089	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	3.081.089	4.300.089	4.300.089	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
					5	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	690.000	0,90	99,00	46,90	46,90	47,37
					51	Remodelación para la reubicación de servicios	690.000	690.000	690.000	0,90	99,00	46,90	46,90	47,37
					7	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	13.000.000	13.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9					Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	19.942.544	19.938.642	18,00	44,00	19,00	52,00	118,18	
51					Modernización y Reparación de la Fragata Libertad	9.083.039	19.942.544	19.938.642	18,00	44,00	19,00	52,00	118,18	
10					Reubicación Batallón de Seg.del Est.Mayor Gral.de la Armada (*****)	0	349.266	345.213	0,00	s/i	26,00	26,00		
51					Reubicación Batallón de Seg.del Est.Mayor Gral.de la Armada	0	349.266	345.213	0,00	s/i	26,00	26,00		
					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR									
50					357	1		3	Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional					
	Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000	255.999				0,00	21,71	11,74	14,26	65,68		
	51	Infraestructura de datos espaciales de la Rep. Arg. (IDERA)Etapa I	0	256.000				255.999	0,00	21,71	17,50	23,31	107,37	
		Ministerio de Economía y Producción												
		MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION												
		Actividades Centrales												
	13	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	400.000				351.375	0,00	50,00	15,43	15,43	30,86	
	51	Refac.Nucleos Sanitarios, edif.sede Min.de Economía y Producción	152.000	400.000				351.375	0,00	50,00	15,43	15,43	30,86	
	14	Completamiento 3er Piso y Sala de Servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	600.000				0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Completamiento 3er Piso y Sala de servidores - J.A.Roca 651	1.959.730	600.000				0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						51 Refaccion Sala Servidores-Centro de Computos-Balcarce 186 7P	0	200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
		26				Administración Financiera								
				1		Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020	514.924	0,00	100,00	80,00	100,00	39,64
	602					51 Remodelación para la Unidad Informática	0	976.020	514.924	0,00	100,00	80,00	100,00	39,64
						COMISION NACIONAL DE VALORES								
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública								
				1		Modernización de la Comisión Nacional de Valores	107.800	107.800	105.494	47,89	17,00	6,15	26,60	156,47
						53 Modernización del Archivo	107.800	107.800	105.494	47,89	17,00	6,15	26,60	156,47
				2		Modernización de la Comisión Nacional de Valores - Etapa II	350.320	350.320	84.920	87,19	12,81	7,68	9,78	76,35
						54 Autopista de la Información Financiera	315.320	315.320	83.040	98,86	1,14	1,09	1,15	100,88
	606					56 Control de Acceso a la Comisión Nacional de Valores	35.000	35.000	1.881	80,00	20,00	0,00	4,30	21,50
						INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA								
		16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas								
				3		Parques de Innovación Tecnológicos	1.011.459	1.498.710	1.334.027	1,08	86,00	24,77	24,77	28,80
						0 Parques de Innovación Tecnológicos	522.289	1.498.705	1.334.027					
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	489.170	5	0	9,03	86,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Inst.de Investigación-Etapa II	427.003	396.198	396.194	95,40	4,60	65,46	84,83	1844,13
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	427.003	396.198	396.194	95,40	4,60	65,45	84,82	1843,91
				8		Contrucciones y Ampliaciones Instit. de Invest. (Etapa III)	637.841	31	0	62,01	37,99	0,00	15,36	40,43
						51 Ampliacion Sala de Proc. Esc. Sat.en Inst. Clima y Agua	240.303	3	0	98,32	1,68	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virologia	29.667	7	0	54,72	45,28	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Bacterias Inst. de Biotecnología	178.002	7	0	94,00	6,00	0,00	29,53	492,17
						55 Remodelación Aloj. Pasantes, Bec. Inst.Microbiología y Zoo.	29.667	7	0	79,13	20,87	0,00	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de frío en el Inst. de Patob. de Castelar	160.202	7	0	94,75	5,25	0,00	0,00	0,00
				12		Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	1.461.710	1.449.607	0,00	100,00	90,63	166,87	166,87
						51 Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-Etapas V	0	1.461.710	1.449.607	0,00	100,00	90,54	166,78	166,78
				17		Ampliacion Laboratorio Biotec. Ccias. Veterinarias y Agron. (*****)	0	582.105	450.533	0,00	s/i	51,66	54,36	
						51 Ampliacion Laboratorio Biotec. Ccias Veter. y Agronomicas	0	582.105	450.533	0,00	s/i	41,10	43,80	
	17					Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías (AITT)								
				4		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	142.333	3	0	83,83	16,17	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	142.333	3	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa II	574.679	30.564	30.327	78,95	21,05	2,25	2,25	10,69
						58 Obras en la Estac.Agrop.C. del Uruguay	574.679	30.564	30.327	31,72	68,28	2,25	2,25	3,30
				9		Construcciones y Ampliaciones Centros del Int.(Etapa III)	1.062.078	33.678	33.647	78,46	21,54	3,00	6,18	28,69
						52 Construcciones Oficinas y Galpon en el Campo Exp. Leales	35.600	5	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						54 Construccioón Oficinas, Banos y Salas de Reuniones E.E.A. Ang	504.339	4	0	40,16	59,84	0,00	0,00	0,00
						56 Obras en Esta. Exp. Agrop. Balcarce	89.001	6	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						57 Obras en la Estac. Exp. Agrop. La Rioja	296.670	5	0	99,92	0,08	0,00	0,00	0,00
						61 Ampliacion Oficinas C.R. Buenos Aires Sur	29.667	7	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						62 Construcción Lab.de Aromas y Fit. en Estac. Exp. Agrop. Mendoza	106.801	33.651	33.647	25,26	74,74	9,00	11,37	15,21
				13		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa V	0	4.167.170	4.093.087	0,00	100,00	68,09	107,03	107,03
						51 Obras Varias C.R. Tucuman - Santiago del Estero	0	464.055	441.276	0,00	100,00	60,00	96,81	96,81
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	0	1.205.210	1.205.190	0,00	100,00	70,00	82,48	82,48
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	0	5	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R.Chaco - Formosa	0	1.663.775	1.613.964	0,00	100,00	75,00	154,96	154,96
						55 Obras Varias C.R. Misiones	0	834.125	832.657	0,00	100,00	80,00	143,50	143,50
				14		Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VI	0	3.438.655	3.392.148	0,00	100,00	83,18	102,08	102,08
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	0	448.970	448.962	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	0	684.190	731.216	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	0	1.022.475	941.957	0,00	100,00	85,00	93,16	93,16
						54 Obras Varias C.R.Córdoba	0	416.365	416.358	0,00	100,00	75,00	110,55	110,55
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	0	866.655	853.655	0,00	100,00	75,00	94,50	94,50
				15		Construc.y Ampliaciones Institutos de Investigacion-EtapaVII	0	770.050	770.042	0,00	100,00	39,24	53,29	53,29
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	0	770.050	770.042	0,00	100,00	85,00	99,05	99,05

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					16	Construc.y Ampliaciones Centros del Interior-Etapa VIII	0	4.166.910	4.101.610	0,00	100,00	76,83	113,84	113,84
					51	Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	0	1.699.555	1.694.700	0,00	100,00	80,00	106,18	106,18
					52	Obras Varias C.R. Patagonia Norte	0	584.010	583.993	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00
					53	Obras Varias C.R.La Pampa - San Luis	0	1.272.140	1.245.041	0,00	100,00	80,00	126,39	126,39
					54	Obras Varias C.R.Patagonia Sur	0	611.205	577.876	0,00	100,00	65,00	100,41	100,41
					18	Constr. Edif. Estacion Experimental Agrop. Agron. San Juan. (*****)	0	300.005	243.140	0,00	s/i	81,00	86,50	
					51	Constr. Edif. Estacion Expeimental Agrop. Agronomia San Juan	0	300.005	243.140	0,00	s/i	70,00	75,50	
					19	Constr. y Ampliac. Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte (*****)	0	148.715	148.711	0,00	s/i	70,00	72,65	
					51	Constr. y Ampliac. Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	0	148.715	148.711	0,00	s/i	25,00	27,65	
					20	Construccion Edificio Agronomia Estacion Agrop. Balcarce (*****)	0	14.510	8.353	0,00	s/i	4,00	4,01	
					51	Construccion Edificio Agronomia Estacion Agrop. Balcarce	0	14.510	8.353	0,00	s/i	1,00	1,01	
					21	Construccion Laboratorios y Oficinas Estacion Agrop. Rafaela (*****)	0	5	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construccion Laboratorios y Oficinas Estacion Agrop. Rafaela	0	5	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					22	Construcciones y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy (*****)	0	766.605	766.598	0,00	s/i	75,00	75,01	
					51	Laboratorio, Ofic. y Viv. Ag. Ext. Rur. Posta de Hornillos.	0	0	0	0,00	s/i	30,00	30,01	
					52	Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	0	766.605	766.598	0,00	s/i	0,00	0,01	
					23	Construccion Laboratorios y Ofic. Estacion Agrop. Manfredi (*****)	0	1.024.370	1.024.364	0,00	s/i	85,00	94,86	
					51	Construccion Laboratorios y Ofic. Estacion Agrop. Manfredi	0	1.024.370	1.024.364	0,00	s/i	65,00	74,86	
					24	Construccion Edificio Agencia Expension Rural Bandera (*****)	0	175.005	171.144	0,00	s/i	78,00	78,52	
					51	Construccion Edificio Agencia Extension Rural Bandera	0	175.005	171.144	0,00	s/i	60,00	60,52	
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA								
		16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	100.000	80.000	79.272	18,82	11,46	2,29	9,09	79,32
					51	Reparación y Mejoras Sede Central	100.000	80.000	79.272	18,82	11,46	2,29	9,09	79,32
					3	Equipamiento Analítico	400.000	215.000	214.386	44,12	11,24	2,77	6,04	53,74
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	400.000	215.000	214.386	44,12	11,24	2,77	6,04	53,74
					4	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	253.100	252.702	85,13	4,82	11,59	12,18	252,70
					51	Modernización de la Tecnología de la Información del INV	100.000	253.100	252.702	85,13	4,82	11,59	12,18	252,70
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA								
		17				Servicios de Laboratorios								
					14	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	2.899.740	683.291	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reubicación de los Laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.517.500	2.899.740	683.291	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
		105				COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								
					16	Desarrollo de Tecnología Nuclear y Provisión de Insumos								
					1	Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores Fase 1	1.075.000	1.123.059	989.441	89,00	1,40	0,55	1,23	87,86
					51	Construcción de Reactores de Baja Potencia	1.075.000	1.123.059	989.441	89,00	1,40	0,55	1,23	87,86
					2	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-Fase 1	40.000	40.000	14.610	95,86	2,06	0,08	0,76	36,89
					51	Adecuación de Reactor para Investigación RA-3	40.000	40.000	14.610	95,86	2,06	0,08	0,76	36,89
					3	Construcción e Instalaciones del Ciclo del Combustible	450.000	650.000	504.895	77,99	0,13	0,75	3,58	2753,85
					52	Perforación de Yacimientos de Uranio (Cerro Solo)	450.000	650.000	504.895	33,33	7,00	0,75	6,10	87,14
					5	Instalación para Aplicaciones Médicas de la Radiación-FASE 2	950.000	1.339.675	1.057.489	66,84	26,60	4,73	27,86	104,74
					52	Laboratorio Calibración en Dosimetría	950.000	1.339.675	1.057.489	46,75	44,00	4,73	41,38	94,05
					6	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	490.500	622.643	599.719	61,76	13,00		1,77	13,62
					52	Area de Gestión - Ezeiza Fase 1	328.700	503.519	488.940	47,35	16,00	12,54	18,04	112,75
					53	Laboratorio Control y Verificación de Calidad	161.800	119.124	110.779	87,92	7,00	4,27	4,96	70,86
					7	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.159.600	501.635	449.515	24,77	3,09		0,49	15,86
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	948.100	255.858	236.801	8,10	13,00	7,44	9,22	70,92
					52	Repositorio Fase 1	211.500	245.777	212.714	26,47	1,00	0,56	0,78	78,00
					8	Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	314.659	273.825	33,70	18,00	6,04	15,70	87,22
					51	Almacenamiento de Elementos Combustibles	230.000	314.659	273.825	33,70	18,00	6,04	12,23	67,94
					9	Residuos Radiactivos de Baja Actividad-FASE 2	10.364.098	2.880.311	2.256.642	25,36	15,75		0,31	1,97
					51	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Malargüe	8.165.000	1.929.463	1.800.493	31,95	20,00	5,05	5,52	27,60
					52	Tratamiento Colas Mineral de Uranio-Los Gigantes	1.320.460	667.410	229.585	21,47	8,00	1,46	2,04	25,50

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						53 Tratamiento Colas Mineral de Uranio C.F. Córdoba	878.638	252.238	195.727	7,97	11,00	1,50	1,78	16,18
						54 Remodelación Casa Guayra (*****)	0	31.200	30.836	58,00	14,68	0,00	14,68	100,00
						Investigación y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Básicas								
					1	Construcción de Instalaciones para Investigación CAC - FASE 1	72.000	72.000	70.542	70,93	0,32	0,00	0,01	3,13
						53 Planta Piloto de Aleaciones Especiales - CAC	72.000	72.000	70.542	35,04	4,00	3,67	3,81	95,25
					2	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Etapa 1	1.114.000	1.029.000	925.130	89,95	6,71	1,32	4,73	70,49
						51 Laboratorio para Ensayos Post Irradiación (PEPI) - CAE	544.000	544.000	521.002	90,22	9,78	1,60	4,49	45,91
						52 Laboratorio Facilidad Radioquímica (LFR) - CAE	570.000	485.000	404.128	89,38	5,00	5,51	9,97	199,40
					3	Construcción de Instalaciones para la Investigación CAB - Etapa 1	410.000	1.547.000	1.528.530	66,97	3,08	1,41	3,03	98,38
						51 Ampliación Capacidad Académica RA - 6 - CAB	350.000	1.325.000	1.309.578	91,52	4,00	1,29	3,92	98,00
						52 Ampliación Laboratorio CAB	60.000	222.000	218.952	50,09	5,00	1,56	2,17	43,40
					4	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes - FASE 1	125.000	485.750	376.989	82,79	7,50	5,26	12,40	165,33
						51 Obra Infraestructura CAC, Usina, Subestación y Otros	125.000	485.750	376.989	82,79	7,50	5,26	12,40	165,33
					5	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes	657.000	658.050	645.114	35,92	4,00	0,26	0,57	14,25
						51 Centro de Aceleración de Iones	600.000	601.050	590.683	32,57	2,00	2,64	2,96	148,00
						53 Laboratorio de Química Analítica	57.000	57.000	54.431	53,00	4,00	0,65	0,95	23,75
					6	Infraestructura CAE - FASE 2	711.000	718.295	710.244	84,23	11,59	7,27	17,04	147,02
						51 Saneamiento CAE	711.000	718.295	710.244	48,29	36,00	6,32	35,93	99,81
					7	Infraestructura CAE-FASE 3	120.000	14.121	14.121	26,10	8,00	0,00	0,95	11,88
						51 Renovación Red de Gas en CAE-FASE 3	120.000	14.121	14.121	26,10	8,00	0,00	0,95	11,88
					8	Construcción de Instalaciones para Investigación CAB - Etapa II	35.000	505.000	367.789	23,60	2,50	1,74	2,24	89,60
						51 Ampliación de la Capacidad Experimental del CAB	35.000	505.000	367.789	23,60	2,50	1,74	2,24	89,60
					9	Construcción de Instalaciones para Investigación CAE - Fase II	350.000	730.000	728.613	20,35	22,00	3,19	22,00	100,00
						51 Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación de Dispositivos Micr	350.000	730.000	728.613	20,35	22,00	3,19	22,00	100,00
						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	299.912	95,00	3,00	1,00	4,00	133,33
						61 Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	800.000	800.000	299.912	95,00	3,00	1,00	4,00	133,33
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES								
					1	Actividades Centrales								
					1	Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cambio Fachada Edificio Sede Central Comisión Nacional de Comunicaciones	7.480.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
					17	Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR								
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	7.984.200	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.946.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	2.600.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						53 Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	1.438.200	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	2.286.200	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Relleno Sanitario Cuenca Alta	1.008.000	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Puente Roca-Patricios	3.721.600	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
					6	Construccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcccion Puente Arroyo San Antonio - Provincia de Salta	400.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	38.600.000	15.400.000	15.055.100	59,05	20,07		8,20	40,86
						56 Aliviador Cildañes - Etapa II	26.000.000	2.800.000	2.729.087	96,16	3,84	0,00	2,20	57,29
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	12.600.000	12.600.000	12.326.012	79,85	20,15		27,79	137,92

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					9	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	400.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Canal Cintura Sur Tafi Viejo	400.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	10.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	700.000	10.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	100	0	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	7.100.000	100	0	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	4.515.088	4.514.286	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.000.000	4.515.088	4.514.286	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Bermúdez - Conducto Calle Paraná	13.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					24	Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Canal Complejo Las Maderas - Los Alisos - Pcia. Jujuy	600.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
25						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.639.200	3.176.910	37,78	5,00		1,41	28,20
					51	Restauración de Monumentos Históricos	6.496.000	4.639.200	3.176.910	37,78	5,00		1,41	28,20
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	2.600.000	13.005.964	10.036.703	34,65	4,00		3,58	89,50
					51	Edificios Fiscales	2.600.000	13.005.964	10.036.703	34,65	4,00		3,58	89,50
					7	CERIDE-Obras Complementarias Etapa II	7.410.000	2.752.990	2.752.846	16,14	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ceride - Obras Complementarias Etapa II	3.710.000	2.633.217	2.633.073	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
					52	Defensa Costera	3.700.000	119.773	119.773	49,70	8,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	995.272	992.747	46,21	53,00	0,00	0,43	0,81
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	1.665.000	995.272	992.747	46,21	53,00	0,00	0,43	0,81
					11	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	0,00	2,60	21,67
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación	300.000	350.000	347.517	15,93	12,00	0,00	2,60	21,67
					12	Protección Cueva de las Manos	704.000	580.438	580.407	79,48	20,52	0,00	0,00	0,00
					51	Protección Cueva de las Manos	704.000	580.438	580.407	79,48	20,52	0,00	0,00	0,00
					13	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción en Institutos del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia	2.000.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	3.540.000	3.539.026	0,00	100,00		43,77	43,77
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón	100.000	3.540.000	3.539.026	0,00	100,00		43,77	43,77
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	28.373.000	28.372.756	0,00	11,29		15,60	138,18
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	40.000.000	28.373.000	28.372.756	0,00	11,29		15,60	138,18
					21	Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	2.521.000	1.588.546	0,00	34,00		3,50	10,29
					51	Restauración y puesta en valor de la cubierta de la Basílica Ntra. Sra. de Luján	5.500.000	2.521.000	1.588.546	0,00	34,00		3,50	10,29
					22	Restauración y Puesta en valor en el Instituto Saturnino Unzué	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Restauración Ex Instituto Saturnino Unzué - MDQ - Cubiertas	1.500.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	7.355.000	3.201.881	28.490	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004 (*****)	0	1.268.611	28.490					
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	7.355.000	1.933.270	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	1.200.000	150.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Edificio del Instituto de Física de Rosario (*****)	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio del Instituto de Física de Rosario	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica								
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	335.360	54,60	5,00	1,30	3,20	64,00
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	335.360	54,60	5,00	1,30	3,20	64,00
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera								
					3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.215.528	4.054.528	3.966.703	35,00	33,00	0,00	22,00	66,67
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	715.528	24.423	0					
					51	Huellas Varias Misiones	100.000	150.000	223.700	35,00	33,00	0,00	24,00	72,73
					52	Huellas Mineras NOA	600.000	1.200.000	1.084.145	35,00	33,00	0,00	24,00	72,73
					53	Huellas Mineras Cuyo	625.000	1.201.655	1.580.408	35,00	33,00	0,00	24,00	72,73

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°	al 31/12/2006	Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						54 Huellas Mineras Comahue	500.000	1.195.000	870.000	35,00	33,00	0,00	19,00	57,58
						55 Huellas Mineras Patagonia	675.000	283.450	208.450	35,00	33,00	0,00	19,00	57,58
						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
					2	Obras Viales de Construcción, Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	1.521.000	361.000	46.186	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						52 Puente Encarnación-Posadas	1.521.000	361.000	46.186	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes (Buenos Aires) -	22.308.257	0	0	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	0	0	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes (Salta)	7.672.000	0	0	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda (Santa Fe)	5.034.784	0	0	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
					13	Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	1.295.000	1.172.154	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional de Náutica	5.797.000	1.295.000	1.172.154	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					14	Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial	5.071.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	3.867.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
					16	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	5.162.500	0	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
					17	Ampliación Unidad 11	1.900.000	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 11	1.900.000	0	0	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
					18	Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Jujuy - Unidad 33	1.643.410	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
					19	Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Salta - Unidad 34	2.085.500	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					20	Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.727.500	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					21	Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
						51 Carcel Federal de Candelaria	1.580.500	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
					22	Centro de Drogadependientes	1.118.710	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
						51 Centro de Drogadependientes	1.118.710	0	0	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
					55	Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario								
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	139.680.099	137.180.099	136.176.701	60,38	39,62		16,81	42,43
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	6.624.007	8.714.007	7.776.480					
						51 Modernización Línea A Subterráneo - Renovación y Aparatos de Vía	15.505.755	15.445.755	15.988.600	91,59	8,41		4,03	47,92
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	24.289.000	19.759.000	5.291.722	0,00	90,00		0,77	0,86
						53 Modernización Línea A Subterráneo - Instalaciones Eléctricas	16.800.000	16.800.000	13.271.273	71,23	23,00		4,62	20,09
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	20.792.900	20.792.900	23.027.553	18,70	77,00		30,06	39,04
						55 Centro de Transbordo Estación Moreno, F. C. Sarmiento	17.249.789	17.249.789	20.656.187	55,62	23,00		17,65	76,74
					62	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Ituzaingó	318.289	318.289	3.759.619	100,00	0,00			
					64	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Avellaneda	1.437.818	1.437.818	4.672.164	99,99	0,01		0,00	0,00
					65	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de San Isidro	2.188.994	2.188.994	9.947.323	99,99	0,01		0,00	0,00
					66	Paso a Diferente Nivel, Municipalidades de San Fernando - Tigre	19.407.339	19.407.339	10.324.792	18,00	50,00		5,93	11,86
					67	Paso Diferente Nivel, Municipalidad de Quilmes	5.193.189	5.193.189	9.694.236	50,13	49,87		24,81	49,75
					68	Paso a Diferente Nivel, Municipalidad de Tres de Febrero	9.873.019	9.873.019	11.766.751	20,39	50,00		38,00	76,00
					4	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	42.137.841	28.208.092	0,00	38,00		5,92	15,58
						0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	0	5.991.857	970.136					
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	52.421.841	36.145.984	27.237.956	0,00	38,00		5,92	15,58
					87	Desarrollo Integrador del Norte Grande - Préstamo BID								
					1	Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica (****)	206.925.272	2.900.859	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
						51 Tendido de Línea de 500 KV de Energía Eléctrica	206.925.272	2.900.859	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
					2	Pavimentación R.N.34 - Provincia de Jujuy	9.082.096	0	0	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N.34 Provincia de Jujuy	9.082.096	0	0	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
					3	Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°	al 31/12/2006	Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						51 Pavimentación R.N. 66 - Provincia de Jujuy	8.293.515	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					4	Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación R.N. 51- Provincia de Salta	10.769.283	0	0	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		91				Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula (**)(1)	11.172.000	27.262.000	26.915.582	0,00	3,00		3,54	118,00
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	11.172.000	27.262.000	26.915.582	0,00	3,00		3,54	118,00
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					4	Puerto Diamante	700.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	700.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					5	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	1.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					6	Reparacion de Puente Uriburu	0	1.148.160	846.687	0,00	100,00	0,00	60,34	60,34
						51 Reparacion en estructura de tablero y de calzada	0	1.148.160	846.687	0,00	100,00	0,00	60,34	60,34
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	1.400.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					8	Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Prolongación de la Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	600.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					9	Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turístico-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas-Zona "El Galfito"	100.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Piramide	1.000.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	800.000	0	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	240.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					15	Puente Pueyrredón	600.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Pueyrredón	600.000	0	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	2.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Dragado Río Uruguay	2.500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					17	Puente Uriburu Etapa II	800.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	800.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	200.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	300.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					21	Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Obra Defensas, contención Río Grande (Qa Humahuaca-Río Los Aliso) Pcia. Jujuy	500.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
				20		Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Itzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	25.120.718	65.845.211	65.844.167	12,96	55,00	20,75	62,70	114,00
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal (Hurlingham-Moron-Itzaingo-Tres de Febrero-Bs. As.	8.062.405	14.050.782	14.307.443	57,32	43,00	16,76	25,91	60,26
						52 1` Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Buenos Aires)	10.530.568	39.904.672	41.817.432	1,36	57,00	23,67	78,27	137,32
						53 2` Tramo Colectores Cloacales y estaciones elevadoras (Hurlingham-Moron-Itzaingo-Bs As)	6.527.745	11.889.757	9.719.292	0,00	99,00	20,75	50,60	51,11
					3	Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	15.758.019	41.913.292	41.889.364	7,10	48,00	14,65	46,59	97,06
						51 Planta Potabilizadora, ampliación , opt. y sist de captación e impulsión (Parana-Entre Ríos)	8.296.532	27.402.567	27.401.192	3,92	95,00	14,94	48,17	50,71
						52 Optimización de los serv de agua potable, Centros de Distribución y Redes (Parana-Entre Ríos)	7.461.487	14.510.725	14.488.172	11,48	87,00	14,10	45,45	52,24
					4	Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	14.307.212	14.307.212	4,87	58,00	29,97	53,04	91,45
						51 Rehab. y ampl. de planta depuradora cloacal (Bella Vista - Buenos Aires)	4.730.689	14.307.212	14.307.212	4,87	58,00	10,98	34,05	58,71
					5	Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	24.491.874	24.490.397	0,00	33,00	11,39	20,44	61,94

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					6	51 Colectores Cloacales, Est. Elev. y Planta Depurad (Lago San Roque - Carlos Paz - Córdoba)	9.986.895	24.491.874	24.490.397	0,00	33,00	4,69	13,74	41,64
						Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	36.138.093	36.121.098	0,00	100,00	24,49	74,80	74,80
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	8.851.408	36.138.093	36.121.098	0,00	100,00	30,89	81,20	81,20
					8	51 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs. As.)	4.340.725	15.213.809	15.212.709	0,00	54,00	11,65	47,78	88,48
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	3.838.743	15.193.459	15.179.709	0,00	58,00	11,55	47,48	81,86
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Moreno Bs As.)	501.982	20.350	33.000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					9	51 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	4.597.572	21.922.282	21.920.276	6,63	20,00	6,22	18,67	93,35
						51 Contrucción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	4.095.591	19.911.278	19.881.570	11,80	30,00	9,53	34,55	115,17
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras (Merlo Bs. As.)	501.981	2.011.004	2.038.706	0,00	1,00	4,03	4,03	403,00
					10	51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	400.153	3.137.374	3.133.655	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	200.793	3.135.000	3.133.655	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						52 Perforaciones 25 Pozos El Pato (Berazategui Bs. As.)	199.360	2.374	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					11	51 Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	6.236.734	6.236.734	6,06	79,00	9,55	30,42	38,51
						51 Construcción de Nueva Cloaca Maxima y Planta Depuradora (LR)	4.952.270	6.236.734	6.236.734	5,96	79,00	3,95	24,82	31,42
					12	51 Contrucción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
						51 Contrucción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomus Bs. AS.	200.793	1.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					13	51 Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Biale Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cloacas y Depuradoras (Lago San Roque - Cosquin - Sta. Maria de Punillas - Biale Masse)	150.595	1.095	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	51 Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto La Laguna Labouyale Córdoba	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	51 Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	1.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización y Rehabilitacion Planta de Tratamiento de desagües	9.337.302	1.000	0	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
					16	51 Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	3.011.891	23.252.088	23.235.382	0,00	15,00	7,61	17,05	113,67
						51 Optimización de Sistemas de Distribución de agua potable Formosa	1.000.000	6.085.685	6.077.244	0,00	8,00	7,97	10,31	128,88
						52 Optimización de Sistemas de Provisión de agua potable Formosa	2.011.891	17.166.403	17.158.138	0,00	22,00	7,42	20,32	92,36
					17	51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa (*****)	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	0	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18	51 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mza.	180.713	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					19	51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	900	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazu Misiones	200.793	900	0	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
					20	51 Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	3.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto V. Regina Rio Negro	1.913.769	3.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
					21	51 Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	1.533	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Depuradora Clocal y Redes Cloacales Gra. Mosconi Salta	1.688.037	1.533	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
					22	51 Construcción Planta Tratamiento líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	803.287	21.864.863	21.861.567	0,00	40,00	10,44	31,00	77,50
						51 Construcción Planta Tratamiento líquidos Cloacales Subsistema cloacal Rawson San Juan	401.701	9.316.086	9.315.485	0,00	24,00	9,37	30,18	125,75
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	12.546.984	12.546.082	0,00	30,00	11,23	26,77	89,23
						53 Cloaca Maxima y Estación de Bombeo Subsistema Cloacal Rawson San Juan	200.793	1.793	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	23.722.330	23.688.130	0,00	53,00	7,62	10,87	20,51
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Sta. Fe	11.314.036	23.722.330	23.688.130	0,00	53,00	3,25	6,50	12,26
					24	51 Construcción de Planta Depuradora Norte, Remodelación de Planta Sur y Cañerías Colectoras	600.000	723.636	720.872	0,00	1,00	3,51	3,51	351,00
						51 Construcción de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs. As.	300.000	718.636	404.149	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación de Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Zona Va. Aguirre Tandil Bs. As.	300.000	5.000	316.723	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					25	51 Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	10.083.331	10.076.331	0,00	58,00	0,00	38,09	65,67
						51 Construcción de 9 Perforaciones y Cañerías de Impulsión (Agua Potable) Tandil Bs. As.	500.000	10.083.331	10.076.331	0,00	58,00	0,00	38,09	65,67
					26	51 Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües El Maiten - Provincia de Chubut	300.000	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					27	51 Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Subacueducto ERP N4 Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	400.000	1.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					28	51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Lomas del Tafi - Tucumán	550.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					29	51 Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	400.000	4.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		Ejec./Progr.
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
624	1	19	17	659	30	52 Ampliación Redes Secundarias Estación de Bombeo e impulsión - San Isidro - Buenos Aires	200.000	2.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	400.000	2.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Optimización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	
					52 Optimización del Sistema de Desagües de la Ciudad de Andalgalá - Catamarca	200.000	1.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
					31 Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción del Acueducto Loro Blanco-Pampa del Infierno-Concepción del Bermejo- Chaco	200.000	2.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
					32 Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Opt. y Amp. Sist. Agua Potable Ciudad de San Salvador de Jujuy y otras - Jujuy	5.200.000	5.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
					33 Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Optimización del Acueducto El Cadillal - Tucumán	200.000	5.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
					34 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	2.000.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO									
					Actividades Centrales									
					1 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	97.297	94,70	1,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	97.297	97.297	97.297	94,70	1,00	0,00	0,00	0,00	
					3 Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino Etapa II	1.176.390	1.176.390	1.161.897	0,00	50,00	32,00	32,00	64,00	
					51 Construcción Edificio 25 (IGRM)	1.176.390	1.176.390	1.161.897	0,00	50,00	32,00	32,00	64,00	
					Producción de Información Geológica de Base									
					1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	880.000	751.176	29,45	30,00	0,38	1,66	5,53	
					51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.220.000	880.000	751.176	29,45	30,00	0,38	1,66	5,53	
					ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES									
					Infraestructura en Concesiones Viales									
					1 Aumento de capacidad en Corredores Viales en Pcia. De Bs. As.	4.600.000	16.074.973	16.074.874	0,00	42,63	19,82	43,68	102,46	
					51 Autovía Cañuelas-Mte. Grande - Sección 4 y 5 - RN N° 3 - Km 87,82 a Km 97,561(Buenos Aires)	4.600.000	16.074.973	16.074.874	0,00	42,63	19,82	43,68	102,46	
					2 Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs. As. I	1.900.000	1.323.536	1.311.941	34,72	65,28	0,00	58,73	89,97	
					51 Obra de alteo R.N.3 Km607,5-Km608,5 Cnel. Dorrego-Bs.As.	100.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					52 Mejora de Intersección RN 3 (650,17) con RN 249 Acc. Punta Alta	1.800.000	1.323.526	1.311.941	37,08	62,72	0,00	62,72	100,00	
					3 Aumento de Capac. En C.Viales en Pcia. Bs.As. III	5.000.000	15.898.387	15.898.387	0,00	84,99	40,81	99,46	117,03	
					51 Autovía Mar Del Plata-Balcarce I Tramo - R.226 - Km 20,5 - Km 31,7 (Buenos Aires)	5.000.000	15.898.387	15.898.387	0,00	84,99	40,81	99,46	117,03	
					4 Aumento de Capac. en C.Viales en Pcia. Bs.As. III	4.000.000	10	0	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	
					51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo - R.226 - Km 31,7 - Km 64,0 (Buenos Aires)	4.000.000	10	0	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	
					5 Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As II	1.600.000	307.519	299.136	0,00	26,36	17,97	17,97	68,15	
					51 Mejora en travesía urbana RN 205 Km 66-Cañuelas Bs. As.	1.500.000	278.509	270.136	0,00	21,17	35,93	35,93	169,72	
					52 Mejora intersección e iluminación RN 5-Km260 9 de julio	100.000	29.010	29.000	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	
					6 Seguridad en C. Viales en Pcia. de Bs. As III	4.800.000	29.020	29.000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Mejora intersección RN 7 Km202,16 Chacabuco-Bs. As.	1.900.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					52 Mejora en travesía urbana- RN 188 Km 156,80- Junin Bs.As.	2.900.000	29.010	29.000	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	
					7 Mejora Intersección Ruta Nacional N° 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Mejora Intersección Ruta Nacional N° 8 Km 224,9 Pergamino - Buenos Aires	1.900.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					8 Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. IV	15.714.400	5.113.310	5.113.310	0,00	10,16	2,56	5,27	51,87	
					51 Autopista Luján-Mercedes Sección I Ruta nacional N° 5 Km. 66,10 - Km. 73,40 Buenos Aires	6.714.400	1.210	1.120	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					52 Autopista Luján- Mercedes Sección III-RN 5 Km 85,78-Km 95,65 (Buenos Aires)	9.000.000	5.112.100	5.112.190	0,00	10,25	5,13	10,55	102,93	
					9 Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs.As. V	6.500.000	6.535.012	6.535.012	0,00	10,00	10,02	15,80	158,00	
					51 Tramo Campana-Zarate RN 9 e/Km 72,62-Km 85,19	6.500.000	6.535.012	6.535.012	0,00	10,00	10,02	15,80	158,00	
					10 Seguridad en C. Viales en Pcia. de Santa Fe I	3.000.000	19.210	19.200	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	
					52 Mejora en travesía urbana - RN 11 K 787- Reconquista Sta.Fe	3.000.000	19.210	19.200	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	
					11 Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Bs. As.VI	6.400.000	10	0	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	
					51 Obra de víncul. Ex RN 193-tramo emp. RN 8-emp. RP 39 Exaltación de la Cruz	6.400.000	10	0	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	
					12 Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. Córdoba I	6.198.378	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Obra en RNA005-Tramo emp.RN8-emp.RP36-Sec.Km 0-12 Río Cuarto	6.198.378	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					13 Seguridad en C. Viales en Pcia.de Sta.Fe II	4.800.000	30.720	30.700	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Mejoras en intersecciones RN.33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.900.000	10	0	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	
					52 Adecuación de accesos RN 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.900.000	30.710	30.700	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°	al 31/12/2006	Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					14	Seguridad en Corredores Viales I	0	4.583.098	3.118.506	55,33	44,67	2,62	17,55	39,29
					52	Const.pasarelas peat.RNN3Km76,75 Cañuelas(Bs.As)RNN33 Km751	0	58.719	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright (Santa Fe) RNN8 Km 294,60	0	842.439	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Apertura paso nivel de colectoras RN226 Km 166,6 Tandil(BsAs)	0	15.985	15.984	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Trav.urbana Río Cuarto(Cba)RN8 Km598,8;A-005 Km0-11,4;RN36	0	21.045	21.045	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Const.pasarelas peat.RN9 Km1349,0 B.Paz(Tuc);RN9 Km1459,80 M	0	20.095	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Mejora de colectoras Lima-Zarate (Bs.As.) RN9 Km100	0	50.569	48.589	97,36	2,64	0,00	2,64	100,00
					59	Mejora intersec.y const.colectoras RN3 Km109-110 S.M.Monte	0	255.957	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construc.canal desagües pluv.-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	0	100	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					62	Mejora Insters.RN19 Km127,2 inters.RN158 S.Fco.(Cba) RN19 Km	0	309.899	311.141	90,10	6,90	0,00	6,90	100,00
					63	Trav.urb.RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerric	0	292.471	292.882	0,00	100,00	57,82	57,82	57,82
					66	Mejora Acceso a Vedia(Bs.As.) RN7 km312,26 (Bs.As.)	0	19.233	19.200	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					67	Mejora acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39(Bs.As.)	0	553.775	303.706	73,95	26,05	0,00	26,05	100,00
					68	Mejora acceso canalizado a la Laguna de Lobos RN205 Km111,45	0	36.573	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Rotonda en intersec.RN7 Km423,32 y RN33 Rufino (Sta Fe)	0	712.638	712.638	59,05	40,95	0,00	40,95	100,00
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque (Corrientes)	0	34	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					74	Acceso a Villa Ramallo RN9 Km 207,00 (Bs.As.)	0	26.280	26.200	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					76	Mejora Intersección de acceso Hersilia (Sta.Fe)RN34 Km369,88	0	100	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Mejora acceso canalizado RN33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	0	19.210	19.200	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					79	Mejora inters.acceso a S.Esteban-Los Cocos (Cba) RN38 Km75,3	0	19.210	19.200	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora de acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RN34 Km 496,08	0	1.309.522	1.309.521	9,16	90,84	0,00	90,84	100,00
					81	Adecuación urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes (Salta)	0	19	0	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00
					82	Construcción intersec.canalizada RN12 KM1383,25 Sta Ana-Misi	0	19.225	19.200	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					16	Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	0	288.518	288.409	0,00	10,40	51,39	51,39	494,13
					51	Iluminación intersec. RN19 Int.RP10 - Río Primero (Cba)	0	288.518	288.409	0,00	10,40	51,39	51,39	494,13
					17	Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires	0	87.829	26.829	95,85	4,15	0,00	4,15	100,00
					55	Construcción pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	0	87.829	26.829	92,25	7,75	0,00	7,75	100,00
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia.Bs.As.	0	269.692	263.905	0,00	100,00	10,47	33,32	33,32
					51	Construc.pasarela peatonal RN8 Km 78 - Exalt.de la Cruz(Bs.As)	0	269.546	263.905	0,00	100,00	31,42	100,00	100,00
					52	Const. de Colec. RN N3 Km 109/110 - San Miguel del Monte Bs.As.	0	106	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Iluminación Rotonda RN N3 Km 192,34 - Int. RP N30- Las Flores	0	40	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					22	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Mendoza	0	4.247.086	4.247.030	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					51	Adecuación Acc. Este e Iluminación RN N7 Km 902,15 La Paz Mendoza	0	1.017.879	1.017.879	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					52	Int. Canalizada Iluminada - Acc. Oeste RN N7 Km 905 La Paz Mendoza	0	1.432.133	1.160.458	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					53	Int. Canalizada Iluminada RN N7 Km 940,41 La Dormida Mendoza	0	846.171	1.117.966	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					54	Iluminación Acceso Las Catitas RN N7 Km 954,1 Las Catitas Mendoza	0	950.903	950.727	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					23	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II	6.783.003	13	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha RN8 Sec. Km606-619- Tramo Río IV- Holmberg	6.783.003	13	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					24	Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Salta I	1.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción multitrocha RN9 Km 1547-1555 Cabeza de Buoy-Salta	1.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					25	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II	1.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constr. Multitrocha RN34 km.1129-1135,5-Cab.de Buoy-Zorralito	1.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					26	Seguridad en C.viales en Provincia de Tucumán I	3.900.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ensanche de puente RN9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	3.900.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					27	Seguridad en C. Viales en Provincia de Tucumán II	2.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de acceso RN9 Km 1362 - Trancas - Tucumán	2.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Rotonda Ruta Nacional Nº 16 Km. 157,15 Intersección Ruta Prov. Nº 4 - Chaco	1.800.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Bicisenda Ruta Nacional Nº 12 Km.1017,84 - Km 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	2.000.000	10	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					30	Obras menores en Ccesiones Viales (1)	7.150.000	1.413.570	1.403.472	0,00	13,72	9,96	30,88	225,07
					51	Rotonda en Intersección RN3 Km 448,7-RP75 Gonzalez Chavez - Bs.As.	4.600.000	29.010	29.000	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00
					54	Mejora Intersección RN11- Calle Sargento Cabral - San Lorenzo - Santa Fe	1.350.000	40.700	30.700	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00
					55	Adecuación de acceso RN34 Km 252,60 - Sunchales - Santa Fe (1)	1.200.000	1.343.860	1.343.772	0,00	32,42	29,89	93,01	286,89

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
					31	Aumento de Capacidad en C. Viales en Provincia de Misiones I	8.758.350	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					51	Constr. de terceras trochas RN12 Km 1370-1399 Arroyo San Juan - San Ignacio-Misiones	8.758.350	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					32	Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones II	14.598.000	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					51	Construcción terceras trochas RN12 km 1399-1436 San Ignacio-Jardín América	14.598.000	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					33	Aumento de capacidad en C.Viales en provincia de Misiones III	8.758.350	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					51	Construcción terceras trochas RN12 km 1442-1470 Jardín América-Puerto Rico	8.758.350	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					34	Aumento de capacidad en C. Viales en provincia de Misiones IV	13.138.200	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					51	Construcción terceras trochas RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto.Rico-Montecarlo-El Dorado-Misiones	13.138.200	0	0	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					35	Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	17.185.644	17.180.913	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					51	Const.Terceras Trochas RN Nº 12 Km 1545-1594,4 El Dorado-Col Delicia-Alto Paraná- Misiones	14.057.800	17.185.644	17.180.913	0,00	8,42	1,56	5,08	60,29
					36	Aumento de capacidad en C. Viales en Provincia de Buenos Aires VII	8.834.650	8.834.650	8.540.470	12,79	87,21	0,00	88,01	100,92
					51	Construcción distribuidor de Bernal-Calle Espora-Quilmes	8.834.650	8.834.650	8.540.470	12,79	87,21	0,00	88,01	100,92
					37	Seguridad en C.Viales en Provincia de La Pampa	821.000	2.319.464	2.317.031	0,00	60,09	17,32	49,61	82,56
					51	Readecuación acceso planta urbana RN5 Km 605-606- Santa Rosa	821.000	2.319.464	2.317.031	0,00	60,09	17,32	49,61	82,56
					38	Aumento de capacidad en C. Viales en Pcia. de Mendoza I	26.012.350	66.838.340	44.711.205	2,23	61,63	20,00	58,97	95,68
					51	Doble vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN7 km 965,51-998,80 Mendoza	26.012.350	66.838.340	44.711.205	2,23	61,63	20,00	58,97	95,68
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, seccion II, Jauregui Pje	0	19.398.738	19.394.073	28,35	71,65	0,93	68,42	95,49
					51	Aut. Luján - Mercedes - Etapa I, sección II RN N5 Km 72,42	0	19.398.738	19.394.073	28,35	71,65	0,93	68,42	95,49
					40	Aumento de capacidad en C. Viales - Provincia de Santiago del Estero I	4.185.000	5.174.978	5.168.646	0,00	92,75	11,54	99,72	107,51
					51	Ensanche de puente sobre Río Dulce RN9 Km 1205 - Termas de Río Hondo	4.185.000	5.174.978	5.168.646	0,00	92,75	11,54	99,72	107,51
					48	Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Sta. Fe	0	730.010	729.603	0,00	100,00	25,40	50,00	50,00
					51	Construcción pasarela peatonal RN N9 Km 376 Cañada de Gomez	0	10	0	0,00	100,00	50,80	100,00	100,00
					52	Construcción pasarela RN N33 km 713 Chabas Sta. Fe	0	730.000	729.603	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Iluminación Int. RN N9 Km 227,03 con RN N 188 - San Nicolas	0	578.699	420.562	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					51	Iluminación Int. Rn N9 Km 227,03 con RN188 - San Nicolas	0	578.699	420.562	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					65	Construcción destacamentos policiales	1.000.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción destacamentos policiales	1.000.000	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					66	Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acceso y Construcción Terminal de Pasajeros - La Quiaca y Palpalá - Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					67	Seguridad en Corredores Viales - Tucuman III (*****)	0	1.715.616	1.713.113	0,00	69,97	0,00	21,96	31,38
					51	Pavimentacion colector,constr.e ilum.pasarelas RN9-Tucuman	0	1.715.616	1.713.113	0,00	69,97	0,00	21,96	31,38
					68	Iluminacion Autopista Rosario-Armstrong-Santa Fe (*****)	0	10.150	10.091	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ilum.Distrib.Funes-Aut.Rosario-Armstrong inters.RPN34s-Funes	0	10.150	10.091	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construccion en R.N. N 188 y R.N. N 33-Santa Fe (*****)	0	61.425	61.400	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Intersecc. canalizada para giro de cam.RN 33Km 711-Chabas	0	30.710	30.700	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					52	Interseccion canalizada p/giro de camiones RN 33 Km711 Chaba	0	30.715	30.700	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					70	Construc. Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco (*****)	0	28.850	28.770	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construc. Pasarela Peatonal RN11Km.1005,70 Barrio Toba Resis	0	28.850	28.770	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construccion en Autopista Richieri (*****)	0	26.210	26.200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rama de salida Km.21 Autopista Richieri-Buenos Aires	0	26.210	26.200	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					18	Infraestructura en Areas Urbanas								
					1	Obras menores en áreas urbanas	847.800	29.020	29.000	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00
					53	Rotonda en inters. RNA-015 y Av. Mons. Roch-Concordia- Entre Ríos	722.800	29.010	29.000	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00
					54	Iluminación en intersec. RN14 y RNA-015- Concordia - Entre Ríos	125.000	10	0	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II	0	2.783.965	2.773.403	0,00	86,71	0,00	86,71	100,00
					51	Repavimentación de la RP N42 seccion RP 51 Acceso a Rawson	0	2.783.965	2.773.403	0,00	86,71	0,00	86,71	100,00
					3	Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	10	0	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y remodelación Ruta Prov. Nº 11 e. diag 74 y calle 60 La Plata- Buenos Aires	825.523	10	0	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.042.300	4.626.683	4.625.450	0,00	65,00	0,00	68,71	105,71
					51	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	4.042.300	4.626.683	4.625.450	0,00	100,00	34,30	121,69	121,69
					52	Pavimentación 70 cuadras Santa Rosa - La Pampa	1.000.000	0	0	0,00	33,00	34,30	34,30	103,94
					5	Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	22.966.779	22.966.779	0,00	2,59	0,00	5,88	227,03
					51	Vinc. y remod. RP Nº 36 - Rot. Gutierrez y RP Nº 2 Fcio. Varela-Berazategui- Buenos Aires	2.722.500	22.966.779	22.966.779	0,00	2,59	0,00	5,88	227,03
					6	Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	10	0	0,00	39,59	29,77	29,77	75,20

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
								Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°		
							Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
						51 Remod. y Pavimentación Av. 66 y Calle 11 (Acc Esc. 67) - La Plata - Buenos Aires	2.940.000	10	0	0,00	39,59	29,77	29,77	75,20
					7	Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	482.885	394.249	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
						51 Repavimentación y ensanche ex Ruta 8 -Calle uruguay a Guido- Pilar - Buenos Aires	4.600.000	482.885	394.249	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.600.000	29.010	29.000	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en accesos Sur - RN14 Km 252,60 - Concordia -Entre Ríos	3.600.000	29.010	29.000	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
					10	Obra Basica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Basica y Gasoducto El Carmen - San Antonio - Provincia de Jujuy	250.000	0	0	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
					11	Obras Menores en Areas Urbanas (*****)	0	5.737	5.700	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Pavimentación tramos urbanos RN Nº9 Km 100,49 Lima (Bs.As.)	0	5.737	5.700	0,00	s/i	s/i	s/i	
					12	Seguridad en Areas No Concesionadas (*****)	0	11.595	11.523	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Repavimentación y desagües - Magdalena (Buenos Aires)	0	11.595	11.523	0,00	s/i	s/i	s/i	
					13	Repavimentación e Iluminación-Camino al Centro Atómico Ezeiza (*****)	0	152.000	11.815	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Repavimentación e iluminación-Camino al Centro Atómico Ezeiza	0	152.000	11.815	0,00	s/i	s/i	s/i	
		19				Obras Mejorativas en Corredores Viales Nacionales								
					1	Corredor Vial 2	13.400.000	12.682.125	12.681.354	0,00	50,00	14,00	25,40	50,80
						51 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 98 - 107	1.200.000	1.985.175	2.089.478	0,00	50,00	36,15	48,11	96,22
						52 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 143 - 150	1.200.000	100	0	0,00	50,00	14,32	14,32	28,64
						53 Corredor Vial 2 - Ruta 5 Km 208 - 221	1.200.000	9.540.200	9.638.494	0,00	50,00	31,41	91,20	182,40
						54 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 259 - 276	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 399 - 406	1.800.000	1.156.650	953.382	0,00	50,00	16,18	16,18	32,36
						56 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 457 - 492	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	4,66	9,32
						57 Corredor Vial 2 - Ruta 7 Km 424 - 457	2.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					2	Corredor Vial 3	8.000.000	44.400	44.200	0,00	11,19	0,91	0,91	8,13
						51 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 106 - 206	4.000.000	22.200	22.100	0,00	11,19	1,82	1,82	16,26
						52 Corredor Vial 3 - Ruta 9 Desc Km 96 - 106	4.000.000	22.200	22.100	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00
					3	Corredor Vial 4	8.300.000	986.143	977.514	0,00	10,01	6,64	6,64	66,33
						51 Corredor Vial 4 - Ruta 8 Km 661 - 695	3.800.000	10	0	0,00	8,70	19,93	19,93	229,08
						52 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 586 - 616	2.000.000	986.133	977.514	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
						53 Corredor Vial 4 - Ruta 33 Km 673 - 675	2.500.000	0	0	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00
					5	Corredor Vial 5	17.685.000	9.708.089	9.480.941	0,00	25,33	5,93	15,54	61,35
						51 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1215 - 1225	2.500.000	7.653.310	8.224.951	0,00	29,40	20,91	78,63	267,45
						52 Corredor Vial 5 - Ruta 9 Km 1315 - 1326	2.500.000	699.400	699.380	0,00	29,40	8,87	8,87	30,17
						53 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 596 - 626	2.500.000	1.333.529	535.466	0,00	15,51	8,56	8,56	55,19
						54 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 584 - 596 Km 626 - 696	2.500.000	21.850	21.143	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00
						55 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 1164 - 1177	3.000.000	0	0	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00
						56 Corredor Vial 5 - Ruta 34 Km 66 - 86	4.685.000	0	0	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00
		664				ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS								
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos								
					1	Ampliacion y recuperacion de plataformas, pistas y calles (#)	0	1.962.216	1.133.510	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Ampliacion y recuperacion de plataformas, pistas y calles	0	1.962.216	1.133.510	0,00	s/i	s/i	s/i	
					5	Reacondicionamiento de plataformas, pistas y calles de rodaje en Aeropuertos - Etapa 2	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Nivelación y puesta en norma las franjas de seguridad del Aeropuerto de Villa Gesell	4.190.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	Reacondicionamiento de Plataformas pistas y calles en Aeropuerto - Etapa 2	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación de estado superficial de pista, calle de rodaje en Aeropuerto de Tandil	2.000.000	5.211.294	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		70				Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología								
					336	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
					43	Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología								
					1	Recondicionamiento del Edificio Central (#)	0	70.000	47.318	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcción de Sanitarios en el Subsuelo	0	70.000	47.318	0,00	s/i	s/i	s/i	
		75				Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
					350	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
					1	Actividades Centrales								
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (*****)	1.200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	1.200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4°	al 31/12/2006	Ejec./Progr.
								31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
80	310	1			3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Salud y Ambiente								
902	52					MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE								
						Actividades Centrales								
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
903	53				52	Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central, Imprenta, Archivo y Almacenes	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL								
						Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción								
					1	Refuncionalización Comedor	700.000	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Comedor	700.000	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
						Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	1.270.000	17.820	17.736	32,05	67,95	0,00	0,00	0,00
					0	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	450.000	17.820	17.736					
					53	Remodelación del Pabellón N°4	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Refacción Ex Vestuario de Parlatorio	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Refacción Integral de Pabellones N° 3,5 y 8	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital	480.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					0	Reparación y Mantenimiento en Hospital	380.000	0	0					
					51	Cloacas en Barrios	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación de Usina	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Readecuación del Lavadero	0	273.960	273.607	0,00	100,00	0,16	0,16	0,16
					51	Readecuación del Lavadero	0	273.960	273.607	0,00	100,00	0,16	0,16	0,16
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					11	Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilización (*****)	0	979.984	849.542	0,00	s/i	0,34	30,34	
					51	Construcción y Equipamiento de la Sala de Esterilización	0	979.984	849.542	0,00	s/i	0,34	30,34	
					12	Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha (*****)	0	348.435	348.200	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Refacción General de Consultorios Externos - Ala Derecha	0	348.435	348.200	0,00	s/i	0,00	0,00	
					13	Construcción de Quirófano (*****)	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
					51	Construcción de Quirófano	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN (ANLIS)								
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					2	Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoria Interna (*****)	0	72.000	66.528	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Remodelación y Ampliación de la Unidad de Auditoria Interna	0	72.000	66.528	0,00	s/i	s/i	s/i	
					1	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos	622.400	11.020	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					59	Remodelación del Bioterio Central	350.400	1	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					61	Remodelación de las Areas de Inmunización y Cría de Animales	272.000	11.019	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
					2	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológicos - Etapa II	285.600	240.763	161.549	0,00	100,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación de Central de Esterilización, Descontaminación y Elaboración de Medios de Cultivo	183.600	179.758	109.569	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
					53	Remodelación del Serpentario	102.000	9.025	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Remodelación del Bioterio de Rabia y Sueros (*****)	0	42.000	42.000	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
					55	Remodelación del Area de Procesos (*****)	0	9.980	9.980	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					2	Invest, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virales								
					1	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	263.919	165.919	165.243	9,83	65,00	2,70	2,70	4,15
					60	Adecuación de Laboratorios de Bacteriología y Virología	203.094	165.649	154.017	39,83	35,00	4,90	4,90	14,00
					62	Adecuación de Laboratorios Micología y Parasitología y Areas Administrativas	60.825	270	11.226	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					5	Control de Calidad de Biológicos								
					2	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					60	Adecuación de Laboratorios y Bioterio de Experimentación del CNCC	180.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Informe al 31/12/2006

CUADRO C

						FINANCIERO (en pesos)			FISICO (% de avance físico)				
						Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado	Acumulado	%
							Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	en el 4º		Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Original	31/12/2006	al 31/12/06	al 31/12/2005	vigente	trim.	al 31/12/2006	anual
				8									
					1	Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
						Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	s/i	s/i
					51	Reparación y Pintura. Constr. Acceso para personas discapacitadas	202.620	11.897	11.896	5,00	90,00	s/i	s/i
					2	Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II (*****)	0	100.723	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio I.N.E. Dr. Juan Jara Fase II	0	100.723	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				9		Investigación y Diagnóstico de Factores de Riesgo Nutricional.							
					1	Refuncionalización del Edificio	61.458	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00 0,00
					67	Ampliación de Laboratorio y Consultorio en el Inst. Nac. de Investigac. Nutric. de SALTA	61.458	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00 0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR							
			60			Atención a Discapacitados Psicofísicos							
					1	Contrucción Natatorio	500.000	689.408	626.131	5,00	41,66	72,98	90,04 216,13
						51 Construcción Natatorio	500.000	689.408	626.131	5,00	41,66	72,98	90,04 216,13
					7	Remodelación del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	240.000	102.570	102.568	0,00	100,00	32,84	100,00 100,00
						51 Construcción de Rampa de Emergencia	40.000	52.570	52.568	0,00	100,00	32,84	100,00 100,00
						52 Instalación Generador Eléctrico	50.000	50.000	50.000	0,00	100,00	100,00	100,00 100,00
						53 Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00 0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Se realizó un anticipo financiero, las obras se iniciaron a fines de septiembre de 2006.

(***) Este proyecto lo ejecuta la Dirección de Arquitectura dentro del proyecto Monumentos Históricos.

(****) Los proyectos se realizan por transferencias.

(*****) Obra terminada, se estan pagando certificaciones atrasadas.

(*****) Proyectos iniciados en el 2º trimestre.

(*****) Proyectos iniciados en el 3º trimestre.

(*****) Proyecto y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

(*****) Los créditos del programa 18 fueron transferidos del Ministerio de Infraestructura durante el 3º trim. No se prevee ejecución para el ejercicio 2006.

(#) Proyectos iniciados en el 4º trimestre.

(1) No reprogramaron

s/i Sin información

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
MANTENIMIENTO																			
Mantenimiento por Administración																			
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		59.890	01-01-06	31-12-06	10.323.000	61.690.149	61.690.149	25,00%	91,67%	91,67%	6
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	DNU	14		s/d	01-01-06	31-12-06	3.088.000	3.999.393	3.999.391	0,00%	0,00%	0,00%	6
Total Mantenimiento por Administración										59.890			13.411.000	65.689.542	65.689.540		91,67%	91,67%	
Mantenimiento por Contrato																			
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/Sanjuan/S.Martin-Mendoza/ André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	15.251	22-08-95	31-12-06	584.000	1.731.551	1.731.550	2,81%	11,26%	76,19%	6
16	2	8	51	CHACO	16	Emp. R.N.N° 95 - Emp. R.N.N° 9/34	KM. 176,27 - KM. 712,22			6.663	15-09-95	14-07-02	0	77.867	77.864	0,00%	0,00%	100,00%	8
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. R.N.N 86/ Emp R.11 - Villa Gral Güemes	km 1167,24 - km1373,73/ km 1290,62 - km 1488 (km-Mes)	8	403,4	3.616	21-04-97	31-07-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
Total Mantenimiento por Contrato										25.530			684.000	1.809.419	1.809.414		6,73%	85,78%	
Mantenimiento por Convenio																			
16	3	24	51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 10	Tramos Varios	11	633,3	8.571	01-01-06	31-12-07	416.000	1.936.413	1.936.410	8,82%	21,96%	21,96%	6
16	3	25	51	NEUQUEN	405-22	TFO Neuquén - Convenio 10	Tramos Varios	11	528,4	7.489	01-01-06	31-12-07	397.000	2.444.502	2.443.677	7,06%	30,03%	30,03%	6
16	3	26	51	RIO NEGRO	23	TFO Río Negro - Convenio 10	Varias	11	1.136,5	8.482	01-01-06	31-12-07	152.000	4.413.673	4.413.672	12,47%	47,37%	47,37%	6
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)	Tramos Varias	11	1.714,9	22.829	01-01-06	31-12-06	2.768.000	25.050.879	25.050.879	8,31%	95,37%	95,37%	6
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3-Compl i a b	TFO Tierra del Fuego - Convenio 9	Varias	11	520,5	10.191	01-01-06	31-12-07	100.000	3.492.189	3.492.188	17,33%	43,57%	43,57%	6
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 10	KM 0 - KM 257,5 / KM 1479,73 - KM 1544,98	11	392,8	3.495	01-01-06	31-12-07	20.000	1.102.362	1.102.359	12,88%	44,23%	44,23%	6
16	3	31	51	SALTA	40-51	TFO Salta - Convenio 8	Tramos Varios	11	482,4	2.614	01-01-06	31-12-06	613.000	1.553.794	1.553.793	0,00%	0,00%	42,54%	6
16	3	32	51	FORMOSA	81 - 86	TFO Formosa - Convenio 8	Tramos Varios	11	236,0	3.626	01-01-06	30-11-07	178.000	2.224.594	2.224.590	30,17%	63,46%	63,46%	6
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1.089	01-09-04	31-08-06	224.000	393.659	393.658	0,00%	28,37%	94,12%	6
16	3	34	51	MENDOZA	405 - 145	TFO Mendoza - Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	4.895	01-04-04	31-03-07	511.000	2.550.842	2.550.441	9,03%	49,54%	91,13%	7
16	3	36	51	CHUBUT	40 - 26 - 260 -	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	5.873	01-01-04	31-12-06	50.000	1.409.252	1.409.251	15,32%	74,89%	94,23%	6
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-79	TFO La Rioja - Convenio 6	Tramos Varios	11	466,1	3.999	01-12-04	31-03-07	50.000	1.566.999	1.566.999	11,25%	44,59%	95,15%	6
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 2	Tramos Varios	11	163,4	1.864	01-01-06	31-12-07	808.000	826.429	826.417	11,91%	38,09%	38,09%	6
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	Tramos Varios - TFO Convenio 5	Varias	11	67,4	2.558	01-01-06	30-12-07	100.000	404.345	404.344	9,73%	38,74%	38,74%	6
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8:Belen- Lte.c/Tucumán	Km. 798,82- km 986,82	11	188,0	2.632	01-01-07	30-11-07	538.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO - Convenio2: Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P.N°17	Km1056,32 - Km1116,96 DNU	11	60,6	850	01-01-07	30-11-07	850.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	3		51	JUJUY	40N-52	TFO Jujuy - Convenio 9	Tramos Varios	11	188,3	1.535	01-01-04	31-12-05				0,00%	4,56%	95,77%	7
16	3			SANTA CRUZ	281	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (2)	Tramos Varios	11	1.840,5	21.272	01-01-05	31-12-05				0,00%	3,68%	99,62%	7
16	3		51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 1	Tramos Varios	11	163,4	1.708	01-01-04	31-12-05				0,00%	0,00%	87,12%	7
16	3		51	LA PAMPA	143-151-152	TFO La Pampa - Convenio 9	Varias	11	633,3	5.707	01-01-04	31-12-05				0,00%	6,15%	100,00%	7
16	3		51	NEUQUEN	22-405-234	TFO Neuquén - Convenio 9	Varias	11	619,7	4.349	01-01-04	31-12-05				0,00%	1,03%	92,80%	7
16	3		51	RIO NEGRO	23-250-251-3	TFO Río Negro - Convenio 9	Varias	11	801,5	5.257	01-01-04	31-12-05				0,00%	2,00%	100,00%	7
16	3		51	TIERRA DEL FUEGO	3-Com. a-b-i	TFO Tierra del Fuego - Convenio 8	Varias	11	517,6	8.092	01-01-04	30-12-05				0,00%	2,22%	72,07%	7
Total Mantenimiento por Convenio										138.977			7.775.000	49.369.934	49.368.678		36,23%	72,55%	
Señalamiento																			
16	4	1	51	PAIS		Señalamiento Horizontal - Nacional	País	12		19.318	01-01-06	31-12-06	1.022.000	22.836.238	22.836.237	25,00%	91,68%	91,68%	6
Obras de Emergencia																			
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		32.997	01-01-06	31-12-06	8.250.000	45.859.340	45.859.339	25,00%	91,68%	91,68%	6
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		10.349	01-01-06	31-12-06	1.635.000	12.175.021	12.175.019	24,99%	91,63%	91,63%	6
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		755	01-01-06	31-12-06	358.000	756.737	756.735	25,04%	91,83%	91,83%	6
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		26.201	01-12-03	30-11-07	73.000	26.580.840	26.532.838	25,00%	91,65%	91,65%	6
Total Obras de Emergencia										70.301			10.316.000	85.371.938	85.323.931		91,66%	91,66%	
Mantenimiento por Sistema Modular																			
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	2.729	19-07-04	18-07-06	449.000	986.598	986.597	0,00%	33,13%	99,96%	7
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	7.989	03-12-04	31-12-06	678.000	4.640.577	4.640.576	8,50%	51,56%	75,49%	6
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	9.090	03-05-04	31-01-07	288.000	2.413.626	2.413.355	2,04%	24,14%	80,17%	6
16	6	5	51	CHUBUT	405	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Río Sengul)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	6.852	07-09-04	06-02-07	460.000	2.866.582	2.866.581	4,09%	39,93%	84,00%	6
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. R.P.N°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N.N°40-Lte.c/Chil	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 10	11	147,1	4.647	01-01-07	31-12-08	951.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	7	51	MENDOZA	7	Emp. Ruta Nacional N° 40 S - Límite con Chile	km 1064 - km 1238 - Sistema Modular	11	174,0	2.958	01-01-07	31-12-08	605.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 / Mdza. - Lte S.Juan / S.Martin - M	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Siste	11	194,7	7.260	01-01-07	31-12-08	266.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	15
16	6	9	51	MENDOZA	405	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	9.279	17-03-05	31-05-07	332.000	2.945.203	2.945.202	4,95%	27,74%	60,47%	6
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N.N° 11 - A Nivel R.N.N° 11- Calle J/Gara	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	5.901	21-07-05	31-05-07	678.000	2.666.403	2.666.032	4,17%	38,86%	55,53%	6
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	9.048	14-07-04	28-02-07	921.000	1.831.647	1.831.646	5,29%	25,65%	60,34%	6
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. R.N.N° 50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Mod	11	259,0	6.592	15-04-04	28-02-07	100.000	2.947.973	2.946.971	10,12%	45,42%	86,01%	6

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
16	6	13	51	SAN JUAN	20-40N-A014	Tramos Varios	Secciones Varias - Sistema Modular	11	26,9	1.611	01-01-07	31-12-08	900.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	14	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luises	Km. 2303,4 - Km. 2461 - Sistema Modular	11	157,6	2.700	01-01-07	31-12-08	266.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	15	51	SANTA CRUZ	3	Estancia Los Luises - Chimen Aike	Km. 2461 - Km. 2619,35 - Sistema Modular	11	158,4	2.700	01-01-07	31-12-08	266.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	16	51	SGO DEL ESTERO	9	Lte. con Córdoba - Stgo. del Estero (ent.)	Km 910 - Km 1139,8	11	46,0	1.100	01-01-07	31-12-08	286.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	17	51	SGO DEL ESTERO	64	Stgo del Estero (sal.) - Emp. R.N. N°38	Km 0 - Km 162,06	11	162,1	2.500	01-01-07	31-12-08	286.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	18	51	TIERRA DEL FUEGO	3	San Sebastian - Tolhuin	Km. 2740 - Km. 2932,71 - Sistema Modular	11	192,7	3.000	01-01-07	31-12-08	327.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	7.037	01-01-07	31-12-08	719.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	6.000	01-01-07	31-12-08	1.226.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	6	21	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aerop. Gral. San Martín - Emp. R.N.N°105	Km1336 - Km1349 DNU	11	13,2	1.500	01-01-07	30-11-07	230.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

Total Mantenimiento por Sistema Modular

100.493

10.234.000

21.298.918

21.296.960

20,04%

41,61%

Obras de Seguridad Social																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	11.109	01-01-07	28-02-08	4.416.000	42.110	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	11.109	01-01-07	28-02-08	4.341.500	25.610	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	3	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)		17	200,0	200	01-01-07	30-04-07	4.491.500	25.610	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	8.292	01-01-07	28-02-08	3.641.000	42.110	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	5	51	BUENOS AIRES	3	Localidad de Gral. Cerri - Semáforos - Señalización		17	1,0	2.000	01-01-07	30-04-07	100.000	75.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	5	52	BUENOS AIRES	3	Acceso a Stroeder		17	1,0	1.500	01-01-07	30-04-07	715.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhué (I) y Espartillador (D)		17	1,0	2.300	01-01-07	30-04-07	1.358.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	2.000	01-01-07	30-04-07	1.082.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	5	55	BUENOS AIRES	35	Acceso a Villa Iris (km 107,92)		17	1,0	2.000	01-01-07	30-04-07	541.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	6	51	ENTRE RIOS	12	Empalme R.P.N° 7		17	1,0	600	01-01-07	31-05-07	370.000	243.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	6	52	ENTRE RIOS	12 - 18	R.N.N° 12 y R.N.N° 18 - Paraje La Loma		17	1,0	650	01-01-07	31-03-07	352.000	231.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Empalme R.P.N° 6		17	1,0	4.657	01-01-07	28-02-08	1.810.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	6	54	ENTRE RIOS	127	Readeacuación Intersección R.P.N° 2		17	1,0	1.506	01-01-07	30-11-07	487.000	320.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	2.000	01-01-07	30-11-07	1.082.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Il		17		300	01-01-07	31-05-07	162.000	106.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	300	01-01-07	31-05-07	162.000	106.002	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	8	51	NEUQUEN	237	Acceso a Picún Leufú - Emp. R.P.N° 17 - Travesía Urbana		17	1,0	1.300	s/d	30-06-07	715.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	300	01-01-07	31-05-07	162.000	106.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	1,0	5.000	01-01-07	30-06-07	324.000	213.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		17	1,0	600	01-01-07	30-06-07	325.000	213.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme R.P.N° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		17	1,0	500	01-01-07	30-06-07	162.000	106.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	54	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		17	1,0	2.000	01-01-07	30-06-07	1.082.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	55	CORRIENTES	14	Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2		17	1,0	1.000	01-01-07	30-11-07	541.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	56	CORRIENTES	14	Acceso a Yapeyú - Intersección Ruta 14 y Ruta 122		17	1,0	200	01-01-07	31-05-07	108.000	71.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	57	CORRIENTES	14	Prog. Inic. 601,03 - Trat.de circulación noct. Ex ilum. Acc.a Alvear		17	1,0	300	01-01-07	31-05-07	162.000	106.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	3.000	01-01-07	31-07-08	1.764.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.R.P.N° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N.N° 116		17	1,0	450	01-01-07	30-06-08	244.000	160.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	10	52	SAN LUIS	20	Int.c/Ruta N° 79 - Int. Ruta N° 20 y Ruta N° 79		17	1,0	1.500	01-01-07	31-10-08	541.000	355.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	10	53	CORDOBA	60	Emp.R.N.N° 9 - Deán Funes - Alto Nivel Emp. R.N.N°9	km 810 a km 814	17	1,0	2.000	01-01-07	30-06-07	2.352.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	17	12,2	1.290	01-01-07	30-11-07	120.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	17	4,0	560	01-01-07	30-05-07	60.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

Total Obras de Seguridad Vial

70.523

33.773.000

2.546.548

0

0,00%

0,00%

Total Mantenimiento

485.032

77.215.000

248.922.537

246.324.760

43,14%

62,18%

CONSTRUCCIONES

Corredores Viales I

22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	12.589	21-02-01	30-08-05	200.000	421.691	421.690	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	9.362	03-02-97	30-04-04	100.000	19.410	19.409	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	13.596	03-02-97	30-04-04	100.000	49.137	49.136	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	18.814	28-01-97	31-07-05	221.000	1	0	0,00%	0,00%	94,34%	7
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	28.314	21-02-01	31-01-05	397.000	1.308.756	1.308.754	0,00%	0,00%	94,43%	7
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	24.210	28-01-97	31-08-05	502.000	569.742	569.741	0,00%	0,00%	91,88%	8

106.885

1.520.000

2.368.737

2.368.730

0,00%

95,69%

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	13	38,0	84.580	17-04-06	30-11-08	39.000	23.083.501	23.044.500	17,33%	34,10%	34,10%	6
22	2	3	51	CHUBUT	405	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	60.000	01-01-07	28-02-09	9.024.000	111	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	34,0	38.757	01-01-07	30-05-08	22.141.000	110	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	11	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Talavera	503-578	8	44,0	16.698	01-01-07	30-11-09	571.000	11	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	12	51	SALTA	16	Coronel Olleros - El Galpón		5	60,4	13.794	01-01-07	30-11-09	1.997.000	11	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	13	51	MENDOZA	405	Emp. R.N.N°144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	6.938	01-01-07	30-11-07	961.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	14.501	04-01-05	30-01-07	4.753.000	8.247.669	7.825.256	2,07%	51,37%	95,35%	6
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	13.000	01-01-07	30-06-08	164.000	64.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	60.000	01-01-07	30-11-10	13.375.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/ Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	45.290	17-10-06	17-06-08	22.881.000	20	0	3,17%	3,17%	3,17%	6
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Emp. R.N.N° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	26.400	01-01-07	30-11-09	6.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	96.000	01-01-07	30-05-08	20.123.000	20	0	0,00%	0,00%	0,00%	6
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	28.000	01-01-07	30-05-08	5.458.000	11	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)	km 1352 - km 1412	8	6,0	7.898	01-01-07	30-11-09	164.000	64.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	42	51	SANTA CRUZ	40S	Lte. con Chubut - Emp. R.P.N° 43	(1979-2052)	8	73,0	36.000	01-01-07	30-11-10	1.431.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile	km 1352 - km 1412	5	70,0	24.180	01-01-07	30-11-09	164.000	64.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog. 520 - prog. 538)	8	18,0	12.705	04-01-05	30-01-07	2.067.000	7.440.637	7.063.596	4,53%	54,17%	95,52%	6
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte. con Chile		8	19,0	68.244	01-01-07	30-11-10	7.837.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	19.000	01-01-07	30-11-09	400.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	32.003	16-12-02	12-05-05	1.166.000	100	0	0,00%	0,00%	97,67%	7
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 Monte Aymond	8	26,0	33.502	12-05-03	31/11/06			0	0,00%	0,47%	100,00%	7
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	57.152	01-01-07	30-11-09	164.000	64.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P.N°16 - Intersecc. Emp. R.P.N°20	8	18,2	60.340	16-11-05	31-05-08	17.762.000	12.887.284	15.847.654	7,60%	26,77%	28,31%	6
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RPJ" (Colonia Elía)	8	27,7	101.021	30-06-06	30-01-07	8.940.000	0	0	3,16%	3,16%	3,16%	6
22	2	53	53	ENTRE RIOS		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPJ" (Colonia Elía) - A°Colman	8	34,7	145.000	01-01-07	30-05-08	39.640.000	989	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,5	467.325	01-01-07	30-05-08	38.206.000	8.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8		145.000	01-01-07	30-11-08	7.350.000	10.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	145.000	01-01-07	30-11-08	23.747.000	18.200	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A°Ayul Grande	8	32,7	183.759	01-01-07	30-11-08	8.139.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Ayul Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,7	145.000	01-01-07	30-11-08	5.932.000	3.182.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Río Mocoretá	8	36,0	145.000	01-01-07	30-11-08	5.407.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	122.517	01-01-07	30-11-08	6.033.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,2	105.130	01-01-07	30-11-08	5.247.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	145.000	01-01-07	30-11-08	7.116.000	15	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	145.000	01-01-07	30-11-08	6.679.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	8,0	145.000	01-01-07	30-11-08	5.468.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°117 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	24.000	01-01-07	30-05-08	1.668.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	53	66	CORRIENTES		Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	8.325	01-01-07	30-05-08	1.842.000	94.930	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	10.000	01-01-07	30-11-07	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración										3.037.059			310.356.000	55.229.630	53.781.006		2,11%	4,65%	

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	400,0	5.957	01-01-06	31-12-06	1.022.000	5.422.166	5.422.165	24,98%	91,59%	91,59%	6
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	45.599	04-06-99	31-03-07	2.657.000	3.640.356	3.640.355	16,06%	25,59%	51,84%	6
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	94.681	17-05-99	30-07-07	100.000	6.933.227	6.933.226	7,85%	12,49%	19,32%	6
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	75.051	17-05-99	28-02-08	100.000	13.246.955	13.246.954	11,17%	19,46%	28,29%	6
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	22.109	05-07-99	31-12-06	398.000	1.821.093	1.821.091	42,06%	50,30%	89,70%	6
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	la-lb-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	39.366	10-05-99	28-02-07	500.000	59.100	59.098	0,00%	0,00%	20,28%	14
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	77.606	15-09-99	30-11-07	10.156.000	100	0	0,00%	0,00%	0,40%	14
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	33.120	01-07-99	31-12-06	972.000	15.172.019	15.172.018	12,05%	48,44%	96,55%	6
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	27.530	03-05-99	31-12-06	512.000	16.204.203	16.204.201	5,25%	63,61%	96,11%	6
22	3	10	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Dos de Mayo-S.Vicente-Fracran-S.Pedro	5	88,0	43.908	06-07-92	30-06-98	0	89.418	89.418	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	32.610	01-05-92	31-12-06	861.000	1.382.829	1.382.827	0,00%	0,00%	88,16%	6
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	4.739	15-06-99	31-03-07	905.000	100	0	0,00%	0,00%	59,80%	14
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	28.524	19-02-01	31-10-05	100.000	509.271	509.271	0,00%	0,00%	99,24%	7
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	47.155	20-09-93	31-12-06	431.000	10.226.242	6.214.290	0,00%	0,00%	99,23%	6
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte c/Chile	8	267,0	208.395	08-09-00	31-10-05	24.000	500.359	500.358	0,00%	0,00%	97,08%	7
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	4.309	07-07-99	31-12-06	536.000	1	0	0,00%	0,00%	87,56%	14
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	98.654	26-09-05	25-09-07	2.044.000	48.167.770	48.167.769	12,02%	46,77%	57,31%	6
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	11.729	13-10-04	08-04-06	381.000	4.446.929	4.439.161	0,00%	36,99%	98,20%	7
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	11.890	20-11-00	31-03-06	100.000	4.340.191	4.340.189	0,00%	2,31%	99,53%	7
22	3	22	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Lte. c/Salta	DNU	8	74,0	70.000	01-01-07	30-11-08	6.564.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	3	23	51	SALTA	9	Tramo 3 Acceso a Parque Industrial	KM. 1591 - KM. 1602	8	11,0	15.305	25-02-97	25-04-00	0	163.175	163.174	0,00%	0,00%	94,77%	7
22	3	24	51	CHACO	16	Pte.Roque Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero	Sección I	8	139,6	148.000	01-01-07	30-05-10	19.088.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	84.496	28-07-06	05-09-08	8.546.000	19.941.813	19.941.812	8,30%	8,30%	8,30%	6
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	48.544	25-08-06	24-11-07	2.044.000	11.434.372	11.434.371	20,40%	23,57%	23,57%	6
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 0,00 - Km 10,125	5	19,3	37.564	01-01-07	30-10-08	9.683.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	61.369	24-09-01	31-12-06	4.780.000	22.925.500	22.064.762	1,54%	29,17%	96,50%	6
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	18.036	04-10-04	28-02-06	258.000	6.372.063	6.372.061	0,00%	23,54%	100,00%	8
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Píñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	67.442	19-08-03	30-04-07	4.420.000	36.517.395	36.517.394	0,00%	0,00%	41,64%	6

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	23.611	01-12-04	31-12-06	7.750.000	52.784.161	30.002.666	28,68%	69,95%	93,78%	6
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	11	29,0	29.154	23-03-06	21-09-07	2.453.000	2.453.000	8.364.762	16,19%	34,51%	34,51%	6
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mexia - Km 137 - Km 181 (Sección II)	11	44,0	32.931	21-03-06	19-03-08	1.000.000	1.000.000	5.747.557	8,72%	21,23%	21,23%	6
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexia - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	20.737	23-03-06	30-06-07	0	0	5.924.040	17,27%	35,87%	35,87%	6
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	21.728	23-03-06	21-09-07	0	0	6.195.295	17,01%	36,05%	36,05%	6
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	39.000	23-03-06	21-03-08				0,00%	20,47%	20,47%	6
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Aduana - Límite con Chile		8	7,0	5.500	01-01-07	30-11-09	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Obras por Convenio con Provincias										1.636.349			88.885.000	285.753.813	280.870.285		14,45%	48,43%	

Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14		6.666	01-12-04	15-12-06	613.000	7.879.060	7.879.058	24,98%	91,59%	91,59%	6
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y IIb (Km 485 - Km 522)	8	51,1	37.742	01-02-07	01-02-09	1.209.000	8.533.505	8.533.504	0,00%	0,00%	0,00%	10
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N.N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	17.633	14-10-99	31-12-06	96.000	2.723.580	2.723.580	0,00%	17,09%	81,97%	14
22	4	4	51	LA RIOJA	40	Lte. c/San Juan - Villa Unión	Km.414,227 - Km.472,338 (Obras Faltantes)	8	58,1	5.728	22-10-99	31-07-01	0	120.254	120.252	0,00%	0,00%	97,24%	7
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	6.000	01-12-07	30-11-09	1.000.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	4
22	4	7	51	CHACO	16	Paso por Resistencia		8	5,0	77.000	01-01-07	28-02-09	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	8	51	SALTA	34	Emp. R.N.N° 81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	5	33,0	1.281	14-11-95	01-07-97	0	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	3.045	22-10-96	03-12-04	272.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	16.289	01-02-99	31-01-05	732.000	1.872.540	1.872.540	0,00%	0,00%	97,74%	7
22	4	23		NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N° 231	Sección II Río Hermoso - Pichi Traful Sector I	8	24,5	7.796	17-09-97	30-11-00			0	0,00%	0,00%	92,92%	7
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	42.468	16-05-05	31-03-07	1.600.000	146.772.373	22.614.495	13,91%	51,72%	82,99%	6
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km. 29,2 - Km. 37,86	13	8,7	124.377	30-09-05	29-09-07	1.300.000	1.300.000	82.897.852	14,85%	60,26%	65,42%	6
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	88.787	09-09-05	30-11-07	185.000	185.000	42.745.025	27,34%	61,14%	65,99%	6
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	25.720	12-04-05	30-08-09	6.436.000	6.880.293	6.880.290	5,82%	26,74%	42,45%	0
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	56.000	01-01-07	30-11-10	1.533.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección II)	km 1867 - km 1909	8	41,6	106.000	01-01-07	30-11-10	470.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/ Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	23.681	01-10-03	31-07-05	613.000	281.730	281.728	0,00%	0,00%	96,21%	8
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/ Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Tún		5	23,2	1.738	17-12-03	28-02-05	1.661.000	100	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	39.924	10-11-03	30-11-05	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	7
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	34.798	24-09-03	24-11-06	1.022.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	7
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	53.585	s/d	s/d	844.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	10
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros	8	18,9	40.100	01-01-07	30-05-10	7.212.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N° 38 (Actual)	8	20,0	84.854	15-10-04	30-12-06	6.051.000	32.812.816	30.906.130	8,00%	37,72%	86,86%	6
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	0,5	18.444	01-01-07	30-05-08	10.412.000	110	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	42	51	SANTA CRUZ	405	Límite c/ Chubut - Perito Moreno		8	88,0	48.400	01-01-07	30-11-10	818.000	22.211.655	22.211.655	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	37.112	01-11-03	31-05-07	324.000	17.004.695	17.004.694	7,76%	48,08%	83,75%	6
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	7.038	08-09-03	08-10-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	91,63%	7
22	4	45		MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	13.072	14-05-04	30-12-05	427.000	450.722	450.721	0,00%	1,56%	93,45%	7
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pil	8	107,5	261.857	01-02-01	31-12-06	6.987.000	37.215.716	35.565.529	2,41%	13,96%	82,86%	6
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	481.838	18-05-03	31-12-06	100.000	79.966.055	74.051.687	1,25%	13,59%	61,43%	6
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	7.693	09-09-03	08-09-04	262.000	111.515	111.513	0,00%	0,00%	99,32%	7
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	10.479	18-03-04	17-08-06	611.000	1.212.906	1.212.904	0,00%	16,21%	95,33%	7
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	42.735	08-10-04	08-04-07	21.334.000	10.657.808	657.807	0,42%	0,70%	24,86%	6
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	32.000	01-01-07	31-10-07	300.000	33.950.526	33.950.525	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	13.954	20-01-04	20-07-06	380.000	3.021.325	3.021.322	0,00%	7,91%	98,30%	7
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P.N°10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	8	14,4	1.291	08-10-04	31-07-05	304.000	111.278	111.276	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	20.572	02-09-05	03-01-07	613.000	14.024.531	14.024.529	34,75%	82,61%	93,32%	6
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	4.717	03-06-03	30-04-04	200.000	100.000	0	0,00%	0,00%	95,42%	8
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15.758	15-10-03	15-12-04	256.000	55.332	55.329	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	2.782	01-01-07	30-04-08	782.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km	8	1,0	3.979	01-01-07	30-11-08	979.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etap a I y Etapa II	8	7,4	24.328	19-02-04	28-02-07	6.408.000	6.423.391	6.423.390	2,54%	23,08%	49,19%	6
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	55.736	18-11-03	31-03-07	531.000	17.719.167	16.498.567	1,58%	26,32%	94,19%	6
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	34.772	18-11-03	31-03-07	500.000	20.912.806	20.912.805	2,88%	35,23%	96,24%	6
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P.N° 29	Acc.Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	3.497	20-07-04	31-10-05	100.000	198.740	198.739	0,00%	0,00%	92,22%	7
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	6.541	01-01-03	30-11-03	847.000	39.861	38.017	0,00%	0,00%	87,05%	7
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	23.741	14-10-04	10-01-07	7.450.000	63.787.422	147.494.022	15,62%	42,11%	95,83%	6
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	36.151	14-10-04	30-04-06	10.343.000	143.000	0	0,00%	4,63%	93,66%	7
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	36.927	14-10-04	30-12-06	9.508.000	3.508.000	0	13,43%	58,21%	90,65%	6
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	38.556	13-10-04	30-12-06	10.372.000	9.272.000	0	13,38%	43,55%	79,92%	6
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	45,0	48.414	13-10-04	31-03-07	13.104.000	13.104.000	0	6,81%	25,71%	56,74%	6
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. c/ Salta	Sección IIng. Juarez - km 25,5	8	31,5	14.374	13-10-04	31-05-08	11.195.000	8.195.000	0	0,00%	12,75%	100,00%	14
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	9.950	13-10-04	31-03-06			0	0,00%	5,13%	100,00%	6
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	km 25,5 - Límite con Salta	8	28,6	40.949	10-10-06	10-10-07	10.619.000	7.719.000	0	21,63%	21,63%	21,63%	6

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	30.298	15-07-05	30-11-08	11.414.000	8.197.000	0	14,37%	42,74%	50,66%	6
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	22.753	07-06-05	30-11-08	10.542.000	8.542.000	0	14,93%	45,33%	65,82%	6
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Cnel. Juan Solá - Pluma de Pato - Secc IV	8	31,1	27.649	12-07-05	30-12-07	10.564.000	9.781.000	0	26,07%	55,73%	68,11%	6
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	13.666	01-04-06	30-03-07	3.377.000	3.377.000	0	29,16%	98,78%	98,78%	6
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	19.286	15-04-06	30-04-07	6.210.000	6.210.000	0	51,81%	75,42%	75,42%	6
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	18.972	15-04-06	30-04-07	5.858.000	5.858.000	0	12,57%	65,64%	65,64%	7
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I	Emp. R.P.N° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. R.P.N° 12 (Pa	8	16,0	5.454	05-05-04	30-10-05	1.359.000	1.864.885	1.864.884	0,00%	0,00%	99,01%	7
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	52.190	16-04-04	31-03-06	1.412.000	15.818.277	15.818.276	0,00%	29,30%	73,49%	7
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	39.171	22-10-04	15-02-07	2.546.000	14.339.141	14.339.140	0,13%	37,58%	95,53%	6
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce R.P.N°5		8	8,0	9.402	29-05-03	31-12-04	199.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	43.296	28-10-03	30-06-07	100.000	0	0	0,00%	0,00%	56,32%	6
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	72.931	12-11-03	31-03-07	8.232.000	22.191.354	20.195.234	0,00%	21,52%	82,89%	6
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	68.066	16-02-04	31-01-07	4.452.000	17.790.956	15.634.865	0,00%	19,31%	91,77%	6
22	4	72	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	66.068	27-05-04	31-03-07	7.441.000	36.313.276	33.281.169	0,91%	31,95%	96,24%	6
22	4	73	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P.N°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	50.692	27-05-04	30-06-07	5.125.000	31.846.283	29.225.043	0,00%	43,85%	89,95%	6
22	4	74	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	32.190	22-11-03	30-12-06	444.000	343.519	343.518	0,00%	0,00%	85,09%	6
22	4	75	51	SANTA CRUZ	405	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P.N° 11	8	28,4	37.081	07-02-03	30-06-05	100.000	943.611	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	4	76	51	SANTA CRUZ	405	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	66.317	27-10-00	31-12-04	1.629.000	1	0	0,00%	0,00%	80,37%	7
22	4	78	51	SANTA CRUZ	405	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	28.335	02-05-00	31-12-05	100.000	1	0	0,00%	0,00%	96,12%	7
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	19.050	22-08-01	30-12-05	291.000	898.820	898.819	0,00%	0,13%	100,00%	7
22	4	80	51	SANTA CRUZ	S/N°	Acceso a El Chaltén por Parque Nacional Los Glaciares	Longitud 24 km	8	24,0	17.400	01-01-07	31-10-07	2.968.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Píscas	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	73.206	01-02-06	30-10-07	9.455.000	40.562.680	40.562.678	20,57%	60,43%	60,43%	6
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativ	8	91,0	288.460	17-04-06	30-09-08	57.034.000	313.877.151	313.877.147	13,88%	29,91%	29,91%	6
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc. II RP N E - 59 - Ballesteros	8	63,0	361.816	16-05-06	14-05-08				2,39%	6,95%	6,95%	6
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc IV Inters. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°178	8	36,0	248.500	31-03-07	31-10-08				0,00%	0,00%	0,00%	2
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	45.600	01-01-07	30-11-09	8.697.000	4.681.632	4.681.630	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco		8	58,4	58.380	01-01-07	30-11-09	981.000	9.991.487	9.991.485	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Lte. c/Chaco	km 29,80 - Emp. RN N 81	8	25,0	83.905	09-05-06	07-05-08				3,96%	15,87%	15,87%	6
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N° 34		8	31,0	30.000	01-01-07	30-10-10	250.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lím. Sta. Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,67	5	46,1	51.896	21-02-06	30-05-10	2.657.000	8.843.213	8.843.212	10,00%	22,82%	22,82%	6
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	8	18,0	31.325	01-01-07	30-11-09	164.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	88	51	MENDOZA	405	Malargüe - Lte. con Neuquén (S III)	Sección III Km 445 - Km 502	8	18,0	37.990	01-01-07	30-11-09	164.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	121.550	01-01-07	30-11-10	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	4.400	01-01-07	30-11-09	400.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	91	51	MENDOZA	405	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	21.266	17-09-01	30-06-05	50.000	1	0	0,00%	0,00%	79,94%	7
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de R	Km 217 - Km 225	5	8,0	40.629	03-08-05	30-11-08	3.421.000	16.031.478	15.358.447	12,80%	37,80%	41,19%	6
22	4	93	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	70.400	01-01-07	30-11-10	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena	8	73,0	105.020	01-09-05	30-12-06	6.746.000	142.107.170	142.107.170	2,44%	25,60%	33,61%	6
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte. Luis Piedra Buena - Est. Los Alamos	8	118,0	10.520	01-09-05	31-08-07				0,00%	149,86%	158,47%	6
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	95.644	03-12-05	30-12-07				0,00%	21,01%	21,01%	6
22	4	95	51	SANTA CRUZ	405	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	98.000	01-01-07	31-08-08	1.044.000	19.394.002	19.393.412	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	96	51	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olñe- Km. 2189,52 - Km. 2215	8	28,3	47.000	01-01-07	30-11-09	100.000	50.090.372	11.039.897	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	96	55	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- sobre R.P.N°29	8	50,5	70.000	01-01-07	31-10-11	200.000	0	22.125.230	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	96	56	SANTA CRUZ	405	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por	8	116,8	172.000	01-01-07	31-10-11	100.000	0	16.925.247	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado		8	350,0	69.000	01-01-07	30-11-08	1.635.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	13,2	31.650	19-01-06	30-11-07	1.738.000	22.969.568	22.969.566	2,83%	52,47%	52,47%	6
22	4	99	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	67.480	30-05-06	31-03-07	1.044.000	16.374.478	16.374.477	0,00%	5,58%	5,58%	6
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas										5.374.773			342.938.000	1.409.717.198	1.377.300.031		16,86%	40,55%	

Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	170.700	01-06-98	30-11-08	2.558.000	35.053.742	35.053.735	2,28%	9,12%	55,17%	6
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	162.439	02-02-98	30-11-08	2.350.000	36.026.484	36.025.782	2,40%	9,58%	60,09%	6
Total Obras por Concesión sin Peaje COT										333.139			4.908.000	71.080.226	71.079.517		9,34%	57,57%	

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																			
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	0,01	3.300	01-01-07	30-11-07	73.000	48.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito)	Prog. 735,68	8	0,03	900	01-01-07	28-02-07	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	0,15	5.000	01-01-07	30-11-08	480.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	0,20	6.344	23-08-02	31-10-04	230.000	98.269	98.267	0,00%	0,00%	99,53%	7
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	0,20	8.112	29-01-03	31-10-04	192.000	1	0	0,00%	0,00%	98,87%	7
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle	1.175	8	0,08	1.175	01-01-07	30-11-08	900.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	0,20	8.307	24-01-03	15-12-03	50.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32	8	0,09	16.940	28-06-05	31-03-07	705.000	7.828.129	7.812.327	0,00%	34,53%	52,73%	6
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	0,03	1.700	01-01-07	30-08-07	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	0,01	1.200	01-01-07	30-10-07	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	12,00	1.270	01-01-07	28-02-07	900.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	0,04	1.250	01-01-07	30-08-07	900.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	0,08	2.400	01-01-07	30-11-07	750.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	0,04	1.470	01-01-07	30-10-07	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	0,03	1.140	01-01-07	28-02-07	800.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	0,03	1.460	01-01-07	30-10-07	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	0,03	1.170	01-01-07	30-10-07	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	0,03	1.500	01-01-07	30-03-07	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	0,03	1.500	01-01-07	30-05-07	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	8	0,01	4.700	01-01-07	30-11-09	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	0,08	2.100	01-01-07	30-11-08	286.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1.00 (Pte. s/Río Alumine)	8	0,01	7.000	01-01-07	30-11-09	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	0,05	1.900	01-01-07	30-11-08	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	0,09	3.000	31-03-07	30-11-08	950.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	1,36	15.528	12-09-06	12-03-08	73.000	298.804	250.803	5,36%	5,36%	5,36%	6
22	6	29	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/1° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,44	8	0,09	3.160	01-01-07	30-11-09	600.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	30	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/3° Brazo Río Negro)	Prog. 1210,93	8	0,09	3.160	01-01-07	30-11-09	600.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	31	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Puente s/A° Zanjón)	Prog. 1207,28	8	0,05	1.350	01-01-07	30-11-08	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	0,06	1.800	01-01-07	30-11-09	36.000	24.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	0,09	3.300	01-01-07	30-11-08	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	0,01	300	01-01-07	30-11-07	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	35	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	8	0,10	4.500	01-01-07	30-11-08	600.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y	5	1,20	69.497	01-09-04	31-08-07	2.928.000	15.908.226	15.908.225	1,22%	33,21%	64,16%	6
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	0,02	10.525	29-08-03	30-06-04	50.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	1,00	3.500	01-01-07	31-05-07	73.000	48.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	1,00	3.500	01-01-07	30-11-07	285.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	1,67	17.400	01-01-07	30-04-10	613.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	0,31	10.500	01-01-07	30-11-09	437.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	0,06	1.500	01-01-07	30-10-07	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	0,08	2.000	01-01-07	30-11-08	500.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N.N°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	0,03	1.500	01-01-07	30-08-07	300.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	0,07	850	01-01-07	30-10-07	50.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	0,02	350	01-01-07	28-02-07	350.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	0,01	1.500	01-01-07	30-11-08	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos DNU	8	0,07	12.300	27-06-06	31-12-07	4.788.000	5.049.944	5.049.944	24,34%	44,97%	44,97%	6

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

252.858

23.690.000

29.303.521

29.119.566

13,96%

36,80%

Obras en Corredores Viales Concesionados

22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. R.N.N° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	8.823	15-07-04	28-02-05	9.000	8.027.234	0	0,00%	0,00%	97,61%	7
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. R.P.N° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	6.855	05-08-04	03-05-05	972.000	591.140	0	0,00%	0,00%	96,56%	7
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp. R.P.N° 61	km 118 - km 156	5	38,0	8.135	27-01-06	31-03-07	1.705.000	1.705.000	7.991.262	13,46%	95,28%	95,28%	6
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel R.P.N° 4 y FFCC Gral. San Martín-En	km 500 - km 539	5	39,0	12.738	20-07-04	30-08-05	2.600.000	2.500.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	1.861	13-08-04	30-04-06	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	11,07%	10
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P.N° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	17.275	04-10-04	31-12-06	1.165.000	1.165.000	3.749.117	8,71%	13,30%	88,83%	6
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	13.940	08-10-04	30-06-05	219.000	219.000	234.883	0,00%	0,00%	95,53%	7
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Arco	km 77 - km 106	5	29,0	14.259	23-07-04	31-12-06	2.313.000	37.486.662	2.199.157	0,21%	6,40%	95,59%	6
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex R.N.N° 191 - R.N.N° A012	km 188 - km 278	5	90,0	42.219	23-07-04	30-04-06	1.293.000	1.293.000	5.141.547	0,00%	7,93%	99,81%	7
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp. R.N.N° 11	km 0 - km 12	5	12,0	10.625	28-09-05	31-05-06	1.713.000	1.713.000	8.945.382	0,00%	85,87%	98,05%	7
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/R.N.N° - Emp. R.N.N° 9 (Salida	km 0 - km 42	5	42,0	6.704	20-07-04	30-04-05	1.422.000	1.422.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N.N° 168 - Emp. R.P.N° 39	km 476 - km 607	5	131,0	7.316	04-01-06	30-09-06	3.281.000	3.281.000	7.231.653	0,57%	99,40%	99,40%	7
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P.N° 38 - Emp. R.P.N° 98	km 684 - km 720	5	36,0	2.566	05-08-04	31-12-04	100.000	100.000	24.273	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N.N° 98 - Emp. R.P.N° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	24.037	06-12-05	31-10-06	2.350.000	2.350.000	23.905.452	0,55%	100,00%	100,00%	7
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	20.732	05-08-04	26-05-06	2.828.000	2.828.000	2.198.355	0,00%	0,00%	99,99%	7
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. R.P.N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420	5	63,0	16.386	05-08-04	30-06-05	1.126.000	1.126.000	347.098	0,00%	0,00%	99,90%	7
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N.N° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	17.523	23-11-04	30-11-05	637.000	15.800.297	0	0,00%	0,00%	99,64%	7
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P.N° 6 (S) - Emp. R.P.N° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	17.695	28-07-04	31-05-05	2.239.000	239.000	0	0,00%	0,00%	99,37%	7
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp. R.N.N° 9 - Emp. R.N.N° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	17.943	19-12-05	31-07-07	3.524.000	2.024.000	2.956.455	0,04%	14,37%	14,37%	6
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°A005/Emp. R.N.N°8-	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-k	5	42,0	21.160	19-05-05	18-12-06	703.000	703.000	15.664.850	18,26%	81,85%	84,24%	6
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P.N° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	24.083	20-07-04	31-07-05	3.566.000	21.386.608	112.900	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P.N° 13	km 225 km 247	5	22,0	1.626	14-07-04	28-02-05	100.000	100.000	44.492	0,00%	0,00%	100,00%	7
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P.N° 80 (S) - Emp. R.P.N° 33	km 259 - km 330	5	31,0	15.146	16-11-05	31-12-06	1.973.000	1.973.000	13.692.828	7,62%	92,54%	95,25%	6
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P.N° 23 - Lte. c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	2.742	20-07-04	28-02-05	100.000	100.000	279.674	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv. de Rosario - R.P.N° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	29.150	05-01-05	28-02-06	100.000	100.000	7.988.200	0,00%	24,32%	99,87%	7

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp. R.P.N° 65 - Emp. R.P.N° 66	km 86 - km 129	5	43,0	23.224	13-01-05	31-12-05	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	98,30%	8
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N.N° 95	km 62 - km 169	5	107,0	13.136	20-08-04	31-05-05	1.711.000	6.504.434	2.304.433	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	8	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - km 62 - km 192		5	130,0	1.120	01-01-07	31-10-07	1.120.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	9	51	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 87 - km 98		5	11,0	990	01-01-07	31-10-07	990.000	2.200.559	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	7.544	21-12-05	31-03-07	1.553.000	1.553.000	2.273.381	0,00%	30,13%	30,13%	6
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-k	km 866 - km 871 (Lte S.Luís/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	1.387	06-04-06	31-03-07	1.199.000	1.199.000	1.308.296	73,47%	94,30%	94,30%	6
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km 128,18-km 131,50/km 230-km 243/km 245-km 247	5	32,0	10.430	24-04-06	23-12-06	2.350.000	8.081.675	8.081.673	34,47%	66,44%	66,44%	6
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN° 3 La Francia - Río Primero	km 188 - km 193/km243 - km 245/km 247 - km 280	8	40,0	22.346	16-05-06	16-03-07				24,63%	31,11%	31,11%	6
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N.N° 188 - Emp. R.P.N° 6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287 / K	5	61,0	22.690	20-04-06	31-12-07	1.970.000	4.717.564	1.627.419	3,41%	9,14%	9,14%	6
22	7	11	54	SANTA FE	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km60	km 304-km 306-km 442-km 468 /km 475-km 480 /km 595-km	5	66,0	30.878	01-01-07	30-11-08	3.769.000	1.000	2.895.771	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - km 557 - km 561		5	4,0	7.071	01-01-07	30-06-07	3.742.000	2.587.876	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	30.347	23-01-06	30-01-07	4.243.000	18.575.835	23.683.698	12,70%	72,29%	72,29%	6
22	7	12	52	TUCUMAN	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp. R.P.N° 347	Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289	5	34,0	23.072	03-05-06	30-04-07				16,26%	29,48%	29,48%	6
22	7	12	53	SALTA	34	CVN° 5 - km 1121 - km 1130		5	9,0	2.520	01-01-07	30-11-07	2.520.000	2.520.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	20.688	08-02-06	31-03-07	3.519.000	18.254.346	18.690.089	13,83%	93,92%	93,92%	6
22	7	13	52	CHACO	11	CVN°6 - km 1002 - km 1005		5	3,0	840	01-01-07	30-06-07	840.000	840.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	13	53	CHACO	11	CVN°6 - km 1005 - km 1008		5	3,0	251	01-01-07	30-06-07	251.000	251.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. N.N° 123 - Emp. R. P.N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	4.363	01-03-05	15-10-05	100.000	100.000	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 199 - km 217	<Km. 199 - Km. 217 > < Km. 244 - Km. 252 >	5	18,0	10.795	18-09-06	18-03-07	1.620.000	16.573.777	584.885	31,05%	31,05%	31,05%	6
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238	km 252 - km256	5	51,0	16.165	01-05-06	30-01-07	2.690.000	0	11.694.030	45,46%	88,49%	88,49%	6
22	7	14	53	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - km 285 - km 296		5	11,0	3.080	01-01-07	31-10-07	3.080.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN 1 - Emp R.P.N 61 - Emp. R.P.N 65	km 260 - km 276	5	16,0	9.443	07-03-06	31-03-07	1.279.000	0	4.293.862	29,11%	69,09%	69,09%	6
22	7	15	54	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - km 319 - km 326		5	7,0	2.940	01-01-07	31-10-07	1.960.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	16	51	BUENOS AIRES	9	CVN°3 - Asc km 73 - km 77		5	4,0	540	01-01-07	31-10-07	360.000	18.905.586	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	25.189	01-03-06	28-02-07	3.240.000	0	17.788.353	37,25%	83,35%	83,35%	6
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	21.603	14-03-06	11-02-07	2.520.000	0	1.117.231	7,23%	12,32%	12,32%	6
22	7	16	61	SANTA FE	19	CVN°3 - km 103 - km 107		5	4,0	1.120	01-01-07	30-11-07	1.120.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	17	51	BUENOS AIRES	8	CVN°4 - km 173 - km 197	km 173 - km 197	5	24,0	2.160	01-01-07	31-10-07	160.000	10.416.504	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	Km 600 - Km 604 y Km 635 - Km 657	5	4,0	17.701	06-04-06	30-12-06	960.000	6.084.395	16.400.897	19,41%	93,42%	93,42%	6
22	7	17	56	SANTA FE	33	CVN°4 - km 535 - km 539		5	4,0	1.120	01-01-07	30-11-07	1.120.000	1.120.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc. Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	11.883	30-12-04	30-10-05	487.000	487.000	169.711	0,00%	0,00%	99,36%	8
22	7	17	59	CORDOBA	36	CVN°4 - km 732 - km 754		5	22,0	7.840	01-01-07	30-11-08	2.239.000	2.239.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	18	54	SANTA FE	34	CVN°5 - km 129 - km 151		5	22,0	6.160	01-01-07	30-09-08	1.759.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P.N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	23.744	26-06-06	28-02-07	500.000	4.944.572	4.086.879	17,28%	23,80%	23,80%	6
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN 6 Obra N 230 - Emp R.P.N° 34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	4.124	04-03-06	31-03-07	900.000	0	872.981	1,02%	21,75%	21,75%	6
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia V. de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	13.483	24-04-06	31-01-07	1.519.000	2.557.406	2.542.117	23,11%	37,29%	37,29%	6
22	7	19	55	CORRIENTES	12	CVN°6 -Ruta Nacional N°12 - km. 1030 -1036		5	6,0	810	01-01-07	30-11-07	540.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	20	54	BUENOS AIRES	226	CVN°1- Ruta Nacional N° 226 - Km 50 - Km 52	Km 50 - Km 52	5	2,0	5.600	01-01-07	31-10-07	560.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	21	62	CORDOBA	7	CVN°2 - Ruta Nacional N°7 - Km. 616 - 654		5	38,0	5.130	01-01-07	30-11-07	3.420.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	22	55	LA PAMPA		CVN°3 - Ruta Nacional 188 - Km. 1 - 8		5	7,0	945	01-01-07	30-11-07	630.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km 442-km 468 /km 475-km 480 /km 595-km 600 /km 695-km	5	64,0	30.877	01-05-06	31-03-07	3.999.000	1.000	0	20,19%	29,08%	29,08%	6
22	7	24	57	CORDOBA	9	CVN°5 - Ruta Nacional N°9 - KM. 595- 615		5	20,0	2.500	01-01-07	30-11-07	800.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Obras en Corredores Viales Concesionados										809.388			103.577.000	239.156.472	223.123.284		30,69%	66,80%	

Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8		3.000	01-01-07	30-01-08	1.412.000	1.166.001	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8		14.000	01-01-07	30-08-09	1.295.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Obras en Circuitos Turísticos										17.000			2.707.000	1.166.003	0		0,00%	0,00%	

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		8		12.000	01-01-07	30-11-09	7.000.000	3.000.010	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	18.000	01-01-07	30-11-09	613.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	7.000	01-01-07	30-11-09	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y R.N.N° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	28.500	01-01-07	30-12-11	500.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	1
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	37.000	01-01-07	30-11-10	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	6	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Punta de Agua - Pircas Negras		8	194,0	11.500	01-01-07	30-11-09	800.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	75.000	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	5.000	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Mir		8	160,0	73.000	01-01-07	30-11-10	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SI	La Dársena - Angastaco	8	43,0	17.000	01-01-07	30-11-11	5.245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	11	51	SALTA	86	Empalme R.N.N° 34 - Tartagal - Tonono		8	35,0	17.200	01-01-07	30-11-08	511.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	12	51	MENDOZA		Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	20.000	01-01-07	30-10-08	3.552.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL		Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8		40.000	01-01-07	30-11-09	3.066.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	14	51	MISIONES	14	San Pedro - Dos Hermanas		8	62,0	5.500	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	9	15	51	MISIONES		Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		8	4,0	5.500	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	16	51	MISIONES		Obras Intersección RNN° 14 - Empalme R.P.N° 4		8		5.000	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano		8	7,3	10.518	18-10-06	18-10-08	16.191.000	1	0	0,49%	0,49%	0,49%	6
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N.N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N.N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	28.568	18-10-06	18-10-08				2,35%	2,35%	2,35%	6
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Sáenz Peña		8	5,0	20.000	01-01-07	30-08-10	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	82.000	01-01-07	30-08-10	800.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	20	51	CHACO	95	Obras Acceso a Villa Angela (Norte y Sur)		8	8,0	10.000	01-01-07	30-11-08	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	50.000	01-01-07	30-11-10	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	46.200	01-01-07	30-05-10	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Pque. Nac. Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao de		8	80,0	5.000	01-01-07	30-11-08	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	80.000	01-01-07	30-11-08	409.000	102	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte. s/ Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	4.000	01-01-07	30-11-08	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N.N° 89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	60.000	31-03-07	30-11-10	3.066.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	9	27	51	CHACO		Obras Empalme R.P.N° 12		8		17.000	01-01-07	31-08-09	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	620.000	01-01-07	30-11-10	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8	513,0	5.000	01-01-07	30-11-09	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Syl		5	0,1	5.000	01-01-07	30-11-08	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	6.000	01-01-07	30-11-09	383.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	5.000	01-01-07	30-11-09	613.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N° 258 - Cholila	Km 0 - Km 30	8	30,0	22.658	15-12-05	31-12-07	501.000	6.046.344	6.046.343	7,03%	29,76%	29,76%	6
22	9	34	51	CHUBUT	S40-P70-S/N	El Maiten - Emp. R.N.N° 40 (ex 258-Epuyén)-Acc.a Bs As Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (IS40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70) - DNU	8	44,8	29.518	22-11-05	30-11-07	613.000	11.699.330	11.699.329	12,52%	43,41%	44,97%	6
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N° 40	Ira. Sección Km 0 - Km 30	8	60,0	33.810	01-02-06	31-01-08	1.000.000	4.641.793	4.641.792	6,34%	16,89%	16,89%	6
22	9	36	51	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel		8	0,2	1.800	01-01-07	30-08-07	245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N° 9 - Límite c/ Catamarca km 154		8	154,0	33.000	01-01-07	30-11-10	767.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	88.000	01-01-07	30-11-10	9.628.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	16.000	01-01-07	30-11-10	327.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	5	2,0	2.784	27-01-06	31-01-07	327.000	1	0	9,34%	74,46%	74,46%	6
22	9	41	51	CORDOBA	10	Adelia María - General Levalle y La Cautiva - Jovita		8	57,0	16.000	01-01-07	30-11-10	327.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		17		10.000	01-01-07	30-08-09	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obrasreasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5		11.000	01-01-07	30-08-09	511.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	12.500	01-01-07	30-08-09	200.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	45	51	CORDOBA	36	R.N.N° 36 - Prolongación		8		10.000	01-01-07	30-08-09	358.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8		26.000	01-01-07	30-08-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	47	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualguaychú - Derivador Rutas		8		33.000	01-01-07	30-08-09	613.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca		8	0,2	7.000	01-01-07	30-11-09	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	49	51	MENDOZA	7	La Paz - San Martín		8	150,0	12.000	01-01-07	30-11-09	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	50	51	RIO NEGRO		Rotonda en el cruce de la R.P.N° 69 y R.N.N° 151 - Campo Grande		8		5.000	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	51	51	RIO NEGRO		Rotonda en 30 km R.N.N° 151 Barda del Medio		8		6.000	01-01-07	30-11-09	750.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N° 3 - La Julia		8	82,0	150.000	01-01-07	31-08-09	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-R		8	119,0	60.000	01-01-07	31-05-10	1.022.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8	51,0	29.000	01-01-07	30-11-08	1.453.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	55	51	SANTA CRUZ	3	km 29 - Monte Aymond		8	30,0	9.000	01-01-07	31-08-09	767.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	15.391	01-03-06	28-02-07	1.875.000	7.429.810	7.429.809	33,65%	62,56%	62,56%	6
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. R.P.N°19	DNU	8	31,0	62.000	01-01-07	30-11-11	14.832.000	27.069.446	27.069.446	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	DNU	5	0,1	1.280	01-01-07	30-06-07	262.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata	DNU	8		20.000	01-01-07	31-05-09	2.044.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lím. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	39.312	20-04-06	18-04-08	2.044.000	15.742.809	15.742.807	14,33%	26,09%	26,09%	6
22	9	61	51	BUENOS AIRES	Av. Juan XXIII y Acc. Parque Ind. Chacabuco		DNU	8	2,8	13.659	01-01-07	30-10-07	1.574.000	2.731.721	2.731.719	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	9	62	51	BUENOS AIRES	AV. VERGAR	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	DNU - Partido de Berazategui	8	4,6	26.220	24-02-06	31-05-10	1.716.000	11.954.375	11.954.374	23,84%	54,88%	54,88%	6
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	DNU - Primera Etapa	8	2,6	21.618	24-01-05	31-03-07	532.000	14.190.400	14.190.399	13,63%	63,73%	93,25%	6
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V- DNU	8	16,6	30.000	01-01-07	30-05-10	1.022.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas	DNU	8	6,0	14.000	01-01-07	31-08-09	818.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.N° 6	DNU	8	86,0	45.000	01-01-07	30-08-10	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano	DNU	8		36.000	01-01-07	30-05-10	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	68	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion I DNU	8	6,8	15.000	01-01-07	30-08-09	900.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	69	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia	Rada Tilly - Caleta Olivia - Seccion II DNU	8	22,3	20.000	01-01-07	30-10-11	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	DNU	5		4.000	01-01-07	30-11-08	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.P.N°14 - Gualjaina - Emp. R.N.N° 40	DNU	8	27,0	33.780	01-01-07	30-08-10	760.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelín - Corcovado	Sec. I Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km 15,24-Km 1	8	35,0	44.000	01-01-07	30-05-10	1.454.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguerr - Emp. R.P.N°20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) - DNU	8	39,0	25.983	09-03-06	30-08-10	500.000	457.482	457.480	4,42%	6,18%	6,18%	6
22	9	75	51	CHUBUT	P70-IS40	El Maitén - Emp. R.N.N° 40 (ex 258-Epuyén)-Acc. a Bs As Chico		8	31,0	29.518	01-01-07	30-11-08	1.698.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	76	51	CHUBUT	P71	Emp R.N.N° 258 - Cholila	Km 30 - Km 60	8	30,0	22.658	01-01-07	30-05-10	1.636.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	6
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)	DNU	8	6,4	20.000	01-01-07	30-05-10	2.044.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87) - DNU	5	0,1	238	27-12-05	30-06-06	220.000	2	0	0,00%	95,80%	95,80%	7

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	3.920	01-01-07	30-11-08	801.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa María	DNU	5	1,0	2.100	01-01-07	30-11-07	429.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	81	51	CORDOBA	P10	Lte. c/ La Pampa - Gral. Levalle	prog. 18.500 - Jovita	8	36,2	29.615	01-01-07	30-05-10	1.588.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	82	51	CORDOBA	PE90	Alcira Gigiena - Gral. Cabrera		8	47,8	32.000	01-01-07	30-05-10	1.881.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección R.P.N°53 - Intersección R.N.N°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900	8	22,9	38.361	13-03-06	30-05-10	1.095.000	1	0	6,61%	22,44%	22,44%	6
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	1,0	530.000	01-01-07	30-08-11	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N.N°81	Km1167 - Km 1184,44 DNU	13	17,4	10.570	01-01-07	30-08-09	570.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalación de Formosa	DNU	8	24,0	29.000	01-01-07	30-05-10	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Misión Laishi - El Colorado	DNU	5	58,0	12.620	27-06-05	28-02-07	1.914.000	5.235.802	5.235.801	1,43%	35,94%	42,91%	6
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He-He	DNU - Secciones I, II y III	5	70,0	26.309	20-05-05	31-03-07	2.645.000	19.169.826	19.169.776	4,10%	57,79%	74,70%	6
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	59.756	07-08-06	05-02-08	17.731.000	3.497.049	3.497.047	7,07%	13,68%	13,68%	6
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	59.756	07-08-06	05-02-08				7,07%	13,68%	13,68%	6
22	9	93	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra	DNU	8	44,0	40.000	01-01-07	30-08-10	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	94	51	MENDOZA	7	Sector Agua de las Avispas		8		525	01-01-07	30-11-09	350.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Emp. R.N.N°7 - Ugarteche DNU	8	13,6	33.943	25-01-05	31-12-06	1.022.000	25.385.997	25.385.997	0,00%	4,26%	49,97%	6
22	9	96	51	SANTA FE	A 008	Av. Circunvalación de Rosario	DNU	17	2,8	5.000	01-01-07	30-11-07	3.415.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	97	51	MENDOZA	145 (exP224)	Paso Pehuénche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	74.000	01-01-07	30-10-09	8.899.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	9	98	51	MENDOZA	145 (exP224)	Bardas Blancas - Hito Pehuénche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuénche	8	16,8	56.930	31-03-07	30-10-09	7.170.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	4
22	9	99	51	MENDOZA	exP224	Paso Hito Pehuénche Sección III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte, c/ Chile (Km 0 - Km 13,6) DNU	8	13,6	57.691	31-03-07	30-10-08	5.791.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	15
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II										3.697.309			168.859.000	158.252.867	155.252.119		3,36%	4,10%	

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																			
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		25.000	01-01-07	30-11-09	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	2	51	MISIONES		Puente Internacional Encarnacion - Posadas	DNU	17	1,0	10.000	01-01-07	30-11-09	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	3	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Pino Hachado	DNU	8	30,0	738	01-01-07	30-11-07	738.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas	DNU	8	2,5	1.500	01-01-07	30-08-07	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Puente sobre Arroyo Pilmatue	DNU	8	1,0	500	01-01-07	30-11-07	500.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura	DNU	8	5,0	9.000	01-01-07	30-05-09	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.N°231 DNU	8	20,6	69.915	21-02-06	30-11-08	1.819.000	8.563.338	8.563.337	6,36%	14,76%	14,76%	6
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquén	DNU	8	98,0	10.000	01-01-07	30-11-10	4.395.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.N°237	I y II DNU	8	64,0	86.400	01-01-07	30-11-11	2.044.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	6
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Norquínco	Pte. s/A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	947	01-02-06	28-02-07	785.000	1	0	0,00%	92,82%	92,82%	6
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche	DNU	8		1.000	01-01-07	30-11-07	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-3 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	Km 1478 - Km 1500 - DNU	5	22,0	34.862	12-04-06	12-07-07				14,65%	27,96%	27,96%	6
22	10	12	52	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-2 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	KM. 1462 - KM. 1478	5	16,0	29.577	07-04-06	07-07-07				8,05%	16,14%	16,14%	6
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5 Obra 24-B-1 Emp. R.P.N°3- Emp R.N.N°34	KM 1448 - KM 1462	5	14,0	19.871	01-03-07	30-06-07	4.316.000	11.323.000	11.322.999	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez- DNU	5	1,4	3.118	01-01-07	30-11-08	637.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. R.N.N° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19 - DNU	8	118,9	68.000	01-01-07	30-08-10	491.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N.N°40	Caballo Anca - Emp. R.N.N° 40	8	48,4	40.000	01-01-07	30-05-10	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100-DNU	8	0,1	15.988	26-10-05	30-05-09	1.022.000	2	0	0,00%	0,96%	4,15%	6
22	10	17	51	SAN LUIS	7	Repavimentación Vía 1	DNU	11		47.800	01-01-07	30-08-10	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	19	51	SANTA CRUZ	3	Autovia- Aerop. R. Gallegos- Planta LU 12	DNU	8	2,5	7.182	01-01-07	30-11-08	1.468.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Río Santa Cruz -DNU	8	0,2	1.500	01-01-07	30-08-07	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	21	51	SANTA FE	168	B/N R.P.N°1- Acceso a Túnel Subfluvial	Km. 479,72- km. 488,88-DNU	8	9,2	5.000	01-01-07	30-11-08	1.022.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastiné- Túnel Subfluvial Hernandarias	DNU	5	3,4	60.001	01-01-07	30-11-10	2.044.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné-DNU	5	3,5	16.654	01-01-07	30-11-09	750.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	4
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.N° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146- DNU	8	31,0	38.400	01-01-07	30-11-11	1.012.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	43.000	01-01-07	30-11-11	1.380.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55 DNU	5	5,5	350	31-03-07	30-10-07	350.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	8	10,1	45.686	13-02-06	12-08-07	1.840.000	16.896.857	16.896.856	24,68%	51,81%	51,81%	6
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso alternativo transito pesado desde R.N.N°9- DNU	8	4,0	2.000	01-01-07	30-11-08	409.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	Pavimentación urbana- 34 arterias urbanas-DNU	8	3,4	1.948	01-01-07	30-08-07	398.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional- Bahía Lapataia	DNU	8	16,0	1.500	01-01-07	30-11-07	307.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares-DNU	8	18,0	90.150	01-03-07	30-10-09	1.260.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V Emp. Traza actual - Principio Autopista-DNU	8	19,5	22.275	01-01-07	30-11-11	1.685.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Intersección Av. Gral. Paz y Camino Negro	DNU	8	1,0	8.000	01-01-07	31-08-09	818.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	34	51	ENTRE RIOS	6-P2-12-131-P	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	6.500	01-01-07	30-11-08	1.329.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.N°015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y R.N.N°14 DNU	8	1,0	653	01-01-07	30-11-07	653.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca	DNU	8	46,0	49.000	01-01-07	30-05-10	1.329.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)	DNU	8	0,5	1.200	01-01-07	30-11-07	245.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección R.N.N°22 y R.N.N°237 DNU	8	1,5	118	01-01-07	30-03-07	118.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.N°13 DNU	8	5,0	8.000	01-01-07	30-05-09	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador R.N.N°11 y R.N.N°A012 y pte. s/ desvío ferr	8	235,0	19.765	01-01-07	30-11-10	1.022.000	1.976.454	1.976.451	0,00%	0,00%	0,00%	4
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc. Pque. Nac. T.d	11	6,0	4.000	01-01-07	30-11-08	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	RUTA	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. R.N.N°3	DNU	8	5,0	4.000	01-01-07	30-11-08	818.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	40.000	01-01-07	31-05-10	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	8	111,9	275.740	01-01-07	31-08-11	304.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	Km. 176,70 - Km. 221,37	8	44,7	161.340	01-01-07	31-08-11	723.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km. 64,50 - Km. 72,00	8	6,5	28.000	01-01-07	31-10-10	111.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.N°40 (S)- Emp. R.P.N°51	Seccion I y Seccion II	8	58,0	72.000	01-01-07	30-10-09	4.791.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Límite con Chile	Seccion I y Seccion II	8	47,0	62.000	01-01-07	30-10-09	4.791.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	60.000	01-01-07	30-05-11	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion I	5	30,0	90.000	01-01-07	30-11-07	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion II	8	33,0	90.000	01-01-07	30-11-07	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	52	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III	8	37,0	90.000	01-01-07	30-11-07	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	35.563	05-06-06	30-09-08	22.787.000	4.340.825	4.174.444	5,20%	14,87%	14,87%	6
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp. R.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	8	33,5	23.209	19-05-06	31-10-07	200.000	3.041.230	3.041.228	10,09%	15,78%	15,78%	6
22	10	56	51	RIO NEGRO	258	Variante R.N.N°237		8	14,7	3.750	01-01-07	30-03-08	1.221.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	Km.198,65- Km. 266,4	11	67,8	20.625	01-03-07	30-09-07	767.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
22	10	61	51	CHACO	89	Emp. R.P.N°7 (Charadai) - Emp. R.P.N°4	Prog. 81,28	8	53,9	55.000	01-01-07	30-11-08	800.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40 - 293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo		8		124.000	01-01-07	30-11-07	1.700.000	36.533.304	36.533.204	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	71	51	MENDOZA		Límite San Luis - Mendoza - Acceso a La Paz	Km 866 - Km 871	5	5,0	1.500	01-01-07	30-04-07	2.000.000	100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	101.606	20-05-06	20-05-08				5,75%	29,46%	29,46%	6
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San Julián - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79 y 2086,00 - 2088,55	5	100,0	91.046	20-12-05	20-12-07	500.000	53.163.863	53.163.762	2,21%	12,50%	12,50%	6
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,4	43.100	01-01-07	30-11-08	1.000.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Km 113	8	113,0	174.000	01-01-07	30-11-08	2.862.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	5		1.281	28-06-06	30-12-06				24,36%	91,10%	91,10%	6
Total Mejoramientoy Reposición de Rutas Fase III										2.554.858			94.537.000	135.839.360	135.672.281			3,95%	3,97%
Total Construcciones										17.819.618			1.141.977.000	2.387.867.827	2.328.566.819			9,80%	24,10%

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4º Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/ La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. R.N.Nº 409	13	223,3	15.295	13-08-97	04-02-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.Nº 14 - Emp. R.N.Nº 14 - Villaguay	13	173,0	11.273	25-10-97	31-01-07	100.000	1.377.688	1.377.687	2,53%	12,34%	95,44%	6
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte. c/ Córdoba / Lte. c/ San Luis - Villa D	13	220,0	18.064	05-09-97	05-09-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.Nº 12 - Emp. R.N.Nº 14 Y 119	13	259,2	25.327	03-10-97	31-12-06	100.000	2.292.647	2.292.645	0,39%	7,05%	96,15%	6
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.Nº 3	13	258,3	23.447	05-11-97	28-02-07	100.000	3.639.393	3.639.392	1,28%	11,14%	96,21%	6
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.Nº 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14.919	14-06-97	31-07-03	100.000	1	0	0,00%	0,00%	96,27%	7
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.Nº 152	13	221,6	17.642	31-07-97	19-09-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	98,65%	7
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Aº La Teresa	13	195,7	11.713	29-10-97	31-08-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	85,36%	8
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	Aº La Teresa - Lte.c/ Río Negro- Emp.R.N.Nº 237-Emp.R.N.Nº	13	275,5	15.807	14-11-97	31-01-05	100.000	1.005.436	1.005.435	0,00%	0,00%	98,92%	7
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	6.976	03-12-97	31-12-02	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	23.399	31-10-97	28-02-07	161.000	2.500.097	2.500.095	1,88%	9,69%	95,72%	6
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.Nº 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	14.026	09-10-97	09-10-04	100.000	344.164	337.393	0,00%	0,00%	100,00%	7
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. R.N.Nº 79 - Emp. R.N.Nº 38 / Lte. c/ San Luis - D. Tell	13	282,8	13.412	13-11-97	05-05-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	8
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.Nº 22 - Emp. R.N.Nº 250	13	118,7	14.994	25-07-97	30-04-04	100.000	1	0	0,00%	0,00%	98,53%	7
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Emp. R.N.Nº 3-Emp. R.P.Nº	13	140,7	20.122	23-06-97	31-03-07	100.000	2.060.261	2.060.259	1,89%	7,31%	92,55%	6
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.Nº 33 (obras faltantes)	13	104,8	14.584	20-05-99	31-12-06	100.000	3.077.243	3.077.241	0,00%	0,00%	91,65%	6
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	20.165	14-11-97	14-11-04	100.000	289.949	289.939	0,00%	0,00%	100,00%	7
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.Nº 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	21.313	19-12-97	30-11-03	100.000	1	0	0,00%	0,00%	100,00%	7
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.Nº 12 (Norte)	13	113,5	18.695	17-11-97	31-01-07	100.000	879.227	879.226	0,01%	1,34%	96,97%	6
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.Nº Ex 3 - Emp. R.N.Nº 251	13	183,6	24.458	23-02-98	22-12-07	100.000	3.783.141	3.783.140	0,80%	15,03%	70,40%	6
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I										980.595			5.634.000	51.622.794	51.612.998		3,17%	96,36%	

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II

26	2	24	51	NEUQUEN	405	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	39.592	01-12-04	30-09-09	11.263.000	22.949.558	22.006.209	6,07%	45,38%	79,88%	6
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. R.N.Nº 95 - Las Lomitas / Emp. R.N.Nº 81 - Villa Gene	13	171,0	47.699	01-01-05	30-09-09	12.158.000	21.970.828	21.970.824	1,02%	36,33%	90,04%	6
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	43.456	01-12-04	30-09-09	12.345.000	20.694.051	20.694.049	0,81%	38,67%	89,87%	6
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/ La Rioja / Emp. R.N.Nº 40N - Arrequeintín	13	313,8	19.509	09-09-03	31-03-07	2.862.000	5.719.803	5.206.907	0,38%	25,99%	79,83%	6
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal) - Lte. c/ La Pampa / Lte. c/ Bs.As. - Emp. I	13	138,0	41.307	01-03-05	30-09-09	15.582.000	23.368.602	23.368.600	0,73%	48,96%	95,71%	6
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.Nº 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	42.231	01-11-05	30-10-10	19.707.000	28.123.889	26.984.114	24,20%	64,82%	72,21%	6
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.Nº10	13	111,3	42.652	01-05-05	30-09-09	19.759.000	14.523.664	14.523.640	4,52%	34,05%	63,65%	6
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/ Avda. Belgrano	13	27,9	39.454	19-11-03	31-01-07	1.223.000	7.105.819	7.105.817	0,38%	8,61%	94,01%	6
26	2	72	51	SANTA FE	11-33-34-A01	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	26.549	10-01-04	10-01-07	1.048.000	1.268.347	1.268.344	0,67%	2,67%	93,68%	6
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Emp. R.N.Nº 157 / Emp. R.N.Nº 60 - Acces	13	114,6	36.957	01-02-05	31-01-10	11.115.000	19.791.544	19.791.541	0,79%	49,73%	90,02%	6
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/ La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.Nº38 - Aimogasta	13	166,7	55.542	03-12-04	30-11-08	11.537.000	27.314.277	26.575.596	10,70%	54,90%	88,75%	6
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.Nº 157 - Emp. R.N.Nº 38	13	171,9	52.946	02-05-05	30-04-10	23.119.000	36.966.778	36.966.774	7,11%	66,15%	89,52%	6
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.Nº 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	24.284	19-06-01	30-11-08	2.072.000	1.084.694	1.084.691	0,47%	1,88%	91,66%	6
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.Nº 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	30.706	05-06-01	30-04-07	3.341.000	3.593.672	3.593.669	0,28%	2,07%	83,76%	6
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.Nº 5 - Est. El Recreo	13	69,2	42.472	01-02-05	30-09-09	14.960.000	21.775.961	21.775.927	0,61%	42,45%	91,98%	6
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	42.587	01-04-05	30-09-09	16.543.000	22.458.525	22.458.520	11,92%	61,55%	92,06%	6
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.Nº10 - Lte. c/Córdoba / Emp.R.N.Nº 35 - Acc. Qu	13	158,3	39.546	01-04-05	31-03-10	15.934.000	22.769.920	22.769.914	3,11%	52,42%	89,68%	6
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.Nº 7	13	71,9	40.405	01-03-05	27-02-10	15.118.000	24.027.547	22.641.551	1,43%	49,28%	93,39%	6
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II										707.894			209.686.000	325.507.482	320.786.687		41,43%	87,27%	

Contratos de Recuperación y Mantenimiento III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	40.807	01-01-07	30-10-10	18.917.000	1.917	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. C/Rep. Uru	13	151,8	44.902	01-01-05	30-12-09	13.759.000	17.684.986	17.684.981	1,22%	34,31%	88,75%	6
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	41.470	01-01-05	30-09-09	8.566.000	14.194.310	14.194.307	0,87%	32,38%	89,45%	6
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N.N° 25 / Emp. R.N.N° 3 - Pt	13	159,7	46.302	01-10-05	30-09-10	14.657.000	20.716.089	19.677.053	11,28%	44,46%	50,93%	6
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	45.804	15-01-05	13-01-10	13.072.000	26.408.003	26.321.096	0,77%	38,68%	71,22%	6
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Río Negro	Lte.c/ Río Negro - Emp.R.N.N° 259	13	149,1	66.037	01-01-07	30-11-11	10.672.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 - Emp. R	13	253,8	36.998	01-02-05	31-01-10	10.146.000	20.592.941	20.510.802	0,89%	28,22%	88,47%	6
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	33.900	01-09-05	30-11-10	18.416.000	25.512.142	19.797.693	15,66%	61,72%	77,19%	6
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N° 65 / Emp. R.P.N° 21 - Alto Nivel R	13	179,7	54.970	31-03-07	30-07-11	8.155.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	16
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N° 405 - Lte. c/Chile	13	182,5	72.317	01-01-07	30-10-10	8.088.000	6.135.334	6.135.332	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/ Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Cir	13	105,0	54.446	02-05-05	02-04-10	21.998.000	33.379.439	33.379.436	4,30%	51,80%	83,72%	6
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	52.800	01-01-06	30-12-10	22.197.000	18.669.707	15.985.272	23,24%	36,26%	42,47%	6
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/ Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R	13	148,9	38.651	01-10-05	31-10-10	15.737.000	25.088.130	22.357.158	16,11%	58,54%	67,98%	6
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38	13	151,9	46.167	01-08-05	30-08-10	17.222.000	32.332.780	29.905.240	12,09%	55,14%	62,13%	6
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Esterob	Acceso a Frías - Emp. R.P.N° 329	13	128,0	43.830	01-04-05	30-03-10	13.292.000	25.983.974	25.983.970	4,17%	34,38%	64,87%	6
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp. R.P.N° 11 - Emp. R.N.N°	13	99,9	45.230	01-03-05	31-03-10	12.605.000	23.810.986	23.810.983	2,11%	47,27%	88,21%	6
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N° 3	13	180,1	42.371	01-01-07	31-08-10	19.623.000	2	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Ch	13	250,4	47.004	01-12-04	29-11-09	9.579.000	14.804.245	14.715.676	0,77%	23,11%	56,74%	6
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	40.100	01-12-04	29-11-09	8.865.000	13.915.631	13.693.133	1,12%	31,61%	68,60%	6
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 B - La Pampa	El Caranzo - Chacharramendi / Emp. R.N.N° 35 - El Caran	13	128,5	31.195	02-01-06	30-12-10	13.868.000	16.105.595	16.105.593	15,91%	53,06%	53,06%	6

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	49.030	01-05-05	28-04-10	16.764.000	35.659.599	35.547.955	20,09%	61,38%	87,05%	6
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 405	Malla 109 - Neuquén	Emp. R.N.N°40S-Lte. c/ Chile / A°La Teresa-Emp. R.N.N°40	13	291,2	43.108	01-02-05	31-01-10	12.407.000	20.367.483	20.104.787	2,36%	33,75%	71,91%	6
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31-Esperanz	13	334,0	44.184	01-07-05	29-06-10	16.875.000	30.496.863	30.496.860	10,97%	50,95%	69,85%	6
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/ San Luis - San Juan / Lte. c/ La Rioja - Emp. R.N.N° 20	13	286,1	37.797	01-06-05	30-11-10	15.051.000	20.504.891	18.948.365	5,69%	37,54%	60,61%	6
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/ La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp. R.N.N°40S/Pte.s	13	223,3	37.474	01-03-05	27-02-10	12.977.000	22.142.657	22.132.652	1,10%	55,19%	85,85%	6
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	36.740	01-07-05	30-08-10	14.926.000	23.586.305	21.799.891	21,74%	58,82%	66,64%	6
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	45.885	01-01-07	30-08-10	10.819.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	35.536	s/d	s/d	9.166.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	11
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. R.N.N° 3 - km 112,78	13	112,8	26.115	s/d	s/d	5.036.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	11
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. R.N.N° 40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Río Alumin	13	140,0	37.552	01-01-07	30-10-10	7.242.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. R.P.N° 2 - Emp. R.P.N° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	1.250	01-01-07	30-10-10	6.358.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/ La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	35.609	01-01-07	30-08-10	6.867.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	23.545	01-01-07	30-04-10	4.541.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	37.082	01-01-07	30-10-10	7.152.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	62.627	01-01-07	30-10-10	7.455.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	4
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	63,0	20.351	01-01-07	30-10-10	3.925.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N° 123 - Emp. R.N.N°123	13	109,3	46.566	01-01-07	30-04-10	6.908.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	38	51	CHUBUT	405-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	49.349	01-01-07	30-10-10	9.554.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	33.692	01-01-07	30-10-10	6.498.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	24.759	31-03-07	30-10-10	4.775.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	2
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°22-Emp. R.N.N°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpa	13	340,7	27.370	s/d	s/d	5.283.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	11
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	33.849	01-01-07	30-04-10	4.914.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N° 33	13	104,8	22.382	01-01-07	30-08-10	4.316.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol	13	167,7	39.200	01-01-07	30-08-10	7.396.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp.R.N.N° 7 - Pte. s/ río Diamante	13	211,2	32.647	01-01-07	30-10-10	6.282.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente	13	105,4	30.322	01-01-07	30-10-10	5.849.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Emp. R.P.N°20	13	272,6	30.681	01-01-07	30-10-10	5.917.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Emp. R.N.N° 95	13	181,4	37.035	01-01-07	31-10-10	7.142.000	101	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III										1.907.038			511.829.000	488.096.233	469.288.235		20,67%	33,46%	

Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV																			
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	36.110	01-01-07	30-11-09	692.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N° 151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - L	13	233,8	47.087	01-01-07	30-11-09	9.250.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	59.940	01-01-07	30-11-09	575.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	93,2	47.087	01-01-07	30-11-09	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N° 40S / Emp. R.P.N° 88 - Em	13	238,6	43.479	01-08-06	01-08-12	100.000	610.790	610.788	3,00%	4,40%	4,40%	6
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N° 144 - Malargüe	13	98,0	26.460	01-01-07	30-11-09	213.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 131 - Emp. R.N.N° 127 / Emp. R.N.N° 12 - Emp	13	133,3	77.854	01-01-07	30-11-12	2.867.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	101,6	62.200	01-01-07	30-08-10	4.419.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	6
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	170,0	33.918	01-01-07	30-10-12	8.100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp. R.P.N° 116 - Emp. R.N.N° 34	13	140,2	39.758	01-01-07	30-08-10	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N° 117-Emp. R.P.N°155- Km 139,00-Emp. R.N.N°1	8	144,7	47.315	01-08-06	30-04-12	100.000	1.876.567	1.876.565	1,29%	4,83%	5,27%	6
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 y 19	13	259,2	46.647	01-01-07	30-08-10	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	19.602	01-01-07	30-11-09	919.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N° 52 - La Quiaca	13	220,3	36.622	01-01-07	30-11-08	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	6
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N° 52 - La Quiaca	13	220,3	36.622	01-01-07	30-11-08				0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	13.915	01-01-07	30-10-11	6.360.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.R.N.N° 79 - Emp.R.N.N° 38	13	102,5	27.678	01-01-07	30-11-09	265.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	70.830	01-01-07	30-10-11	10.389.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N.N° 22 / Emp. R.N.N° 95 - Fin Pa	13	171,0	30.689	01-01-07	30-11-09	2.146.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	68.820	01-01-07	30-08-10	660.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,7	13	115,3	32.639	01-01-07	30-11-09	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte. c/Santa Cruz / Emp. R.N.N° 3 - Emp.R.P.N	13	135,5	58.607	01-01-07	30-05-11	351.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	40.422	01-01-07	30-11-09	706.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N.N° 3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N° 3 -	13	222,0	43.009	01-01-07	30-08-10	2.771.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús Maria - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	32.764	01-01-07	30-11-10	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N N° 3	13	144,2	60.000	01-01-07	30-08-10	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. R.N.N° 11 - Prog. 123	13	123,4	37.029	01-01-07	30-10-11	320.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	83.400	01-01-07	30-11-09	520.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	30.901	01-01-07	30-11-09	449.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N.N° 74 / Patquia - Emp. R.N.N° 40N	13	300,8	68.138	01-07-06	30-11-09	100.000	3.023.363	3.023.361	0,79%	6,17%	6,17%	6
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N. N° 40 N - T	13	146,3	22.355	01-01-07	30-11-10	1.430.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P.N° 13 - Lte. con Sgo del Estero / Lte. con Chaco - E	13	119,6	66.058	01-01-07	30-08-10	100.000	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.	13	205,1	48.679	01-01-07	30-11-11	1.000.000	1.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2006

PR	SP	PY	OB	Provincia	ruta	Denominación	Sección	Cod	Long	Inv. Total (en miles \$)	Inicio	Fin	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/12/2006	Devengado 31/12/2006	Avance 4° Trim 06	Avance Año 06	Avance Total	Est
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	33.241	01-01-07	30-08-10	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	195,0	42.022	01-01-07	30-08-10	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	46.715	01-01-07	30-11-11	448.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,6	36.925	01-01-07	31-08-10	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16- Emp R.P.N°13	13	88,4	66.089	01-01-07	30-10-11	225.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	36.000	01-01-07	30-10-11	233.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.P.N°62/ Km 207,27 - Km 310,8 DNU	13	103,5	65.622	01-01-07	30-08-11	845.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°62 - Km 310,80 - Km 419,69 DNU	13	107,0	49.620	01-01-07	30-10-11	233.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/ Catamarca DNU	13	154,1	46.236	01-01-07	30-08-11	752.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	47.395	01-08-06	01-08-11	100.000	3.747.557	3.747.555	14,12%	19,81%	19,81%	6
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/ San Juan DNU	13	122,0	30.769	01-01-07	30-11-10	248.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20 DNU	13	78,0	65.383	01-01-07	30-11-10	593.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/ Neuquen - Lte. C/ Chubut DNU	13	144,0	42.319	01-01-07	30-08-10	2.824.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. R.N.N 251°- Pasaje A Verde- Emp. R.N.N 250°- Emp. R.N.N 250°- Emp. R.N.N 250°	13	254,0	76.194	01-01-07	30-10-11	378.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. R.N.N°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	42.852	01-01-07	30-10-11	294.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	48	51	CHUBUT	40(S)	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.N°20	13	79,0	61.539	01-01-07	30-08-11	845.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	25.287	01-01-07	30-10-11	311.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	34.035	01-01-07	30-10-11	223.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	41.028	01-01-07	30-10-11	301.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/ San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte. c/ San Luis	13	212,2	63.666	01-01-07	30-10-11	265.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. R.N.N°60 - Río Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	72.648	01-01-07	30-08-11	962.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	306,8	92.025	01-01-07	30-08-11	830.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/ Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	34.188	01-01-07	30-10-11	346.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.N° 6 A° Altamirano - Gral. Galarza/R.P.N° 39 Nogoya - I	13	86,0	43.558	01-07-06	28-06-12	100.000	6.757.510	6.757.508	14,47%	24,27%	24,27%	6
26	4	57	51	CATAMARCA	60 - 38	Malla 406 D		13		35.000	01-01-07	30-10-11	4.262.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	58	51	SALTA		Malla 406 - Salta - Jujuy		13		50.000	01-01-07	30-11-10	491.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	59	51	SALTA		Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N.N° 9 y N° 34	13	90,0	27.132	01-01-07	30-10-11	370.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. c/ Bolivia	13	159,0	47.778	01-01-07	30-10-11	206.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc. Quines - Lte.c/ San Juan / Acc. Quines - Lte.c/ La Rioja	13	188,0	56.310	01-01-07	30-08-11	549.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	51.000	01-01-07	30-11-11	278.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	41.541	01-01-07	30-08-11	486.000	10	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV										3.000.751			76.146.000	16.017.303	16.015.777		0,95%	0,95%	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento										6.596.278			803.295.000	881.243.812	857.703.697		11,32%	33,80%	
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad										24.900.928			2.022.487.000	3.518.034.176	3.432.595.276		10,85%	27,41%	

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2006
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	802.722.024	1.020.340.513	723.882.207	695.555.550	13,6%
Provincia de Buenos Aires	557.747.722	877.897.351	824.442.313	820.912.546	16,0%
Provincia de Catamarca	52.796.797	57.807.366	91.378.319	91.378.319	1,8%
Provincia de Córdoba	230.790.945	344.355.872	265.817.962	265.816.208	5,2%
Provincia de Corrientes	102.292.088	27.227.486	22.637.970	22.637.970	0,4%
Provincia del Chaco	60.713.195	48.888.309	44.299.253	44.299.253	0,9%
Provincia del Chubut	118.404.460	137.039.590	135.712.266	135.614.376	2,6%
Provincia de Entre Ríos	237.364.707	126.234.363	131.623.200	131.605.740	2,6%
Provincia de Formosa	131.521.556	201.895.084	205.073.275	205.033.315	4,0%
Provincia de Jujuy	94.347.457	35.695.471	32.097.819	32.097.819	0,6%
Provincia de La Pampa	112.065.711	99.847.401	90.212.394	90.212.394	1,8%
Provincia de La Rioja	56.756.399	139.527.439	120.197.554	120.197.554	2,3%
Provincia de Mendoza	117.986.440	151.281.683	136.474.835	136.474.835	2,7%
Provincia de Misiones	104.922.313	125.528.044	109.714.610	109.682.742	2,1%
Provincia del Neuquén	72.244.770	67.225.972	58.748.366	58.572.508	1,1%
Provincia de Río Negro	121.097.375	180.442.687	182.232.609	181.541.065	3,5%
Provincia de Salta	117.850.937	110.576.337	149.779.373	149.779.373	2,9%
Provincia de San Juan	64.642.275	88.707.568	85.047.559	85.046.831	1,7%
Provincia de San Luis	39.092.630	48.696.148	43.834.317	43.834.317	0,9%
Provincia de Santa Cruz	106.074.130	265.754.558	232.730.886	232.705.723	4,5%
Provincia de Santa Fe	194.419.140	273.414.332	265.274.230	264.274.202	5,2%
Provincia de Santiago del Estero	139.279.272	107.569.730	90.625.766	90.625.766	1,8%
Provincia de Tucumán	69.104.336	86.911.090	90.679.465	90.676.103	1,8%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	17.655.136	35.240.989	35.403.957	35.401.118	0,7%
Interprovincial	236.502.519	127.412.787	202.795.411	202.568.319	4,0%
Nacional	68.209.000	692.633.194	656.949.436	656.949.436	12,8%
Binacional	1.526.000	18.258.223	27.918.709	27.918.709	0,5%
No Clasificado	64.771.681	98.159.277	110.686.358	102.280.965	2,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.092.901.015	5.594.568.864	5.166.270.419	5.123.693.056	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2006
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	27.683.375	18.167.375	190,9%
Ministerio del Interior	1.550.000	3.268.811	1.718.811	110,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	73.793	73.793	-
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	178.899.040	123.206.040	221,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	4.618.290.815	7.489.426.090	2.871.135.275	62,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	424.930.131	72.936.881	20,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	45.748.629	-251.371	-0,5%
Ministerio de Salud	28.294.244	42.877.630	14.583.386	51,5%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	14.706.893	5.833.624	65,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.386.932.000	-125.912.000	-8,3%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	9.615.442.392	3.107.403.814	46,8%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	9.516.000	27.683.375	22.324.656	22.124.656	79,9%
Ministerio del Interior	1.550.000	3.268.811	3.264.420	3.264.420	99,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	196.000	196.000	0	0	0,0%
Ministerio de Defensa	0	73.793	73.793	73.793	100,0%
Ministerio de Economía y Producción	55.693.000	178.899.040	177.790.082	177.790.082	99,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	4.618.290.815	7.489.426.090	7.426.984.188	7.426.309.422	99,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	351.993.250	424.930.131	421.698.781	421.356.647	99,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	46.000.000	45.748.629	25.139.768	25.139.768	55,0%
Ministerio de Salud	28.294.244	42.877.630	42.642.221	42.642.221	99,5%
Ministerio de Desarrollo Social	8.873.269	14.706.893	14.523.206	14.523.206	98,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.512.844.000	1.386.932.000	1.366.978.888	1.366.978.888	98,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	9.615.442.392	9.502.120.003	9.500.903.103	98,8%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Economía y Producción				
<i>Formulación y Ejecución de Políticas Económicas</i>				
Asist.Financ.para el Dique y Central Hidroel. Los Caracoles	40.000.000	155.521.040	155.447.500	100,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	56.600.000	41.788.114	41.781.129	100,0%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Fondo Nacional de la Vivienda	582.200.000	687.689.000	693.918.887	100,9%
Mejoramiento Habitacional	16.000.000	28.371.210	16.369.478	57,7%
Acciones para Planes Federales de Vivienda	1.736.075.027	3.027.874.533	3.036.810.233	100,3%
Acciones sobre Emergencia Habitacional	163.355.472	163.355.472	141.585.370	86,7%
<i>Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	15.262.000	13.747.600	14.222.375	103,5%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	112.261.001	159.916.321	158.542.419	99,1%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Obras Municipales				
Delegación de Control del Puente Santo Tomé-Sao Borgia	0	29.259.536	29.259.536	100,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	29.693.285	51.005.624	50.579.002	99,2%
Asistencia Financiera para Infraestructura Social				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	66.936.714	257.884.752	261.514.041	101,4%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Transferencias a Empresas Privadas				
Concesionario Ferrocarril General Belgrano	0	5.526.893	5.994.065	108,5%
Metrovías S.A.	83.944.726	149.163.441	156.589.970	105,0%
Trenes de Buenos Aires S.A.	59.714.000	195.640.994	218.484.082	111,7%
Transportes Metropolitanos General Roca S.A.	33.879.900	45.716.209	22.567.221	49,4%
Transportes Metropolitanos General San Martin S.A.	6.714.000	6.714.000	0	0,0%
Ferrovías S.A.	52.776.000	39.620.289	15.847.970	40,0%
Ferrocenral S.A.	0	0	25.212.828	
Ferroexpreso Pampeano S.A.	11.740.893	15.847.970	6.868.372	43,3%
Siemens S.A.	0	0	4.771.301	
Belgrano Cargas S.A.	5.742.357	5.742.357	4.265.172	74,3%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	0	18.191.795	36.741.200	202,0%
Mitre - interjurisdiccional	26.832.000	22.391.000	0	0,0%
Sin discriminar		6.000.000	8.546.070	142,4%
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Transferencias a Empresas Privadas	399.706.938	512.965.222	512.964.898	100,0%
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	475.737.000	588.982.609	588.982.609	100,0%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales para financiar gastos de capital	0	186.688.243	186.631.314	100,0%
Energías Renovables en Mercados Rurales GEF 20548 ARG	12.756.000	11.686.500	636.935	5,5%
Proyecto Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF 4454-AR)	18.446.000	11.946.000	11.853.927	99,2%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	156.101.000	209.576.000	200.874.002	95,8%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Obras de Infr.Urbana en Municip.</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	0	45.931.141	45.665.618	99,4%
<i>Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria</i>				
Transferencias a Universidades Nacionales	22.257.000	45.176.000	45.163.559	100,0%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	247.082.617	325.528.767	320.739.429	98,5%
<i>Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	114.477.000	124.784.286	122.883.565	98,5%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2006

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	0	247.695.638	247.695.638	100,0%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	35.896.193	93.096.193	92.705.884	99,6%
Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	25.980.000	25.980.000	25.980.000	100,0%
Expansiones de Agua Potable y Cloacas con Cooperativas Trabajo				
Transferencias a Gobiernos Municipales	5.000.000	27.000.000	26.912.099	99,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente</i>				
Capacitación BID1345				
United Nations Office for Project Service	8.000.000	8.890.000	8.862.700	99,7%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a gobiernos provinciales	71.443.728	95.436.000	95.272.782	99,8%
United Nations Office for Project Service	0	41.300.000	41.272.175	99,9%
<i>Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica</i>				
Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales	179.385.000	182.064.500	181.885.638	99,9%
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa</i>				
Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales	299.250	17.104.000	17.044.000	99,6%
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS				
<i>Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica</i>				
Transferencias para Actividades Científicas o Académicas	15.329.000	17.765.000	17.760.670	100,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social				
<i>Plan Jefes de Hogar</i>				
Extensión Proyecto de Protección Social - Préstamo BIRF 7157-AR	45.000.000	43.998.629	23.613.005	53,7%
Ministerio de Salud				
<i>Atención de la Madre y el Niño</i>				
Seguro Universal de Maternidad e Infancia				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	22.504.437	18.615.580	18.939.123	101,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100,0%
<i>Empresas Públicas Sector Energía y Minería</i>				
Energía Argentina S.A.	107.300.000	16.000.000	15.941.667	99,6%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	155.549.000	185.549.000	185.549.000	100,0%
<i>Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital</i>				
Ente Binacional Yacyretá	0	48.000.000	48.000.000	100,0%
<i>Empresas Públicas Sector Comunicaciones</i>				
Sistema Nacional Medios Públicos (S.E.)	13.500.000	22.500.000	22.500.000	100,0%
<i>Asistencia Financiera a Provincias</i>				
Desarrollo Vial	360.500.000	431.888.000	415.938.221	96,3%
TOTAL	6.241.977.538	9.363.115.458	9.278.186.679	99,1%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	828.225.117	944.709.793	1.444.818.324	1.444.618.324	15,2%
Provincia de Buenos Aires	1.562.566.122	2.624.592.666	2.619.333.346	2.619.200.780	27,6%
Provincia de Catamarca	117.872.889	140.958.772	120.907.794	120.902.310	1,3%
Provincia de Córdoba	254.910.772	373.809.080	418.118.789	418.011.729	4,4%
Provincia de Corrientes	93.419.102	178.436.494	137.928.715	137.920.593	1,5%
Provincia del Chaco	125.168.705	234.915.545	227.189.040	227.189.040	2,4%
Provincia del Chubut	140.605.400	157.812.384	245.006.967	244.962.364	2,6%
Provincia de Entre Ríos	163.671.133	240.422.924	173.462.747	173.434.852	1,8%
Provincia de Formosa	140.506.058	199.082.079	157.906.189	157.742.917	1,7%
Provincia de Jujuy	166.548.407	217.706.310	213.642.483	213.625.915	2,2%
Provincia de La Pampa	82.813.416	111.840.921	83.812.058	83.645.407	0,9%
Provincia de La Rioja	67.399.915	136.526.723	160.577.042	160.571.670	1,7%
Provincia de Mendoza	125.860.569	196.197.522	191.272.693	191.227.701	2,0%
Provincia de Misiones	128.724.075	204.368.898	201.996.672	201.958.262	2,1%
Provincia del Neuquén	70.771.375	108.057.771	98.771.893	98.759.354	1,0%
Provincia de Río Negro	103.707.632	126.149.104	154.429.605	154.417.106	1,6%
Provincia de Salta	112.761.230	185.892.629	185.689.464	185.664.509	2,0%
Provincia de San Juan	207.103.004	360.976.623	339.367.581	339.344.970	3,6%
Provincia de San Luis	53.061.917	91.081.725	50.452.271	50.452.271	0,5%
Provincia de Santa Cruz	328.865.208	365.823.751	555.937.734	555.937.734	5,9%
Provincia de Santa Fe	328.097.798	475.098.134	529.914.507	529.806.291	5,6%
Provincia de Santiago del Estero	161.177.523	168.371.938	143.212.678	143.196.084	1,5%
Provincia de Tucumán	202.471.865	279.085.446	274.573.271	274.546.520	2,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	75.921.369	114.572.715	120.734.911	120.703.171	1,3%
Interprovincial	924.754.188	1.169.327.631	569.488.673	569.488.673	6,0%
Nacional	59.721.789	125.002.467	0	0	0,0%
Binacional	0	77.259.536	77.259.536	77.259.536	0,8%
No Clasificado	7.244.000	7.362.811	6.315.020	6.315.020	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.633.950.578	9.615.442.392	9.502.120.003	9.500.903.103	100,0%
