


INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre Año 2007

INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende todas aquellas erogaciones que realiza la Administración Nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 31/03/07

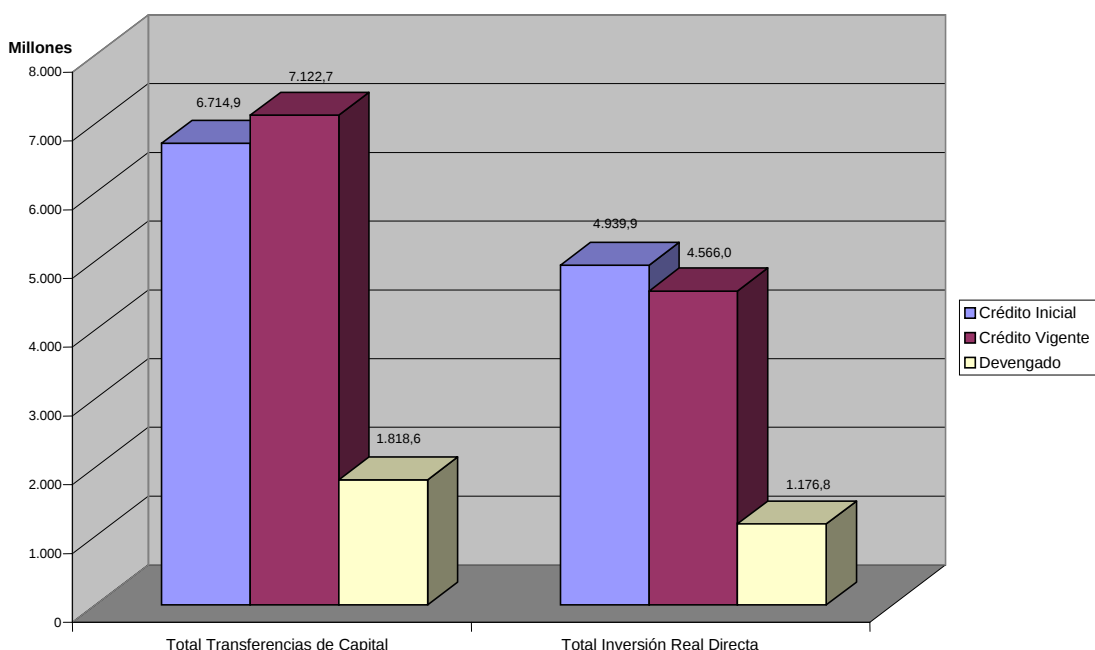


La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. El crédito inicial inherente a la IRD ascendió a \$ 4.939,9 millones y disminuyó en \$ 373,9 millones al cierre del primer trimestre (-7,6%). El principal componente de la Inversión Real Directa, los proyectos de inversión, dispuso de una asignación crediticia de \$ 3.790,4 millones, mientras la Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso contó con un crédito de \$ 775,6 millones.

Los proyectos de inversión incluyen gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De su asignación crediticia \$ 3.604,4 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de \$ 1.088,6 millones al cierre del primer trimestre), \$ 104,4 millones a maquinarias y equipos y \$ 81,6 millones a otros gastos (activos intangibles, tierras y terrenos, entre otros), con una ejecución de \$ 13,2 millones y \$ 9,9 millones, respectivamente.


La Inversión Real Directa incluye además la adquisición de bienes de capital, desagregada en \$ 706,9 millones en maquinarias y equipos (con una ejecución de \$ 61,9 millones), \$ 34,7 millones en edificios e instalaciones (ejecución de \$ 2,4 millones) y \$ 30,7 millones de activos intangibles (\$ 870 miles).

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/07

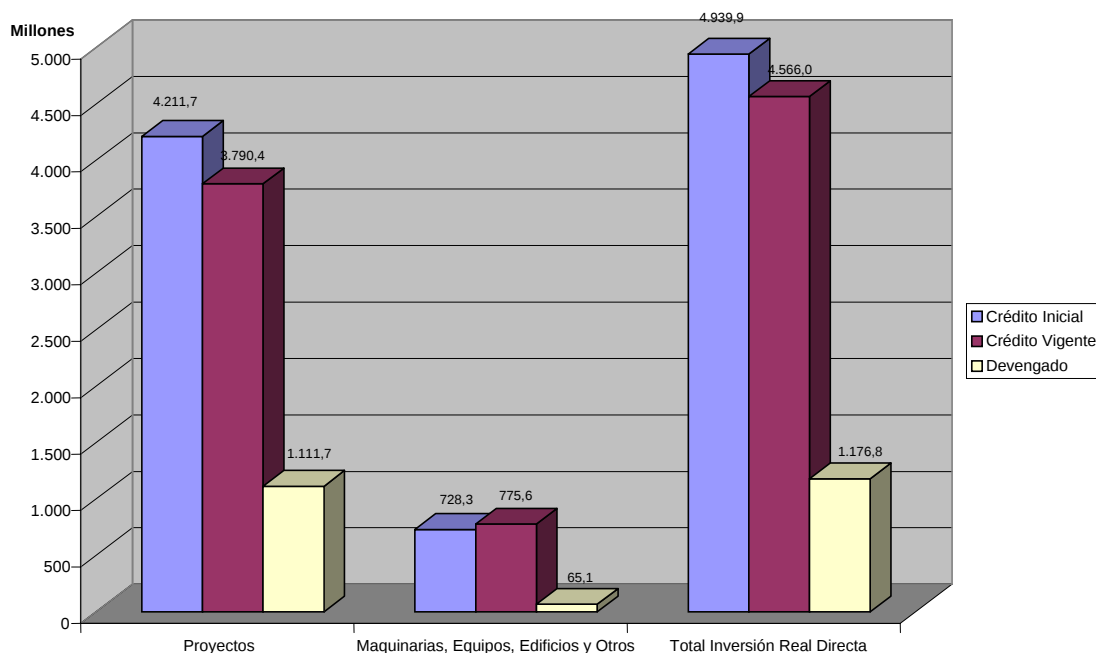

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital (transferencias de capital) que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al cierre del trimestre, sobre un crédito de \$ 7.122,7 millones, la ejecución financiera ascendió a \$ 1.818,6 millones.

Gráfico N° 3
Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/07

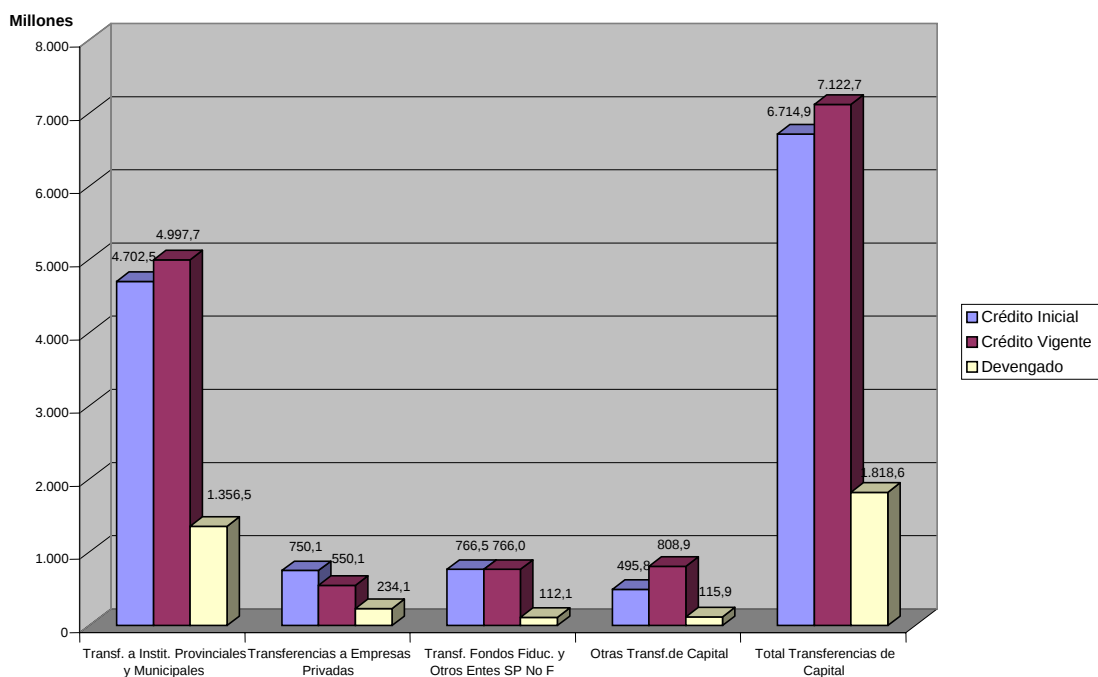

Al 31/03/2007, del monto de ejecución de las transferencias de capital, \$ 1.356,5 millones (74,6% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, \$ 234,1 millones (12,9%) a transferencias a empresas privadas, \$ 112,1 millones (6,2%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$ 115,9 millones (6,4%) a otros tipos de transferencias.

A continuación se expone un cuadro que contiene el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la Ejecución al 31/03/2007 de la Inversión Total:

Cuadro N°1
Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/07 (en pesos)

CONCEPTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Inversión Real Directa	4.939.928.849	4.565.979.353	1.176.789.069	25,8%
Proyectos	4.211.676.829	3.790.421.776	1.111.696.963	29,3%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	728.252.020	775.557.577	65.092.106	8,4%
Transferencias de Capital	6.714.872.919	7.122.708.166	1.818.634.199	25,5%
INVERSION TOTAL	11.654.801.768	11.688.687.819	2.995.423.268	25,62%


Las Transferencias de Capital registraron una mayor ejecución que la Inversión Real Directa en el primer trimestre. Asimismo se destacan el aumento del crédito asignado a Transferencias de Capital y el recorte crediticio en Inversión Real Directa.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2007

La ejecución de la inversión real directa alcanzó a \$ 1.176,8 millones, lo que implica incrementos del 66,6% respecto del primer trimestre de 2006, del 197,9% sobre el primer trimestre de 2005 y del 460,2% en relación al primer trimestre de 2004.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 31/03/07

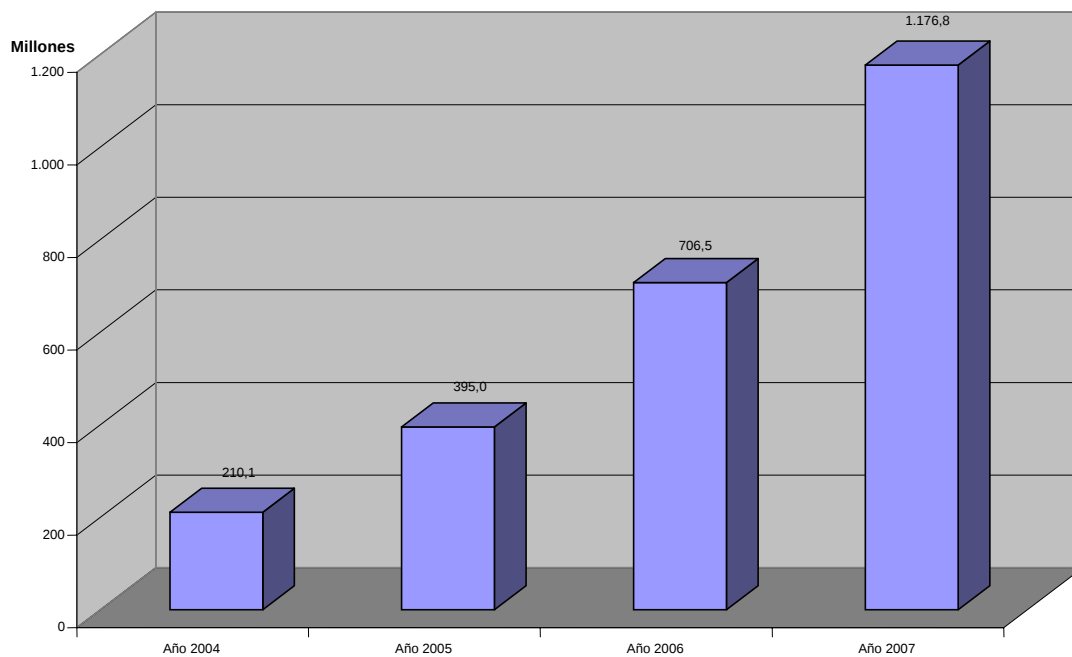

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la Inversión Real Directa, al 31/03/2007, disminuyó en \$ 373,9 millones (7,6%), de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el siguiente cuadro:

Cuadro N°2

Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/03/07 (en pesos)


NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	1.147.116.081	1.158.230.966	111.887.577	9,7%
Organismos Descentralizados	3.765.769.068	3.380.704.687	1.061.122.243	31,4%
Instituciones de Seguridad Social	27.043.700	27.043.700	3.779.249	14,0%
TOTAL	4.939.928.849	4.565.979.353	1.176.789.069	25,8%

El crédito inicial asignado a los proyectos de inversión, al 31/03/2007, registró una disminución de \$ 421,3 millones (10%) mientras que el gasto en adquisición de bienes de uso aumentó \$ 47,3 millones (6,5%).

Respecto al devengado presupuestario, en la Administración Central los servicios que concentraron la mayor ejecución fueron el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (\$ 72,1 millones), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (\$ 7,5 millones), la Gendarmería Nacional (\$ 6,6 millones) y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (\$ 6,5 millones). A nivel de Organismos Descentralizados la ejecución se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad (\$ 866,5 millones) y, en menor medida, en el Órgano de Control de Concesiones Viales (\$ 85,8 millones), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$ 73,4 millones) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$ 17,1 millones).

2-Según Fuente de Financiamiento

Al cierre del primer trimestre el financiamiento de la Inversión Real Directa con recursos del Tesoro Nacional aumentó considerablemente respecto del mismo período de 2006 (en el presente ejercicio alcanzó al 86% del total de la inversión contra el 43% del ejercicio 2006). Por su parte, las transferencias internas pasaron a financiar el 6% de la Inversión Real Directa frente al 35% que alcanzaban en el 2006.

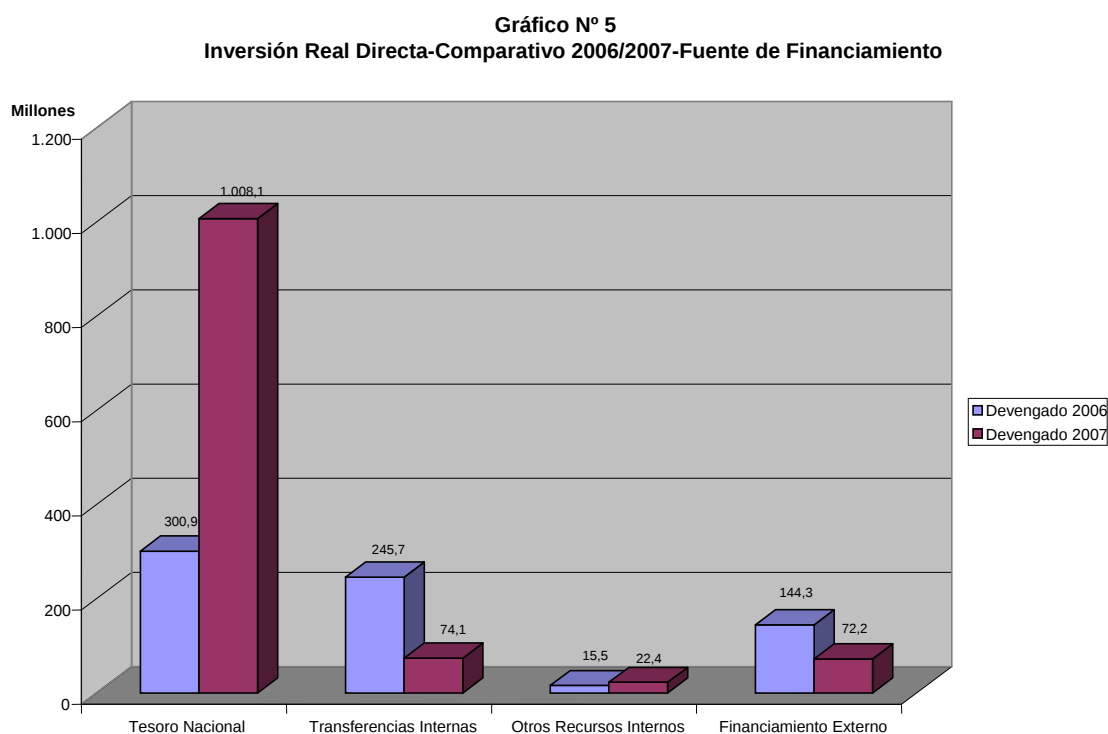

Al 31/03/2007 la ejecución del devengado, respecto de igual período de 2006, se incrementó en la fuente de financiamiento Tesoro Nacional (aumento de \$ 707,2 millones, 235%) y en otros recursos internos (suba de \$ 6,9 millones, 44%) y disminuyó en transferencias internas (\$ 171,7 millones, 70%) y en financiamiento externo (\$ 72,1 millones, 50%). Se aprecia un notable aumento del monto y de la participación de las rentas generales en el financiamiento de la IRD.

Cuadro N°3

Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/07 (en pesos)


FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución.
Tesoro Nacional	2.707.071.933	2.330.831.568	1.008.104.494	43,3%
Transferencias Internas	975.131.260	975.135.260	74.069.657	7,6%
Otros Recursos Internos	376.730.007	377.133.876	22.425.351	5,9%
Financiamiento Externo	880.995.649	882.878.649	72.189.567	8,2%
TOTAL	4.939.928.849	4.565.979.353	1.176.789.069	25,8%

De los \$ 1.008,1 millones de ejecución, financiados con Tesoro Nacional al 31/03/2007, \$ 751,6 millones de pesos correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad (construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento C.Re.Ma., mantenimiento y actividades de conducción y administración por \$ 589,0 millones, \$ 99,7 millones, \$ 61,9 millones y \$ 941 miles, respectivamente), \$ 17,4 millones al Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela, \$ 16,6 millones al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II y \$ 7,7 millones al proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El Tesoro Nacional también financió la inversión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$ 73,4 millones), del Órgano de Control de las Concesiones Viales (\$ 74,5 millones) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$ 16,4 millones).

Respecto a la ejecución de la Inversión Real Directa con transferencias internas, se incluyeron los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organo de Control de Concesiones Viales (ejecutados con transferencias del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte) por \$ 62,8 millones y \$ 11,3 millones, respectivamente.

La Inversión Real Directa con fuente de financiamiento externo se concentró en los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad en construcciones (\$ 41,2 millones) y el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (\$ 10,0 millones). En menor medida, se financió el proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Préstamo BIRF 4163/AR Etapa II, \$ 6,8 millones) y el equipamiento conjunto para las Misiones de Paz realizado por el Ministerio de Defensa (\$ 6,6 millones).

Gráfico N° 6
Inversión Real Directa- Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 31/03/07

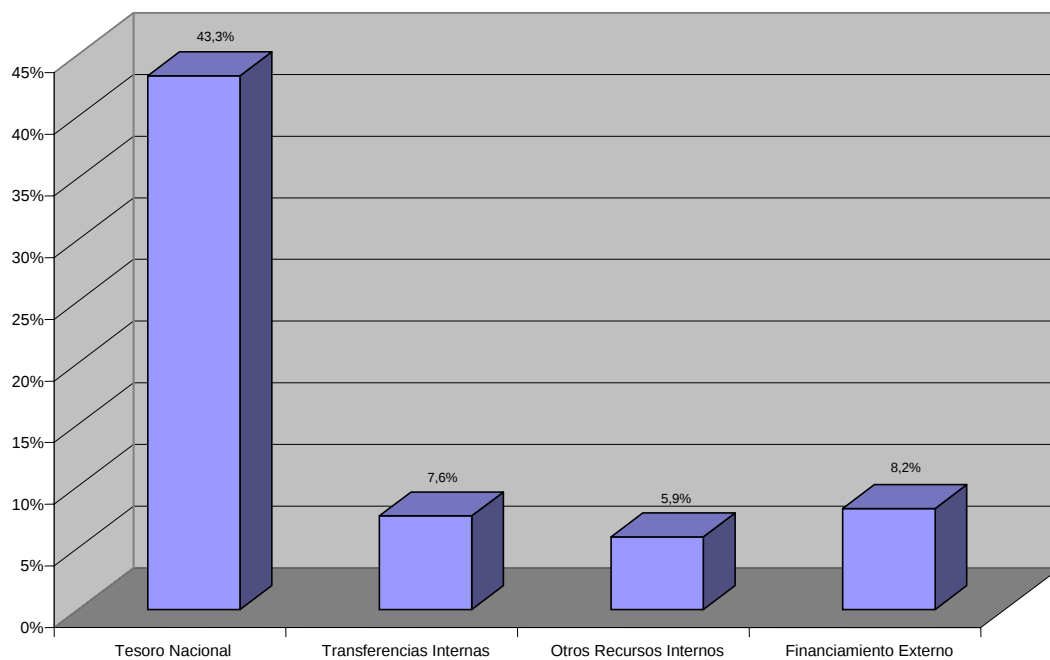

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa se concentró un 39% en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los \$ 131,5 millones incluyendo, principalmente, los proyectos del Organo de Control de Concesiones Viales (\$ 42,3 millones), de la Dirección Nacional de Vialidad (\$ 40,5 millones) y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$ 24,3 millones). Además, fue importante la ejecución del proyecto Hospital El Cruce Florencio Varela (\$ 17,4 millones).

En la provincia de Santa Fe la ejecución correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$ 50,1 millones), obras por convenio (\$ 12,2 millones, destacándose la R.N.Nº 95-Empalme R.Nº 286 Límite con Chaco), obras de mejoramiento y reposición (\$ 11,6 millones, en Variante Laguna La Picasa y R.N.Nº 34 Cruce Urbano con Rafaela y \$ 12,0 millones en la R008 Río Paraná - Autopista. Rosario/Córdoba) y obras en corredores viales concesionados (\$ 13,1 millones del Corredor Vial 3 III Etapa en R.N.Nº 11).

Respecto a la provincia de Formosa la ejecución de la inversión se concentró en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (\$ 31,7 millones del proyecto R.N.Nº 81 Las Lomitas-Límite con Salta-Empalme R.N.Nº 34 y \$ 7,3 millones del proyecto Remodelación Cruce por Ciudad de Clorinda).

En la provincia de Salta se invirtieron \$ 49,1 millones aplicados, principalmente, en el proyecto R.N.Nº 9 CV 5:Obra 24-b: R.P.Nº 3 - Empalme R.N.Nº 34 (\$ 14,8 millones), R.N.Nº 81-Las Lomitas-Límite con Salta-Empalme R.N.Nº 34 (\$ 13,5 millones) y a obras de emergencia (\$ 12,9 millones).

En la provincia de Río Negro la inversión se dirigió, principalmente, a financiar los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (\$ 36,0 millones) y los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$ 8,0 millones, Misiones César y SAOCOM).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una inversión de \$ 92,9 millones, principalmente destinados al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II (\$ 23,3 millones). Se aclara que, en algunos casos, los fondos no se invierten efectivamente en la ciudad, pero igualmente son imputados a la jurisdicción en virtud de que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

Teniendo en cuenta los datos del Censo Poblacional del año 2001 del Instituto Nacional


de Estadística y Censos y la extensión territorial de cada jurisdicción se construyó un indicador de gasto de inversión real directa según densidad poblacional (habitante/km²).

El indicador de inversión real directa según densidad poblacional surge de la fórmula:

$$= \text{Inversión Real Directa} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \text{habitantes} / \text{Km}^2$$

Gráfico N° 7
Inversión Real Directa por habitante y kilómetro cuadrado (*)
(en pesos/habitantes/km2)

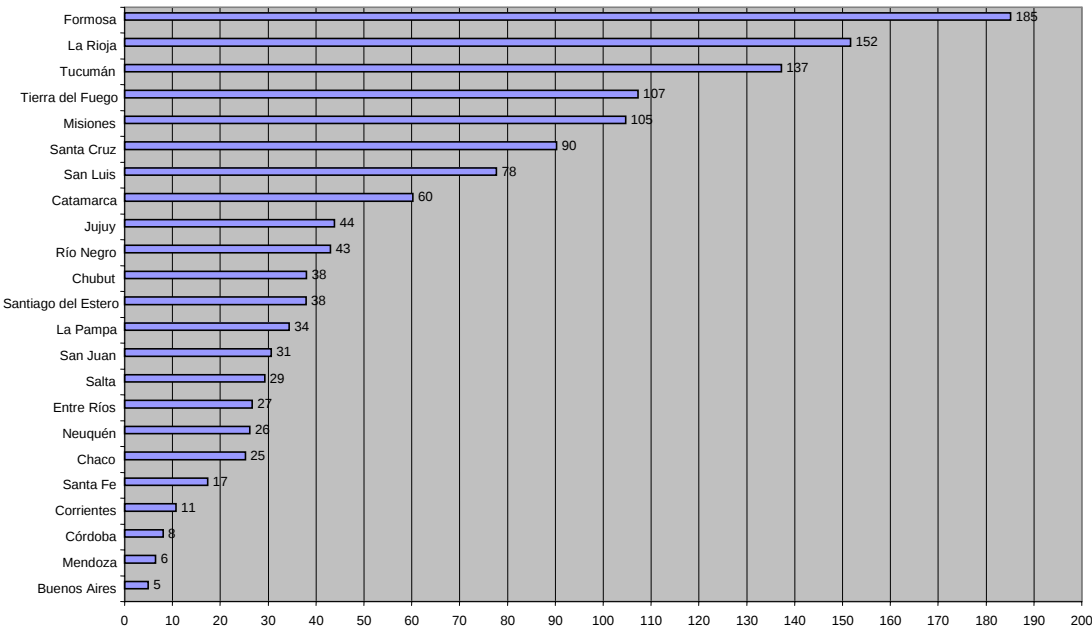

(*) en el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires por razones de escala (indicador: 16.774)

De acuerdo a este indicador la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Formosa presentan los valores más elevados mientras que, en el otro extremo, se ubican la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este capítulo se hace referencia a la ejecución física de los proyectos de inversión. Para ello se tomó un subconjunto que representa alrededor del 97% del costo total de la cartera de inversión y 82,7%, aproximadamente, de la ejecución al cierre del primer trimestre del ejercicio. Cabe destacar que los proyectos mencionados tienen gran relevancia económica y un importante impacto social.

Cuadro N° 4
Principales Proyectos de Inversión ordenados según monto devengado al 31/03/2007

Servicio Administrativo	Programas/Proyectos	Costo Total	Devengado al 31/03/2007	% s/total Inversión Real Directa
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Construcciones de Rutas	28.649.812.000	677.162.553	57,5%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento	9.078.815.000	125.523.464	10,7%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Mantenimiento de Rutas	410.753.000	61.901.782	5,3%
Secretaría de Transporte	Transporte Urbano de Buenos Aires	4.361.904.566	23.354.453	2,0%
OCCOVI	Vinculación y Remodelación R.P.N°36-Rotonda Gutiérrez y R.P.N°2 Florencio Varela	105.572.648	19.034.193	1,6%
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	80.000.000	17.436.980	1,5%
CONAE	Misiones Satelitales	530.619.181	16.306.050	1,4%
ENHOSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	112.818.829	13.369.054	1,1%
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa – Gral San Martín R.N.N°7 Km 965,51-998,80 Mendoza	80.818.314	11.079.545	0,9%
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	139.827.069	7.690.441	0,7%
Subtotal		43.550.940.607	972.858.515	82,7%
Total Inversión Real Directa		44.875.141.797	1.176.789.069	100,0%

El costo total considera los fondos calculados para toda la vida del proyecto de inversión (abarcando todos los ejercicios que involucran la fecha inicial y la fecha de terminación del mismo). La construcción de rutas, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad, aparece como la principal acción que encaran los proyectos de inversión existentes.

A continuación se detallan los principales proyectos de inversión según el cuadro precedente, presentados primeramente los Organismos Descentralizados (por contener los proyectos más relevantes) y posteriormente la Administración Central:

Organismos Descentralizados

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tuvo a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de 38.336 kilómetros de la red vial nacional. Para este fin se han establecido diferentes sistemas de gestión que obedecen al nivel de tránsito de las rutas:

Cuadro N° 5
COMPOSICION DE LA RED VIAL (Kilómetros)
Comparativo al Trimestre I de 2006/2007

SISTEMA	Ejec. Año 2006- al	Ejec. Año 2007- al	Var. %
	I Trimestre	I Trimestre	
Contratos Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.	9.478	10.263	8,3%
Concesión	8.895	8.895	0,0%
Transferencia Funciones Operativas (TFO)	7.290	7.435	2,0%
Mantenimiento Administración Propia	6.249	6.835	9,4%
Obras (Construcciones)	3.882	5.223	34,5%
Intervenciones en rutas provinciales concesionadas o no incluidas aún en la red (*)	701	3.557	407,4%
Sistema Modular	1.855	1.855	0,0%
Construir-Operar-Transferir (COT)	626	626	0,0%
Red Accesos a la CABA - R.A.B.A.	290	290	0,0%
Red Accesos a Ciudad de Córdoba - R.A.C.	276	276	0,0%
Sistema Km./mes	195	195	0,0%
Longitud total de la red	38.336	38.336	0,0%

(*) El importante incremento obedece a nuevas obras en Rutas Provinciales comenzadas en el primer trimestre de 2007. Los kilómetros en intervención están incluidos en los respectivos sistemas.

A continuación se detalla el avance físico al 31/03/2007 para cada programa y subprograma presupuestario:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó el mantenimiento de rutas en forma directa por 6.835 kilómetros. Se realizaron trabajos en la Red Vial, no incorporados a los otros sistemas de gestión, utilizando equipos y mano de obra propios.

-Mantenimiento Sistema Km/mes

Se finalizó el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André en Rutas N.Nº 40N-7-142, con 194,7 kilómetros de longitud.

-Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (T.F.O)

En este sistema se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva la misma, previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros mantenidos alcanzaron los 7.435.

-Señalamiento de Rutas

En este subprograma se están realizando trabajos en 2.372 kilómetros.

-Obras de Emergencia

Se realizó 1 obra de emergencia y están en ejecución otras 20 obras.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el primer trimestre, incluyen la ejecución de trabajos en 2.050 kilómetros y comprenden los siguientes tramos:

Cuadro N° 6 Sistema Modular (kilómetros en ejecución)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N° 34/81	Empalme R.N.N° 50 – Límite Bolivia/Pluma de Pato	Salta	258,9
R.N.N° 25	Los Altares - Empalme Ruta N.N° 40 (S)	Chubut	277,6
R.N.N° 16	Límite con Chaco – Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
R.N.N° 40S	Empalme R.N.N° 25 - Empalme R.P.N° 56	Chubut	289,0
R.N.N° 16	Empalme R.N.N° 95 – Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
R.N.N° 40S	Pareditas/Malargüe	Mendoza	229,6
A007	Av. B.Parera-A.Nivel R.N.N° 11-A. Nivel R.N.N° 11- C.J/Garay	Santa Fé	14,4
R.N.N°60	Tinogasta Límite con Chile	Catamarca	254,18
R.N.N°142-40N-7	G.Andre-Empalme R.N.N°20	Mendoza	194,8
Total			2.050

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

Se finalizó el tramo en R.N.N°40 Malargüe/Barrancas Sección I y II (36 kilómetros en la provincia de Mendoza). Asimismo se mantenían en obra los siguientes tramos:

Cuadro N° 7 Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (kilómetros en ejecución)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N°14	Guauguaychú-Paso de los Libres, Sección Intersección Empalme R.P.N° 16 – Intersección Empalme R.P.N° 20 y Sección Empalme R.P.N° 20 – Empalme R.P."J" (Colonia Elía)	Entre Ríos	46
R.N.N°40	Río Agua Clara km 809-El Eje km 847	Catamarca	38
R.N.N°16	Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos-El Caburé y Sección Límite con Chaco-Los Pirpintos	Santiago del Estero	29
Total			152

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizaron los tramos R.P.N° 98 tramo Wanda Deseado con 45 kilómetros en la provincia de Misiones y R.P.N° 11 Famatina - Límite con Catamarca Secciones Campana – Límite con Catamarca y Km 25- Campana (46,9 kilómetros en la provincia de La Rioja). Al cierre del primer trimestre de 2007 estuvieron en ejecución 1.630 kilómetros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos:

Cuadro N° 8 Mantenimiento y Reposición de Rutas (kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N°03	Laguna Khami-Rancho Hambre	Tierra del Fuego	23
R.N.N°40	Perito Moreno-Bajo Caracoles Sección Perito Moreno	Santa Cruz	48,9
R.N.N°81	Las Lomitas -Juan G. Bazán	Formosa	30
R.N.N°35	Arroyo El Gato-Empalme R.N.N°8	Córdoba	2
R.N.N°40	Empalme R.N.N°23-Norquínco Puente s/ A° Las Bayas	Río Negro	0,06
R.N.N°34	Límite con Santiago del Estero-Gobernador Garmendia	Santiago del Estero	25
Total			129

Además, estuvieron en ejecución 3.404 kilómetros correspondientes a obras de mejoramiento y reposición de rutas.

-Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

Comprendió trabajos de reparación de obenques en puentes sobre el Río Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas (1200 metros), sobre el Río Gallegos (90 metros), el Puente nuevo en Tramo Arroyo Batel y Batelito (70 metros) y el Puente sobre el Río San Lorenzo (330 metros).

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (COT) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Límite c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Empalme R.N.º 5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al nivel establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años. La fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2011.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprendieron la finalización de los siguientes tramos:

Cuadro N° 9 Corredores Viales Concesionados (kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.º09	CVN° 3 - Obra N° 1-Campana Río Areco	Buenos Aires	29
R.N.º03	CVN° 1 - Obra N° 10B-Villa Dorna-Empalme R.P.º61	Buenos Aires	38
R.N.º07	CVN° 2 - Obra N° 23B-Km 866-km 871	Córdoba	5
R.N.º08	CVN° 4 - Obra N° 204-Empalme R.N.º36-Acceso a Suco	Córdoba	4
R.N.º05	CVN° 2 - Obra N° 11B-Cruce FC Sarmiento-Emp. R.P.º1	Buenos Aires	33
R.N.º34	CVN° 5 - Obra N° 6A-Empalme R.P.º80 S Emp. R.P.º33	Santa Fe	31
Total			140

Asimismo, al cierre del primer trimestre se encontraban en ejecución 802 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

-Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

En el C.Re.Ma I se encontraban en ejecución las siguientes mallas:

Cuadro N° 10 Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (kilómetros en ejecución)	
Malla	Longitud en kilómetros
Malla 107A - Chubut	124,5
Malla 107B - Chubut	140,7
Malla 111 - Neuquén	134,7
Malla 113 - Chubut	201,2
Malla 114 - Río Negro	141,9
Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
Malla 201B - Buenos Aires	104,8
Malla 206 - Buenos Aires	167,1
Malla 208 - Buenos Aires	258,3
Malla 211 - Buenos Aires	139,9
Malla 401B - Salta	114,8
Malla 502 - Entre Ríos	271,4
Malla 506 - Entre Ríos	259,2
Malla 508 - Chaco	222,3
Malla 510 - Entre Ríos	173,0
Malla 512A - Corrientes	84,3
Malla 401A - Salta Tucumán	142,3

Malla 512B – Corrientes	113,5
Total	2.978

Para el C.Re.Ma. II las obras en ejecución totalizaron 2.284 kilómetros, enumeradas a continuación:

Cuadro N° 11
Contratos de Recuperación y Mantenimiento II
(kilómetros en ejecución)

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 116A - La Pampa - Buenos Aires	138,0
Malla 116B - La Pampa	113,9
Malla 117A - La Pampa	111,3
Malla 117B - La Pampa	158,3
Malla 123B – Río Negro	145,2
Malla 131 – Neuquén	104,5
Malla 202A – Santa Fé	27,9
Malla 202B – Santa Fé	95,7
Malla 215 – Buenos Aires	69,2
Malla 216A - Buenos Aires	72,7
Malla 216B - Buenos Aires	71,9
Malla 306 - San Juan	313,8
Malla 314 - Mendoza/San Luis	161,5
Malla 338 – Formosa	171,0
Malla 408A – Catamarca/Sgo. del Estero/Tucumán	114,6
Malla 408B - La Rioja/Catamarca	166,7
Malla 408C – Catamarca	171,9
Malla 409A – Tucumán	75,3
Total	2.283,4

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzaron los 3.836 kilómetros, detalladas a continuación:

Cuadro N° 12
Contratos de Recuperación y Mantenimiento III
(kilómetros en ejecución)

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 102A – Chubut	250,4
Malla 102B – Chubut	230,4
Malla 103 - Río Negro	163,8
Malla 104 - La Pampa	128,5
Malla 108A - Río Negro	146,5
Malla 109 – Neuquén	291,2
Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
Malla 207/304 – La Rioja/Córdoba	334,0
Malla 301 - San Luis	253,8
Malla 302 - San Juan	286,1
Malla 312 – Mendoza	223,3
Malla 332 - San Juan	105,3
Malla 402A - Sgo. del Estero	96,7
Malla 402B - Sgo. del Estero	120,9
Malla 404 – Jujuy/Salta	148,8
Malla 407- Sgo. Del Estero/Catamarca/Tucumán	151,9
Malla 408D - Tucumán/Sgo del Estero	127,9
Malla 509 - Entre Ríos	151,8
Malla 513A – Entre Ríos	90,3
Malla 513B – Entre Ríos	99,9
Malla 606 – Chubut	159,7
Malla 437 – Tucumán	145,7
Total	3.836

En relación al C.Re.Ma. IV las mallas en ejecución sumaron 1.165 kilómetros, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 13
Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV
(kilómetros en ejecución)

Malla	Longitud en kilómetros
Malla 309 – La Rioja	300,8
Malla 513C – Entre Ríos	86,0

Malla 501 – Corrientes	144,7
Malla 313B – Mendoza	238,6
Malla 303 – La Rioja	237,9
Malla 204 – Córdoba	157,4
Total	1.165

Organo de Control de las Concesiones Viales

Programa Infraestructura en Concesiones Viales

A través de este programa, el OCCOVI desarrolla las tareas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revisten carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas.

Las obras de la doble vía en los departamentos de Santa Rosa y Gral. San Martín a la altura del km. 965,5 de la R.N.Nº 7, que se desarrollan en el marco del proyecto de aumento de la capacidad en corredores viales de la provincia de Mendoza, mostraron una ejecución, al primer trimestre del ejercicio 2007, de \$ 11,1 millones. El proyecto tiene como objeto la duplicación de calzada existente en una longitud de 33,9 kilómetros y formará parte del corredor bioceánico central que permitirá la vinculación directa de las provincias del centro y oeste del país (Mendoza, San Juan y La Rioja) con la República de Chile.

Programa Infraestructura en Areas Urbanas

A través de este programa, el OCCOVI satisface la demanda de obras en áreas urbanas no concesionadas, ejecutando tareas de vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano (controlando que se construyan de forma de garantizar las condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas) con especial cuidado del impacto ambiental y en el marco económico y jurídico legalmente establecido.

El proyecto de vinculación y remodelación de la R.P.Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P.Nº 2 - Florencio Varela, devengó, al 31/03/2007, la suma de \$ 19,0 millones. Por medio de esta obra se prevé mejorar un tramo de 6.450 metros y los trabajos incluyen la repavimentación desde el km. 34,5 al km. 40,9 con el objetivo de transformar en autovía el citado tramo de la R.P.Nº 36.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Programa Asistencia Técnica -Financiera para Saneamiento

El programa se encarga de la habilitación de obras, la rehabilitación, optimización y ampliación de los servicios existentes y el fortalecimiento institucional de los entes subprestatarios del servicio.

Entre los proyectos más relevantes que mostraron ejecución al 31/03/2007 se destaca la Construcción del Acueducto Centro Oeste (en la provincia de Santa Fe), que devengó \$ 13,3 millones con un grado de ejecución física acumulada del 20,5%. Se prevé la construcción de una planta depuradora cloacal y el primero y segundo tramo de colectoras cloacales y estaciones elevadoras en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, beneficiando a 135.000 personas.

La construcción del Acueducto Trelew-Puerto Madryn (provincia de Chubut), que beneficiará a cerca de 110.000 personas, devengó \$ 8,5 millones, presentando un grado de avance físico acumulado al 31/03/2007 del 81,1%.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE continuó durante el primer trimestre del ejercicio 2007, su plan de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014. Para ello trabaja asociada a la contratista INVAP S.E, encargada de la construcción de los satélites del Plan y de las pruebas de ensayo.

La CONAE cuenta con el apoyo de otros entes del Sistema Científico Tecnológico, que cooperan en diferentes desarrollos tales como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A. Asimismo se continuó con la adaptación de los satélites a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) mediante un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana (ASI). Los proyectos relevantes de la CONAE son Infraestructura Terrestre y Misiones Satelitales.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2007 se realizaron importantes inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, en la obra Misión SAC-D Aquarius (ex Misión Cesar, siendo socia la NASA). Las principales inversiones corresponden a la primera certificación del contrato con la contratista principal INVAP S.E., que entregó toda la documentación correspondiente a la ingeniería básica y parte de la documentación correspondiente a la ingeniería de detalle. También se certificaron avances con entes del sistema científico tecnológico que están trabajando en el desarrollo y la construcción de partes de la carga útil argentina (radiómetros), como el Instituto Argentino de Radioastronomía y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata. Por otra parte se adquirieron componentes de vuelo para la carga útil del satélite y para la construcción de los modelos de ingeniería de los subsistemas de la plataforma. Las misiones satelitales en curso son:

Cuadro N° 14
Misiones Satelitales en curso

	MISION	SOCIOS
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/Francia
SAC-D Aquarius (ExCESAR)	Observación de la tierra	España
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (ASI)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

La CONAE ha definido dos familias de misiones satelitales, según los instrumentos argentinos principales que llevan a bordo:

- La Serie SAC con instrumentos argentinos centrados en el rango óptico: cumplieron misión los satélites SAC A (Misión tecnológica) y SAC B (Astrofísica), encontrándose en operación el satélite SAC C. Se encuentran en desarrollo los satélites SAC D /Aquarius, SAC E /SABIA y SAC-F/ALSAT-2.
- La Serie SAOCOM con instrumentos argentinos centrados en el rango de microondas (radar): contempla las plataformas 1 A/B y 2 A/B, donde las componentes A/B son similares mientras que la serie 2 incorporó los avances tecnológicos (resultado de las misiones anteriores). Se encuentra en desarrollo el SAOCOM 1.

Los satélites SAC-A, SAC-B y SAC-C fueron concebidos por la CONAE y construidos totalmente en nuestro país con la participación de la empresa INVAP S.E, como contratista principal. Los satélites SAOCOM y SAC-D, actualmente en construcción, también cuentan con INVAP S.E como contratista principal.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios **Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)**

Al 31/03/2007 se fortalecieron las áreas de exploración de yacimientos y la infraestructura de explotación (que servirá para el abastecimiento de las centrales con uranio nacional). Asimismo se profundizó la exploración del Cerro Solo y se continuó la línea de investigación aplicada en reactores nucleares (para su utilización nacional y para su exportación como reactores de alta tecnología).

Por otra parte se está avanzando en los desarrollos y la investigación aplicada vinculados a la construcción de las nuevas centrales nucleares y se avanzó en los componentes de seguridad de los proyectos relacionados a residuos radiactivos de baja actividad, continuando los desarrollos para el tratamiento de los de alta actividad.

Administración Central**Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios****Secretaría de Transporte****Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario**

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires devengó, al 31/03/2007, la suma de \$ 23,4 millones, correspondiente a las obras de Modernización Línea "A" Subterráneo (obras civiles, señalamiento y radiocomunicación) y del paso a diferente nivel de la Municipalidad de San Fernando-Tigre.

Programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y Vías Navegables

El puerto de Caleta Paula se encuentra ubicado próximo a la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Se proyecta la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste, en un frente de 160 metros medidos en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros medidos en sentido este-oeste. Además, se prevé una obra de control de deriva litoral en lado sur del acceso al puerto. Al cierre del primer trimestre del ejercicio se devengaron \$ 7,7 millones.

Secretaría de Obras Públicas**Programa Ejecución de Obras de Arquitectura**

El Hospital Interzonal El Cruce (Florencio Varela) es un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorio externo.

El programa médico asistencial que se propone ha sido diseñado como un establecimiento polivalente de agudos con posibilidad de dar respuesta a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondientes al 3° nivel de atención de salud de la población de su área programática (distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes). Al 31/03/2007 devengó la suma de \$ 17,4 millones.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2007

1-Según Nivel Institucional


Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15				
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/03/2007 (en pesos)				
NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	6.481.694.676	6.512.841.501	1.497.708.569	23,0%
Organismos Descentralizados	233.178.243	609.866.665	320.925.630	52,6%
TOTAL	6.714.872.919	7.122.708.166	1.818.634.199	25,5%

Dentro de la Administración Central, sobresalieron las transferencias para acciones de Planes Federales de Vivienda (\$ 667,9 millones), para la formulación y ejecución de la política energética (\$ 227,9 millones), para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$ 65,7 millones), para Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (\$ 53,8 millones), los traspasos a los gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social (\$ 52,4 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) (\$ 45,0 millones), a Ferrovías S.A. (\$ 42,2 millones), a Trenes de Buenos Aires S.A. (\$ 29,0 millones), a Herso S.A. (\$ 26,1 millones), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$ 23,8 millones), a Metrovías S.A. (\$ 19,8 millones). Asimismo se destacaron las transferencias destinadas a Emergencia Habitacional (\$ 19,5 millones), a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (\$ 19,0 millones), la asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$ 18,3 millones) y la atención de emergencias por inundaciones (\$ 17,5 millones). Por otra parte resultaron relevantes las transferencias para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y para infraestructura y para equipamiento (efectuadas por el Ministerio de Educación, por \$ 21,4 y 17,9 millones, respectivamente).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad (construcción de rutas por convenio con provincias, por \$ 274,5 millones) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas con cooperativas de trabajo, por \$ 38,9 millones).

Gráfico N° 8
Transferencias de Capital - Devengado al 31/03/07

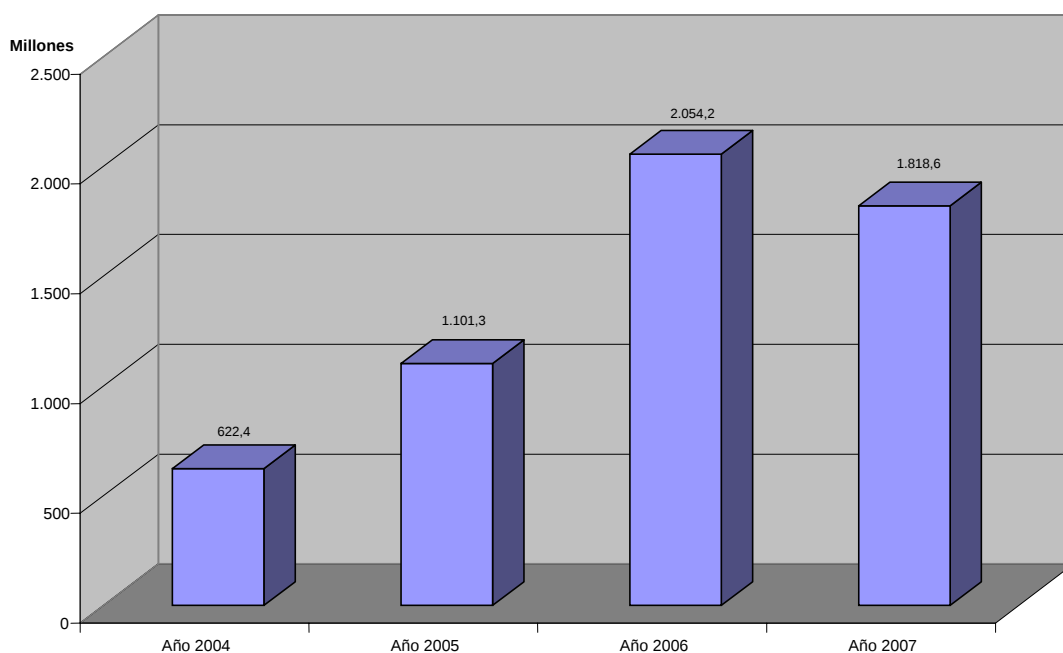

En resumen, las transferencias de capital mostraron una disminución, respecto al primer trimestre de 2006, de \$ 235,6 millones (-11%). Entre otras causas que explican esa baja sobresale, a partir de lo dispuesto por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 25.917 y su reglamentación), la exclusión del Presupuesto Nacional de los recursos inherentes al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), manteniéndose solamente el Programa de Reactivación de Planes de Vivienda. Asimismo se transfirieron menores recursos vinculados con la política energética. Dichas disminuciones fueron compensadas, parcialmente, con mayores aportes a las Provincias (para construcciones viales y de viviendas) y al Sistema de Transporte Ferroviario.

Por otra parte, el monto devengado al primer trimestre de 2007 arrojó importantes aumentos nominales, comparado con los años 2005 y 2004, de \$ 717,3 y de \$ 1.196,2 millones (+65% y +192%, respectivamente), según se observa en el gráfico.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 16
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/03/2007 (en pesos)


FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.604.273.252	5.991.887.771	1.653.870.216	27,6%
Recursos con Afectación Específica	229.752.055	229.752.055	50.494.802	22,0%
Otros recursos internos	32.270.000	32.270.000	6.943.937	21,5%
Financiamiento Externo	848.577.612	868.798.340	107.325.244	12,4%
TOTAL	6.714.872.919	7.122.708.166	1.818.634.199	25,5%

Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/03/2007 (en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.604.273.252	5.991.887.771	1.653.870.216	27,6%
Recursos con Afectación Específica	229.752.055	229.752.055	50.494.802	22,0%
Otros recursos internos	32.270.000	32.270.000	6.943.937	21,5%
Financiamiento Externo	848.577.612	868.798.340	107.325.244	12,4%
TOTAL	6.714.872.919	7.122.708.166	1.818.634.199	25,5%

Desde el punto de vista del financiamiento, el Tesoro Nacional alcanzó el 90,9% de las transferencias sobresaliendo los citados los Planes Federales de Vivienda (\$ 667,9 millones), la construcción de rutas por convenio con provincias (\$ 274,5 millones), la formulación y ejecución de la política energética (\$ 178,1 millones) y las asistencias para infraestructura social en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (\$ 52,4 millones), para Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) (\$ 45,0 millones), Ferrovías S.A. (\$ 42,2 millones) y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$ 35,3 millones).

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 31/03/07

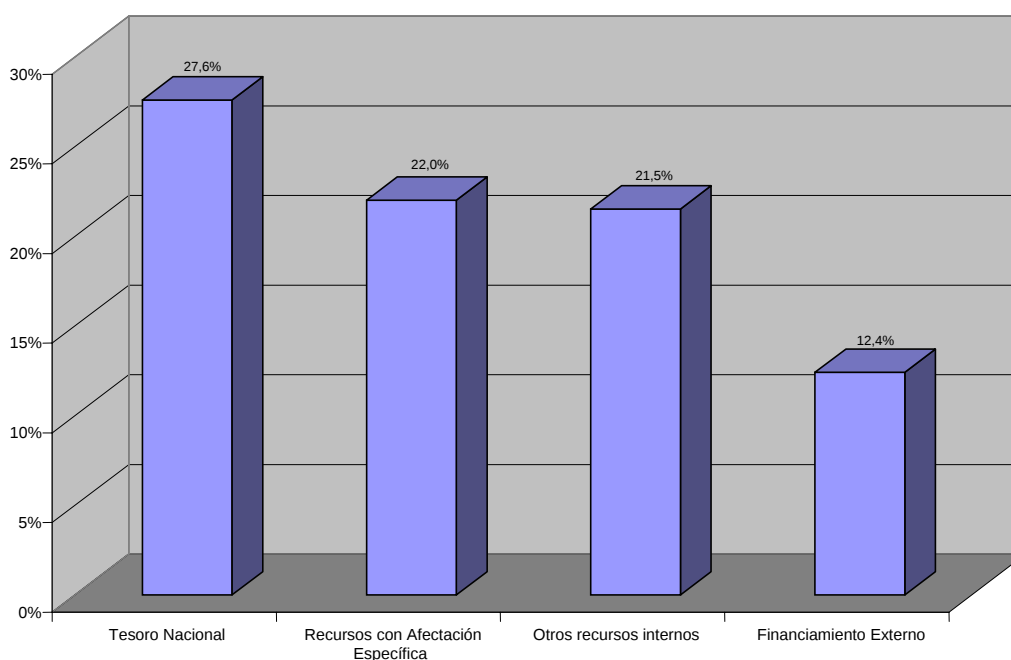

Los recursos afectados financiaron el 2,8% de las transferencias de capital comprendiendo, principalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior FEDEI (\$ 47,7 millones). Asimismo el crédito externo fue aplicado, principalmente, al plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$ 45,6 millones), al programa Mejoramiento Barrial -PROMEBA (\$ 22,5 millones), a las provincias para mejoramiento del sistema educativo (\$ 14,1 millones) y a la atención de emergencias por inundaciones (\$ 12,7 millones).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las transferencias de capital, al cierre del primer trimestre del ejercicio 2007, se concentraron, fundamentalmente, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones concentraron alrededor del 55% del total registrado al 31/03/2007.

Respecto a las transferencias realizadas a la provincia de Santa Cruz (19,4% del total) incluyeron las obras viales realizadas por convenio con la provincia (\$ 264,6 millones), para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$ 23,8 millones), para infraestructura social (\$ 19,5 millones), para Planes Federales de Vivienda (\$ 17,6 millones) y provincias para aprovechamiento de los recursos hídricos (\$ 11,7 millones).

Las transferencias de capital inherentes a la provincia de Buenos Aires (17,8%) comprendieron, mayormente, los Planes Federales de Vivienda (\$ 238,5 millones), el plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$ 21,6 millones) y las destinadas a obras hídricas y saneamiento (\$ 12,3 millones).

En el caso de las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17,7%) se destinaron a la formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario (\$ 180,5 millones), a energía (\$ 52,1 millones), al mejoramiento de la calidad educativa (\$ 14,1 millones) y al desarrollo urbano (\$ 14,8 millones).


Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial, asociadas a dos o más jurisdicciones, se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$ 112,1 millones).

Se presenta a continuación el indicador de transferencias de capital según densidad poblacional, cuya formula responde a:

$$= \text{Transferencias de capital} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \frac{\text{Habitantes}}{\text{Km}^2}$$

Gráfico N° 10
Transferencias de Capital por habitante y kilómetro cuadrado (*)

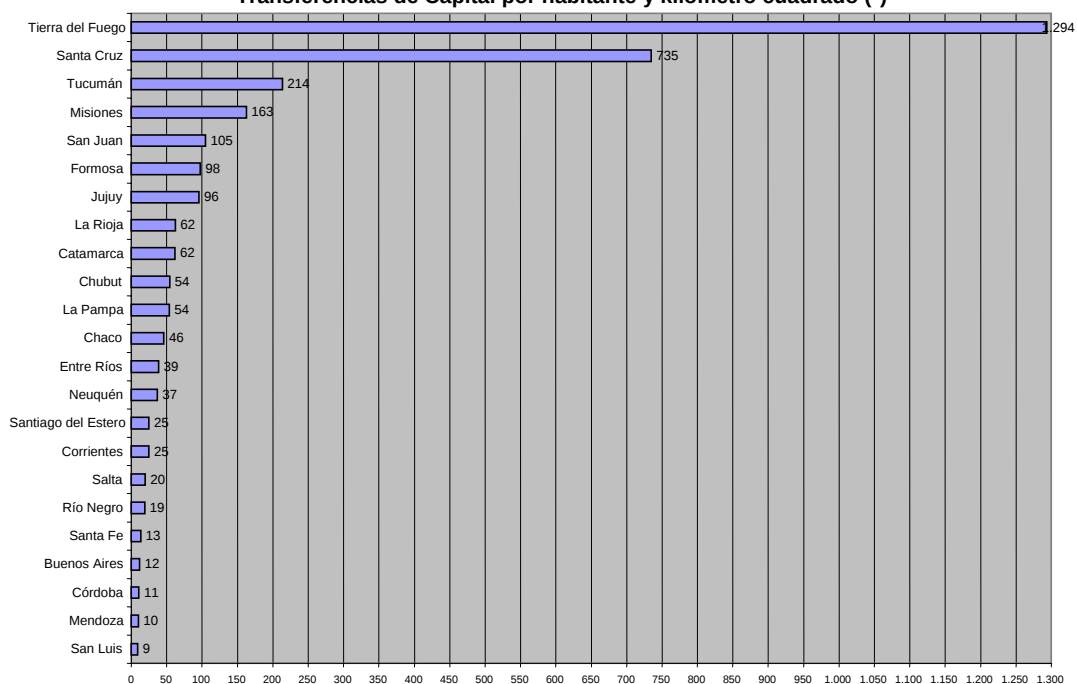

(*) En el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires por razones de escala (indicador: 58.252)

Resultó, al 31/03/2007, que las transferencias de capital por habitante son mayores en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Tucumán y menores en San Luis, Mendoza y Córdoba.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	46.074.155	3.652.488	8,6%
Presidencia de la Nación	33.461.134	35.609.134	2.148.000	6,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	6.000.000	0	0,0%
Ministerio del Interior	11.236.020	10.961.020	-275.000	-2,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	120.118.547	-250.000	-0,2%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	55.370.000	0	0,0%
Ministerio de Defensa	64.237.643	64.237.643	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	35.536.127	0	0,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	3.404.896.937	-426.530.541	-11,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	200.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	4.894.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	6.524.213	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	3.790.421.776	-421.255.053	-10,0%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	7.710.160	-153.840	-2,0%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	37.401.386	-8.415.000	-18,4%
Ministerio Público	6.075.133	6.075.133	0	0,0%
Presidencia de la Nación	24.394.427	24.711.427	317.000	1,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	33.815.923	0	0,0%
Ministerio del Interior	123.048.617	125.158.117	2.109.500	1,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	5.539.845	250.000	4,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	8.396.000	110.000	1,3%
Ministerio de Defensa	86.676.181	96.574.981	9.898.800	11,4%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	106.796.147	2.942.509	2,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	128.439.431	14.488.626	12,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	79.048.000	22.804.000	40,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	40.916.742	1.550.000	3,9%
Ministerio de Salud	41.980.323	42.507.119	526.796	1,3%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	6.572.166	877.166	15,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	775.557.577	47.305.557	6,5%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	4.565.979.353	-373.949.496	-7,6%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	46.074.155	26.731.696	2.811.738	6,1%
Presidencia de la Nación	33.461.134	35.609.134	9.986.860	6.003.522	16,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	6.000.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	11.236.020	10.961.020	470.745	470.745	4,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	120.118.547	22.381.994	16.824.528	14,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	55.370.000	10.470	10.470	0,0%
Ministerio de Defensa	64.237.643	64.237.643	520.477	520.477	0,8%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	35.536.127	8.579.032	2.542.678	7,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	3.404.896.937	1.176.314.743	1.082.233.184	31,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	200.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	4.894.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	6.524.213	603.767	279.621	4,3%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	3.790.421.776	1.245.599.784	1.111.696.963	29,3%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	7.710.160	1.704.129	967.407	12,5%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	37.401.386	12.010.231	2.856.011	7,6%
Ministerio Público	6.075.133	6.075.133	831.668	331.516	5,5%
Presidencia de la Nación	24.394.427	24.711.427	4.451.343	1.772.015	7,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	33.815.923	301.003	199.707	0,6%
Ministerio del Interior	123.048.617	125.158.117	15.714.888	9.379.740	7,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	5.539.845	1.534.595	1.122.786	20,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	8.396.000	437.836	289.284	3,4%
Ministerio de Defensa	86.676.181	96.574.981	13.400.256	9.824.326	10,2%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	106.796.147	33.762.517	7.787.527	7,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	128.439.431	18.567.563	14.154.153	11,0%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	79.048.000	16.225.648	7.872.341	10,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	40.916.742	4.342.062	4.054.209	9,9%
Ministerio de Salud	41.980.323	42.507.119	6.008.058	3.028.911	7,1%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	6.572.166	1.841.624	1.452.173	22,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	775.557.577	131.133.421	65.092.106	8,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	4.565.979.353	1.376.733.205	1.176.789.069	25,8%

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	3.280.497	99.974	0	0,00	24,00	s/i	
					51	Adecuación para Instalación Subdirección de Notificaciones	3.280.497	99.974	0	0,00	24,00		
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	4.487.919	4.079.376	0	0,00	100,00	s/i	
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	4.487.919	3.538.015	0	0,00			
					68	Construcción de Locales Subsuelo Av. de los Inmigrantes 1950 (1)	0	541.361	0	0,00			
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.546.745	2.506.663	0	0,00	80,00	s/i	
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.506.745	2.273.569	0	0,00	100,00		
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal (1)	40.000	233.094	0	0,00	13,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	516.872	914.212	214.244	0,00	100,00	s/i	
					52	Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle 1171	516.872	914.212	214.244	0,00	100,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	678.660	178.655	21,00	1,00	s/i	
					52	Lavalle 1220 Cap.Fed., Reparación de Cubiertas, Fachadas y Contrafrente	0	178.660	178.655	21,00	1,00		
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal (1)	40.000	500.000	0	0,00	1,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	7.447.946	10.112.697	172.046	0,00	79,00	s/i	
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de seis Juzgados	7.447.946	10.112.697	172.046	0,00	79,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	452.000	587.383	234.046	20,00	5,00	s/i	
					51	Adecuación Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal	452.000	587.383	234.046	20,00	5,00		
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.640.547	400.000	0	0,00	25,00	s/i	
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	1.000.248	200.000	0	0,00	100,00		
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	600.299	200.000	0	0,00	100,00		
					53	Secretaría Electoral de La Plata - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				10		Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	786.796	786.796	0	0,00	20,00	s/i	
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre. San Juan Adecuación Sector Electoral	746.796	746.796	0	0,00	100,00		
					52	Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	40.000	40.000	0	0,00	1,00		
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	3.462.796	1.346.631	0	0,00	24,00	s/i	
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edif.Calle Garibaldi	3.074.497	958.332	0	0,00	24,00		
					52	Edif. Primera. Junta 2687, Santa Fe - Adecuación	388.299	388.299	0	0,00	23,00		
				12		Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.039.796	500.000	0	0,00	20,00	s/i	
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	999.796	400.000	0	0,00	100,00		
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (1)	40.000	100.000	0	0,00	1,00		
				14		Área Cámara Posadas							
				1		Construcción de Sedes Judiciales (1)	40.000	0	0	0,00	1,00	s/i	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
						51 Tribunales Federales de Posadas Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				15		Área Cámara Resistencia							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	371.631	258.019	5,00	1,00	s/i	
						51 Adecuación y Obras del Juzgado Federal de Formosa	40.000	371.631	258.019	53,00	1,00		
					2	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (1)	0	600.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Juzgado de Roque Saenz Peña, Remodelaciones y Reparaciones (1)	0	600.000	0	0,00	100,00		
				16		Área Cámara de Córdoba							
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	683.548	300.000	0	0,00	100,00	s/i	
						51 Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	683.548	300.000	0	0,00	100,00		
				17		Área Cámara San Martín							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	880.135	782.282	125.224	45,00	40,00	s/i	
						51 Adecuación Edificio de la Cámara Federal y Tribunal Oral N° 4	0	282.282	125.224	91,00	9,00		
						52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	800.135	100.000	0	0,00	100,00		
						53 Edificio Calle Larraalde 673 Morón - Adecuación Edificio (1)	40.000	300.000	0	0,00	7,00		
						54 Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir (1)	40.000	100.000	0	0,00	4,00		
				18		Área Cámara Tucumán							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.586.242	2.958.022	148.923	0,00	100,00	s/i	
						52 Juzg. Fed. Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	2.586.242	2.958.022	148.923	0,00	100,00		
				22		Fuero Penal Económico							
					1	Remodelación y adecuación de Sede Judicial	665.000	0	0	71,00	29,00	s/i	
						52 Adecuación Juzg. Penal Económ. Av. de los Inmigrantes 1950	665.000	0	0	71,00	29,00		
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)							
				21		Justicia de Máxima Instancia							
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.962.451	5.283.451	711.128	15,00	50,00	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	659.999	2.779.999	711.128	44,25	35,00		
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	367.520	367.520	0	0,00	37,00		
						57 Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	852.632	852.632	0	0,00	100,00		
						62 Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	973.353	973.353	0	0,00	100,00		
						63 Reforma de las Instalaciones Eléctricas Palacio de Justicia (2)	0	1.000	0	100,00	0,00		
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia	108.947	308.947	0	0,00	100,00		
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.894.737	4.106.237	0	0,00	83,00	s/i	
						56 Refac. y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú	1.894.737	4.004.737	0	0,00	83,00		
						69 Reparación y Mantenimiento de Ascensores B. Mitre 718 y Maipú 92	0	1.500	0	0,00	100,00		
						70 Adecuación de Locales para el Traslado del Cuerpo Médico Forense	0	100.000	0	0,00	100,00		
				3		Refacciones Varias	156.316	258.816	0	0,69	98,00	s/i	
						73 Reparación y Mantenimiento de Ascensores Edificio Lavalle (2)	0	2.500	0	100,00	0,00		
						76 Reformas - Edificio Lavalle 1250 (1)	156.316	256.316	0	0,00	100,00		
				4		Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	0	0,00	75,00	s/i	
						51 Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	0	0,00	75,00		
				5		Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.240.804	1.830.804	769.453	54,00	46,00	s/i	
						51 Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.240.804	1.830.804	769.453	54,00	46,00		
				6		Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00		
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	773.684	0	0,00	52,00	s/i	
						51 Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	773.684	0	0,00	52,00		
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00	s/i	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00		

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
20						Presidencia de la Nación							
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
		17				Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas							
			3			Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	3.346.000	383.998	0,00	100,00	32,00	32,00
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	3.346.000	383.998	0,00	100,00	32,00	32,00
	20					Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR							
		36				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	380.000	866.960	675.420	96,00	4,00	0,80	20,00
						58 C.de Interpretación en San Martín de los Andes - 2da. Etapa	380.000	866.960	675.420	0,00	100,00	20,00	20,00
		37				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.672.000	2.227.360	2.189.487	80,25	19,75	3,46	17,50
						53 Albergue para Voluntarios en Villa La Angostura	152.000	707.360	153.497	61,00	39,00	5,85	15,00
						54 Camino Tronador-Los Rápidos	1.140.000	1.140.000	1.053.625	66,00	34,00	6,80	20,00
						58 Senderos y Miradores en Isla Victoria	76.000	76.000	360.192	16,00	84,00	16,80	20,00
						59 Infraestructura Isla Victoria Area Central	304.000	304.000	622.173	79,00	21,00	3,15	15,00
		42				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	152.000	677.680	382.826	87,56	12,44	0,00	0,00
						54 Construcción Albergue para Voluntarios en Lago Verde (2)	152.000	677.680	382.826	100,00	0,00	0,00	100,00
	21					Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
		38				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	3.137.007	3.137.007	0	35,00	45,00	0,00	0,00
						52 Obras en Junta de la Palca	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Obras en Agua del Godo	1.537.007	1.537.007	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Terminación Viviendas en Rodeo	1.200.000	1.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		39				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	301.517	301.517	0	86,00	14,00	0,00	0,00
						56 Mejoramiento Camino de Acc.al Parque Nac. Quebrada del Condorito	301.517	301.517	0	86,00	14,00	0,00	0,00
		40				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	1.161.476	1.161.476	0	7,00	1,00	0,00	0,00
						53 Centro Operativo Area Pobladores	591.326	591.326	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Centro Operativo Area Robles	570.150	570.150	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		41				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.800.000	1.800.000	451.918	15,00	85,00	25,11	29,54
						51 Obras 1º Etapa Infraestructura	1.000.000	1.000.000	451.918	39,00	61,00	45,19	74,08
						52 Adecuación Galpón de esquila como Centro de Interpretación	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	22					Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004							
		1				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	392.698	36,00	64,00	21,23	33,17
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	392.698	39,00	61,00	21,23	34,80
		2				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	840.000	68.994	8,00	92,00	5,15	5,60
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	840.000	68.994	18,00	82,00	5,15	6,28
		3				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	1.364.000	864.000	327.639	33,00	67,00	24,02	35,85
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	1.364.000	864.000	327.639	45,00	55,00	24,02	43,67
		4				Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	1.437.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	1.437.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	116					BIBLIOTECA NACIONAL							
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional							
			1			Construcción Edificio Las Heras- Museo del Libro (1)	2.100.934	1.600.934	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro (1)	2.100.934	1.600.934	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	301					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION							
		1				Actividades Centrales							
						2 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	140.000	945.000	29.809	99,66	0,34	0,24	70,59
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	140.000	945.000	29.809	99,66	0,34	0,24	70,59
		3				Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	8.095.000	1.049.007	36,90	63,10	10,17	16,12
						51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	8.095.000	1.049.007	36,90	63,10	10,17	16,12

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

						FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/03/2007	Devengado al				
								31/03/2007	31/03/2007	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
					4	Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.223.000	51.725	0,00	100,00	3,82	3,82
	337				51	Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.223.000	51.725	0,00	100,00	3,82	3,82
						SECRETARIA DE CULTURA							
		36				Difusión de la Música y Danza							
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	115.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	115.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		37				Preservación y Exhibición Artística-Cultural							
					1	Mejoras en Museos (1)	430.000	430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en el Museo Ricardo Rojas (1)	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (1)	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoras en el Museo Roca (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Museo Mitre (1)	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		38				Desarrollo y Promoción Cultural							
					5	Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1 (1)	880.000	691.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Obra en el Edificio de la Avenida Alvear (1)	135.000	135.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña (1)	15.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Obra en el Edificio de la Calle Alsina (1)	230.000	144.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Edificio de la Calle México (1)	260.000	157.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Mejoras en el Palais de Glace (1)	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos (1)	160.000	160.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					6	Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	4.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
25						Jefatura de Gabinete de Ministros							
	305					DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION -JEFATURA DE GABINETE							
		23				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento(**)							
					1	Construcción de Instalaciones Deportivas (1)	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Salón Cubierto de Atletismo (1)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Construcción Gimnasio Ezeiza (1)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior							
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA							
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes							
					22	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		34				Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		37				Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		40				Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	935.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	935.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		43				Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		47				Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	1.000.000	0	0,00	69,00	0,00	0,00
		48				Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al				
									31/03/2007		al 31/12/2006	DADC 2007	31/03/2007 anual
					4	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	375				51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		40				GENDARMERIA NACIONAL							
				2		Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
					2	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	250.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	250.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
		20				Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Argentina	1.493.953	1.493.953	470.745	20,70	79,30	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	1.493.953	1.493.953	470.745	23,60	37,97	0,00	0,00
		21				Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	783.567	783.567	0	62,40	37,60	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	158.000	158.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	178.000	178.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón 4 "Concordia" (1)	125.000	125.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Refacción Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez" (1)	124.567	124.567	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (1)	38.000	38.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Ampliación Escuadrón 55 "Tucumán" (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Grupo "Alfárez Pedrozo" - Agrup. XII "Comahúe" (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		22				Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		23				Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	380				51	Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						PREFECTURA NAVAL ARGENTINA							
		31				Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial							
				1		Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				5		Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				6		Construcción Prefectura Zona Mar Argentina Norte (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Estructura Basamento Edificio (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		37				Formación y Capacitación Profesional de la PNA							
				2		Construcción de Alojamiento para Coursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Coursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto							
	106					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
		1				Actividades Centrales							
				3		Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
				1		Infraestructura Terrestre	2.036.000	5.588.000	167.523	40,64	59,36	0,19	0,32
					0	Infraestructura Terrestre	53.000	53.000	0				

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	5.000	3.785.000	106.322	76,30	14,45	0,45	3,11
						52 Construcción del Instituto Gulich	188.000	20.000	0	13,50	0,12	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	775.000	890.000	32.000	12,05	11,11	0,71	6,39
						56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00
						58 Construcción de Antenas Educativas	700.000	405.000	29.201	2,65	1,99	0,19	9,55
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	300.000	20.000	0	0,08	0,07	0,00	0,00
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	405.000	0	0,00	8,91	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	110.293.301	105.986.301	16.306.050	32,79	10,00	2,04	20,40
						0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.040.000	77.670				
						52 Misión SAOCOM	79.472.030	63.125.030	2.769.638	26,60	11,76	0,40	3,40
						53 Misión SABIA	5.000	5.000	40.666	14,19	0,69	0,67	97,10
						54 Misión CESAR	28.816.271	40.816.271	13.418.076	22,60	34,99	9,68	27,67
				4		Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
						52 Antena Multipropósito N° 6	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
				5		Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	39,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	0,25	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	0	0,00	44,00	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	0	0,00	22,22	0,00	0,00
17						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
				1		Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	367.000	852.000	266.844	1,18	1,00	0,32	32,00
						0 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	360.000	370.000	205.706	14,32	5,12	3,32	64,84
						52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	479.000	61.138	0,00	1,01	0,08	7,92
18						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
				1		Actividades Centrales							
				2		Remodelación Palacio San Martín	710.849	710.849	0	50,00	10,00	8,80	88,00
						51 Remodelación Palacio San Martín	710.849	710.849	0	50,00	10,00	8,80	88,00
				3		Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1)	0	488.060	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						0 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1)	0	244.030	0				
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1)	0	244.030	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16						Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia	0	488.063	0	2,15	97,85	0,00	0,00
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	488.063	0				
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	0			2,15	97,85	0,00	0,00
				8		Remodelación Embajada en Roma	508.195	508.195	84.109	0,00	30,00	0,00	0,00
						0 Remodelación Embajada en Roma	0	100.000	84.109				
						51 Remodelación Embajada en Roma	508.195	408.195	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	370.472	0	35,00	40,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	370.472	0	35,00	40,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	0,00	0,00
					12	Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	1.016.394	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Remodelación de la Embajada en Francia	0	150.000	0				
					51	Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	866.394	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Desarrollo del Plan Antártico							
					15	Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1)	191.513	191.513	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1)	191.513	191.513	0	0,00	30,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos							
						MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS							
				1		Actividades Centrales							
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	10.470	86,11	13,89	3,87	27,86
					51	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias (2)	180.000	180.000	9.930	100,00	0,00	0,00	100,00
					52	Equipamientos Varios	45.000	45.000	540	90,00	10,00	0,20	2,00
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos (2)	45.000	45.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				18		Política e Infraestructura Penitenciaria							
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	2.716.200	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	2.716.200	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.673.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.673.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					12	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					15	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					16	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					17	Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.067.138	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.067.138	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					19	Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					20	Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					21	Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					22	Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa							
						MINISTERIO DE DEFENSA							
				18		Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas							
					1	Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)	7.502.000	7.502.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					0	Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)	945.000	945.000	0				
					51	RSMA - Fabricación e Instalación de Radares (1)	6.557.000	6.557.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				379		ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
					16	Capacidad Operacional de la Armada							
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	71.330	29,22	50,00	3,48	6,96

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						51 Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	71.330	29,22	50,00	3,48	6,96
		18				Formación y Capacitación							
				1		Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,13	0,87
						51 Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,13	0,87
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	22.682.603	238.544	12,70	59,00	0,91	1,54
						0 Construcción de Alojamiento para Personal Militar (1)	0	0	114.430				
						51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	22.682.603	124.114	12,70	59,00	0,91	1,54
				4		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	0,00	0,00
						51 Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	0,00	0,00
				5		Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	0	47,80	52,20	0,00	0,00
						51 Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	0	47,80	52,20	0,00	0,00
				7		Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00
	450					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
				3		Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	64.988	14,26	28,00	0,00	0,00
						51 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	64.988	14,26	28,00	0,00	0,00
50						Ministerio de Economía y Producción							
		357				MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
				1		Actividades Centrales							
						13 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	425.000	187.184	15,43	84,57	44,00	52,03
						51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	425.000	187.184	15,43	84,57	44,00	52,03
				14		Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J. A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J.A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Restauración Integral del Patio Principal- Edificio PAHAC	600.000	795.000	643.606	0,00	100,00	81,00	81,00
						51 Restauración Integral Piso 1 Edificio PAHAC Y.H.250	600.000	795.000	643.606	0,00	100,00	81,00	81,00
				16		Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Provisión e Instalación Cielorrasos Suspendidos	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	930.000	930.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	930.000	930.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				19		Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				20		Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				21		Des. e Implement. Nueva Red Privada Telecomunic - MECyP (1)	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Des. e Implement. Nueva Red Privada Telecomunic - MECyP (1)	500.000	500.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				22		Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I (1)	700.000	700.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive (1)	400.000	400.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						52 Instalación de Sistema Contra Incendios - Hidr. y Rociad. Automático (1)	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera							
						1 Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	35.434	39,64	60,36	60,00	99,40
						51 Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	35.434	39,64	60,36	60,00	99,40
	602					COMISION NACIONAL DE VALORES							
				16		Control y Fiscalización de la Oferta Pública							
						1 Modernización de la Comisión Nacional de Valores	371.000	371.000	4.650	74,49	25,51	1,27	4,98

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
						53 Modernización del Archivo	371.000	371.000	4.650	74,49	25,51	1,27	4,98
606						INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
		16				Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T							
				3		Parques de Innovación Tecnológicos PITS	744.355	744.355	913	62,81	2,00	0,00	0,00
						0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	367.004	367.004	913				
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	377.351	377.351	0	42,00	2,00	0,00	0,00
				5		Construcción y Ampliaciones Inst. de Investigación -Etapas II	329.387	329.387	0	71,63	28,37	0,00	0,00
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	329.387	329.387	0	71,63	28,37	0,00	0,00
				8		Construcción y Ampliaciones Instit. de Invest. Etapa III (2)	492.029	492.029	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Ampliación Sala de Proc. Satelitales en Instit. Clima y Agua (2)	185.370	185.370	0	98,32	1,68	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virología (2)	22.884	22.884	0	54,72	17,28	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología (2)	137.307	137.307	0	94,00	6,00	0,00	0,00
						55 Remodelación Alojamiento Inst. Microbiología y Zool. Agríc. (2)	22.884	22.884	0	79,13	10,87	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de Frío en el Inst. de Patobiología-Castelar (2)	123.584	123.584	0	94,75	4,00	0,00	0,00
				12		Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	385.695	200.761	33,00	57,00	3,60	6,32
						51 Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	385.695	200.761	33,00	57,00	3,60	6,32
				17		Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	771.403	487.820	8,00	92,00	8,90	9,67
						51 Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	771.403	487.820	8,00	92,00	8,90	9,67
17						Investigación Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT							
				4		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - EtapaI	109.787	109.787	0	0,00	28,00	0,00	0,00
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	109.787	109.787	0	0,00	28,00	0,00	0,00
				5		Construcción y Ampliaciones Centros del interior -EtapasII (2)	443.297	443.297	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						58 Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay (2)	443.297	443.297	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				9		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (2)	819.281	819.281	37.000	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales (2)	27.459	27.459	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						54 Construcción Ofic. Baños y Sala Reuniones Estación Exper. Anguil (2)	389.049	389.049	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						56 Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce (2)	68.654	68.654	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						57 Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Rioja (2)	228.846	228.846	37.000	100,00	0,00	0,00	100,00
						61 Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur (2)	22.884	22.884	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						62 Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. Mendoza	82.389	82.389	0	50,52	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -EtapasV	1.619.937	1.619.937	130.791	73,00	27,00	2,30	8,52
						51 Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	192.848	192.848	4.500	42,03	57,97	0,00	0,00
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	771.403	771.403	0	91,57	8,43	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	38.572	38.572	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa	385.695	385.695	126.291	79,14	20,86	4,22	20,23
						55 Obras Varias C.R. Misiones	231.419	231.419	0	68,87	31,13	0,00	0,00
				14		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapas VI	925.703	925.703	227.943	60,57	39,43	4,00	10,14
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	77.144	77.144	0	28,87	71,13	0,00	0,00
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	154.288	154.288	13.465	93,88	6,12	1,70	27,78
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	385.695	385.695	80.512	71,95	28,05	6,00	21,39
						54 Obras Varias C.R. Córdoba	154.288	154.288	59.913	39,39	60,61	5,70	9,40
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	154.288	154.288	74.053	94,64	5,36	5,36	100,00
				15		Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapas VII	1.928.513	1.928.513	48.104	25,00	35,00	1,00	2,86
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	1.928.513	1.928.513	48.104	25,00	35,00	1,00	2,86
				16		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapas VIII	925.690	925.690	27.138	73,00	27,00	0,02	0,07
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	385.695	385.695	0	79,79	20,21	0,00	0,00
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	154.288	154.288	0	58,40	41,60	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al		DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
						53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	154.288	154.288	13.000	72,53	27,47	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur	231.419	231.419	14.138	80,71	19,29	2,00	10,37
				18		Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	2.314.220	2.314.220	234.314	8,00	92,00	9,00	9,78
						51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	2.314.220	2.314.220	234.314	8,00	92,00	9,00	9,78
				19		Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	1.928.513	3.315	2,00	34,00	0,00	0,00
						51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	1.928.513	3.315	2,00	34,00	0,00	0,00
				20		Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce	1.542.818	1.542.818	0	1,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce	1.542.818	1.542.818	0	1,00	3,00	0,00	0,00
				21		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	2.314.220	0	0,00	53,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	2.314.220	0	0,00	53,00	0,00	0,00
				22		Construcción y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy	1.542.818	1.542.818	0	38,00	62,00	0,00	0,00
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	1.542.818	1.542.818	0	38,00	62,00	0,00	0,00
				23		Construcción Laboratorios y Oficinas. Estación Agrop. Manfredi	1.928.513	1.928.513	1.760	50,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas. Estación Agrop. Manfredi	1.928.513	1.928.513	1.760	50,00	50,00	0,00	0,00
				24		Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	1.542.818	0	82,00	18,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	1.542.818	0	82,00	18,00	0,00	0,00
609				16		INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	340.000	44.711	41,74	58,26	2,19	3,76
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	340.000	44.711	30,50	40,25	5,29	13,14
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	0	27,90	12,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	0	27,90	12,00	0,00	0,00
				3		Equipamiento Analítico	447.660	447.660	0	50,16	13,00	0,00	0,00
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	447.660	447.660	0	50,16	13,00	0,00	0,00
				4		Modernización de la Tecnología de la Información	456.960	456.960	34.437	97,31	2,69	1,66	61,71
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	456.960	456.960	34.437	97,31	2,69	1,66	61,71
623				17		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
						Servicios de Laboratorios							
				14		Reubicación Laboratorio Serv.Nac. de Sanidad y Calidad Agroalim.	3.800.000	3.800.000	192.797	10,00	60,00	5,00	8,33
						51 Reubicación Laboratorio Serv.Nac. de Sanidad y Calidad Agroalim.	3.800.000	3.800.000	192.797	10,00	60,00	5,00	8,33
56				105		Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios							
				20		COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA							
						Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
				1		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	10.042	90,00	4,00	0,02	0,50
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	10.042	90,00	4,00	0,02	0,50
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	128.000	395	95,00	3,00	0,10	3,33
						51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	128.000	395	95,00	3,00	0,10	3,33
				3		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	450.000	58.000	39,00	7,00	0,80	11,43
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	450.000	58.000	39,00	7,00	0,80	11,43
				4		Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	500.000	0	28,00	4,00	0,00	0,00
						51 Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	500.000	0	28,00	4,00	0,00	0,00
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	130.000	797	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	130.000	797	0,00	10,00	0,00	0,00
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.075.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.075.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	250.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	250.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al				
									31/03/2007	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
					10	Ampliación Laboratorios CAB	500.000	1.000.000	110.774	52,16	30,00	4,10	13,67
					51	Ampliación Laboratorios CAB	500.000	1.000.000	110.774	52,16	30,00	4,10	13,67
				11		Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	0	25,84	20,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	0	25,84	20,00	0,00	0,00
				21		Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
				1		Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	0	88,28	8,00	0,00	0,00
				51		Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	0	88,28	8,00	0,00	0,00
				2		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	235.000	99	94,71	4,00	0,00	0,00
				51		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	235.000	99	94,71	4,00	0,00	0,00
				3		Saneamiento del CAE	250.000	250.000	0	88,93	11,00	0,00	0,00
				51		Saneamiento del CAE	250.000	250.000	0	88,93	11,00	0,00	0,00
				4		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	0	27,05	20,00	0,00	0,00
				51		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	0	27,05	20,00	0,00	0,00
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				8		Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				9		Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	100.000	100.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				51		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	100.000	100.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				11		Construcción y Equipamiento Laborat.p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	130.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				51		Construcción y Equipamiento Laborat.p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	130.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				12		Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	390.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				51		Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	390.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				14		Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	6.592.600	3.026	0,00	12,00	0,05	0,42
				51		Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	6.592.600	3.026	0,00	12,00	0,05	0,42
				22		Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
				1		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.453.000	1.558.000	2.174	79,49	9,81	0,01	0,10
				51		Área Gestión Ezeiza	1.350.000	1.425.000	0	62,89	15,00	0,00	0,00
				52		Laboratorio Control y Verificación	103.000	133.000	2.174	91,68	6,00	0,09	1,50
				2		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.832.000	1.460.000	38.456	24,37	5,74	0,13	2,26
				51		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.635.000	1.153.000	35.782	15,82	20,00	0,50	2,50
				52		Repositorio Fase 1	197.000	307.000	2.674	27,21	1,00	0,01	1,00
				3		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	505.000	99.968	48,70	18,00	6,95	38,61
				51		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	505.000	99.968	48,70	18,00	6,95	38,61
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad	10.400.000	10.400.000	241.742	24,47	13,19	0,38	2,88
				51		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	7.199.700	7.453.000	187.016	30,08	14,00	0,49	3,50
				52		Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	1.761.000	1.684.800	50.522	18,46	12,00	0,34	2,83
				53		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.289.300	1.112.200	1.705	8,25	11,00	0,02	0,18
				54		Remodelación Casa Guayra	150.000	150.000	2.500	72,68	27,32	0,50	1,83

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
					5	Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	0	53,95	2,00	0,00	0,00
					51	Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	0	53,95	2,00	0,00	0,00
					6	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	0	95,19	4,81	0,00	0,00
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	0	95,19	4,81	0,00	0,00
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	255.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	255.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				23		Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no Nucleares							
					1	Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	511.999	35,53	3,00	0,00	0,00
					51	Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	511.999	35,53	3,00	0,00	0,00
					2	Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	530.000	530.000	388.601	42,35	26,00	19,40	74,62
					51	Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	530.000	530.000	388.601	42,35	26,00	19,40	74,62
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
108				16		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	100.000	0	98,00	1,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	100.000	0	98,00	1,00	0,00	0,00
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	720.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras y Recuperación Bco. de Bombas del Laboratorio de Hidráulica (1)	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
354				17		MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
						Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR							
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	10.654.800	10.654.800	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.854.800	3.854.800	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	3.400.000	3.400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	3.400.000	3.400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	886.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	886.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	687.200	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	687.200	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricos	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricos	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
19						Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (2)	200.000	12.575.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					56	Aliviador Cildanez - Etapa II (2)	0	6.775.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II (2)	200.000	5.800.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	457.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	457.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	9.264.462	476.792	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	9.264.462	476.792	0,00	90,00	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	1.944.700	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	1.944.700	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					31	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					32	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
						51 Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00
25						Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	8.882.000	1.348.226	40,35	11,00	1,88	17,09
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	8.882.000	1.348.226	40,35	11,00	1,88	17,09
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	3.550.000	6.550.000	152.547	58,31	8,00	0,63	7,88
					51	Edificios Fiscales	3.550.000	6.550.000	152.547	58,31	8,00	0,63	7,88
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	1.000.000	6.587.400	1.593.093	16,14	5,00	2,76	55,20
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	900.000	5.282.000	1.593.093	0,00	5,00	2,76	55,20
					52	Defensa Costera	100.000	1.305.400	0	49,70	42,00	0,00	0,00
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,19	0,38
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,19	0,38
				12		Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	109.934	99,34	0,66	0,00	0,00
					51	Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	109.934	99,34	0,66	0,00	0,00
				13		Refacacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Refacacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	24.386.178	24.276.178	17.436.980	32,51	25,00	13,58	54,32
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	24.386.178	24.276.178	17.436.980	32,51	25,00	13,58	54,32
				21		Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	9.700.000	460.215	10,16	52,00	7,01	13,48
					51	Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	9.700.000	460.215	10,16	52,00	7,01	13,48
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	5.898.499	5.898.499	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	1.937.806	1.937.806	0				
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	3.960.693	3.960.693	0	0,00	8,00	0,00	0,00
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				26		Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	350.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	350.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				27		Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	400.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	400.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				28		Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				29		CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica							
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	98.619	57,80	4,70	1,00	21,28
					51	Monitoreo de Activ. Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	98.619	57,80	4,70	1,00	21,28
32						Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)							
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.245.000	3.245.000	724.178	57,00	32,00	3,00	9,38
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	594.027	19.939	0				
					51	Huellas Varias Misiones	250.973	250.973	0	59,00	32,00	3,00	9,38

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						52 Huellas Mineras NOA	750.000	1.099.088	175.933	59,00	32,00	3,00	9,38
						53 Huellas Mineras Cuyo	750.000	975.000	398.245	59,00	32,00	3,00	9,38
						54 Huellas Mineras Comahue	450.000	450.000	150.000	54,00	32,00	3,00	9,38
						55 Huellas Mineras Patagonia	450.000	450.000	0	54,00	32,00	3,00	9,38
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
	2					Obras Viales. Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	100.000	100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						52 Puente Encarnación - Posadas	100.000	100.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
	13					Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	984.506	0,00	100,00	10,00	10,00
						51 Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	984.506	0,00	100,00	10,00	10,00
	14					Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00
55						Formulación y Ejeción de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario							
	2					Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	99.288.912	99.288.912	23.354.453	99,75	0,25	0,02	8,00
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	9.501.725	9.528.725	2.547.974				
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	81.949.712	81.922.712	15.853.313	13,02	86,98	11,12	12,78
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	4.837.475	4.837.475	1.544.034	72,06	27,94	8,04	28,78
						66 Paso a Diferente Nivel, Municipio de San Fernando - Tigre	3.000.000	3.000.000	3.409.133	64,00	36,00	10,00	27,78
	4					Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	78.318.491	78.318.491	7.164.373	12,42	46,98	4,17	8,88
						0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	4.933.332	4.933.332	116.122				
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	73.385.159	73.385.159	2.308.718	12,42	46,98	4,17	8,88
89						Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345)							
	1					Escuela Nacional Fluvial (1)	0	4.071.988	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial (1)	0	4.071.988	0	0,00	0,00	0,00	0,00
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
	2					Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	9.500.000	7.690.441	7,52	49,00	6,69	13,65
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	9.500.000	7.690.441	7,52	49,00	6,69	13,65
	3					Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	4					Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	5					Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	2.000.000	0	0,00	88,00	0,00	0,00
						51 Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	2.000.000	0	0,00	88,00	0,00	0,00
	6					Reparación Puente Uriburu	0	460.000	0	79,00	21,00	21,00	100,00
						51 Reparación de Estructura de Tablero y Calzada	0	460.000	0	79,00	21,00	21,00	100,00
	7					Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	3.000.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	3.000.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00
	8					Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00
						51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00
	9					Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
	10					Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	2.000.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	2.000.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
	11					Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
	12					Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	1.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	1.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
	13					Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	1.000.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	1.500.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	1.500.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	3.000.000	3.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	3.000.000	3.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	1.540.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	1.540.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				24		Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
613				20		ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO							
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	19.920.237	19.920.237	8.353.428	66,59	26,74	13,80	51,61
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	742.512	742.512	2.678.655	84,77	15,23	15,23	100,00
					52	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	14.136.489	14.136.489	3.334.684	75,47	10,00	6,56	65,60
					53	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	5.041.236	5.041.236	2.340.090	39,53	40,47	19,62	48,48
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación	29.103.558	29.103.558	9.647.507	46,90	43,00	9,57	22,26
					51	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación	21.173.555	21.173.555	4.378.407	56,92	43,00	6,34	14,74
					52	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	7.930.003	7.930.003	5.269.100	46,79	43,00	12,80	29,77
				4		Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.	8.631.415	8.631.415	6.809.516	57,27	40,73	21,64	53,13
					51	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.	8.631.415	8.631.415	6.809.516	57,27	30,73	21,64	70,42
				5		Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	27.309.750	27.309.750	2.854.556	20,43	50,20	11,00	21,91
					51	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	27.309.750	27.309.750	2.854.556	20,43	50,20	11,00	21,91
				6		Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	14.745.213	8.508.656	74,08	25,92	7,00	27,01
					51	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	14.745.213	8.508.656	74,08	20,00	7,00	35,00
				7		Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.126.865	19.126.865	763.421	23,48	35,52	5,15	14,50
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	12.949.333	12.949.333	763.421	46,95	43,05	5,83	13,54
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	6.177.532	6.177.532	0	0,00	18,00	4,46	24,78
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	24.540.227	24.540.227	2.441.597	31,86	25,79	7,76	30,09
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	6.708.350	6.708.350	1.842.598	60,43	39,57	10,47	26,46
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	17.831.877	17.831.877	598.999	3,28	30,00	5,06	16,87
				10		Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	172.600	172.600	21.200	0,00	1,00	0,81	81,00
					51	Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(#)	17.359	17.359	9.320	0,00	0,00	1,62	
					52	Perforación 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	155.241	155.241	11.880	0,00	2,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

							FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/03/2007	Devengado al		DADC		
									31/03/2007	31/03/2007		31/03/2007	anual
					11	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja	4.247.851	4.247.851	1.653.049	43,39	26,61	26,19	98,42
					51	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja	4.247.851	4.247.851	1.653.049	43,39	26,61	26,19	98,42
					12	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	2.584.891	0	0,00	52,64	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	2.584.891	0	0,00	52,64	0,00	0,00
					13	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	9.964.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					51	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	9.964.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					14	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	206.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	206.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					15	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües (#)	57.359	57.359	0	0,00	0,00	0,54	
					51	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües (#)	57.359	57.359	0	0,00	0,00	0,54	
					16	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	27.463.825	27.463.825	6.719.355	15,42	24,00	10,56	44,00
					51	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	18.611.840	18.611.840	1.182.196	10,31	25,00	3,80	15,20
					52	Optimización de Sisema de Provisión de Agua Potable Formosa	8.851.985	8.851.985	5.537.159	20,53	23,00	17,33	75,35
					17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					51	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					18	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	3.589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	3.589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					20	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.222.597	1.222.597	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.222.597	1.222.597	0	0,00	13,00	0,00	0,00
					21	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	3.283.550	6.820	0,00	33,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	3.283.550	6.820	0,00	33,00	0,00	0,00
					22	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	20.840.944	20.840.944	6.335.424	20,92	18,00	8,80	48,89
					51	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	6.482.420	6.482.420	3.338.949	31,14	21,00	15,65	74,52
					52	Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	14.331.165	14.331.165	2.996.475	31,62	33,00	11,75	35,61
					53	Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan (#)	27.359	27.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	44.058.202	13.369.054	9,68	37,00	10,84	29,30
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	44.058.202	13.369.054	9,68	37,00	10,84	29,30
					24	Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	9.213.656	9.213.656	3.630.970	2,74	30,00	8,93	29,77
					51	Constr. de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs As (#)	7.359	7.359	2.530	2,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	9.206.297	9.206.297	3.628.440	3,48	60,00	17,86	29,77
					25	Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil Bs. As.	3.006.352	3.006.352	2.296.032	83,88	16,12	10,00	62,03
					51	Constucción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil Bs. As.	3.006.352	3.006.352	2.296.032	83,88	16,12	10,00	62,03
					26	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					28	Construcción de Acueducto L. del Taffí - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto L. del Taffí - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Constucción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Estación de Bombeo- San Isidro - Buenos Aires	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	14.718	14.718	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					31	C. Acueducto L.Blanco-Pampa del Infierno-C.del Bermejo-Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al				
									31/03/2007	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						51 C. Acueducto L.Blanco-Pampa del Infierno-C.del Bermejo-Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras Integral Desagües y Tratamientos (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				41		Optimización Sist.de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sist.de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				45		Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipoletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipoletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				46		Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				47		Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Acueducto Sur Salta (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Sur Salta (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007		2007		
						55 Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						72 Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						78 Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						81 Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						87 Obras de Agua Potable (1)	233.714	233.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Perf. de 12 Pozos y Centros de Mezcla - Corimayo AB Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción de Redes de Distrib. Primarias - V. Indepen Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción de Redes Secundarias B° San Martín - Lan. - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Ampliación de Redes y Construcción de Tanques Elevados para Refuerzo (1)	204.278	204.278	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción de Redes de Expansión Primarias - Quilmes - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						88 Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. (1)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Perf. de 27 Pozos - Batería Unión - Ezeiza - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande Sur- Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						91 Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						92 Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						98 Construcción Planta de Trat.Liq.Cloacales-Fiorito-L.Zamora (1)	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Trat.Liq.Cloacales-Fiorito-L.Zamora (1)	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						99 Construcción de Colectores Cloacales-Lomas de Zamora (1)	155.000	155.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Colectores Cloacales-Lomas de Zamora (1)	155.000	155.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
						Actividades Centrales							
					1	Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	0	96,23	3,77	0,38	10,08
						51 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	0	96,23	3,77	0,38	10,08

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
					3	Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	581.743	581.743	0	32,00	15,00	6,00	40,00
					51	Construcción Edificio 25	581.743	581.743	0	32,00	15,00	6,00	40,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
				1		Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.347.000	82.424	31,11	3,00	0,59	19,67
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.347.000	82.424	31,11	3,00	0,59	19,67
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
				17		Infraestructura en Concesiones Viales							
				1		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As.	11.104.037	8.104.037	7.751.591	43,68	56,32	19,46	34,55
					51	Autovía Cañuelas-M.Gde-RN 3 - Km 87,82- Km 97,561Bs.As.	11.104.037	8.104.037	7.751.591	43,68	56,32	19,46	34,55
				2		Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Bs.As.I	1.402.765	1.000	0	93,45	6,55	0,17	2,60
					51	Obra de Alteo RN.3-Km 607,5-Km608,5 Cnel. Dorrego-Bs.As.	1.402.765	1.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					52	Mejora de Interseccion RN 3 con RN 249 Acc.a Punta Alta	0	0	0	99,83	0,17	0,17	100,00
				3		Aumento de Capacidad en C.Viales Pcia. Bs.As.II	5.747.342	6.047.342	4.029.431	99,46	0,54	0,00	0,00
					51	Autovía M.del Plata-Balcarce I Tramo R.226 - Km 20,5 - K	5.747.342	6.047.342	4.029.431	99,46	0,54	0,00	0,00
				4		Aumento de Capacidad en C.Viales Pcia. Bs.As.III	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autovía M.del Plata-Balcarce II Tramo-R.226- Km 31,7 -	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II	1.402.766	5.302.766	763.048	17,97	44,15	13,98	31,66
					51	Mejora en Travesía Urbana RN 205 KmC66-Cañuelas Bs.As.	701.383	2.801.383	763.048	35,93	64,07	23,24	36,27
					52	Mejora Intersección e Iluminación RN 5 -Km260 9 de Julio Bs.	701.383	2.501.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	2.104.148	3.403.765	0	0,00	88,88	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección RN 7 Km 202,16 Chacabuco- Bs.As.	701.383	1.000	0	0,00	88,88	0,00	0,00
					52	Mejora en Travesía Urbana RN 188 Km 156,80 - Junín Bs.As.	1.402.765	3.402.765	0	0,00	88,88	0,00	0,00
				7		Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	701.383	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	701.383	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				8		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	48.920.782	10.473.391	2.032.274	5,57	53,22	2,84	5,34
					51	Autop. Luján-Mercedes Sec.I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 BA.	24.448.391	1.000	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					52	Autop. Luján-Mercedes Sec.III RN 5 Km 85,78 - Km 95,6	24.472.391	10.472.391	2.032.274	10,55	39,80	4,88	12,26
				9		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	35.069.138	9.990.873	6.148.857	15,80	58,97	11,71	19,86
					51	Tramo Campana - Zárate RN 9 E/ Km 72,62- Km 85,20	35.069.138	9.990.873	6.148.857	15,80	58,97	11,71	19,86
				10		Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	1.402.765	6.802.765	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					52	Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista Sta.Fe	1.402.765	6.802.765	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				11		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Obra Vincul.Ex RN 193Tramo Emp.RN 8-Emp.RP39 Exalt.de L Cruz	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				12		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	3.506.913	1.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
					51	Obra en RN A005-Tramo Emp.RN8-Emp.RP36-Sec.Km0-12 R.Cuarto	3.506.913	1.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
				13		Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	2.104.148	6.403.765	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Intersec. RN 33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	701.383	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Adecuación de Accesos RN.34 Km387 - Ceres - Santa Fe	1.402.765	6.402.765	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				14		Seguridad en Corredores Viales I	1.364.954	13.432.885	525.869	70,15	10,00	3,23	32,30
					52	Const.Pasarelas Peat.RN 3Km76,75 Cañuelas Bs.As RN 33 Km751 (2)	1.000	58.800	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright Santa Fe RN 8 Km 294,60 (2)	1.000	843.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					55	Travesía Urb. Río Cuarto Cba RN8 Km598,8;A-5 Km 0-11,4;RN36 (2)	1.000	21.100	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					56	Const.Pasarelas Peat.RN9 Km1349,0 B.Paz Tuc;RN9 Km1459,80 M (2)	1.000	20.100	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					59	Mejora Intersec.y Const.Colectoras RN3 Km109 110 S.M.Monte (2)	1.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					61	Construc.Canal desagües Pluv.-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	35.069	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					63	Trav.Urb.RN188 Km8,0-112,0 C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerric	20.000	275.000	337.060	57,82	42,18	0,00	0,00
					66	Mejora Acceso a Vedia Bs.As. RN7 Km 312,26 Bs.As.	17.535	1.817.535	0	0,00	100,00	10,47	10,47

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						67 Mejora Acceso a Alberti e Iluminación RN 5 Km 189,39 Bs.As. (2)	44.000	247.000	188.809	100,00	0,00	0,00	100,00
						68 Mejora Acc.Canalizado a la Laguna de Lobos RN 205 Km111,45 (2)	30.000	37.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						71 Constr. de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Ctes	1.000	235.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207,00 Bs.As.	280.553	980.553	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						76 Mejora Intersección Acceso Hersilia Sta.Fe RN 34 Km369,88	701.383	2.651.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	70.138	2.870.138	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Mejora Inters.Acceso a S.Esteban-Los Cocos Cba RN38 Km75,3	10.000	1.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						80 Mejora de Acceso a Pinto Sgo del Estero RN34 Km 496,08 (2)	10.000	74.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						81 Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	35.069	1.535.069	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						82 Constr. Intersec.Canalizada RN12 Km 1383,25 Sta Ana-Misiones	105.207	1.465.207	0	0,00	100,00	53,35	53,35
16						Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	140.277	490.277	406.704	51,39	48,61	36,05	74,16
						51 Iluminación Intersec. RN19 Int.RP10 - Río Primero Cba.	140.277	490.277	406.704	51,39	48,61	36,05	74,16
17						Construccion de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (2)	10.000	60.100	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						55 Construccion pasarela peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	10.000	60.100	0	96,40	3,60	0,00	0,00
21						Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	54.028	514.028	0	33,32	30,00	0,00	0,00
						51 Constr.Pasarela Peatonal RN8 Km 78 - Exalt. de la Cruz Bs. As.	30.000	140.000	0	31,42	50,00	0,00	0,00
						52 Const. Colect. RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						53 Ilumin. Rotonda RN 3 Km 192,34 - Int. RP 30- L.Flores Bs.As.	14.028	364.028	0	0,00	100,00	0,00	0,00
23						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Córdoba II	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Constr.Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
24						Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia. de Salta I	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Constr. Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
25						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Salta II	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Constr. Multitrocha RN34 Km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalit	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
26						Seguridad en C. Viales en Pcia. de Tucumán I	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 S.Cayetano-Tucumán	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
27						Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
28						Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Constr. Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
29						Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	5.602.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Constr. Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	5.602.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00
30						Obras Menores en Concesiones Viales	4.942.343	14.752.703	362.115	30,88	47,62	0,38	0,80
						51 Rotonda en Intersec.RN3 km448,7-RP75 González Chavez-Bs.As.	701.383	3.601.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Bs. As. (1)	701.383	4.001.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso RN7 Km 139 Carmen de Areco - Bs. As. (1)	350.691	3.469.613	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejora Intersec. RN 11-Calle Sgo.Cabral-San Lorenzo -S. Fe	701.383	3.501.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Adecuación Acceso RN34 km.252,60 - Sunchales- Santa Fe	172.941	172.941	361.737	93,01	6,99	6,98	99,86
						56 Mejora de Acceso RN12 km1056 Paso de la Patria Corrientes (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						57 Mejora en Intersección RN12 Km 1361 Candelaria Misiones (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						58 Readecuación de Acceso RN12 Km1398 San Ignacio Misiones (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						59 Readecuación de Acceso RN12 Km 1416 Santo Pipa Misiones (1)	280.553	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						60 Readecuación de Acceso RN12 Km 1445 Puerto Leoni Misiones (1)	280.553	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						61 Rotonda e Ilumin en RN3 Inters. con Av. Piazza Azul Bs. As. (1)	701.383	1.000	378	0,00	87,50	0,00	0,00
31						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones I	5.895.816	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
						51 Constr. de Terceras Trochas RN12 Km1370-1399 Arroyo San Juan	5.895.816	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
32						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones II	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al				
									31/03/2007	al 31/12/2006	DADC	31/03/2007	anual
						51 Const. 3°Troch.RN12 Km1399-1436 S.Ignacio-Jardín Amér. Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
33						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones III	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
						51 Const. 3°Troch.RN12 Km 1442-1470 Jardín Amér.-Pto Rico Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
34						Aumento de Capacidad en C. Viales en Pcia. de Misiones IV	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
						51 Const. 3°Troch.RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto Rico-Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,21	20,76
35						C.3°Tr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones	6.807.613	7.607.613	7.545.772	5,19	34,73	7,21	20,76
						51 C.3°Tr.RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia de Misiones	6.807.613	7.607.613	7.545.772	5,19	34,73	7,21	20,76
36						Construccion Distribuidor de Bernal,Calle Espora, Quilmes	0	858.621	0	99,87	0,13	0,00	0,00
						51 Construccion Distribuidor de Bernal,Calle Espora Quilmes	0	858.621	0	99,87	0,13	0,00	0,00
37						Seguridad en C.Viales en Pcia. de La Pampa I	701.383	2.601.383	384.133	49,61	50,39	25,75	51,10
						51 Readecuación Acceso Planta Urbana RN 5 Km 605-606-Sta Rosa LP	701.383	2.601.383	384.133	49,61	50,39	25,75	51,10
38						Aumento de Capacidad en C.Viales en Pcia de Mendoza I	30.558.390	43.220.845	11.079.545	61,20	38,80	16,97	43,74
						51 Doble Vía Sta.Rosa-Gral. San Martín RN7 km 965,51-998,80 Mza.	30.558.390	43.220.845	11.079.545	61,20	38,80	16,97	43,74
39						Autopista Luján - Mercedes EtapaI, Seccion II, Jaúregui Pje	2.920.751	2.920.751	31.530	96,77	3,23	0,20	6,19
						51 Autopista Luján-Mercedes EtapaI, Seccion II RN5 Km 72,42	2.920.751	2.920.751	31.530	96,77	3,23	0,20	6,19
40						Aumento de Capacidad en C.Viales -Pcia. Stgo. del Estero I	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
						51 Ensanche Pte. s/Río Dulce RN9 Km1205-Termas Río Hondo SE.	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
48						Construcción Pasarelas Peatonales en Pcia de Santa Fe	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN9 Km376 Cañada de Gomez (2)	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00
63						Ilumin.Inters. RN9 Km 227,03 con RN 188 - San Nicolás (2)	50.000	165.000	87.085	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Ilumin.Inters. RN9 Km 227,03 con RN 188 - San Nicolás (2)	50.000	165.000	87.085	100,00	0,00	0,00	100,00
64						Iluminación RN 11 en Chaco	50.000	380.000	0	75,94	24,06	22,84	94,93
						51 Iluminación RN 11 Km1000-1002 Resistencia Chaco	50.000	380.000	0	75,94	24,06	22,84	94,93
65						Constr.de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As	2.496.922	1.000.000	0	0,00	30,71	0,00	0,00
						51 RN9 Km54 L.verde Escobar,RN9-RP6-Campana,RN8-RP51 Arrecifes	2.496.922	0	0	0,00	30,71	0,00	0,00
						52 RN205 y RP51 Saladillo,RN205 y 226 Bolivar,RN3 y RP86 B.Juar (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 RN22 Km714 Medanos,RN222 Km769 Algarrobo-Pta.Alta (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 RN188,Km398 Banderale,RN33 entre RP65 Guamini,RN33 y Lim.Pro (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Edif.Cpo.de Apoyo a los Serv. Viales-Km31 Autop.BsAs-La Plata (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67						Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III	701.383	721.383	532.235	79,16	20,84	10,01	48,03
						51 Pavimentación Colectora,Constr.e Ilum.Pasarelas RN9 Tucumán	701.383	721.383	532.235	79,16	20,84	10,01	48,03
68						Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe	140.277	740.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Ilum.Distrib.Funes-Autop.Ros.-Armstrong Inters.RP34-Funes SF	140.277	740.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
69						Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	1.403.467	9.503.467	0	0,00	76,66	14,26	18,60
						51 Inter.Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	701.383	4.701.383	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Inters.Canalizada p/ giro Camiones RN 33Km 711-Chabas Sta.Fe	701.383	3.701.383	0	0,00	100,00	37,75	37,75
						53 Mejora Travesía Urbana RN 8 Venado Tuerto Sta. Fe (1)	701	1.100.701	0	0,00	30,00	0,00	0,00
70						Construc. Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construc. Pasarela Peat. RN11Km.1005,70 Bo.Toba Resist.Chaco	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
71						Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	370.277	741.277	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Rama de Salida Km.21 Autopista Richieri Buenos Aires	140.277	740.277	0	1,00	100,00	0,00	0,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas (1)	230.000	1.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
72						Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	1.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
						51 Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	1.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
73						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs As II (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en S. Miguel del Monte y P. Alta RN3 (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
74						Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As. (1)	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al		DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007	al 31/12/2006	2007		
						51 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As. (1)	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00
				75		Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba (1)	2.103	7.002.103	0	0,00	48,19	0,00	0,00
						51 Puente Sobre el A° El Ajó RN 7 Km 600 - Córdoba (1)	701	7.000.701	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9- Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149-203 Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales (1)	80.000	4.090.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta (1)	80.000	4.090.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				77		Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Stgo. del Estero (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acc. Puente sobre el Río Dulce RN 34 Stgo. del Estero (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos (1)	112.000	112.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
						51 Acc. a Gualaguaychú RN14 Entre Ríos (1)	112.000	112.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
				80		Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As. (1)	701	5.600.701	0	0,00	88,88	0,00	0,00
						51 Mejora Inter. RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As. (1)	701	5.600.701	0	0,00	88,88	0,00	0,00
				81		Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III (1)	141.917	5.612.917	502.083	0,00	17,06	0,00	0,00
						51 Mejora Inter. y Colect.RN3 Km 186.72-187.29 Las Flores Bs.As. (1)	701	701	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						52 Mejora Inter. y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As. (1)	701	5.600.701	502.083	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Constr. Tercer Puente La Niña RN 252 Bs. As. (1)	130.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Rotonda en Intersección RN 3- RN 252 El Triángulo Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg RN 3 Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Acceso Canalizado Dorrego (1)	701	701	0	0,00	85,72	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av Caseros y San Martín -Tres Arroyos (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Ilum. Rotondas RN 205-RP 65 y RP 30 y RN 226 Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Obras de Alcantarillado en Bolívar- Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Prov y Colocación de Barandas B.Beam RN5 Km305-307 C. Casares (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av Elguera R- Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Pavimentación de Acc. a Av. Damasco Valdés-Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Enlace RN 9 y Acc. a Villa Constitución- Córdoba (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias- Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Iluminación Acceso a Zárate RN 3- Bs. As. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				82		Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II (1)	4.907	3.970.206	0	0,00	33,36	0,00	0,00
						51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo-Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación de Empalme de Acceso a RP 26- Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco RN 9 - Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes-Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo-Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Sta Isabel-Sta. Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Travesía Urbana en Murphy RN 33-Sta. Fe (1)	701	1.795.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Travesías Urbanas en RN 11 (1)	0	2.171.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				83		Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				84		Travesía Urbana en Capióvi RN 12- Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Travesía Urbana en Capióvi RN 12- Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				85		Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-Pcia.Entre Ríos (1)	200.000	16.974.826	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualaguaychú-Pcia.Entre Ríos (1)	200.000	16.974.826	0	0,00	1,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

AI 31/03/2007

						FINANCIERO			FISICO			
						Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	al 31/03/2007	31/03/2007	al 31/12/2006	DADC 2007	31/03/2007	anual
					86	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Bs. As. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00
					51	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Bs. As. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00
					88	Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo-Pcia. de Santa Fe (1)	0	4.800.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo-Pcia. de Santa Fe (1)	0	4.800.000	0	0,00	100,00	0,00
		18				Infraestructura en Áreas Urbanas						
				1		Infraestructura en Áreas Urbanas	455.197	1.000	0	0,00	1,00	0,00
					53	Rotonda en Inters. RN15 y Av.Mons.Rosch-Concordia-E.Ríos	350.691	1.000	0	0,00	90,00	0,00
					54	Iluminacion en Inters. RN14 y RN 15-Concordia Entre Ríos	104.506	0	0	0,00	90,00	0,00
				2		Seguridad en Áreas Concesionadas II	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00
					51	Repavimentación RP 42 Sección RP 51 Acceso a Rawson Bs.As.	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00
				3		Vincul. y remod. RP11 entre diag 74 calle 60 L. Plata- Bs.As	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00
					51	Vincul. y remod. RP11 entre diag 74 calle 60 L. Plata- Bs.As.	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00
				4		Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	645.000	0	68,71	31,29	0,00
					51	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	645.000	0	87,39	12,61	0,00
				5		Vinculación y Remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As	36.220.978	44.551.549	19.034.193	40,18	59,82	18,42
					51	Vinculación y Remod. RP 36 - Rot. Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As	36.220.978	44.551.549	19.034.193	40,18	59,82	18,42
				6		Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acc Esc. 67 L. Plata Bs As	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00
					51	Remod. y Pavim. Av.66 y Calle 11 Acc Esc. 67 L. Plata Bs As	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00
				7		Repav. y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs As	701.383	3.701.383	798.018	29,77	70,23	20,30
					51	Repav. y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs As	701.383	3.701.383	798.018	29,77	70,23	20,30
				9		Mejoras en Pcia. de Entre Ríos I	7.328.747	14.328.747	0	0,00	80,00	0,00
					51	Mejoras en Accesos Sur - RN 14 Km.252,60 Concordia - E. Ríos	7.328.747	14.328.747	0	0,00	80,00	0,00
				11		Obras Menores en Áreas Urbanas	701.383	3.151.383	0	0,00	100,00	2,37
					51	Pavimentación Tramos Urbanos RN 9 Km 100,49 Lima Bs.As.	701.383	3.151.383	0	0,00	100,00	2,37
				12		Seguridad en Áreas no Concesionadas	210.415	5.010.415	0	0,00	100,00	0,00
					51	Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	210.415	5.010.415	0	0,00	100,00	0,00
				13		Repavimentación e Iluminación Camino al Ctro. Atómico Ezeiza	701.383	4.301.383	0	0,00	100,00	0,00
					51	Repavimentación e Iluminación Camino al Ctro. Atómico Ezeiza	701.383	4.301.383	0	0,00	100,00	0,00
				14		RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires (1)	0	0	0	0,00	46,67	0,00
					51	RP25-Tramo:Pilar-Acc.Oeste-Pcia de Buenos Aires (1)	0	0	0	0,00	46,67	0,00
				15		Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	5.512.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	5.512.000	0	0,00	100,00	0,00
				16		Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Ríos (1)	0	0	0	0,00	87,50	0,00
					51	Vinc.Acc.Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Ríos (1)	0	0	0	0,00	87,50	0,00
		19				Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales						
				1		Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa	5.000.000	11.189.000	10.385.365	25,40	74,60	24,97
					51	Obra Mejorativa N212 CV2-RN5 Km98-107 Km143-150 Km208-221	1.000.000	5.233.000	3.653.813	48,11	51,90	27,34
					52	Obra Mejorativa N221 CV2-RN7 Km259-276	1.000.000	1.040.000	1.039.944	14,32	85,68	47,89
					53	Obra Mejorativa N208 CV2-RN7 Km457-492	1.000.000	3.816.000	3.507.577	91,20	8,80	4,37
					55	Obra Mejorativa N211 RN7 Km399-406 Km424-457	2.000.000	1.100.000	2.184.030	16,18	83,82	21,78
				2		Corredor Vial 3	5.000.000	512.000	511.431	0,91	68,83	6,68
					51	Obra Mejorativa N214 CV3-RN9 Km157-206	2.000.000	512.000	511.431	1,82	58,75	5,19
					52	Obra Mejorativa N201 CV3-RN9 Km96-106	3.000.000	0	0	0,00	100,00	11,30
				3		Obras Mejorativas en CV4-AnoII-I Etapa	7.000.000	7.527.000	7.526.793	6,64	80,86	39,25
					51	Obra Mejorativa N205 CV4 RN8 Km661-695	3.500.000	4.810.000	4.809.885	19,93	80,07	36,33
					52	Obra Mejorativa N206 CV4 RN33 Km586-616,Km673-675	3.500.000	2.717.000	2.716.907	0,00	100,00	42,73
				5		Obras Mejorativas en CV5-AnoII-I Etapa	29.138.939	27.612.937	5.267.418	15,54	66,65	10,67

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al		DADC	31/03/2007	anual
									31/03/2007				
						0 Obras Mejorativas en CV5-Anoll-I Etapa (1)	3.000.000	3.000.000	306.549				
						51 Obra Mejorativa N217 CV5 RN9 Km 1215-1225 Km 1315-1325	9.273.024	4.313.503	3.083.622	75,92	24,08	19,57	81,27
						52 Obra Mejorativa N203 CV5 RN34 Km 584-612 Km 646-651 Km 684-696	5.000.000	1.532.000	1.531.287	8,87	91,13	22,95	25,18
						53 Obra Mejorativa N227 CV5 RN34 Km 1164-1177	4.359.002	8.506.913	345.960	8,56	91,44	39,36	43,04
						54 Obra Mejorativa N218 CV5 RN34 Km 66,00-86,00	7.506.913	10.260.521	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				6		Obras de Mejoras en C. Val 1 Año II - II Etapa (1)	99.000	99.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 236 C.V 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6.80 (1)	98.000	98.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 241 C.V 1 RN 3 Acc. Barrow - Acc.Tres Arroyos Bs.As. (1)	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Obras de Mejoras en C. Val 2 Año II - II Etapa (1)	546.000	546.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 209 C.V 2 RN 7 Emp. RP 10 Acc. a Washington (1)	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 222 C.V 2 RN 7 Limite San Luis/Mza -Acc. La Dormida (1)	160.000	160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 224 C.V 2 RN 7 Emp. RP 6-RP 41 Km 63-103 (1)	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 234 C.V 2 RN 5 Acc. Carlos Casares - Acc.San Bernardo (1)	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Obra 240 C.V 2 RN 5 Limite Bs As / La Pampa- Acc. Uriburu (1)	145.000	145.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Obra de Mejora en C. Vial 3 Año II - II Etapa (1)	729.000	729.000	0	0,00	1,91	0,00	0,00
						51 Obra 202 C.V 3 RN 9 Río Areco - Acc. a San Pedro (1)	133.000	133.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Obra 215 C.V 3 RN 9 Río Areco - Río Tala (1)	120.000	120.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						53 Obra 216 C.V 3 RN 9 Río Tala - RP 51 (1)	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe (1)	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						55 Obra 223b C.V 3 RN 11 Santo Tobrae - Santa Fe (1)	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						56 Obra 232 C.V 3 RN 188 Emp. RP 1 Emp RP 35 - La Pampa (1)	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				9		Obra de Mejora en C. Vial 4 Año II - II Etapa (1)	327.000	327.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 235 C.V 4 RN 8 Arrecifes - Pergamino Km 173-197 Bs. As. (1)	197.000	197.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 239 C.V 4 RN 36 Almafuerte Acc. Los Molinos - Córdoba (1)	130.000	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Obra de Mejora en C. Vial 5 Año II - II Etapa (1)	369.000	369.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 210 C.V 5 RN 9 Río Juramento Emp. RN 34- Salta (1)	97.000	97.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 219 C.V 5 RN 34 Acc. Cañada Rosquín Emp RN 62 Sta.Fe (1)	125.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 220 C.V 5 RN 34 Lím. Santa Fe / Stgo. del Estero Km 39 (1)	147.000	147.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Obra de Mejora en C. Vial 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C.V 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Obra de Mejora en C. Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C. Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Obra de Mejora en C. Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C. Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Obra de Mejora en C. Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C. Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Obra de Mejora en C. Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C. Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Obra de Mejora en C. Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en C. Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS							
				16		Control del Sistema Nacional de Aeropuertos							
				10		Reacond. de Plataformas, Pistas y Calles Aerop. Villa Gesel (1)	2.950.000	2.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Nivelación y Puesta en Norma Franja de Seg. Aerop. V.G. (1)	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Cerco Operativo del Aeropuerto de Villa Gesell (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Reacond de Plataformas, Pistas y Calles Rodaje Aerop. Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Rep Est Sup de Pist y Call. Rod. y Baliz Aerop Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.	
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/03/2007	Devengado al					
								al 31/03/2007	31/03/2007	al 31/12/2006	DADC 2007	31/03/2007	anual	
70					12	Reacond. de Plat., Pistas y Calles de Rodaje Aerop. de Junín (1)	1.840.313	1.840.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Cerco Operativo del Aeropuerto de Junín (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						13	Reacondic. Pavimento y Balizam. Aerop. Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reacondic. Pavimento y Balizam. Aerop. Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
75	336	43			2	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología								
						SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
						Formul.e Implementación de la Polít.de Ciencia y Tecnología								
						51 Implementación de Sistemas de Seguridad (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						52 Tendido de Red (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
80	350	1			3	Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
						MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
						Actividades Centrales								
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						5 Reparación Edificio Callao Nº 114 (1)	1.260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						52 Reparación Primer Subsuelo Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
903	53				6	Regularización del Trabajo								
						6 Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.334.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.334.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						Ministerio de Salud								
						MINISTERIO DE SALUD								
						Actividades Centrales								
						1 Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.750.000	1.750.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00	
						52 Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central	1.750.000	1.750.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00	
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
						Atención a Enfermos								
						6 Remodelación y Equipamiento de Pabellones	750.000	170.000	0	32,05	67,95	0,00	0,00	
						55 Refacción Integral de Pabellones N 3,5 y 8	750.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						7 Reparación y Mantenimiento en Hospital	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						52 Reparación de Usina	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						10 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
51 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00							
906	56				11	Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilizacion	0	130.000	0	87,00	13,00	0,00	0,00	
						51 Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilizacion	0	130.000	0	87,00	13,00	0,00	0,00	
						13 Construcción de Quirofano	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Construcción de Quirofano	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
						3 Puesta en Valor y Adecuación de Dist. Areas del Ed. Cent. de ANLIS (1)	1.605.413	1.605.413	279.621	0,00	100,00	70,00	70,00	
						51 Reconst de Vered y Arm de la Red Pluv del Pabe Ppal de ANLIS (1)	164.658	164.658	279.621	0,00	100,00	70,00	70,00	
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque (1)	393.349	393.349	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						53 Puesta en Valor y Consolid. de las Fachadas, Vestíbulo de Acceso (1)	914.765	914.765	0	0,00	100,00	0,00	0,00	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito	% Acumulado	Programado	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
								al 31/03/2007	Devengado al			al 31/12/2006	
									31/03/2007		DADC	31/03/2007	anual
						54 Adecuación de los Serv. de Higiene, Seguridad y Arquitectura (1)	50.312	50.312	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Remodelación y Refuncionalización de la Amp. de las Of. del Dpto. de RRHH (1)	82.329	82.329	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	909					COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
		59				Atención de Pacientes							
				2		Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	910					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR							
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos							
				1		Construcción Natatorio	250.000	250.000	0	44,76	55,24	0,00	0,00
						51 Construcción Natatorio	250.000	250.000	0	44,76	55,24	0,00	0,00
				7		Remodelación del Inst. Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	206.800	206.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Archivo General 2° Etapa (1)	64.800	64.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Departamento Residentes (1)	44.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Farmacia (1)	48.000	48.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio (1)	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Proyecto y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

s/i Sin información

(#) Proyectos y obras del ENOHSA que no pudieron cumplimentar la primera programación física debido a que el crédito vigente no es suficiente para el inicio de los mismos. (incluye los proyectos del 31 al 92)

(1) Proyectos y obras nuevos iniciados en el ejercicio 2007.

(2) Obra terminada físicamente, los devengados corresponden a certificaciones atrasadas.

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédto Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
MANTENIMIENTO																					
Mantenimiento por Administración																					
16	1	1	97	51	PAIS	Vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		1/1/07	31/12/07	5.765	5.765.000	17.765.000	13.094.456	16,7%	16,7%	6	B	
16	1	2	97	51	PAIS	Vs	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		1/1/07	31/12/07	3.088	3.088.000	3.751.198	3.751.196	16,6%	16,6%	6	B	
Total Mantenimiento por Administración														8.853	8.853.000	21.516.198	16.845.652				
Mantenimiento por Contrato																					
16	2	7	50	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/ André-Emp 20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/8/95	31/12/06	15.251	68.000	429.311	429.304	0,9%	77,1%	7		
16	2	10	22	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29/4/97	31/7/04	3.616	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
Total Mantenimiento por Contrato														18.867	168.000	529.311	429.304				
Mantenimiento por Convenio																					
16	3	24	42	51	LA PAMPA	143,151,152	TFO La Pampa Convenio N 10		11	633,3	1/1/06	31/12/07	8.571	3.007.000	1.530.451	1.530.450	21,6%	39,0%	6		
16	3	25	58	51	NEUQUEN	22,40(S),234	TFO Neuquén Convenio N 10		11	528,4	1/1/06	31/12/07	7.489	2.163.000	713.155	713.154	7,4%	37,4%	6		
16	3	26	62	51	RIO NEGRO		TFO Río Negro Convenio N 10		11	1.136,5	1/1/06	31/12/07	8.482	2.808.000	1.095.388	1.095.387	12,4%	59,7%	6		
16	3	27	78	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 10		11	2.207,3	1/1/07	31/12/07	24.839	18.950.000	2.950.000	1.858.393	16,7%	16,7%	6	A	
16	3	28	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3com a,b,m,i 52, 40(N), Ex RP16	TFO Tierra del Fuego Convenio N° 9		11	520,5	1/1/06	31/12/07	10.191	2.186.000	2.012.910	2.012.909	19,1%	64,7%	6		
16	3	30	38	51	JUJUY		TFO Jujuy Convenio N10	Varias	11	392,8	1/1/06	31/12/07	3.495	455.000	762.533	762.531	9,6%	53,1%	6		
16	3	31	66	51	SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 10	Tramos Varios	11	482,4	1/1/06	31/12/06	2.614	11.000	11.000	0	8,3%	100,0%	7		
16	3	32	34	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 8		11	236,0	1/1/06	31/12/07	3.626	1.925.000	726.297	726.296	15,5%	77,9%	6	A	
16	3	33	34	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (I.F.O.)	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	1/9/06	30/8/08	2.048	398.000	1	0	12,5%	24,9%	6		
16	3	34	50	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	1/4/04	31/12/06	4.895	2.669.000	496.140	496.138	4,0%	100,0%	7		
16	3	36	26	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	1/1/04	30/12/07	5.873	2.994.000	1	0	5,1%	46,1%	6		
16	3	37	46	51	LA RIOJA	40-76-78-150	TFO La Rioja - Convenio 7	Tramos Varios	11	434,5	1/12/06	30/11/07	4.286	2.000.000	536.326	536.325	25,0%	25,0%	6		
16	3	38	22	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 2		11	163,4	1/1/06	31/12/07	1.864	1.000.000	315.753	315.751	14,2%	51,7%	6		
16	3	39	90	51	TUCUMAN	9,38	TFO Tucumán Convenio N° 6		11	37,4	1/1/06	31/12/07	2.558	1.000.000	1	0	9,7%	45,2%	6	A	
16	3	40	10	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8:Belen- Lte.c/ Tucuman	Km. 798,82- km 986,82	11	188,0	1/11/07	31/8/08	2.632	20.000	20.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	3	41	54	51	MISIONES	14	TFO - Convenio2: Emp. RP N°20 - Emp. RP N°17	Km1056,32 - Km1116,96	11	60,6	1/11/07	30/8/08	850	6.000	6.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	3		78	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288- 193	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)		11	1.714,9	1/1/06	31/12/06	23.944				0,8%	100,0%	7		
Total Mantenimiento por Convenio														118.257	41.592.000	11.175.956	10.047.334				
Señalamiento																					
16	4	1	97	51	PAIS	Vs	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12	---	1/1/07	31/12/07	5.714	5.714.000	10.866.355	10.498.994	16,7%	16,7%	6	B	
Total Señalamiento														5.714	5.714.000	10.866.355	10.498.994	16,7%	16,7%		
Obras de Emergencia																					
16	5	1	97	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	---	1/1/07	31/12/07	3.571	3.571.000	19.429.365	17.400.307	16,7%	16,7%	6	B	
16	5	2	97	51	PAIS	Vs	Obras en Puentes	Nacional	14	---	1/1/07	31/12/07	3.571	3.571.000	1.531.891	1.531.890	16,7%	16,7%	6	B	
16	5	3	97	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14	---	1/1/07	31/12/07	143	143.000	1	0	16,8%	16,8%	6	B	
16	5	4	97	51	PAIS	Vs	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14	---	1/1/07	31/12/07	4.286	4.286.000	1.617.970	1.492.787	16,7%	16,7%	6	B	
Total Obras de Emergencia														11.571	11.571.000	22.579.227	20.424.984				
Mantenimiento por Sistema Modular																					
16	6	1	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/7/04	18/7/08	5.458	29.000	29.000	0	0,9%	51,8%	6		
16	6	3	22	51	CHACO	16	Emp. R.N.N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	3/12/04	30/3/08	7.989	510.000	767.007	633.145	4,0%	79,5%	6		
16	6	4	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. R.N.N° 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	3/5/04	31/10/07	10.314	1.387.000	297.857	297.856	2,8%	77,4%	6		
16	6	5	26	51	CHUBUT	40S	Emp.R.N.N° 25 - Emp. R.P. N° 56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	7/9/04	6/2/07	7.195	205.000	630.000	629.269	4,4%	85,3%	7		
16	6	6	26	51	CHUBUT	40-260	Emp.R.P.N°22-Lte.c/ Chubut/Sta Cruz / Emp.R.N. N°40-Lte c/ Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	1/3/07	31/10/07	6.000	63.000	63.000	0	0,0%	0,0%	3		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
16	6	8	50	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	G.Andre - Emp. R.N. N°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martín - Mdza	(35 - 112,5- 3,27- 80,83) / (997,4 - 1041,8)	11	194,7	1/6/07	31/5/07	7.260	386.000		1	0	0,0%	0,0%	15	
16	6	9	50	51	MENDOZA	405	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/3/05	31/5/07	7.492	1.109.000		563.644	547.486	1,9%	81,6%	6	
16	6	10	82	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel R.N. N° 11 - A Nivel R.N. N° 11- Calle I/ Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/7/05	31/5/07	6.922	831.000		28.216	28.215	11,3%	58,7%	6	
16	6	11	66	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/7/04	12/7/08	9.048	54.000		1.009.176	815.091	5,6%	66,0%	6	
16	6	12	66	51	SALTA	34 - 81	Emp. R.N. N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. R.N. N° 34	(1329,12 - 1488,40) / (1763,6 - 1863,30)	11	259,0	15/4/04	14/4/07	6.592	990.000		580.361	580.359	3,7%	89,7%	6	
16	6	19	6	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P. N°4 - Emp. R.P. N°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	1/11/07	31/5/07	7.037	27.000		27.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	6	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	1/11/07	31/10/07	6.000	46.000		46.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	21	54	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. R.N. N°105	Km1336 - Km1349	11	13,2	1/11/07	31/10/08	1.500	2.000		2.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	22	66	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.N. N° 51	Km 4433,87 - Km 4594,22	11	160,4	1/10/07	30/9/09	5.950	23.000		23.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	23	66	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Lte con Chile / S.A. De los Cobres - Lte con Jujuy	(26,39 - 296,44) / (4607,03 - 4666,62)	11	329,6	1/10/07	30/9/09	7.736	30.000		30.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	24	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	11	214,9	1/9/07	31/8/09	7.738	30.000		30.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	25	26	51	BUENOS AIRES	40	Emp R.N. N°25 - Emp R.P. N ° 56	km.1556,60- km 1815,71	11	259,1	1/3/07	27/2/09	9.300	35.000		35.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	26	26	51	CHUBUT	26	Emp (Ex) R.N. N° 26 Emp R.N. N° 40	102,47 - 210,17 / 1815,71 - 1865,6	11	157,6	1/10/07	30/9/09	5.700	22.000		22.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	27	6	51	BUENOS AIRES	---	Mant., Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad. Aut. de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11	---	1/5/07	30/4/09	31.000	24.000		24.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	28	66	51	SALTA	34-50	Lte. Con Jujuy - Lte. Inter. Con Bolivia/Emp R.N.N ° 34- Lte.con Bolivia	km 1287 - km 1484 / 0,00 - km 71,1	11	17,0	1/7/07	30/6/09	17.300	1.500.000		0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mantenimiento por Sistema Modular													173.531	7.303.000		4.207.262	3.531.421				
Obras de Seguridad Vial																					
16	7	2	42	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	17	200,0	1/11/07	1/5/08	11.000	407.500		407.500	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	3	82	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)	200 Km	17	200,0	1/11/07	1/5/08	11.000	557.500		557.500	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	18	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	17	30,0	1/11/07	31/8/08	8.292	72.000		414.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	1/8/07	30/11/07	2.300	144.000		144.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	6	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	1/11/07	1/4/08	2.000	84.000		84.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	30	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. c/R.P.N° 6, R.P.N° 2 y Acc. A Bovril	Inter. R.N. N°127 - R.P. N°2 - ACC. BOVRIL	17	5,5	1/3/07	28/2/06	11.857	134.000		1	0	0,0%	0,0%	4	
16	7	6	30	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	1/11/07	30/9/08	2.000	100.000		100.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	62	51	RIO NEGRO	3	Cruce con R.N.N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	1/8/07	31/12/07	4.400	95.000		95.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	62	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	1/10/07	1/3/08	300	5.000		5.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	8	58	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	1/8/07	31/12/07	600	13.000		13.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	22	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	1,0	1/8/07	30/1/08	1.200	1.251.000		1.251.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	22	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	1/8/07	30/1/08	600	151.000		151.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	22	53	CHACO	95	Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	1/8/07	30/1/08	500	125.000		125.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	82	54	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		17	1,0	1/8/07	30/1/08	2.000	56.000		56.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	82	55	SANTA FE	95	Intersección con R.N. N° 95 y R.P. N°2		17	1,0	1/10/07	31/3/08	1.800	28.000		28.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	34	58	FORMOSA	11	Intersección c/R.N.N° 81	(Prog. Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	1/10/07	31/5/08	3.000	63.000		63.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.R.P.N° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/R.N. N° 116		17	1,0	1/8/07	30/1/08	450	112.000		112.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	74	52	SAN LUIS	20 - 79	Int. R.N.N° 20 y R.N.N ° 79		17	1,0	1/9/07	1/3/08	2.937	31.000		31.000	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	14	53	CORDOBA	9	Jesús MARIA - San José de la Dormida	Emp. R.N.N° 60 (Alto Nivel Emp. R.N.N 9)	17	1,0	7/11/06	6/11/07	7.724	134.000		134.000	124.092	7,2%	8,7%	6	A
Total Obras de Seguridad Vial													73.960	3.563.000		3.771.001	124.092				
Total Mantenimiento													410.753	78.764.000		74.645.310	61.901.781				
CONSTRUCCIONES																					
Corredores Viales I																					
22	1	3	58	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/2/01	30/8/05	12.589	100.000		1	0	0,0%	100,0%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	1	4	38	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	3/2/97	30/4/04	9.362	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	5	38	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	3/2/97	30/4/04	13.596	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	6	66	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/1/97	31/7/05	18.814	1.065.000	1	0	0,0%	94,3%	7		
22	1	7	50	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III°: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/2/01	31/1/05	28.314	576.000	1	0	0,0%	94,4%	7		
22	1	8	66	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/1/97	31/8/05	24.210	1.967.000	1	0	0,0%	91,9%	8		
Total Corredores Viales I														106.885	3.908.000	6	0				

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	2	10	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	13	38,0	17/4/06	15/4/08	89.010	10.031.000	11.441.181	11.441.179	11,3%	48,1%	6		
22	2	3	26	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	1/6/07	30/11/07	60.000	153.000	153.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	6	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	17/6/08	46.094	29.000.000	15.576.886	1.401.051	6,4%	6,4%	6		
22	2	13	50	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N. N° 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69	8	18,7	1/6/07	30/11/07	6.938	116.000		1	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	14	50	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	4/1/05	30/11/06	14.501	304.000	7.833.127	29.126	0,0%	99,1%	7		
22	2	18	94	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	1/11/07	31/10/08	13.000	99.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	66	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	1/11/07	30/11/10	60.000	115.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	23	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	30/5/08	45.290	25.466.000	13.456.246	1.446.489	2,6%	5,8%	6		
22	2	32	38	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. R.N.N° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	1/11/07	30/11/09	26.400	67.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	14	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	1/3/07	30/5/08	94.071	367.000	9.407.163	9.407.161	0,0%	0,0%	4		
22	2	35	14	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	1/11/07	30/5/08	28.000	107.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	41	66	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	1/11/07	30/11/09	18.000	69.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	50	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Lte. con Chile		5	70,0	1/11/07	30/11/09	46.000	176.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	4/1/05	28/2/07	12.835	28.000	7.528.000		0	5,4%	100,0%	8	
22	2	48	70	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	1/11/07	30/4/09	68.244	348.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	66	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	1/11/07	30/4/10	40.000	153.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16/12/02	12/5/05	32.003	746.000	746.000		0	0,0%	97,7%	7	
22	2	51	78	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/5/03	30/12/05	33.502	218.000	218.000		0	0,0%	100,0%	7	
22	2	52	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 y Vte. Chihuido	8	63,0	1/11/07	30/11/09	57.152	157.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	30	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. R.P. N°16 - Intersecc. Emp. R.P. N°20	8	18,2	16/11/05	31/5/08	66.469	26.318.000	32.243.924	3.291.384	7,5%	34,8%	6		
22	2	53	30	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P. N°20 - Emp. R.P. "J" (Colonia Elía)	8	27,7	30/6/06	30/8/07	101.021	20.000.000	20.000.000	3.804.658	1,4%	4,6%	6		
22	2	53	30	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elía) - A°Colman	8	34,8	1/6/07	31/5/10	171.447	32.222.000	32.222.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	30	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. R.P. N°29	8	33,3	1/6/07	31/5/10	228.409	32.222.000	32.222.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	30	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P. N°29 - Ubajay	8	35,6	1/6/07	31/5/10	254.938	32.222.000	32.222.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	30	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N. N°18	8	35,0	1/6/07	30/5/10	190.399	32.224.000	32.224.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	30	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N. N°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	1/6/07	30/5/10	225.310	10.208.000	10.208.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	30	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	1/6/07	30/5/10	186.989	32.222.000	32.222.000		0	0,0%	0,0%	15	
22	2	53	30	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	35,9	1/6/07	30/5/10	206.079	32.222.000	32.222.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	1/6/07	30/5/10	165.270	36.250.000	36.250.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp. R.N. N°127	8	29,3	1/6/07	30/5/10	139.932	36.250.000	36.250.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N. N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	1/6/07	30/5/10	16.127	36.250.000	36.250.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. R.P. N°126	8	30,4	1/6/07	31/5/10	165.845	36.250.000	36.250.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P. N°126 - Emp. R.N. N°117	8	27,6	1/6/07	31/5/10	128.200	36.250.000	36.250.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N. N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	1/6/07	31/5/10	63.599	6.000.000	6.000.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	53	18	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	1/6/07	30/5/08	10.000	2.082.000	2.082.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	2	54	38	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	1/11/07	31/10/08	10.000	74.000	74.000		0	0,0%	0,0%	0	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración														3.121.074	506.986.000	511.551.537	30.821.048				

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	97	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	---	1/1/07	31/12/07	4.286	4.286.000	614.769	589.631	16,7%	16,7%	6	B	
22	3	2	46	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	8	39,0	4/6/99	31/3/07	67.373	7.845.000	1.023.813	661.416	7,2%	43,3%	6		
22	3	3	46	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/5/99	30/7/07	94.681	12.787.000	6.428.505	6.428.504	2,8%	22,1%	6	C	
22	3	4	46	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	17/5/99	28/2/08	75.051	18.001.000	12.100.599	12.100.598	17,5%	46,9%	6		
22	3	5	46	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	5/7/99	30/4/07	38.151	3.733.000		1	0	13,1%	60,3%	6	
22	3	6	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/5/99	28/2/07	39.366	7.686.000		1	0	0,0%	20,3%	14	
22	3	7	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/9/99	30/11/07	77.606	15.206.000		1	0	0,0%	0,4%	14	
22	3	8	46	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	1/7/99	31/5/07	45.524	3.748.000	7.656.512	7.656.510	12,0%	94,7%	6		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	3	9	46	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	3/5/99	31/12/06	27.530	794.000	1.759.461	1.759.460	2,2%	100,0%	8		
22	3	11	54	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay- I - Deseado	8	45,0	1/5/92	31/5/05	32.610	2.206.000	1	0	0,0%	88,2%	7		
22	3	12	46	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	15/6/99	31/3/07	4.739	1.203.000	1	0	0,0%	59,8%	14		
22	3	13	42	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/2/01	31/10/05	28.524	40.000	40.000	0	0,0%	99,2%	7		
22	3	14	54	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/9/93	18/3/07	47.155	52.000	4.063.661	0	0,6%	99,9%	6		
22	3	15	38	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/ Emp 9-Lte. c/ Chile	8	267,0	8/9/00	31/10/05	208.395	6.081.000	6.081.000	0	0,0%	97,1%	7		
22	3	18	46	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	7/7/99	31/12/06	4.309	268.000	1	0	0,0%	87,6%	7		
22	3	19	78	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovia	Aeropuerto - Av San Martín - 1° Etapa	8	6,4	26/9/05	25/9/07	98.654	15.270.000	11.893.784	11.893.783	16,0%	78,0%	6		
22	3	20	26	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	8/4/06	11.775	228.000	45.726	0	0,0%	98,2%	7		
22	3	21	50	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bdas Blancas - Acc. a C Grande	8	22,9	20/11/00	31/3/06	11.890	1.478.000	979.014	979.013	0,0%	99,5%	7		
22	3	25	82	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/ Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	1/9/05	31/8/08	84.500	521.000	6.767.808	5.767.807	11,9%	20,2%	6		
22	3	26	82	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. c/ Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25/8/06	24/11/07	48.544	809.000	12.791.402	12.791.401	21,1%	44,7%	6		
22	3	27	82	51	SANTA FE	A-008	Río Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 10,125 - km 29,395	5	19,3	1/11/07	31/10/09	37.564	96.000	96.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	28	54	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	24/9/01	31/3/07	61.369	2.546.000	14.546.000	169.504	24,1%	95,1%	6		
22	3	75	82	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	4/10/04	28/2/06	18.036	217.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
22	3	76	54	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/8/03	30/4/07	84.687	26.239.000	26.239.000	5.261.597	3,0%	98,3%	6		
22	3	86	62	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Valcheta - Musters	km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	1/12/04	1/4/07	25.477	3.145.000	9.253.023	3.488.171	5,8%	99,0%	6		
22	3	86	62	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Musters - Tte. Maza	km 105 - km 137 (Seccion II)	11	29,0	23/3/06	21/9/07	29.154	8.125.000	6.122.160	7.290.012	19,2%	53,7%	6		
22	3	86	62	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Teniente Maza - Ramos Mexía	km 137 - km 181 (Sección III)	11	44,0	21/3/06	19/3/08	32.931	3.934.000	3.934.000	3.766.572	10,8%	32,1%	6		
22	3	86	62	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Ramos Mexía - Talcahuala	km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/3/06	21/9/07	20.737	3.285.000	3.285.000	4.156.349	17,6%	53,5%	6		
22	3	86	62	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Talcahuala - Sierra Colorada	km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/3/06	21/9/07	21.728	3.468.000	3.468.000	5.384.709	17,2%	53,3%	6		
22	3	86	62	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Sierra Colorada - Los Menucos	km 225 - km 269	8	43,8	1/2/07	28/1/09	56.498	589.000	589.000	0	7,1%	7,1%	6		
22	3	86	62	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos - Maquinchao	km 269 - km 340	8	72,0	23/3/06	30/9/08	90.999	4.403.000	4.403.000	7.617.368	8,9%	24,5%	6		
22	3	86	62	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Maquinchao - Jacobacci	km 340 - km 410	8	70,0	1/11/07	31/10/09	60.000	229.000	229.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	86	62	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Jacobacci - Pilcaniyeu	km 410 - km 537	8	126,7	1/11/07	30/4/10	110.000	420.000	420.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	87	58	51	NEUQUEN	242	Aduana - Límite con Chile		8	7,0	1/11/07	30/12/08	5.500	42.000	42.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	3	88	78	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	6/1/07	4/1/09	107.720	331.000	11.000.001	8.429.604	10,1%	10,1%	6		
22	3	89	78	51	SANTA CRUZ	P15	R.P.N° 11 - Paso Zamora		8	58,0	1/11/07	31/10/09	116.000	295.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras por Convenio con Provincias													1.929.063	159.606.000	155.872.246	106.192.009					
Mejoramiento y Reposición de Rutas																					
22	4	1	97	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	--	1/1/07	31/12/07	1.129	1.129.000	6.317.115	5.987.802	16,7%	16,7%	6	B	
22	4	2	46	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	8	44,0	1/11/96	28/2/02	3.845	444.000	1	0	0,0%	100,0%	10		
22	4	2	46	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y Iib (km 485 - km 522)	8	51,1	8/1/07	31/12/08	42.668	0	0	0	3,2%	3,2%	6		
22	4	3	62	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	31/12/06	17.633	3.397.000	3.397.000	0	0,0%	82,0%	14		
22	4	5	70	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	1/11/07	30/11/09	40.000	313.000		1	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	11	58	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	8	6,7	22/10/96	3/12/04	3.045	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	22	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	1/2/99	31/1/05	16.289	368.000	6.368.000	0	0,0%	99,0%	7		
22	4	25	6	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/5/05	31/3/07	42.468	133.000	133.000	3.595.530	8,6%	91,6%	6		
22	4	25	6	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	km 29,2 - km 37,86	13	8,7	30/9/05	29/9/07	124.377	21.038.000	10.843.536	9.618.782	10,9%	78,3%	6		
22	4	25	6	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - Km 46,3	13	8,4	9/9/05	30/11/07	91.150	11.422.000	11.422.000	9.184.222	9,9%	74,2%	6		
22	4	29	26	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/4/05	30/8/09	27.830	4.275.000	946.062	946.061	10,8%	50,1%	6		
22	4	30	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	1/11/07	30/11/09	56.000	214.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	31	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1909	8	41,6	1/11/07	30/11/10	106.000	382.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	32	50	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/ Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	1/10/03	31/7/05	23.681	897.000	1	0	0,0%	96,2%	8		
22	4	34	78	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel		5	23,2	17/12/03	28/2/05	1.738	100.000	6.600.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	35	78	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/03	30/11/05	39.924	832.000	1	0	0,0%	95,2%	7		
22	4	36	78	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/9/03	24/11/06	34.798	725.000	1	0	0,0%	94,8%	7		
22	4	37	78	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2		30/11/05	53.585	1.116.000	1	0	0,0%	0,0%	12		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	4	39	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	1/6/07	30/11/09	152.700	77.000	77.000	0	0,0%	0,0%	3		
22	4	40	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N. N° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	31/3/07	86.183	3.820.000	28.820.000	1.050.238	4,9%	90,4%	6		
22	4	41	14	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	5,0	1/11/07	30/5/08	19.000	94.000	94.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	42	78	51	SANTA CRUZ	405	Límite c/ Chubut - Perito Moreno		8	67,5	1/3/07	28/2/10	111.058	681.000		1	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	43	46	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	1/11/03	31/5/07	37.112	2.343.000	3.333.158	3.333.156	12,1%	95,9%	6		
22	4	44	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	8/9/03	8/10/04	7.038	589.000		1	0	0,0%	91,6%	7	
22	4	45	50	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/5/04	30/12/05	13.072	856.000		1	0	0,0%	93,5%	7	
22	4	46	14	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	1/2/01	2/5/07	261.857	22.980.000	23.107.671	2.898.567	2,2%	85,0%	6		
22	4	47	6	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/5/03	31/3/07	494.836	6.734.000	64.699.941	5.699.265	1,2%	94,7%	6		
22	4	48	30	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. R.N.N° 127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	9/9/03	8/9/04	7.693	100.000	100.000	0	0,0%	99,3%	7		
22	4	49	82	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Tunel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/3/04	17/8/06	10.479	276.000	65.983	65.982	0,0%	95,3%	7		
22	4	50	58	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. R.N. N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	8/10/04	8/4/07	37.756	8.073.000		1	0	0,6%	15,6%	6	
22	4	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	1/9/06	31/10/07	146.111	244.000	7.560.453	7.560.452	2,7%	8,0%	6	A	
22	4	52	70	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/1/04	20/7/06	13.954	48.000	48.000	0	0,0%	98,3%	7		
22	4	53	42	51	LA PAMPA	143	Emp. R.P. N°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	8/10/04	31/7/05	1.291	1.039.000		1	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	54	34	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta calle Mendoza	5	6,0	2/9/05	3/3/07	25.022	3.144.000	7.729.215	7.653.763	15,9%	92,6%	6		
22	4	55	78	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	3/6/03	30/4/04	4.717	100.000	100.000	0	0,0%	95,4%	8		
22	4	56	14	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	15/12/04	15.758	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	57	18	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	1/11/07	30/4/09	2.782	11.000	11.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	58	18	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km646/km648	8	1,0	1/6/07	31/8/08	9.575	83.000	83.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	59	30	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/2/04	20/6/07	29.328	3.511.000	891.862	891.860	2,9%	43,8%	6		
22	4	60	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	30/9/07	57.563	637.000	8.637.000	0	3,2%	97,4%	6		
22	4	61	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acc.a Banfield - Acc.a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	30/4/07	50.480	1.380.000	8.380.000	1.324.153	6,5%	89,0%	6	A	
22	4	62	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde R.P. N° 29	Acc Sdor Rey,desvio trán.pes.y calles int.	5	1,9	20/7/04	31/10/05	3.497	272.000	2.272.000	0	0,0%	92,2%	7		
22	4	63	54	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	1/1/03	30/11/03	6.541	847.000		1	0	0,0%	87,1%	7	
22	4	64	34	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	km 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14/10/04	31/1/07	24.550	931.000	18.196.976	45.206.265	6,4%	96,9%	7		
22	4	64	34	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del Mortero	8	25,0	14/10/04	30/4/06	34.499	314.000	314.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	34	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	14/4/07	37.914	2.549.000	2.549.000	0	7,3%	95,6%	6		
22	4	64	34	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanoes	8	28,0	13/10/04	14/4/07	38.556	6.071.000	6.071.000	0	7,0%	87,0%	6		
22	4	64	34	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanoes - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	14/4/07	49.591	16.817.000	16.817.000	0	4,5%	60,7%	6		
22	4	64	34	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	13/10/04	31/3/06	14.374	0	0	0	0,0%	100,0%	10		
22	4	64	34	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	28/11/08	47.363	9.711.000	9.711.000	0	53,8%	62,1%	6		
22	4	64	34	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	km 25,5 - Lte. Con Salta	8	25,5	13/10/04	31/3/06	9.950				0,0%	100,0%	10		
22	4	64	34	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/06	8/10/08	40.949	10.289.000	10.289.000	0	20,9%	42,6%	6		
22	4	64	66	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/7/05	30/11/08	30.298	8.768.000	8.768.000	0	12,7%	63,4%	6		
22	4	64	66	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	7/6/05	30/11/08	23.875	6.259.000	6.259.000	0	10,8%	73,5%	6		
22	4	64	66	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/7/05	30/12/07	27.649	8.004.000	8.004.000	0	9,8%	77,9%	6		
22	4	64	66	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Pluma de Pato - Emp. R.N. N° 34 (Sec.III)	8	30,0	1/4/06	30/3/07	13.666	4.635.000	4.635.000	0	0,4%	99,6%	6		
22	4	64	66	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Pluma de Pato - Emp. R.N. N° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/4/06	30/4/07	19.286	8.028.000	8.028.000	0	8,6%	84,1%	6		
22	4	64	66	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N. N° 34	Pluma de Pato - Emp. R.N. N° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/4/06	30/4/07	18.972	8.072.000	8.072.000	0	29,6%	95,3%	6		
22	4	65	70	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. R.P. N° 436 - Emp. R.P. N° 12	8	16,0	5/5/04	30/10/05	5.454	101.000	101.000	0	0,0%	99,0%	7		
22	4	66	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre - Laguna Khami - Kosovo	km 2934 - km 2959	8	25,0	16/4/04	31/3/06	52.151	1.976.000	8.976.000	0	0,0%	73,5%	7		
22	4	67	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	28/2/07	37.652	317.000	9.317.000	8.422.154	21,4%	99,7%	7		
22	4	68	78	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce R.P. N°5		8	8,0	29/5/03	31/12/04	9.402	98.000	98.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	69	78	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	28/10/03	30/6/07	43.296	427.000	427.000	0	1,4%	57,7%	6		
22	4	70	78	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	12/4/07	95.048	5.313.000	12.813.000	1.745.815	2,7%	67,0%	6	A	
22	4	71	78	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/2/04	14/2/07	72.397	7.047.000	14.547.000	389.763	1,3%	88,3%	7	A	
22	4	72	78	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P. N°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/5/04	30/9/07	66.068	6.807.000	14.307.000	1.392.842	0,5%	95,9%	6		
22	4	73	78	51	SANTA CRUZ	405	Tres Lagos - Emp. R.P. N°11	Sección III: km 86 - Emp. R.P. N°11	8	42,3	27/5/04	30/6/07	50.692	4.285.000	11.785.000	241.744	0,6%	92,0%	6		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	4	74	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P. N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	31/5/07	32.190	686.000	686.000	0	0,0%	88,4%	6		
22	4	75	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P. N°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. R.P. N° 11	8	28,4	7/2/03	30/6/05	37.081	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	76	78	51	SANTA CRUZ	40S	Iapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	100.000	100.000	0	0,0%	80,4%	7		
22	4	78	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/ Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	25,0	2/5/00	31/12/05	28.335	1.098.000	1.098.000	0	0,0%	96,1%	7		
22	4	79	78	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/ Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/8/01	30/12/05	19.050	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	81	82	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Pícala	km 380 - km 390,5	8	15,0	1/2/06	31/5/07	66.930	19.288.000	24.929.251	10.557.502	14,8%	80,9%	6		
22	4	82	14	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/4/06	15/4/08	288.460	226.963.000	46.401.914	47.954.882	6,9%	36,8%	6		
22	4	82	14	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/5/06	14/5/08	361.816	307.858.000	958.000	0	4,6%	13,1%	6		
22	4	82	14	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. c/ R.N. N°9 Actual	8	45,0	1/6/07	31/5/09	323.703	82.206.000	2.206.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	82	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc IV: Int. R.N.N°9 Act - Emp. R.N. N°178	8	36,0	15/11/06	13/11/08	248.500	4.008.000	0	0	4,4%	6,0%	6		
22	4	82	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc V: Emp. R.N. N° 178 - Carcaraña	8	39,6	2/10/06	30/9/08	303.405	4.974.000	1.368.110	0	3,8%	8,8%	6		
22	4	83	34	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	1/11/07	30/11/11	45.600	174.000	2.106.950	2.106.943	0,0%	0,0%	0		
22	4	84	34	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. N° 81 - Lte. c/ Chaco - Sec. I	Lte. c/ Chaco - Prog 29,800	8	29,8	1/11/07	30/10/09	58.380	89.000	11.122.482	10.747.490	0,0%	0,0%	0		
22	4	84	34	52	FORMOSA	95	Emp. R.N. N° 81 - Lte. C/ Chaco - Sec. II	prog. km 29,800 - Emp. R.N. N° 81	13	29,8	9/5/06	7/5/08	83.905	76.000	0	0	9,5%	31,0%	6		
22	4	85	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N. N° 34		8	31,0	1/11/07	30/10/09	30.000	76.000	76.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	86	86	51	ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	km180,79 - km 226,67	5	46,1	21/2/06	30/5/10	51.896	4.269.000	6.510.409	6.510.409	8,3%	32,5%	6		
22	4	87	50	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - km 393 - km 445	8	52,0	1/11/07	30/10/09	70.000	267.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	88	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (S III)	Sección III km 445 - km 502	8	57,0	1/11/07	30/10/09	70.000	267.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	89	78	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	1/4/07	31/3/12	193.000	232.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	90	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	1/11/07	30/10/08	4.400	34.000	34.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	91	50	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo - Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	17/9/01	30/6/05	21.266	100.000	100.000	0	0,0%	79,9%	7		
22	4	92	82	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ Cdad Rafaela - Cruce Urb. por la Cdad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	3/8/05	30/11/08	40.629	13.987.000	13.987.000	1.010.396	10,0%	51,2%	6		
22	4	93	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	1/6/07	30/5/10	70.400	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	94	78	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	G.B.San Julián - Comandante L. Piedrabuena	8	111,7	15/9/05	14/9/07	85.060	8.259.000	2.452.655	39.176.848	12,2%	78,5%	6		
22	4	94	78	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/9/05	14/7/07	105.020	22.210.000	22.210.000	0	18,7%	62,8%	6		
22	4	94	78	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	3/12/05	30/11/08	112.259	20.384.000	20.384.000	0	2,7%	42,0%	6		
22	4	95	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	1/6/07	30/11/09	79.957	250.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	96	78	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olnie- km 2189,52 - km 2215,91	8	28,3	30/11/06	31/3/08	55.200	90.000	1.830.698	0	0,8%	1,1%	6		
22	4	96	78	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km. 2289,64	8	72,9	15/4/07	13/4/09	110.626	154.000	154.000	162.793	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	78	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. s/ Río Chico - Km. 2289,64 - Km. 2344,99	8	55,4	15/9/06	15/3/09	80.201	75.000	675.000	3.341.904	2,6%	6,0%	6		
22	4	96	78	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/ R. Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II	8	66,5	1/6/07	31/3/09	65.000	229.000	229.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	78	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II	8	57,0	1/6/07	31/5/09	55.000	178.000	178.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	78	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por R.N. N°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	8	116,8	1/6/07	31/5/10	115.000	438.000	438.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	97	78	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	350,0	6/1/07	30/1/09	123.783	264.000	29.311.555	29.310.554	19,9%	19,9%	6		
22	4	98	78	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acc. a Rospentek y Pavim en Avda.	8	13,2	19/1/06	31/7/07	31.650	3.069.000	3.269.000	2.212.786	7,9%	43,3%	6	A	
22	4	99	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P. N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/5/06	27/11/08	67.480	419.000	4.190.996	4.190.995	5,4%	14,8%	6	A	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas														6.796.714	944.867.000	579.429.012	274.491.918				
Obras por Concesión sin Peaje COT																					
22	5	1	34	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/ Paraguay	13	297,3	1/6/98	30/11/08	170.700	33.719.000	24.719.000	3.891.437	2,3%	57,5%	6		
22	5	2	6	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	2/2/98	29/1/11	162.439	15.517.000	15.742.659	2.819.254	2,3%	62,4%	6		
Total Obras por Concesión sin Peaje COT														333.139	49.236.000	40.461.659	6.710.691				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																					
22	6	3	18	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30	1/11/07	31/10/08	3.300	36.000	36.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	4	18	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30	1/11/07	31/3/08	1.500	23.000	23.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	5	18	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/ Río Miriñay)	Prog. 182	8	150	1/11/07	30/11/08	6.700	34.000	34.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	6	6	70	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/ Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200	23/8/02	31/10/04	6.344	130.000	130.000	0	0,0%	99,5%	7		
22	6	7	70	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/ Río San Juan)	Prog. 174,92	8	80	29/1/03	31/10/04	8.112	100.000	100.000	0	0,0%	98,9%	7		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédto Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	6	8	70	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/ Río del Valle		8	80	1/11/07	30/11/08	1.175	9.000	9.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	10	78	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/ Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200	24/1/03	15/12/03	12.406	100.000	100.000		0	0,0%	67,0%	8	
22	6	11	78	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/ Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike- R. Gallegos)	8	90	28/6/05	26/2/07	16.940	3.008.000	2.277.297	2.277.296	8,1%	74,2%	6	A	
22	6	12	82	51	SANTA FE	11	Puente s/ Río San Lorenzo		8	30	1/11/07	30/8/08	1.700	13.000	13.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30	1/11/07	31/10/08	1.200	9.000	9.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	12	1/11/07	31/10/08	1.300	10.000	10.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	40	1/11/07	30/1/09	1.250	10.000	10.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80	1/11/07	30/4/09	2.400	12.000	12.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	17	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	40	1/11/07	30/10/08	1.470	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Matadero)	Prog. 425,54	8	30	1/11/07	30/10/08	1.140	9.000	9.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° Bragado)	Prog. 429,95	8	30	1/11/07	30/10/08	1.460	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30	1/11/07	30/10/07	1.170	9.000	9.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	14	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/ A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30	1/11/07	30/3/08	1.500	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	14	51	CORDOBA	9	Emp.R.P. N°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/ A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30	1/11/07	30/10/08	1.500	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	23	46	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pituil (Pte. s/ Río Capayán)	Prog. 600,42	8	30	1/11/07	30/1/09	4.700	24.000	24.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/ Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80	1/11/07	31/1/09	2.100	16.000	16.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	58	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/ Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte s/ Río Alumine)	8	30	1/6/07	30/5/09	18.487	42.000	42.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	6	26	62	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/ A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50	1/11/07	30/10/08	1.900	15.000	15.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	62	51	RIO NEGRO	23	Puente s/ Río Pilcaniyeu		8	90	1/11/07	30/11/08	3.000	23.000	23.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	38	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/ Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330	12/9/06	30/11/09	15.528	60.000	1.028.643	792.312	4,7%	10,1%	6		
22	6	32	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/ A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60	1/11/07	30/10/08	1.800	14.000	14.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	90	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/ R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90	1/11/07	30/4/09	3.300	25.000	25.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	90	51	TUCUMAN	157	Puente s/ A° El Chileno		8	30	1/11/07	31/10/08	1.300	5.000	5.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	35	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/ Río Salado)	Prog. 492,54	8	100	1/11/07	31/10/09	4.500	34.000	34.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	6	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/ Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas	5	1.200	1/9/04	31/8/07	69.497	11.699.000	1.229.328	1.229.327	2,4%	66,5%	6		
22	6	37	78	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/ Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20	29/8/03	30/6/04	10.687	100.000	100.000		0	0,0%	98,5%	7	
22	6	38	30	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/ Río Guayquiraró		8	200	1/11/07	30/4/09	3.500	27.000	27.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/ Río Saladillo	5	39	1/11/07	30/10/08	1.400	7.000	7.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	30	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/ A° Feliciano)	Prog. 572	8	130	1/3/07	28/2/09	26.290	66.000	66.000		0	0,0%	0,0%	4	
22	6	41	38	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/ Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	310	1/6/07	30/11/08	20.297	65.000	65.000		0	0,0%	0,0%	2	
22	6	42	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60	1/11/07	31/10/08	1.500	23.000	23.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80	1/11/07	30/4/09	2.000	15.000	15.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	30	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. R.N. N°18 (Pte.s/ A° Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30	1/11/07	30/10/08	1.500	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/ Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	70	1/11/07	30/10/08	1.200	8.000	8.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	34	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/ A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	20	1/11/07	30/10/08	1.350	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/ Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	10	1/11/07	31/10/08	1.500	11.000	11.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	18	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	70	27/6/06	31/12/07	12.300	229.000	1.691.373	992.482	11,5%	56,4%	6		
22	6	49	66	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	km 1480,80	8	60	1/11/07	31/10/08	3.800	58.000	58.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	50	14	51	CORDOBA	----	Nuvo Puente s/ Río IV		8	50	1/11/07	31/10/09	17.000	345.000	1		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	10	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc.a Sta Cruz (Cuestecilla)-Pte.s/ R.Paclín	8	100	1/11/07	31/10/08	2.500	19.000	19.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	38	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400	1/11/07	31/10/09	50.000	153.000	1		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	38	51	JUJUY	9	Pte. s/ Río Grande		8	200	1/11/07	31/10/09	30.000	416.000	416.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	54	66	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/ Riacho Seco (1300 km.)	8	50	1/11/07	30/4/09	9.600	73.000	73.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	66	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/ Seco	km. 97,77	8	30	1/11/07	30/4/09	13.600	104.000	104.000		0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	66	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/ Viñaco		8	100	1/11/07	31/10/08	4.000	8.000	8.000		0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (*)														412.703	17.262.000	7.994.643	5.291.417				

Obras en Corredores Viales Concesionados

22	7	1	6	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.R.N. N° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/7/04	28/2/05	8.823	211.000	12.211.000	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	6	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.R.P. N° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	5/8/04	3/5/05	6.855	236.000	236.000	0	0,0%	96,6%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	7	1	6	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.R.P. N° 61	km 118 - km 156	5	38,0	27/1/06	31/10/06	14.676	834.000	834.000	5.500.377	0,0%	100,0%	7		
22	7	2	14	51	CORDOBA	7	CVN° 2 - Obra N° 7	km 500 - km 539	5	39,0	20/7/04	30/8/05	12.738	100.000	8.100.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	2	6	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	13/8/04	30/4/06	1.861	650.000	650.000	0	0,0%	11,1%	10		
22	7	2	6	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Ob N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. R.P. N° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	4/10/04	31/10/06	17.275	100.000	100.000	621.456	0,0%	99,1%	7		
22	7	2	42	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. R.P. N° 3 - Emp. R.N. N° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	8/10/04	30/6/05	13.940	875.000	875.000	0	0,0%	95,5%	7		
22	7	3	6	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/7/04	31/7/06	15.086	673.000	5.713.282	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	82	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - R.N. N° A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/7/04	30/9/06	46.473	2.222.000	2.222.000	0	0,0%	93,7%	7		
22	7	3	82	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp R.N. N° 11	km 0 - km 12	5	12,0	28/9/05	31/7/06	10.418	55.000	55.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	82	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - A.Nivel Emp. R.N. N° 9 (Sal.Cba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/7/04	30/4/05	6.704	470.000	470.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	82	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. R.N. N° 168 - Emp. R.P. N° 39	km 476 - km 607	5	131,0	4/1/06	30/9/06	7.316	1.000	1.000	41.281	0,0%	99,4%	7		
22	7	3	82	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. R.P. N° 38 - Emp. R.P. N° 98	km 684 - km 720	5	36,0	5/8/04	31/12/04	2.566	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	3	82	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. R.N. N° 98 - Emp. R.P. N° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	6/12/05	31/10/06	24.037	1.249.000	1.249.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	7	3	6	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Ob N° 17 - J.A. de la Peña - A.Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	5/8/04	31/5/05	20.732	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	7	3	6	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. R.P. N° 66 - Emp. R.P. N° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415- km420/km450-km471	5	63,0	5/8/04	30/6/05	16.386	100.000	100.000	0	0,0%	99,9%	7		
22	7	4	82	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. R.N. N° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	30/11/05	17.523	100.000	8.100.000	0	0,0%	99,6%	7		
22	7	4	82	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. R.P. N° 6 (S) - Emp. R.P. N° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/7/04	30/6/05	18.418	111.000	111.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	4	6	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.R.N. N° 9 - Emp. R.N. N° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	19/8/07	17.943	3.904.000	3.904.000	936.920	7,1%	24,4%	6		
22	7	4	14	54	CORDOBA	36-A005	CVN° 4 - Obra N° 22	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666- km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	19/5/05	19/3/07	26.202	2.038.000	2.038.000	2.663.725	25,3%	93,3%	6		
22	7	5	82	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. R.P. N° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20/7/04	31/7/05	24.083	211.000	8.211.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	5	82	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. R.P. N° 13	km 225 km 247	5	22,0	14/7/04	28/2/05	1.626	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
22	7	5	82	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. R.P. N° 80 (S) - Emp. R.P. N° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	688.000	688.000	72.085	0,8%	100,0%	8		
22	7	5	82	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. R.P. N° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/7/04	28/2/05	2.742	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	5	82	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - R.P. N° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	5/1/05	28/2/06	29.150	100.000	100.000	0	0,0%	99,9%	7		
22	7	5	82	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.R.P.N° 65 - Emp. R.P.N° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/1/05	31/12/05	23.224	395.000	395.000	0	0,0%	98,3%	8		
22	7	7	22	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. R.N. N° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/8/04	31/5/05	13.347	100.000	100.000	0	0,0%	98,4%	8		
22	7	9	82	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	(392 - 399) - (558 - 585) -(613 - 616)	5	7,0	21/12/05	20/5/07	7.544	753.000	3.753.000	0	0,0%	30,1%	6		
22	7	9	14	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B	km 866 - km 871	5	5,0	6/4/06	30/11/06	1.483	175.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	10	14	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - S.Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/4/06	31/8/07	13.513	1.401.000	5.405.145	12.109.143	29,9%	81,2%	6		
22	7	10	2	52	CORDOBA	19	CVN°3 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/5/06	18/3/07	22.346	6.704.000	6.704.000	0	28,5%	59,6%	6		
22	7	11	6	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. R.N. N° 188 - Emp. R.P. N° 6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/4/06	31/12/07	22.690	8.638.000	18.055.304	894.026	2,8%	11,9%	6		
22	7	11	74	54	SANTA FE	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	1/1/06	30/4/07	30.878	29.589.513	29.589.513	17.161.276	39,1%	68,2%	6		
22	7	12	14	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	6/2/07	31/8/07	7.764	295.000	3.965.442	0	5,0%	5,0%	6		
22	7	12	86	52	ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P.N° 208 - Emp.R.P. N° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/1/06	23/7/07	30.347	8.717.000	8.717.000	12.387.440	13,3%	85,6%	6		
22	7	12	90	52	TUCUMAN	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. R.P. N° 208 - Emp. R.P. N° 347	km 1250 - km 1280 / km 1285 - km 1289	5	34,0	3/5/06	30/4/07	23.072	0	0	0	17,9%	47,4%	6		
22	7	13	82	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	8/2/06	30/4/07	20.688	1.234.000	1.234.000	906.805	0,8%	94,7%	6		
22	7	13	18	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	1/3/05	15/10/05	4.363	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	7	14	6	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish	km 199 - km 217-km 244 - km 252	5	26,0	1/1/06	31/3/07	10.795	8.996.000	25.896.988	6.538.852	50,0%	81,0%	6		
22	7	14	6	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	1/6/06	30/4/07	16.165	14.144.000	14.144.000	2.611.431	11,2%	99,7%	6	A	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	7	14	6	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P. N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	7/4/06	31/3/07	12.253	8.160	8.160	3.857.876	33,4%	90,5%	6		
22	7	14	6	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/1/07	17/7/07	10.220	9.189.840	9.189.840	351.899	19,9%	19,9%	6	A	
22	7	16	82	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	1/3/06	30/4/07	25.189	5.470.000	6.601.242	6.697.882	14,5%	97,8%	6		
22	7	16	82	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/3/06	30/9/07	21.603	6.496.000	6.496.000	6.399.359	22,5%	34,8%	6		
22	7	17	14	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	km 600 - km 604 y km 635 - km 657	5	4,0	6/4/06	5/12/06	17.701	6.312.000	137.850	131.599	0,0%	93,4%	7		
22	7	17	82	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.883	100.000	100.000	0	0,0%	99,4%	8		
22	7	19	18	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/6/06	26/4/07	23.744	21.370.000	27.803.512	3.356.095	27,3%	51,1%	6		
22	7	19	54	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	4/4/06	31/3/07	8.243	492.000	492.000	23.520	19,3%	30,2%	6		
22	7	19	22	53	CHACO	16	CVN°6 - km 68 - km 89 - Emp. R.P. N°11	km 68 - km 89	5	21,0	24/4/06	30/4/07	16.132	4.951.000	4.951.000	4.563.381	33,0%	64,2%	6		
22	7	23	82	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	1/5/06	31/3/07	30.877	0	0	0	47,3%	76,4%	6	A	
22	7	25	82	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Emp. R.P. N° 79 (S) - Calchaquí	km 635 - km 661	13	26,0	28/2/07	30/8/07	17.288	611.000	611.000	0	1,4%	1,4%	6		
22	7	25	6	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. G. Pinto - Lte. Bs As/ L. Pampa	km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	1/12/06	31/5/08	15.598	13.648.000	13.648.000	0	12,3%	12,3%	6		
Total Obras en Corredores Viales Concesionados													836.967	165.217.513	244.466.279	87.826.428					

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	54	51	MISIONES	----	Corredor de las Misiones		8	S/D	1/11/07	31/10/09	9.000	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	62	51	RIO NEGRO	----	Corredor de los Lagos		8	S/D	1/11/07	31/10/10	35.000	11.166.000	11.166.000	0	0,0%	0,0%	0	
													44.000	14.166.000	14.166.000	0				

Total Obras en Circuitos Turísticos

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	38	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		8	69,0	1/7/07	30/6/10	12.000	46.000	46.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	38	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	1/11/07	30/4/11	18.000	69.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	42	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N. N° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	1/11/07	31/10/10	7.000	53.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	6	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y R.N. N° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	1/7/07	31/5/09	73.013	198.000	1	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	5	74	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	1/11/07	30/10/11	47.800	122.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	66	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	1/11/07	30/10/09	7.500	781.000	625.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	66	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	1/10/07	30/9/09	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	66	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	1/10/07	30/9/11	73.000	1.111.000	889.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	1/11/07	30/10/09	120.000	43.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	1/11/07	31/10/09	120.000	38.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	1/11/07	31/10/08	48.000	23.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	66	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	1/11/07	30/10/09	90.000	37.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	50	51	MENDOZA	149	Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	1/11/07	31/10/10	100.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	96	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8	S/D	1/11/07	30/10/09	40.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	15	54	51	MISIONES	14	Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		8	4,0	1/11/07	30/8/08	5.500	28.000	28.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	54	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N. N° 14 - Empalme R.P. N° 4		8	0,5	1/11/07	31/5/08	3.000	25.000	25.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	22	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/R.N. N°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp R.P.N°63 - Emp R.N. N°11 (0 - 7,6)	8	7,3	18/10/06	16/10/08	38.792	111.000	5.525.745	5.525.743	10,7%	15,6%	6	A
22	9	17	22	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp R.N. N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	18/10/08	28.568	0	0	0	10,4%	12,7%	6	A
22	9	18	22	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	1/6/07	31/5/09	46.083	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	19	22	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	1/10/07	30/9/09	40.000	157.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	22	51	CHACO	89	Villa Ángela - General Pinedo		8	50,0	1/11/07	31/10/10	150.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	1/9/07	30/8/09	80.000	118.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	23	90	51	TUCUMAN	S/N°	Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle		8	80,0	1/11/07	30/10/09	50.000	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	10	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	1/9/07	30/8/09	80.000	306.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	10	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	1/11/07	30/10/08	8.000	82.000	1	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	9	26	22	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N. N° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. R.N. N° 89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	1/11/07	30/10/09	80.000	625.000	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	9	26	22	52	CHACO	11	Autovía: Emp. R.N. N° 89 - Acc. Margarita Belén (SII)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	1/11/07	31/10/09	50.000	306.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	26	22	53	CHACO	11	Autovía: Emp. R.N. N° 89 - Acc. Margarita Belén (SIII)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belén	8	14,7	1/11/07	31/10/09	70.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	27	22	51	CHACO	P12	Obras Empalme Ruta Provincial 12		8	S/D	1/11/07	31/8/09	17.000	233.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	28	22	51	CHACO	----	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	1/11/07	31/10/12	200.000	1.184.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	22	51	INTERPROVIN CIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8	513,0	1/11/07	31/10/12	5.000	155.000	125.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	22	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. II)	Seccion II	8	58,5	1/11/07	31/10/12	150.000	693.000	554.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	22	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. III)	Sección III	8	79,3	1/11/07	31/10/12	210.000	852.000	682.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	86	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,0	1/11/07	31/10/12	150.000	648.000	518.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	86	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. V)	Seccion V	8	61,0	1/11/07	31/10/12	180.000	649.000	519.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	66	56	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VI)	Sección VI	8	74,6	1/11/07	31/10/12	210.000	791.000	633.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	66	57	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VII)	Sección VII	8	64,0	1/11/07	31/10/12	180.000	692.000	554.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	29	66	58	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	64,6	1/11/07	31/10/12	180.000	670.000	536.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	30	22	51	CHACO	95	Reconst.Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina		5	0,1	1/11/07	31/10/08	50.000	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	31	22	51	CHACO	S/N°	Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	1/11/07	31/10/08	6.000	46.000	46.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	32	96	51	INTERPROVIN CIAL	S/N°	Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	1/11/07	31/10/08	7.000	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	33	26	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 (Emp R.N. N° 40) - Cholila	Km 0 - Km 30	8	30,0	15/12/05	31/12/07	22.658	7.230.000	3.230.000	1.310.237	5,8%	35,6%	6		
22	9	34	26	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Emp. R.N. N° 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As Chico	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)-	8	44,8	22/11/05	30/11/07	29.518	8.813.000	4.635.837	4.635.835	14,0%	59,0%	6		
22	9	35	26	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N. N° 40	Ira. Sección Km 0 - Km 30	8	30,0	1/2/06	31/1/08	33.810	3.963.000	5.901.958	4.461.386	14,3%	31,2%	6		
22	9	36	26	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel	km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/ A° Seco)	8	6,3	1/6/07	28/2/08	15.951	28.000	1.590.575	1.590.574	0,0%	0,0%	2		
22	9	37	14	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/ Catamarca km 154		8	154,0	1/11/07	31/10/10	70.000	126.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	38	14	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	1/11/07	31/10/11	300.000	1.782.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	39	14	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	1/11/07	30/10/09	50.000	244.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	40	14	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	5	2,0	27/1/06	31/12/06	2.649	262.000	1	0	21,7%	100,0%	8		
22	9	42	30	51	ENTRE RIOS	----	Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		17	S/D	1/11/07	31/10/09	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	43	30	51	ENTRE RIOS	P20	Ob.reasfalt.de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5	S/D	1/11/07	30/4/09	5.000	84.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	44	30	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	1/11/07	30/4/09	40.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	45	14	51	CORDOBA	36	R.N. N° 36 - Prolongación		8		1/11/07	30/10/09	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	46	30	51	ENTRE RIOS	S/N°	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	1/11/07	31/10/10	26.000	99.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	47	30	51	ENTRE RIOS	14	Aut.Mesopotámica Ceibas - Gualaguaychú - Deriv. Rutas 14 y 16		8	1,0	1/11/07	31/10/10	33.000	126.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	48	96	51	INTERPROVIN CIAL	S/N	Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca		8	0,2	1/11/07	31/10/10	7.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	50	62	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el cruce de la R.P. N° 69 y R.N. N° 151 - Campo Grande		8	0,5	1/11/07	31/1/10	5.000	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	51	62	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en 30 km R.N. N° 151		8	0,5	1/8/07	31/3/08	3.500	45.000	45.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	52	78	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	82,0	1/6/07	31/5/10	192.983	1.146.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	9	53	78	51	SANTA CRUZ	40	P.Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera- Río Turb		8	119,0	1/11/07	31/10/10	60.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	54	78	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8	51,0	1/11/07	30/10/09	29.000	111.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	56	14	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. R.N. N°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. a Sinsacate	8	2,2	1/3/06	28/6/07	15.391	3.214.000	3.800.575	3.800.574	28,9%	84,5%	6		
22	9	57	54	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. R.P. N°19		8	31,0	22/3/06	22/3/09	79.899	158.000	15.340.336	15.340.335	17,2%	59,9%	6		
22	9	58	6	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza		5	0,1	1/6/07	2/3/07	2.750	20.000	20.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	59	6	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata		8	6,0	1/11/07	31/10/09	20.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	60	6	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavim. y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/4/06	18/4/08	39.312	4.961.000	3.925.255	3.925.254	7,6%	33,7%	6	A	
22	9	61	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. Juan XXIII y Acc.a Parque. Ind. Chacabuco		8	2,8	1/11/06	30/10/07	13.659	285.000	1	0	12,4%	12,4%	6		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	9	62	6	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/2/06	31/10/07	40.758	3.027.000	7.509.831	7.509.829	16,2%	51,5%	6		
22	9	63	6	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/1/05	31/3/07	21.618	843.000	4.216.786	4.216.785	0,7%	98,0%	6		
22	9	64	10	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I, IV y V		10,7	1/3/07	28/2/09	50.430	139.000	10.086.045	10.086.044	0,0%	0,0%	4		
22	9	64	10	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	1/10/07	30/9/08	6.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	10	53	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	1/10/07	31/3/09	50.000	41.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	64	10	54	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S. 4	R.P.Nº 33, Puente s/ Río del Valle	8	4,7	1/10/07	31/3/09	13.000	25.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	65	10	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas		8	6,0	1/9/07	31/8/09	30.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	66	22	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.Nº 6		8	86,0	1/11/07	31/10/10	200.000	55.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	67	22	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	1/11/07	31/10/11	36.000	92.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	70	26	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5	S/D	1/11/07	30/11/08	4.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	71	26	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N. Nº40 - Gualjaina	R.N. Nº40 - km 27,00	8	27,0	1/2/07	1/2/09	37.643	64.963	3.652.274	3.764.303	5,3%	5,3%	6	A-C	
22	9	71	26	52	CHUBUT	P12	Emp. R.P. Nº 14 (Gualjaina)- Emp. R.N. Nº 40- Sec. II	km 27 - km 62	8	35,0	1/10/07	30/9/09	44.000	112.037	112.037	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	72	26	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I -Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-Km. 20,96)-	8	32,0	1/6/07	30/6/10	54.948	118.000	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	9	72	26	52	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado - Sección II	km 26,28 - km 62	8	35,7	1/11/07	31/10/09	40.000	132.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	73	26	51	CHUBUT	RP 19	Río Pico - Emp. R.N. Nº 40	2ra. Sección km 30 - km 65	8	35,0	31/5/07		38.692	148.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	9	74	26	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguerr - Emp. R.P. Nº20	km 0-km 7,735(R40)-km 0-km 28,896(P56)	8	39,0	9/3/06	30/11/08	25.983	2.938.000	3.193.861	3.193.859	9,4%	16,6%	6		
22	9	77	14	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	1/11/07	31/10/09	25.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	78	14	51	CORDOBA	35	Emp. R.N. Nº7 - Emp. R.N. Nº8	Puente s/Aº El Gato (km 669,87)	5	0,1	27/12/05	27/4/06	228	14.000	14.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	9	79	14	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	1/11/07	31/10/09	10.000	60.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	80	14	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa María		5	1,0	1/11/07	30/4/08	1.000	32.000	32.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	82	14	51	CORDOBA	PE90	Alcira Gigena - Gral. Cabrera	Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto Juarez Celman	8	*47,8	15/9/06	13/10/08	42.558	122.000	1	0	7,5%	9,3%	6	K	
22	9	85	18	51	CORRIENTES	S/Nº	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	0,5	1/11/07	31/10/12	530.000	810.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	86	34	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. R.N. Nº81	km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/06	30/8/09	12.445	81.000	1.596.153	0	20,1%	20,9%	6		
22	9	87	34	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	1/9/07	30/11/09	32.762	150.417	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	88	34	51	FORMOSA	86	Mision Tacaaale - R.N. Nº95	Emp. R.N. Nº22 - Emp. R.N. Nº95 y Acc. a Va. Gral. Güemes	8	29,6	28/11/06	26/11/08	46.816	117.583	1	0	4,0%	7,1%	6		
22	9	89	34	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Guemes - Fortín Leyes	8	25,1	1/6/07	29/5/12	39.805	153.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	89	34	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S II	II - Fortín Leyes - San Martín 2	8	25,1	1/7/07	31/5/09	42.000	160.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	89	34	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1º Lugones	8	24,8	1/9/07	31/8/09	32.000	122.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	89	34	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1º Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	1/9/07	31/8/09	45.000	138.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	90	34	51	FORMOSA	P1	Mision Lai Shi - El Colorado		5	58,0	27/6/05	31/12/06	20.521	0	3.864.128	3.864.126	8,9%	75,8%	6		
22	9	91	34	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N. Nº11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/5/05	31/3/07	21.681	3.855.000	575.104	575.103	2,2%	93,2%	6		
22	9	92	38	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Emp. R.N. Nº9	8	8,0	7/8/06	5/2/08	59.756	102.000	6.452.727	6.452.725	5,4%	18,3%	6		
22	9	93	46	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra		8	44,0	1/11/07	30/4/09	40.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	94	50	51	MENDOZA	7	Sector Agua de Las Avispas		8	5,0	1/11/07	1/5/08	525	8.000	8.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	95	50	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Emp. R.N. Nº7 - Ugarteche	8	13,6	25/1/05	30/4/07	35.535	1.893.000	3.970.162	3.970.161	1,5%	92,8%	6	A	
22	9	96	82	51	SANTA FE	A 008	Av. Circunvalación de Rosario		17	2,8	1/11/07	30/10/08	5.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	97	50	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	1/11/07	30/5/09	25.427	16.445.000	13.156.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	9	98	50	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	2/1/07	30/12/08	67.458	18.976.000	15.181.001	0	4,3%	4,3%	6		
22	9	99	50	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte. c/ Chile	8	13,6	1/4/07	31/3/09	59.429	12.820.000	10.256.001	0	0,0%	0,0%	4		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II														6.046.354	109.192.000	133.861.443	84.222.873				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																				
22	10	1	50	51	MENDOZA	----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8	S/D	1/11/07	31/10/08	25.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	54	51	MISIONES	----	Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0	1/11/07	30/10/10	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	58	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	1/11/07	30/10/08	1.500	23.000	23.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	58	51	NEUQUEN	40	Puente sobre Arroyo Pilmatue		8	1,0	1/7/07	31/10/07	1.961	8.000	8.000	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	6	58	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura		8	5,0	1/11/07	30/10/09	20.000	92.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	58	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N. Nº231	Sección IV: Acc. V.Traful - Emp. R.N. Nº231	8	20,6	21/2/06	30/11/08	69.915	18.520.000	7.626.532	7.626.530	8,4%	23,2%	6	
22	10	8	62	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquén		8	21,0	1/6/07	30/5/09	116.277	76.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	9	62	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N. Nº237	Sección I y II	8	64,0	1/10/07	30/9/10	86.400	176.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	62	51	RIO NEGRO	40	Emp. R.N. Nº23 - Norquingo	Pte. s/Aº Las Bayas - Km 1272,39	8	0,1	1/2/06	30/11/06	797	27.000	27.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	11	62	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche		8	S/D	1/10/07	30/9/08	1.000	15.000	15.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	12	66	51	SALTA	9	CVNº5: Obra 24-B-1:Emp. RPNº3- Emp R.N. Nº34	km 1448- km 1462	5	14,0	18/12/06	18/8/07	18.883	621.000	14.792.808	14.792.786	10,5%	10,5%	6	
22	10	12	66	52	SALTA	34	CVNº5: Obra 24-B-2: Emp. RPNº3- Emp R.N. Nº34	km 1462 - km 1478	5	16,0	7/4/06	7/7/07	29.577	16.614.000	1	0	16,1%	43,1%	6	
22	10	12	66	53	SALTA	9	CVNº5: Obra 24-B-3:Emp. RPNº3- Emp R.N. Nº34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/4/06	12/7/07	34.862	19.602.000	1	0	17,7%	45,6%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico			Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total				
22	10	13	66	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. R.N. N°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez-	5	1,4	1/11/07	1/5/09	20.000	38.000	38.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	14	66	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. R.N. N° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	8	118,9	1/11/07	30/10/10	68.000	173.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	15	70	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N. N°40	Caballo Anca - Emp. R.N. N° 40	8	48,4	1/10/07	30/9/09	90.000	102.000	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	15	70	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N. N° 40	(Sección II - a 2)	8	10,0	1/10/07	30/9/09	40.000	100.000	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	15	70	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- R.N. N°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,2	1/6/07	30/5/10	82.250	72.000	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	10	15	70	54	SAN JUAN	150	Ischyigualasto - R.N. N° 40	R. Bermejo - Emp. R.N. N ° 40 (Sección III)	8	34,4	1/6/07	30/5/09	71.945	87.000	1	0	0,0%	0,0%	2			
22	10	16	70	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100	8	0,1	26/10/05	30/5/09	15.988	3.640.000	1	0	7,5%	32,3%	6			
22	10	20	78	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Río Santa Cruz	5	0,2	1/11/07	30/10/08	5.000	23.000	23.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	22	82	51	SANTA FE	168	Río Colastiné- Tunel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	1/6/07	30/11/10	117.781	178.000	1	0	0,0%	0,0%	2			
22	10	23	82	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Inters. La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	5	3,5	1/3/07	8/2/10	140.269	127.000	1	0	0,0%	0,0%	4			
22	10	24	82	51	SANTA FE	178	Emp. R.N. N° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146	8	31,0	1/9/07	30/8/09	90.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	25	82	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. N. 34	203-233	8	30,0	1/11/07	30/10/08	20.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	26	50	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31/1/07	2/5/07	400	8.000	8.000	0	33,3%	33,3%	6			
22	10	27	82	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/2/06	12/8/07	48.057	9.910.000	12.163.078	12.163.077	16,4%	69,5%	6			
22	10	28	82	51	SANTA FE	----	Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso alternativo tránsito pesado desde R.N. N°9	8	4,0	1/11/07	31/10/09	2.000	31.000	31.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	29	82	51	SANTA FE	----	Municipalidad de Ceres	pavimentación urbana- 34 arterias urbanas	8	3,4	1/11/07	30/10/09	1.948	29.761	29.761	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	30	94		TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional Bahía Lapataia		8	16,0	1/9/07	30/8/08	20.000	23.239	23.239	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	31		51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	19,9	1/10/07	30/9/09	130.000	626.000	1	0	0,0%	0,0%	2			
22	10	32	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza actual - Principio Autopista	8	12,7	1/3/07	9/2/09	105.140	190.000	21.027.971	21.027.971	0,0%	0,0%	4			
22	10	33	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Intersección Av. Gral.Paz y Camino Negro		8	1,0	1/11/07	31/10/09	50.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	34	30	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	1/11/07	30/10/09	6.500	99.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	35	30	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N. N°a015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y R.N. N°14	8	1,0	1/11/07	30/4/08	653	20.000	20.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	36	42	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	1/11/07	31/10/11	30.000	125.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	37	42	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)		8	0,5	1/10/07	30/11/07	2.500	18.000	18.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	38	58	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	intersección R.N. N°22 y R.N. N°237	8	1,5	1/10/07	31/3/08	2.500	4.000	4.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	39	58	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Int.Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P. N°13	8	5,1	1/9/07	30/8/10	21.687	166.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	40	82	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Inters. R.N. N°11 y R.N. A012 y pte. s/desv.ferro.	8	2,4	14/11/06	13/2/08	29.779	2.393.000	2.260.558	823.340	13,5%	14,6%	6			
22	10	41	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac. Tierra del Fuego	5	6,0	1/11/07	30/4/09	18.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	42	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. R.N. N°3		8	5,0	1/11/07	30/4/09	10.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	43	6	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	1/6/07	30/5/11	40.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	44	6	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	8	111,9	1/11/07	31/10/12	275.740	527.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	45	6	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	km 176,70 - km 221,37	8	44,7	1/11/07	31/10/12	161.340	308.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	46	6	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	km 64,50 - km 72,00	8	7,5	1/11/07	31/10/09	30.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	47	26	51	CHUBUT	260	Empalme R.N. N°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	1/11/07	31/10/10	170.000	183.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	48	26	51	CHUBUT	260	Empalme R.P. N°51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	1/10/07	30/9/10	130.000	158.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	49	50	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	1/8/07	30/7/09	100.000	322.000	322.000	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	50	82	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección I	5	40,0	1/8/07	30/4/10	200.000	172.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	51	82	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección II	8	40,0	1/8/07	31/7/10	200.000	172.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	52	82	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III	8	37,0	1/8/07	31/7/10	200.000	172.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	54	18	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	5/6/06	30/9/08	35.563	4.850.000	10.548.637	2.743.179	13,3%	28,2%	6			
22	10	55	46	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.R.N.N° 60	Km. 333 - Km 374,50 (Sección II)	8	33,5	19/5/06	31/10/07	23.209	215.000	2.436.696	2.436.695	13,1%	28,9%	6			
22	10	57	74	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores-Limite Córdoba/San Luis-Quines	Km198,65- Km 266,4	11	67,8	1/9/07	31/3/08	20.625	29.000	1	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	58	22	51	CHACO	89	Emp. R.N. N ° 11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S I	Prog. 0,00 - 22,05	8	22,0	1/11/07	31/10/10	80.000	130.000	104.001	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	59	22	51	CHACO	89	Emp. R.N. N ° 11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S II	Prog. 22,05 - 43,28	8	22,0	1/11/07	31/10/10	80.000	130.000	104.001	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	60	22	51	CHACO	89	Cotte-Lai - Emp. RPN° 7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80	Prog. 43,28 - 75,80	8	30,0	1/11/07	30/10/10	100.000	130.000	104.001	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	61	22	51	CHACO	89	Emp. R.P. N°7 (Charadai) - Emp. R.P. N°4	Prog. 81,28	8	20,0	1/11/07	30/11/10	70.000	286.000	229.001	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	62	22	51	CHACO	89	Samuhu Emp. R.P. N °4 - Emp. R.N.N ° 95 (Villa Angela)		8	36,0	1/11/07	30/10/10	120.000	130.000	104.001	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	63	54	51	MISIONES	14	Emp. R.P. N° 20 (Gramado) - Emp. R.P. N ° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,0	1/9/07	30/8/10	140.000	851.000	681.001	0	0,0%	0,0%	0			

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédto Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	10	64	54	51	MISIONES	14	Emp. R.P. N ° 20 - Emp. R.P. N °17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117	8	27,0	1/9/07	31/8/10	120.000	1.167.000	934.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	65	14	51	CORDOBA	S/N	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	8,0	1/10/07	30/9/09	200.000	286.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	67	78	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	Emp. R.N. N° 40 -Paso Fronterizo Laurita	8	75,0	1/8/06	30/7/09	144.144	172.000	8.272.000	7.563.479	3,1%	10,8%	6		
22	10	67	78	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S II	El Zudo - Ea. Bella Vista	8	75,0	1/9/07	28/2/10	200.000	140.000	140.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	67	78	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Guer Aike	8	75,0	1/7/07	31/12/10	100.000	191.000	191.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	68	78	51	SANTA CRUZ	40	Chimen Aike - Cabo Virgenes		8	130,0	1/7/07	30/6/10	300.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	69	50	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	1/11/07	30/10/08	6.000	184.000	0	0	0,0%	0,0%	3		
22	10	69	50	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III)	Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota	8	9,8	1/11/07	30/10/08	6.000	94.000	0	0	0,0%	0,0%	3		
22	10	69	50	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V)	Fin pavimento - Acc. Hotel Villavicencio	8	8,2	1/11/07	30/10/08	6.000	75.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	72	78	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián -	Km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	20/12/07	91.046	17.753.000	3.459.083	11.715.082	1,4%	14,2%	6		
22	10	72	78	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/5/06	20/5/08	101.606	8.256.000	8.256.000	0	7,9%	38,4%	6		
22	10	73	90	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N. N° 38 - Lte c/ Catamarca		8	30,0	1/10/07	30/10/09	100.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	74	90	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Iltico	Puente s/ Río Chirimayo	8	0,0	27/7/06	31/8/07	1.136	151.000	737.030	717.029	33,1%	88,6%	6		
22	10	75	14	51	CORDOBA	9	Autopista Pilar - Villa María - Acc a dif localidades desde la autop		8	S/D	1/11/07	31/5/10	7.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	76	66	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	1/6/07	30/5/09	35.550	115.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	77	38	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		8	15,0	1/8/07	28/2/09	20.000	57.597	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	78	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	1/8/07	31/7/08	4.380	730.403	1	0	0,0%	0,0%	15		
22	10	79	14	51	CORDOBA	----	Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	1/11/07	31/10/09	31.609	110.535	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	80	14	51	CORDOBA	8	Obra de intersección R.N. N° 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota		8	0,5	1/10/07	31/3/08	1.600	24.465	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	81	22	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	1/11/07	1/5/09	40.000	82.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	82	34	51	FORMOSA	P3	Emp. R.N. N°81 - Emp. R.N. N°86	Km 113	8	80,0	1/11/07	30/10/09	150.000	886.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto - km 60		8	60,0	1/9/07	30/8/09	150.000	134.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	85	86	51	ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	11	25,0	28/6/06	31/1/07	1.281	18.000	1	0	8,9%	100,0%	7		
22	10	86	78	51	SANTA CRUZ	----	Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia - Convenio		8	4,0	1/11/07	30/10/09	16.000	81.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	88	50	51	MENDOZA	7	Doble Vía - Santa Rosa - Desaguadero		8	108,0	1/11/07	31/10/10	400.000	437.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	90	74	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	km 198,65 - km 266,41	8	67,8	1/9/07	31/3/08	20.625	39.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	92	6	51	BUENOS AIRES	----	Acceso a Campo Universitario Tandil		8	1,0	1/11/07	31/10/08	3.000	41.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	93	6	51	BUENOS AIRES	----	Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez		8	0,5	1/11/07	31/10/09	12.000	88.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	96	6	51	BUENOS AIRES	177	Empalme R.P. N° 21 - Alto Nivel R.N. N° 9 - Pergamino		8	7,8	1/11/07	31/10/08	6.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	97	6	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Límite con Santa Fe		8	50,0	1/11/07	31/10/08	8.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	98	82	51	SANTA FE	178	Límite con Buenos Aires- Emp. R.N.N° 33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	1/11/07	31/12/08	42.285	108.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	99	18	51	CORRIENTES	----	Isla Apipe San Antonio - Puerto Tonla		8	S/D	1/11/07	30/10/08	2.000	14.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III													6.160.308	115.636.000	94.761.454	81.609.168					

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																				
22	11	4	14	51	CORDOBA	RP 21	R.P. N° 20 - R.P. N° 19 - Pte s/A° El Gato y San Antonio		8	0,2	1/11/07		5.000	48.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	5	30	51	ENTRE RIOS	RP 42	Pte Mendez - Casariego (s/ Río Gualeguaychu)- R.P. N° 136		8	15,0	1/11/07		6.000	73.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	6	70	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lte. con Mendoza	8	35,3	20/9/07		42.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	9	66	51	SALTA	S/N°	Tolombon - Hualinchay		8	40,0	1/11/07		15.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	11	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N. N° 12 - Mercedes		8	73,0	1/9/07		20.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	12	70	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	1/11/07	31/10/09	6.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	13	14	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Río Cuarto		8	285,0	1/11/07	31/10/12	900.000	4.572.000	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	14	78	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección RNN° 228 Y RPN° 73		8	0,5	1/11/07	31/10/08	3.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	19	66	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	1/11/07	31/10/12	200.000	1.041.000	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	20	14	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. c/San Luis		8	18,0	1/11/07	31/10/09	12.000	299.000	1	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	11	21	14	51	CORDOBA	PU203	R.N.N° 9 - Capilla Los Remedios		8	8,1	1/11/07	30/10/09	15.000	924.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	28	50	51	MENDOZA	7	Acceso a Mercado Cooperativo	km 1034,9	8	1,0	1/6/07	30/11/07	2.366	17.000		1	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	29	86	51	ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. R.N. N° 9 (N) - Emp. R.N. N° 9 (S)	8	7,5	1/6/07	31/5/09	43.799	121.000		1	0	0,0%	0,0%	2	
22	11	30	30	51	ENTRE RIOS	S/N°	Trama urbana Ciudad de Nogoyá	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.P. N° 26	8	3,8	1/6/07	30/11/07	7.260	46.000		1	0	0,0%	0,0%	15	
22	11	31	54	51	MISIONES	12	Lte. C/Corrientes - A° Itaembé - Acc. A Garupá	Variante R.N. N° 12	8	21,5	1/4/07	31/3/09	40.000	417.000		1	0	0,0%	0,0%	4	
22	11	32	70	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	1/11/07	31/10/10	54.000	165.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	33	62	51	RIO NEGRO	151	Emp. Acceso a Dique Ballester		8	S/D	1/11/07	31/10/08	4.000	61.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	34	62	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.P.N° 69 y Acc. A Bahía Manzano		8	S/D	1/11/07	31/10/08	3.000	61.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	35	38	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N.N° 66 - Emp. R.N.N° 34	8	13,0	1/11/07	31/10/10	60.000	469.000	375.001		0	0,0%	0,0%	0	
22	11	36	38	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.N° 66 - Emp. R.N.N° 34	8	40,0	1/11/07	31/10/09	50.000	375.000	300.001		0	0,0%	0,0%	0	
22	11	37	38	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acc. a San Pedro de Jujuy		8	60,0	1/11/07	31/10/09	150.000	750.000	600.001		0	0,0%	0,0%	0	
22	11	39	86	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114.000 - 137,416	8	23,4	1/11/07	31/10/09	30.000	127.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	40	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte con Chile		8	---			42.846	298.000		1	0			7	
22	11	43	78	51	SANTA CRUZ	----	Desvío Tránsito Pesado por Av. Asturias		8	10,0	1/11/07	31/10/10	60.000	255.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	45	90	51	TUCUMAN	157	Vte Bella Vista - Emp. Aut. R.N. N° 38		8	8,0	1/9/07	31/10/09	50.000	102.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	46	82	51	SANTA FE	Av. 27 de Febrero y L.N. Alem	Remod. Av. 27 de Febrero y Av. Alem	Av. 27 de Febrero y L.N. Alem	8	*2,65			20.300	282.000		1	0			7	K
22	11	47	30	51	ENTRE RIOS	12	Acc. a San Benito - Av. Almafuerte (Paraná)	Acc Sur a Parana	8	3,1	1/11/07	31/10/09	15.000	73.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	48	70	51	SAN JUAN	P511	San Agustín del Valle Fértil - San Ramón		8	50,0	1/11/07	31/10/10	70.000	127.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	49	30	51	ENTRE RIOS	P20	I - R.P. N° 39 - Las Moscas	Sección I	8	30,6	1/11/07	31/10/10	50.000	132.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	50	30	51	ENTRE RIOS	P20	II - Las Moscas - Villaguay	Sección II	8	24,4	1/11/07	30/10/10	50.000	125.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	51	30	51	ENTRE RIOS	P51	I - Larroque - Estacion Parera	Sección I	8	27,4	1/11/07	30/10/09	40.000	95.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	52	30	51	ENTRE RIOS	P51	II - Estación Parera - Urdinarrain	Sección II	8	14,2	1/11/07	30/10/09	40.000	76.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	53	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	1/11/07	31/10/09	30.000	107.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	54	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	1/11/07	31/10/09	30.000	112.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	55	86	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Seccion III: 92.000 - 114.000	8	25,0	1/11/07	31/10/09	30.000	112.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	56	14	51	CORDOBA	PE86	Achiras - Sampacho		8	36,8	1/11/07	31/10/10	60.000	675.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	57	14	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo		8	6,2	1/11/07	31/10/08	10.000	207.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	58	14	51	CORDOBA	PS 358	La Palestina - Arroyo Cabral		8	15,2	1/11/07	31/10/09	20.000	293.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	59	14	51	CORDOBA	P23	Alpa Corral - El esquinaso		8	39,8	1/11/07	31/10/09	35.000	374.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	60	14	51	CORDOBA	PE 79	Tancacha - Villa Ascasubi		8	13,3	1/11/07	31/10/09	25.000	395.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	61	14	51	CORDOBA	----	Acc. a Sanatorio J.J. Puente		8	8,1	1/11/07	31/10/08	12.000	270.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	62	14	51	CORDOBA	P 32	La Posta - Las Arrias		8	24,8	1/11/07	31/10/09	30.000	332.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	63	14	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N. N° 13 - KM. 17		8	6,0	1/11/07	31/10/08	8.000	279.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	64	62	51	RIO NEGRO	----	Circuito Turístico Tronador - Cascada Los Alerces		8	67,0	1/11/07	31/10/08	3.000	82.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	65	14	51	CORDOBA	RP N° 34	Puesto Bustos - Giulio Cesare	Intersecc.c/ Acc. al P.N.Quebrada del Condorito y Camino de Acc.	8	S/D	1/11/07	31/10/08	5.000	138.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	66	78	51	SANTA CRUZ	RP N° 63	Emp. R.N. N°3 - Parque Nacional Monte León (Costa)	Acc. Parque Nacional Monte Leon	8	30,0	1/11/07	31/10/10	50.000	1.222.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	67	90	51	TUCUMAN	RP N° 330	Alpachiri - Río Jaya	Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos	8	12,7	1/11/07	31/10/09	10.000	183.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	68	30	51	ENTRE RIOS	S/N°	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	1/11/07	31/10/09	10.000	144.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	69	22	51	CHACO	S/N°	Capitan Solari - Parque Nacional Chaco	Acceso a Parque Nacional Chaco	8	5,2	1/11/07	31/10/08	5.000	113.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	70	66	51	SALTA	RP N° 20	Emp. R.P. N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	1/11/07	31/10/09	20.000	260.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	71	70	51	SAN JUAN	S/N°	Chigua de abajo - Quebrada alcaparrosa	Acc. Parque Nacional San Guillermo	8	60,0	1/11/07	31/10/09	20.000	611.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	72	38	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Límite con Salta - Abra Pampa	Sección I	8	40,0	1/11/07	31/10/10	50.000	509.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	73	90	51	TUCUMAN	RP N° 307	Tafi del Valle - Limite con Catamarca		8	60,0	1/11/07	31/10/10	50.000	519.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	74	10	51	CATAMARCA	RP N° 46	Belen - Andalgalá	Belén - Cuesta de Belén	8	32,0	1/11/07	31/10/10	50.000	464.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	75	10	51	CATAMARCA	RP N° 219	Acc. Ruinas el Shincal		8	6,0	1/11/07	31/10/08	6.000	92.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	76	74	51	SAN LUIS	RP N° 29	Ruta de los Dinosaurios	L. Chañarienta - L. Liebres	8	63,0	1/11/07	31/10/10	45.000	326.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	77	46	51	LA RIOJA	RN N° 75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial	8	6,0	1/11/07	31/10/09	10.000	263.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	78	42	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N. N° 35 - Emp. R.N. N° 22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. R.N. N° 22)	8	25,5	1/11/07	31/10/09	15.000	330.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	79	82	51	SANTA FE	RN N° 177	Emp. R.P. N° 21 - Alto nivel R.N. N° 9		8	7,8	1/6/07	31/3/08	10.034	101.000		1	0	0,0%	0,0%	2	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
22	11	80	6	51	BUENOS AIRES	RP N° 72	San Francisco de Bellocq - Copetonas - Acc. Balneario Reta	Puente sobre el Arroyo Claromecó	8	67,0	1/11/07	31/10/11	90.000	181.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	81	70	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N. N° 141 - Caucete y Difunta Correa	Seccion: I y la: Acc. D. Correa - Lado Norte	8	29,8	1/11/07	31/10/08	7.000	114.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	82	82	51	SANTA FE	0	Enlace Autopista R.N. N°9 - R.P. N° 21		8	S/D	1/11/07	31/10/08	10.000	1.000.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramientoy Reposición de Rutas Fase IV														2.862.605	21.300.000	1.275.064	0				
Total Construcciones														28.649.812	#####	1.783.839.343	677.165.552				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO (C.Re.Ma.)																					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I																					
26	1	1	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	13	111,4	26/5/97	30/5/05	14.043	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	2	78	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto.	13	132,3	24/4/97	30/12/04	13.515	100.000	100.000	0	0,0%	99,7%	7		
26	1	3	42	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	3/7/97	25/7/04	9.733	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	4	46	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. a C.del Eje - Chemical	13	243,8	18/6/97	30/6/04	11.169	256.000	256.000	0	0,0%	97,7%	8		
26	1	6	66	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	4/6/97	31/8/07	21.090	43.000	455.679	341.758	1,6%	84,1%	6		
26	1	7	66	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/4/97	31/8/07	22.299	217.000	599.470	599.468	0,6%	77,9%	6		
26	1	8	46	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/ Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	4/7/97	30/9/04	17.762	583.000	583.000	0	0,0%	96,7%	7		
26	1	9	38	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	5/4/97	13/10/04	12.709	100.000	232.900	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	10	22	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/5/97	31/7/06	22.231	832.000	832.000	384.401	0,0%	99,7%	7		
26	1	11	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	10/4/97	31/8/06	19.845	461.000	461.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	12	18	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.R.N. N° 117-Emp.R.P. N°155-Km 139,00-Emp. R.N. N°14- Emp.R.N. N°14-Yapeyú	13	144,7	7/7/97	30/7/06	27.283	581.000	581.000	0	0,0%	85,8%	7		
26	1	13	30	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	13	271,4	27/8/97	24/3/08	23.850	226.000	226.000	226.000	3,3%	97,8%	6		
26	1	14	18	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 - Km. 139,00	13	217,6	3/11/97	5/4/04	20.456	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	15	22	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/2/98	31/7/07	17.433	943.000	943.000	487.028	2,7%	97,6%	6		
26	1	16	18	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/ Misiones	13	122,5	7/7/97	12/9/04	15.340	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	17	54	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	19	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50	13	204,7	18/7/97	30/11/04	16.672	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	21	70	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan	13	286,8	15/8/97	15/8/03	16.006	100.000	2.057.815	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	22	46	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N°N° 74	13	231,6	2/8/97	31/12/02	6.378	100.000	350.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	23	46	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina	13	292,0	13/1/98	26/1/04	10.860	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	24	46	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Emp. R.N. N° 74 - Emp. R.N. N° 60 / Patquia - Emp. R.N. N° 40N	13	327,8	30/9/97	30/6/04	17.876	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	25	26	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11/11/97	31/10/07	19.294	193.000	453.000	319.776	1,6%	97,2%	6		
26	1	26	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. R.N. N° 281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	12/2/05	20.207	2.105.000	2.105.000	0	0,0%	89,6%	7		
26	1	28	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	13/1/98	11/3/08	21.453	262.000	262.000	0	0,6%	96,1%	6		
26	1	29	6	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N R.N.N°3-P.Alta/Emp. R.N.N°3-Emp. R.N.N° 229/Emp. R.N. N°3-Pte. s/R. Colorado	13	167,1	17/7/97	14/4/07	20.221	228.000	308.598	308.593	1,9%	98,0%	6		
26	1	31	82	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	9/12/97	30/12/05	26.066	121.000	121.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	32	26	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. R.N.N° 40S-Emp. R.N.N°258-Emp. R.N.N°25 Emp. R.N. N° 40S Trevelin	13	201,2	1/12/97	31/12/07	29.160	194.000	1.849.287	1.698.165	1,5%	87,4%	6		
26	1	33	26	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	25/11/04	21.472	100.000	100.000	0	0,0%	99,8%	7		
26	1	34	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	1/8/97	6/10/04	17.069	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	35	62	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche - Lte. c/ Chubut	13	141,9	1/4/98	31/12/08	19.905	495.000	495.000	147.289	1,7%	80,5%	6	A	
26	1	36	74	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.c/S Juan y Lte.c/La Rioja	13	187,7	17/6/98	10/5/04	13.993	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	37	74	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/1/98	15/4/04	13.402	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	38	14	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús Maria-Lte.S.Del Estero-Emp. R.N. N° 9-Lte.c/Catamarca	13	309,5	12/7/97	31/5/05	15.095	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	39	74	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147	13	245,6	20/6/97	28/2/04	14.250	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	40	42	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	23/6/97	30/9/04	18.091	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
26	1	41	6	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	4/3/98	31/12/07	24.383	196.000	392.552	392.550	2,4%	88,3%	6		
26	1	43	50	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.L Pampa - Carmensa / S.Rafael - Emp.405	13	223,3	13/8/97	4/2/04	15.295	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	44	30	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	28/2/08	12.123	160.000	160.000	134.307	3,3%	92,3%	6		
26	1	45	14	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. A Quines	13	220,0	5/9/97	5/9/04	18.064	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	46	30	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	3/10/97	30/4/08	26.327	360.000	360.000	210.168	2,4%	96,9%	6		
26	1	47	6	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	5/11/97	28/2/07	24.055	308.000	668.000	644.844	2,9%	99,5%	6		
26	1	48	62	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/6/97		14.919	100.000	718.787	715.313	0,0%	96,3%	7		
26	1	50	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	31/7/97		17.642	239.000	239.000	0	0,0%	98,6%	7		
26	1	51	58	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	31/8/04	11.713	100.000	100.000	0	0,0%	85,4%	8		
26	1	52	58	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Río Negro- Emp.Rn N° 237-Emp.Rn N° 234	13	275,5	14/11/97	31/1/05	15.807	171.000	171.000	0	0,0%	98,9%	7		
26	1	53	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	3/12/97	31/12/02	6.976	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	54	58	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/97	28/2/08	23.399	163.000	383.000	294.651	1,9%	97,6%	6		
26	1	55	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	9/10/97	9/10/04	14.026	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	57	46	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D. Tello / Emp. RNN° 79 - Lte.C/San Juan	13	282,8	13/11/97	5/5/04	13.412	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	60	62	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	25/7/97		14.994	220.000	220.000	0	0,0%	98,5%	7		
26	1	61	26	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Emp. R.N. N° 3-Emp. R.P. N° 20	13	140,7	23/6/97	31/12/06	23.496	69.000	384.000	304.261	2,5%	81,7%	6		
26	1	62	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp.R.N. N° 33	13	104,8	20/5/99	28/2/08	14.584	135.000	135.000	0	2,7%	95,7%	6		
26	1	63	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	64	82	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco	13	209,1	19/12/97	30/11/03	21.313	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	65	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatè Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	30/11/07	19.278	43.000	43.000	0	0,8%	95,0%	6		
26	1	66	62	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	23/2/98	14/10/07	24.458	98.000	687.163	413.551	11,7%	82,7%	6	A	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I														1.002.685	12.702.000	20.133.251	7.622.123				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento II																					
26	2	24	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	1/12/04	30/9/09	46.074	2.099.400	8.233.566	1.851.788	0,6%	83,3%	6		
26	2	37	34	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.R.N. N° 95 - Las Lomitas / Emp. R.N. N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	1/1/05	30/9/09	49.896	2.462.100	7.794.001	161.805	1,0%	91,5%	6		
26	2	50	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	1/12/04	30/9/09	43.456	2.238.200	8.405.032	800.575	0,8%	90,7%	6		
26	2	66	70	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N - Arrequeintin (O.faltantes)	13	313,8	9/9/03	31/3/08	19.509	3.940.100	9.078.154	1.533.542	2,2%	89,9%	6		
26	2	68	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	1/3/05	30/9/09	41.307	4.384.100	7.414.001	195.059	0,7%	100,0%	6		
26	2	69	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	1/11/05	30/10/10	42.231	7.986.300	12.076.001	6.146.330	22,1%	94,3%	6		
26	2	70	42	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	1/5/05	30/9/09	42.652	6.639.500	8.646.292	1.548.986	4,7%	69,0%	6		
26	2	71	82	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/1/07	37.498	99.200	7.186.890	190.819	0,1%	99,3%	7		
26	2	72	82	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/1/04	8/1/08	27.290	86.800	7.086.800	64.550	0,3%	93,3%	6		
26	2	78	90	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frías	13	114,6	1/2/05	31/1/10	36.957	2.250.600	7.726.001	97.001	0,8%	90,8%	6		
26	2	79	46	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37	13	166,7	3/12/04	30/11/08	55.542	8.186.400	13.522.493	5.493.005	5,8%	96,0%	6		
26	2	80	10	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	2/5/05	30/4/10	52.946	7.653.900	7.469.001	248.912	0,9%	90,4%	6		
26	2	81	90	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/6/01	30/11/08	24.284	913.800	7.295.001	76.129	0,5%	92,1%	6		
26	2	93	50	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	5/6/01	30/4/08	30.706	1.848.300	7.634.222	7.280	0,6%	84,9%	6		
26	2	94	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	1/2/05	2/3/10	42.472	2.638.100	7.851.001	87.261	0,6%	92,6%	6		
26	2	95	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	1/4/05	30/9/09	42.587	7.392.800	13.885.001	5.187.420	0,4%	92,4%	6		
26	2	97	42	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	1/4/05	31/3/10	39.546	4.374.100	6.411.001	294.460	1,1%	90,8%	6		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
26	2	98	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	1/3/05	27/2/10	40.405	1.972.300	7.701.782	133.446	0,5%	93,9%	6		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II														715.358	67.166.000	155.416.240	24.118.368				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento III																					
26	3	1	82	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P. Sec. N° 286 - Lte. con Sta Fe/ Chaco	13	79,0	1/11/07	30/11/12	43.116	703.000	703.000	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	2	30	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte. c/Rep. Uruguay	13	151,8	1/1/05	30/12/09	44.902	3.121.000	5.181.941	376.035	1,2%	90,0%	6		
26	3	3	30	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	1/1/05	30/9/09	41.470	1.181.100	6.181.100	272.011	0,9%	90,3%	6		
26	3	4	26	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel R.N. N° 25 / Emp. R.N. N° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	1/10/05	30/9/10	46.302	9.539.400	12.999.576	3.460.175	11,0%	61,9%	6		
26	3	5	62	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti y Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/1/05	13/1/10	54.523	2.135.900	6.376.973	352.313	0,6%	80,8%	6		
26	3	6	26	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -CHUBUT	Lte.c/Río Negro - Emp. R.N. N° 259	13	149,1	1/9/07	31/8/12	97.343	2.274.700	2.274.700	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	7	74	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp.R.N. N° 147	13	253,8	1/2/05	31/1/10	36.998	2.061.500	3.923.342	361.840	0,9%	89,4%	6		
26	3	8	74	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetqueñ - Emp. R.P. N° 3	13	129,4	1/9/05	30/11/10	39.850	8.841.200	17.670.326	8.829.121	8,0%	89,8%	6		
26	3	9	82	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P. N° 65	13	179,7	31/5/07	30/7/11	54.970	5.966.800	5.966.800	0	0,0%	0,0%	16		
26	3	10	50	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N. N° 405 - Lte. c/Chile	13	182,5	1/5/07	30/4/12	85.689	29.890.900	29.890.900	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	11	70	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	2/5/05	2/4/10	73.467	9.829.400	12.034.501	2.205.097	6,4%	80,9%	6	C	
26	3	12	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Pte) - S. Del Estero (Ent)	13	120,9	1/1/06	30/12/10	52.800	16.275.700	23.832.224	7.556.523	8,1%	52,7%	6		
26	3	13	38	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	1/10/05	31/10/10	38.651	9.908.300	18.049.914	8.141.613	15,8%	88,2%	6		
26	3	14	86	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. R.N.N° 38	13	151,9	1/8/05	30/8/10	46.167	13.030.000	22.014.691	8.984.690	17,4%	86,2%	6		
26	3	15	90	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N° 329	13	128,0	1/4/05	30/3/10	43.830	5.471.500	7.958.293	2.486.791	5,2%	88,3%	6		
26	3	16	30	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp. R.N.N° 12	13	99,9	1/3/05	31/3/10	45.230	5.221.100	5.570.060	36.004	0,9%	88,7%	6		
26	3	17	78	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N. N° 3	13	180,1	1/11/07	31/10/12	81.023	678.000	678.000	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	18	26	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. R.N.N° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	1/12/04	29/11/09	47.004	7.837.500	8.347.357	390.171	0,8%	57,5%	6		
26	3	19	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	1/12/04	29/11/09	40.100	5.576.200	5.955.051	339.757	1,1%	69,7%	6		
26	3	20	42	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El Carancho	13	128,5	2/1/06	30/12/10	36.670	9.939.300	16.141.258	4.221.649	15,3%	61,2%	6	C	
26	3	21	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpav - Allen	13	146,5	1/5/05	28/4/10	49.030	6.857.200	9.930.883	452.600	0,9%	88,0%	6		
26	3	22	58	51	NEUQUEN	231 - 237 - 405	Malla 109 - Neuquén	Emp.R.N.N°405-Lte. c/Chile / A°La Teresa	13	291,2	1/2/05	31/1/10	47.996	5.467.700	11.075.276	1.310.642	8,2%	76,7%	6		
26	3	23	46	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chamical / Emp. R.P. N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	1/7/05	29/6/10	48.848	6.501.400	8.014.878	1.513.476	2,2%	78,7%	6		
26	3	24	70	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan	13	286,1	1/6/05	30/11/10	49.000	8.769.200	12.359.145	3.589.943	8,6%	71,9%	6		
26	3	25	50	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.L Pampa-Carmensa/San Rafael-Emp. R.N.N° 40	13	223,3	1/3/05	27/2/10	37.642	2.773.800	3.114.647	203.186	1,2%	87,0%	6		
26	3	26	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	1/7/05	30/8/10	44.867	10.241.700	12.756.598	2.514.896	12,5%	75,6%	6		
26	3	27	18	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	1/11/07	31/10/12	48.847	1.758.887	1.758.887	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	28	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	1/5/07	30/5/11	35.536	905.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	29	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. R.N. N° 3 - km 112,78	13	112,8	1/9/07	31/8/12	68.181	1.536.900	1.536.900	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	30	58	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp.R.N. N° 40-P.Traful y nvo pte s/R.Aluminé	13	140,0	1/5/07	30/4/12	43.943	1.403.600	1.403.600	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	31	82	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. R.P.N° 2 - Emp. R.P.N° 286	13	126,0	1/11/07	30/10/12	39.722	1.367.800	1.367.800	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	32	14	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	1/11/07	30/10/12	91.463	2.101.100	2.101.100	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	33	14	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	1/11/07	30/10/12	60.000	908.300	908.300	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	34	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	1/5/07	30/4/12	86.813	2.625.000	15.065.548	7.014.450	0,0%	0,0%	0		
26	3	35	90	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N R.N. N° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	1/12/06	30/4/12	79.900	27.952.700	22.647.861	6.519.840	3,8%	3,8%	6		
26	3	36	10	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	63,0	1/11/07	31/10/12	45.990	623.800	623.800	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	37	18	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N. N° 123 - Emp. R.N. N°123	13	109,3	1/11/07	30/10/12	49.194	1.129.100	1.129.100	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	38	26	51	CHUBUT	405-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N. N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	1/6/07	29/5/12	104.904	2.273.000	2.273.000	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	39	58	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	1/11/07	31/10/12	77.368	2.395.600	2.395.600	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	40	26	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	1/11/07	31/10/12	41.050	4.169.100	4.169.100	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	41	62	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. R.N.N°22-Emp. R.N. N°250 /	13	340,7	1/11/07	31/10/12	27.370	3.511.600	3.511.600	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
26	3	42	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P. N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	1/11/07	31/10/12	50.784	1.165.600	1.165.600	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	43	6	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N. N° 33	13	104,8	1/11/07	31/10/12	47.183	1.084.300	1.084.300	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	44	6	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.R.N. N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N. N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N. N°3-Emp.R.N. N°229	13	167,7	1/11/07	31/10/12	7.515	1.733.600	1.733.600	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	45	74	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte. sobre Río Diamante	13	211,2	1/5/07	30/4/13	50.554	1.590.300	1.590.300	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	46	66	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - C Quijano / Talapampa - Río Ancho	13	105,4	1/11/07	31/10/12	65.849	1.097.400	1.097.400	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	47	54	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	1/11/07	31/10/12	91.000	2.693.900	2.693.900	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	48	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 95	13	181,4	1/6/07	29/5/12	53.800	1.854.500	1.854.500	0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III														2.594.454	255.974.587	341.113.231	71.132.823				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV																					
26	4	1	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	1/11/07	31/10/12	60.183	1.783.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	2	42	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro - Emp. R.N. N° 143	13	233,8	1/11/07	31/10/12	69.000	2.556.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	3	42	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	1/11/07	31/10/12	99.900	2.960.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	4	50	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	93,2	1/6/07	29/5/13	47.890	20.844.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	5	50	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N. N° 40S	13	238,6	1/8/06	1/8/12	43.479	18.188.000	1.662.102	1.662.043	1,2%	5,6%	6		
26	4	6	50	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N. N° 144 - Malargüe	13	98,0	1/11/07	31/10/12	44.100	479.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	7	30	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 131 - Emp. R.N. N° 127 / Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 32	13	133,3	1/7/07	30/6/12	77.854	1.990.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	8	18	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	101,6	1/7/07	30/6/12	70.907	1.355.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	9	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	1/11/07	31/10/12	88.892	1.507.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7	1/11/07	31/10/12	39.758	1.767.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	11	18	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp. R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyú	8	144,7	1/8/06	30/4/12	47.315	16.858.000	814.872	814.869	1,3%	6,1%	6		
26	4	12	30	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2	1/11/07	31/10/12	116.618	2.073.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	13	46	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	1/11/07	31/10/12	32.670	968.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	14	38	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	1/11/07	31/10/12	101.300	1.933.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	15	10	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	1/11/07	30/10/11	62.618	1.855.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	16	46	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp. R.N. N° 79 - Emp. R.N.N° 38	13	102,5	1/11/07	31/10/12	45.000	1.367.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	17	10	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	1/6/07	29/5/12	106.245	3.148.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	18	34	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 - Fin Pavimento	13	171,0	1/6/07	29/5/12	30.689	1.364.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	19	18	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	1/11/07	31/10/12	114.700	3.399.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	20	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	1/11/07	30/11/09	50.117	1.451.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	21	26	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N. N° 3 - Emp. R.P.N° 20	13	140,7	1/7/07	30/6/12	98.720	2.605.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	22	58	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	1/11/07	31/10/12	60.633	1.797.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	23	6	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N. N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	1/11/07	30/10/12	85.046	2.196.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	24	14	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	1/2/07	31/1/13	64.644	29.297.000	1	0	3,6%	3,6%	6		
26	4	25	6	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N. N° 3	13	259,4	1/11/07	30/8/10	70.000	1.164.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	26	82	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4	1/11/07	31/10/12	55.544	1.646.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	27	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	1/11/07	30/10/12	125.100	3.707.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	28	58	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	1/11/07	30/1/12	51.503	1.526.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	29	46	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp RN 74 / Patquia - Emp R.N. N° 40	13	300,8	1/7/06	28/6/12	68.138	30.427.000	714.318	714.316	0,8%	5,8%	6		
26	4	30	66	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N - Talapampa	13	146,3	1/11/07	30/11/10	65.849	994.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	31	22	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco - Emp R.P. N° 116	13	119,6	1/11/07	29/10/12	66.058	2.936.000	1	0					
26	4	32	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Emp. R.N. N° 50	13	205,1	1/11/07	30/10/12	48.679	2.164.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	33	30	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	1/11/07	30/10/12	66.038	1.477.000	1	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/03/2007

DATOS DE OBRA														Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles \$)	Crédito Inicial	Crédto Vigente 31/03/07	Devengado al 31/03/07	Avance 1 Trim.	Avance Total			
26	4	34	18	51	CORRIENTES	14-120-S/Nº	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N Nº 14 - Emp. R.N.N Nº 12/ Acceso a Yacireta	13	195,0	1/11/07	30/10/12	87.512	1.868.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	35	30	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp.R.N.Nº 14 - Emp.R.N.Nº 14 - Villaguay	13	173,0	1/11/07	29/10/12	77.859	2.307.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	36	6	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. Nº 86 - Emp. R.N. Nº 3	13	139,6	1/11/07	30/10/12	62.829	1.776.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	37	22	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.Nº16- Emp.R.P.Nº13	13	88,4	1/11/07	29/10/12	79.961	2.937.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	38	22	51	CHACO	95	Malla 537- I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	1/11/07	30/10/12	54.000	1.600.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	39	26	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. RP Nº62/ Km 207,27 - Km 310,8	13	103,5	1/11/07	30/10/12	98.433	1.069.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	40	26	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RN Nº62 - Km 310,80 - Km 419,69	13	107,0	1/11/07	30/10/12	74.430	809.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	41	14	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN Nº9 - Lte. C/Catamarca	13	154,1	1/11/07	30/11/12	69.354	2.055.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	42	46	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. Nº74 - Lte Catamarca/ La Rioja - Aminga	13	237,9	1/8/06	1/8/11	47.395	17.271.000	10.639.479	10.639.476	14,1%	33,9%	6		
26	4	43	50	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan	13	122,0	1/11/07	29/10/12	56.174	610.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	44	50	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN Nº20	13	78,0	1/11/07	29/10/12	70.038	759.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	45	62	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,0	1/11/07	29/10/12	42.319	1.881.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	46	62	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. R.N.Nº 251- Pasaje A Verde	13	254,0	1/11/07	29/10/12	114.291	1.242.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	47	22	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. R.N. Nº95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	1/11/07	29/10/12	64.278	698.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	48	26	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P. Nº20	13	79,0	1/11/07	29/10/12	92.309	1.003.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	49	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.Nº 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	1/11/07	29/10/12	37.930	1.124.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	50	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.Nº 12 (Norte)	13	113,5	1/11/07	29/10/12	51.053	1.513.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	51	42	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.Nº 35 - Emp. R.N.Nº 22	13	137,0	1/11/07	29/10/12	61.542	1.823.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	52	46	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.Nº31	13	212,0	1/11/07	29/10/12	100.000	2.830.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	53	46	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. R.N. Nº60 - Río Agua Clara	13	242,2	1/11/07	29/10/12	108.972	3.229.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	54	46	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp.R.N.Nº 150 -Vinchina- Patquia -Portezuelo	13	307,0	1/11/07	29/10/12	138.038	4.090.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	55	66	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	1/11/07	29/10/12	51.282	557.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	56	30	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	R.P.Nº 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/ R.P.Nº 39 Nogoya - Emp. R.P. Nº6	13	86,0	1/7/06	28/6/12	43.558	23.231.000	8.819.447	8.819.444	16,5%	40,8%	6		
26	4	58	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy		13	205,1	1/11/07	29/10/12	48.679	815.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	59	66	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N. Nº 9 y Nº 34	13	90,0	1/11/07	29/11/12	40.698	442.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	60	66	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.Nº50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	1/7/07	28/6/12	99.715	779.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	61	74	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. c/San Juan y Lte. c/La Rioja	13	188,0	1/11/07	29/10/12	84.465	2.503.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	62	96	51	INTERPROVIN CIAL	16	Malla 436		13	170,0	1/11/07	29/10/12	76.500	831.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	63	14	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	1/11/07	29/10/12	62.312	677.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	66	50	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P. Nº3 - Acc. A Colonia Alvear	13	161,5	1/11/07	29/10/12	100.000	787.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	69	70	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbas - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	1/11/07	29/10/12	40.000	652.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	70	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/ Emp.R.N. Nº40 - Arrequeintin	(3608,95 - 3671,26) - (223,15 - 333,16)	13	172,3	1/11/07	29/10/12	40.000	652.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	71	26	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Emp. Ex R.P.Nº 20 - Emp. R.N. Nº 40 / Río Mayo - Acc. a Facundo	13	175,3	11/11/07	29/10/12	52.581	857.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	72	42	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.Nº 14	13	119,8	1/11/07	29/10/12	78.000	1.143.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	73	6	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex R.N. Nº3	13	161,0	1/11/07	29/10/12	84.624	1.086.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV													4.766.318	257.287.000	22.650.281	22.650.148					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento													9.078.815	593.129.587	539.313.003	125.523.462					

Código	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Código	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

- A Certificación demorada. Valor estimado
B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C Modificación de Obra en trámite
D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J Reinicio de obra en estudio
S/D Sin datos

(*) Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/03/2007
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	785.687.610	829.748.311	169.558.299	92.885.095	7,9%
Provincia de Buenos Aires	719.247.118	723.711.400	176.129.830	131.546.984	11,2%
Provincia de Catamarca	25.811.811	28.945.438	20.624.773	20.624.773	1,8%
Provincia de Córdoba	199.441.329	149.297.064	41.384.734	40.699.811	3,5%
Provincia de Corrientes	251.519.994	242.138.706	8.789.036	8.768.148	0,7%
Provincia del Chaco	30.955.245	30.807.449	25.486.850	24.719.242	2,1%
Provincia del Chubut	103.483.733	94.057.385	35.584.326	35.301.139	3,0%
Provincia de Entre Ríos	338.613.877	342.989.735	35.695.034	24.291.384	2,1%
Provincia de Formosa	131.479.216	149.275.474	83.362.702	64.817.283	5,5%
Provincia de Jujuy	29.816.394	38.761.001	14.286.746	14.275.510	1,2%
Provincia de La Pampa	54.660.537	62.420.249	15.160.359	14.712.709	1,3%
Provincia de La Rioja	157.326.893	73.770.296	40.887.643	39.420.048	3,3%
Provincia de Mendoza	180.518.328	142.605.069	15.321.604	15.103.599	1,3%
Provincia de Misiones	82.230.654	84.738.514	30.062.845	30.062.845	2,6%
Provincia del Neuquén	54.427.201	28.132.034	11.672.353	11.669.643	1,0%
Provincia de Río Negro	167.164.072	171.722.754	52.448.041	48.326.738	4,1%
Provincia de Salta	139.769.162	114.255.581	57.981.863	49.096.821	4,2%
Provincia de San Juan	56.720.462	63.143.388	29.415.326	17.062.006	1,4%
Provincia de San Luis	16.832.283	24.533.255	21.874.257	21.874.257	1,9%
Provincia de Santa Cruz	172.252.832	172.825.220	43.446.496	43.430.329	3,7%
Provincia de Santa Fe	246.745.172	323.090.836	81.440.276	69.267.858	5,9%
Provincia de Santiago del Estero	124.016.244	127.888.785	41.700.829	41.700.829	3,5%
Provincia de Tucumán	58.864.174	112.722.133	44.160.915	41.320.900	3,5%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	11.199.467	9.298.381	2.303.222	2.303.222	0,2%
Interprovincial	671.586.609	111.376.788	56.827.282	52.923.659	4,5%
Nacional	64.680.500	216.693.515	183.950.424	183.865.878	15,6%
Binacional	110.000	110.000	11.389.869	11.389.869	1,0%
No Clasificado	64.767.932	96.920.592	25.787.271	25.328.490	2,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	4.565.979.353	1.376.733.205	1.176.789.069	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	16.245.436	150.000	0,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.200.000	1.400.000	200.000	16,7%
Ministerio del Interior	1.890.000	1.890.000	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	16.536.000	0	0,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	6.221.064.573	405.614.519	7,0%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	394.673.728	870.728	0,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	28.451.745	29.451.745	1.000.000	3,5%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	9.752.684	0	0,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	379.444.000	0	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	7.122.708.166	407.835.247	6,1%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	16.245.436	2.527.711	3.165.055	19,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.200.000	1.400.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	1.890.000	1.890.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	16.536.000	3.580.820	3.580.820	21,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	6.221.064.573	1.667.254.979	1.665.760.895	26,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	394.673.728	60.266.404	60.567.565	15,3%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	5.295.131	5.094.771	9,9%
Ministerio de Salud	28.451.745	29.451.745	2.208.289	2.208.289	7,5%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	9.752.684	2.487.404	2.487.404	25,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	379.444.000	75.769.400	75.769.400	20,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	7.122.708.166	1.819.390.138	1.818.634.199	25,5%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2007

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	131.000.000	131.000.000	30.037.409	22,9%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Acciones para Planes Federales de Vivienda	2.528.237.314	2.528.237.314	667.891.957	26,4%
Acciones para Emergencia Habitacional	154.501.046	119.211.332	19.478.260	16,3%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	208.561.221	222.561.224	47.394.681	21,3%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	80.000.000	80.000.000	15.796.982	19,7%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	155.352.698	156.552.698	53.784.112	34,4%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Metrovías S.A.	32.695.274	32.695.274	19.672.575	60,2%
Trenes de Buenos Aires S.A.	58.166.691	58.166.691	28.964.668	49,8%
Herso S.A.	0	0	26.132.235	
Ferrovías S.A.	72.271.220	72.271.220	42.205.422	58,4%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	24.505.608	24.505.608	18.997.986	77,5%
Sin discriminar	47.866.735	47.866.735	34.930.727	73,0%
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	424.466.000	424.466.000	112.081.067	26,4%
Cooperativas de Servicios Públicos	0	23.009.491	11.276.760	49,0%
Sin discriminar (a empresas privadas)	0	0	50.000.000	
Fondo Electrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	216.489.000	216.489.000	47.680.107	22,0%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	289.409.000	289.409.000	65.743.354	22,7%
<i>Atención de Emergencia para Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	85.845.285	85.845.285	17.461.322	20,3%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	0	75.000.000	264.646.842	352,9%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	54.515.452	54.515.452	12.167.638	22,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa BIRF 7353</i>				
Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales	14.100.000	14.720.728	14.120.728	95,9%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a Provincias e Institutos de Enseñanza Provinciales	141.713.606	141.713.606	17.878.663	12,6%
<i>Innovacion y Desarrollo de la Formacion Tecnologica</i>				
Transferencias a Provincias e Institutos de Enseñanza Provinciales	201.834.500	201.834.500	23.300.016	11,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asist. Financiera a Empresas Publicas y Entes Binacionales</i>				
Agua y Saneamiento Básico AySA S.A.	166.000.000	166.000.000	45.000.000	27,1%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	155.549.000	155.549.000	23.841.000	15,3%
TOTAL	5.243.079.650	5.321.620.158	1.710.484.511	32,1%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	996.360.232	1.004.170.784	322.030.731	322.572.622	17,7%
Provincia de Buenos Aires	1.092.820.956	1.189.247.734	322.072.338	321.852.649	17,7%
Provincia de Catamarca	131.163.296	131.020.855	20.224.821	21.128.542	1,2%
Provincia de Córdoba	219.752.332	326.909.587	55.521.632	55.536.719	3,1%
Provincia de Corrientes	112.421.961	114.107.993	20.171.689	20.261.484	1,1%
Provincia del Chaco	180.537.323	182.759.177	45.169.022	45.169.022	2,5%
Provincia del Chubut	191.493.889	191.501.964	50.517.152	50.590.873	2,8%
Provincia de Entre Ríos	128.860.362	166.421.719	35.227.913	35.213.111	1,9%
Provincia de Formosa	126.025.266	129.502.680	35.582.030	34.183.396	1,9%
Provincia de Jujuy	167.899.530	177.407.263	31.113.439	31.113.439	1,7%
Provincia de La Pampa	77.905.708	77.912.377	22.947.964	22.947.964	1,3%
Provincia de La Rioja	150.353.907	154.362.156	17.221.609	16.146.277	0,9%
Provincia de Mendoza	152.197.384	152.839.898	23.729.671	23.729.671	1,3%
Provincia de Misiones	114.771.640	118.031.289	46.687.741	46.700.032	2,6%
Provincia del Neuquén	124.606.199	124.613.359	16.356.525	16.356.525	0,9%
Provincia de Río Negro	117.747.362	117.752.786	21.523.665	21.523.665	1,2%
Provincia de Salta	144.784.580	154.151.837	32.984.249	32.984.249	1,8%
Provincia de San Juan	192.761.108	204.517.391	58.517.404	58.517.404	3,2%
Provincia de San Luis	137.401.115	137.409.151	2.627.223	2.627.223	0,1%
Provincia de Santa Cruz	351.509.795	441.050.138	353.328.079	353.328.079	19,4%
Provincia de Santa Fe	336.895.360	336.907.097	53.075.928	53.167.331	2,9%
Provincia de Santiago del Estero	149.932.257	149.942.094	27.575.992	27.575.992	1,5%
Provincia de Tucumán	246.766.974	440.348.963	64.192.218	64.416.827	3,5%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	61.023.014	84.038.059	27.777.336	27.777.336	1,5%
Interprovincial	869.460.000	668.960.000	112.081.067	112.081.067	6,2%
Nacional	132.672.369	140.072.815	7.700	7.700	0,0%
No Clasificado	6.749.000	6.749.000	1.125.000	1.125.000	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	7.122.708.166	1.819.390.138	1.818.634.199	100,0%
