

INVERSION PUBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2007

INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende todas aquellas erogaciones que realiza la Administración Nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 30/06/2007

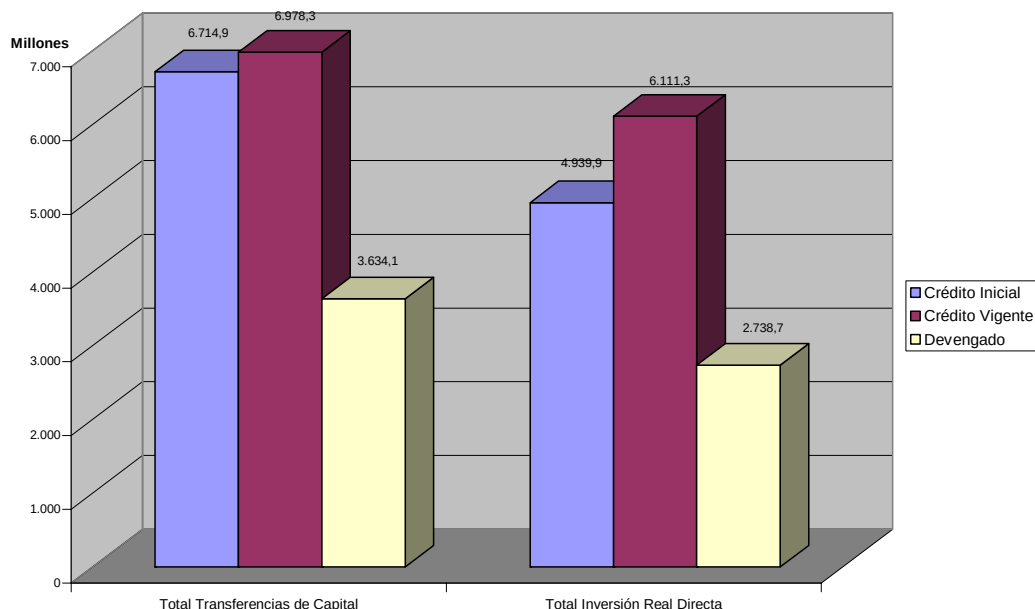


La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. El crédito inicial inherente a la IRD ascendió a \$4.939,9 millones y aumentó en \$1.171,4 millones al cierre del primer semestre (23,7%). El principal componente de la Inversión Real Directa, los Proyectos de Inversión, dispuso de una asignación crediticia de \$5.145,7 millones, mientras la Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso contó con un crédito de \$965,6 millones.

Los proyectos de inversión incluyen gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De su asignación crediticia \$4.939,6 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de \$2.424,5 millones al cierre del primer semestre), \$109,6 millones a maquinarias y equipos y \$96,5 millones a otros gastos (servicios no personales, bienes de consumo, activos intangibles, tierras y terrenos, entre otros), con una ejecución de \$29,2 millones y \$34,2 millones, respectivamente.


La Inversión Real Directa incluye además la adquisición de bienes de capital, desagregada, en su gran mayoría, en \$896,3 millones en maquinarias y equipos (con una ejecución de \$239,8 millones), \$34,5 millones en edificios e instalaciones (ejecución de \$7,2 millones) y \$28,6 millones de activos intangibles (\$2,9 millones).

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2007

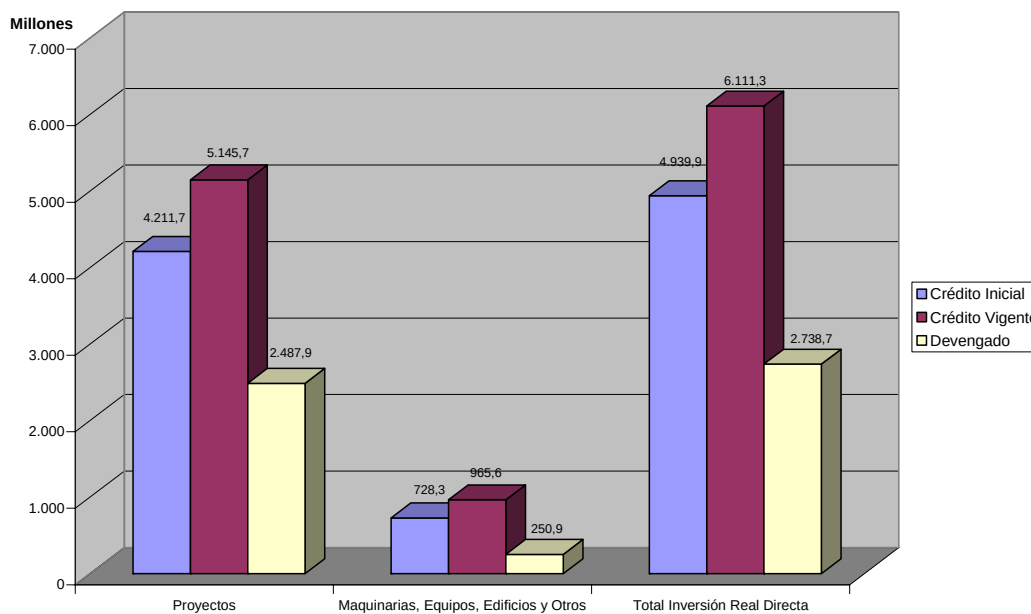

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a otros agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital (transferencias de capital) que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al cierre del semestre, sobre un crédito de \$6.978,3 millones, la ejecución financiera de las transferencias de capital ascendió a \$3.634,1 millones.

Gráfico N° 3
Ejecución Transferencias de Capital al 30/06/2007

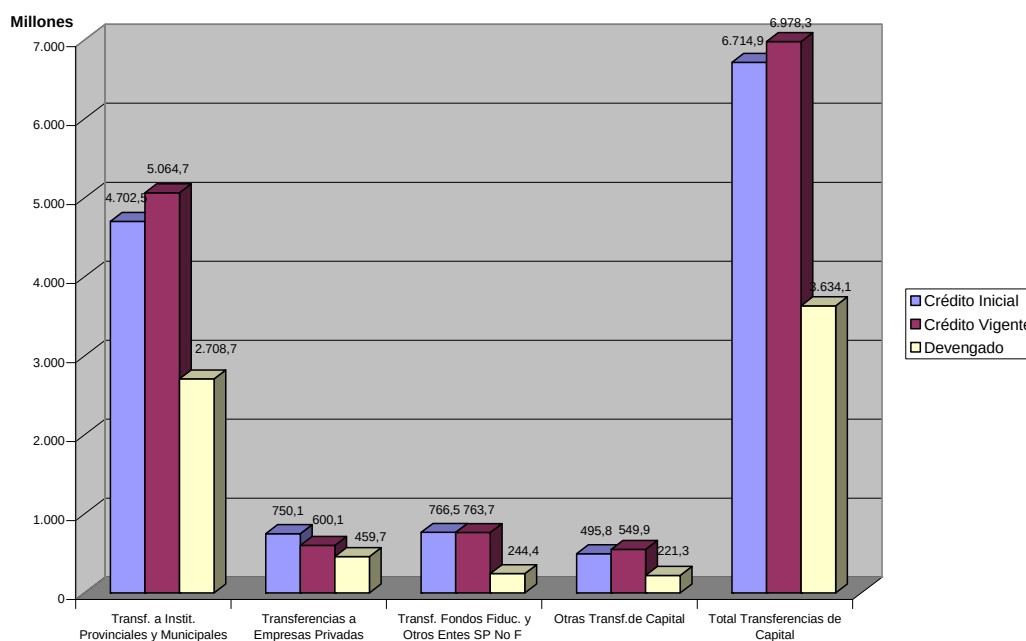

Al 30/06/2007 del monto de ejecución de las transferencias de capital, \$2.708,7 millones (74,5% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, \$459,7 millones (12,7%) a transferencias a empresas privadas, \$ 244,4 millones (6,7%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$ 221,3 millones (6,1%) a otros tipos de transferencias.

A continuación se expone un cuadro que contiene el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la Ejecución al 30/06/2007 de la Inversión Total desagregada por los principales componentes:

Cuadro N°1
Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/07 (en pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Inversión Real Directa	4.939.928.849	6.111.300.327	2.738.715.623	44,8%
Proyectos	4.211.676.829	5.145.702.627	2.487.853.632	48,3%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	728.252.020	965.597.700	250.861.991	26,0%
Transferencias de Capital	6.714.872.919	6.978.301.999	3.634.093.398	52,1%
Inversión Total	11.654.801.768	13.089.602.326	6.372.809.021	48,7%

Las Transferencias de Capital registraron una mayor ejecución que la Inversión Real Directa en el primer semestre. Asimismo se destacan los aumentos crediticios asignados a la Inversión Real Directa (23,7%) y a las transferencias de capital (3,7%).


El crédito inicial asignado a los proyectos de inversión, al 30/06/2007, registró un aumento de \$934,0 millones (22,2%) mientras que el crédito para adquisición de bienes de uso aumentó \$237,3 millones (32,6%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2007

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$2.738,7 millones durante el primer semestre, lo que implica incrementos del 67,8% respecto a igual período de 2006, del 168,6% respecto a 2005 y del 449,2% en relación a 2004.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/06/2007

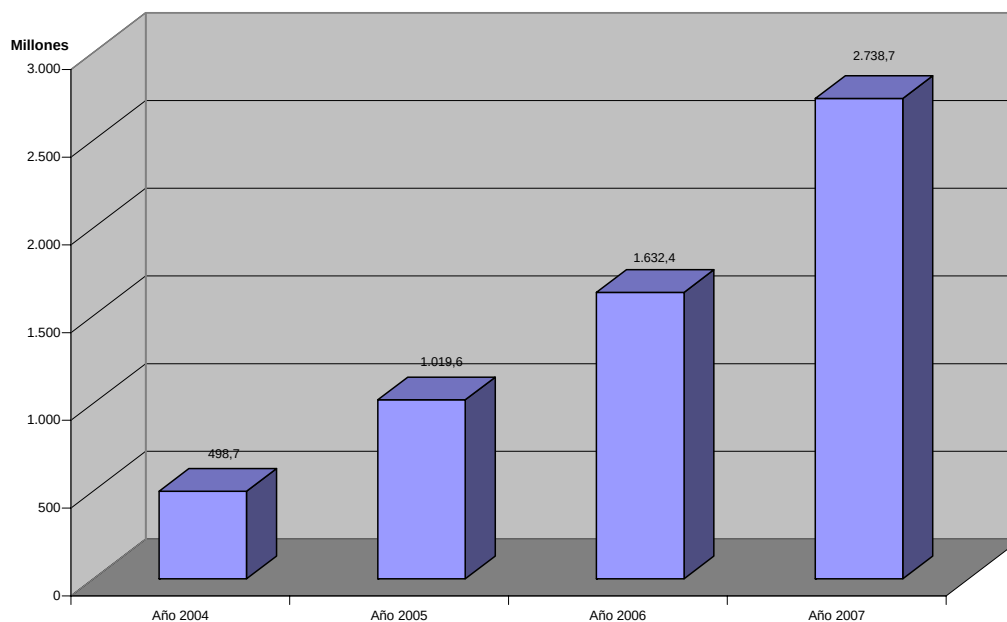

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la Inversión Real Directa, al 30/06/2007, aumentó en \$1.171,4 millones (23,7%), de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/07 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	1.147.116.081	1.404.487.753	356.831.341	25,4%
Organismos Descentralizados	3.765.769.068	4.679.768.874	2.370.821.823	50,7%
Instituciones de Seguridad Social	27.043.700	27.043.700	11.062.459	40,9%
TOTAL	4.939.928.849	6.111.300.327	2.738.715.623	44,8%


Respecto al devengado presupuestario, en la Administración Central los servicios que concentraron el gasto de IRD fueron el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios (\$149,3 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (\$88,7 millones), la Gendarmería Nacional (\$18,4 millones), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (\$14,3 millones), el programa Mejoramiento de la Calidad Educativa dependiente del Ministerio de Educación (\$13,5 millones) y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (\$11,1 millones). A nivel de Organismos Descentralizados la ejecución se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad (\$1.949,5 millones) y, en menor medida, en el Organo de Control de Concesiones Viales (\$184,4 millones), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$152,2 millones) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$40,0 millones).

2-Según Fuente de Financiamiento

Al cierre del primer semestre el financiamiento de la Inversión Real Directa con recursos del Tesoro Nacional aumentó considerablemente respecto del mismo período de 2006 (en el presente ejercicio alcanzó al 84,5% del total de la inversión contra el 50,4% del ejercicio 2006). Por su parte, las transferencias internas pasaron a financiar el 5,7% de la Inversión Real Directa frente al 30,2% que alcanzaban en el 2006.

Gráfico N° 5
Inversión Real Directa-Comparativo 2006/2007-Fuente de Financiamiento

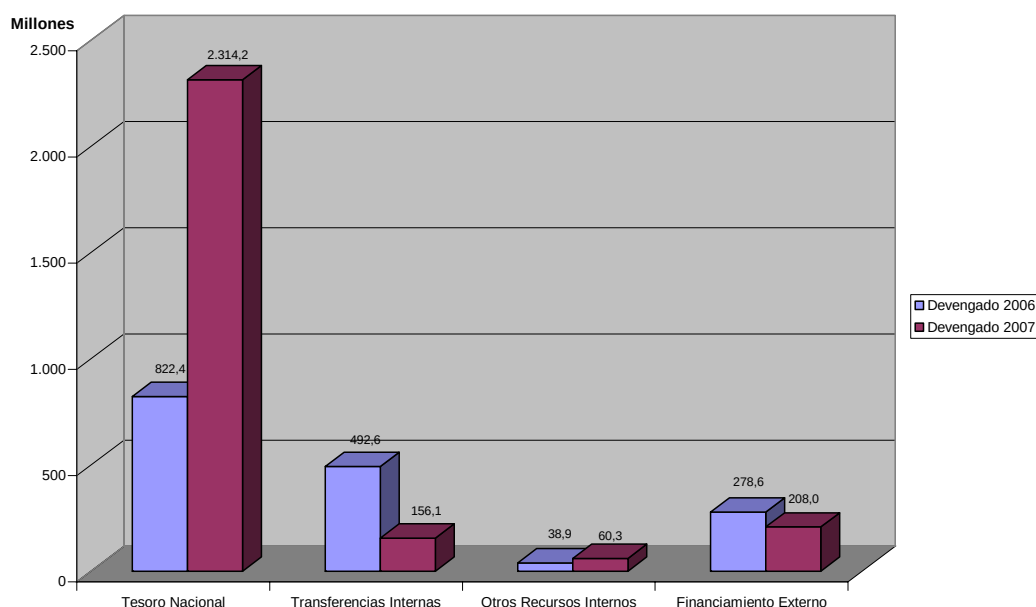

Al 30/06/2007 la ejecución del devengado, respecto de igual período de 2006, se incrementó en la fuente de financiamiento Tesoro Nacional (aumento de \$1.491,9 millones, 181,4%) y en otros recursos internos (suba de \$21,4 millones, 55,0%) y disminuyó en transferencias internas (\$336,4 millones, 68,3%) y en financiamiento externo (\$70,5 millones, 25,3%). Se aprecia un notable aumento del monto y de la participación de las rentas generales en el financiamiento de la IRD.

Cuadro N° 3

Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/07 (en pesos)


Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	2.707.071.933	3.836.263.808	2.314.217.377	60,3%
Transferencias Internas	975.131.260	984.161.710	156.139.133	15,9%
Otros Recursos Internos	376.730.007	375.763.872	60.318.327	16,1%
Financiamiento Externo	880.995.649	915.110.937	208.040.786	22,7%
TOTAL	4.939.928.849	6.111.300.327	2.738.715.623	44,8%

De los \$2.314,2 millones de ejecución, financiados con Tesoro Nacional al 30/06/2007, \$1.667,7 millones de pesos correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad (construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento C.Re.Ma., mantenimiento y actividades de conducción y administración por \$1.334,4 millones, \$190,2 millones, \$140,1 millones y \$3,1 millones, respectivamente), \$33,7 millones al Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela, \$27,3 millones al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II y \$14,9 millones al proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula (todos pertenecientes al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios). El Tesoro Nacional también financió la inversión del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$154,2 millones), del Organo de Control de las Concesiones Viales (\$161,6 millones) y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$33,2 millones), entre otras inversiones.

Respecto a la ejecución de la Inversión Real Directa con fuente de financiamiento Transferencias Internas, se incluyeron los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad y del Organo de Control de Concesiones Viales (ejecutados con transferencias del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte) por \$133,3 millones y \$22,8 millones, respectivamente.

La Inversión Real Directa con fuente de financiamiento externo se concentró en los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad en construcciones (\$126,7 millones) y el Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (\$19,1 millones). En menor medida, se financiaron los proyectos Transporte Urbano de Buenos Aires (Préstamo BIRF 4163/AR Etapa II, \$14,5 millones) y la Construcción Alteo Terraplén Laguna La Picasa (CAF 3192, \$12,8 millones), dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el equipamiento conjunto para las Misiones de Paz realizado por el Ministerio de Defensa (\$10,9 millones), entre otros.

Gráfico N° 6
Inversión Real Directa-Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 30/06/2007

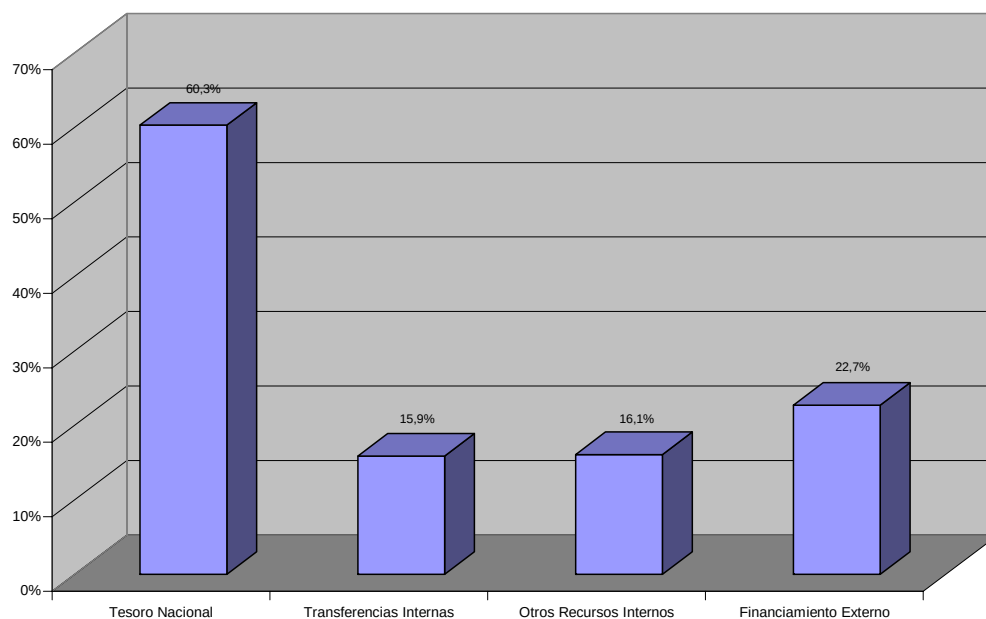

II-INVERSION REAL DIRECTA SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

La Inversión Real Directa se concentró un 36% en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los \$285,5 millones incluyendo, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (\$87,5 millones), del Organismo de Control de Concesiones Viales (\$82,1 millones) y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$55,3 millones). Además, fue importante la ejecución del proyecto Hospital El Cruce Florencio Varela (\$33,7 millones). Las obras en ejecución bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad comprenden, fundamentalmente, la R.P.Nº 9 - Campana-La Plata con \$20,6 millones, Avenida Vergara-Calle 23-Camino General Belgrano con \$12,5 millones, R.N.Nº 33 Emp.R.N.Nº 5-Estancia el Recreo con \$6,9 millones y Corredor 5 - Bahía Blanca-Emp. R.N.Nº 5 con \$6,7 millones. Las obras financiadas por el Organismo de Control de Concesiones Viales comprenden, fundamentalmente, la vinculación y remodelación en la R.N.Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P.Nº 2-Florencio Varela por \$31,8 millones, tramo Campana Zárate R.N.Nº 9 con \$15,6 millones y Autovía Cañuelas Monte Grande R.N.Nº 3 con \$11,2 millones.

En la provincia de Santa Cruz la ejecución comprendió a las obras R.P.Nº 12 Emp.R.P.Nº 25 - Pico Truncado con \$79,1 millones, R.N.Nº 288 Emp.R.N.Nº 3 - La Julia con \$53,4 millones y R.N.Nº 3 - Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Puerto Deseado con \$26,3 millones. También se ejecutaron \$14,9 millones en el proyecto Ampliación Puerto Caleta Paula bajo jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En la provincia de Santa Fe la ejecución correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$121,2 millones). Comprende obras por convenio (\$39,6 millones, destacándose la R.N.Nº 95 Empalme R.P.Nº 286-Límite con Chaco Secciones I y II), obras de mejoramiento y reposición (\$21,2 millones en R.N.Nº 7 tramo Variante Laguna La Picasa, \$17,8 millones en la R.N.Nº Río Paraná - Autopista Rosario/Córdoba y \$14,2 millones en R.N.Nº 168 Río Colastine-Túnel Subfluvial Hernandarias y \$4,7 millones en R.N.Nº 34 tramo Cruce Urbano-Rafaela) y obras en corredores viales concesionados (\$16,1 millones del Corredor Vial 3 III Etapa en R.N.Nº 11).

Respecto a la provincia de Formosa la ejecución de la inversión se concentró en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (\$64,4 millones en el proyecto R.N.Nº 81 Las Lomitas-Límite con Salta-Empalme R.N.Nº 34, \$16,4 millones en R.N.Nº 81 Límite con Chaco y \$9,5 millones en el proyecto Remodelación Cruce por Ciudad de Clorinda) y por el ENOHSA para optimización de sistemas de distribución de agua potable (\$14,4 millones).


La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una inversión de \$215,1 millones, principalmente destinados al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II (\$41,8 millones). Se aclara que, en algunos casos, los fondos no se invierten efectivamente en la ciudad, pero igualmente son imputados a la jurisdicción en virtud de que allí se encuentra el domicilio legal de los beneficiarios.

Teniendo en cuenta los datos del Censo Poblacional del año 2001 del Instituto Nacional de Estadística y Censos y la extensión territorial de cada jurisdicción se construyó un indicador de gasto de inversión real directa según densidad poblacional (habitante/km²).

El indicador de inversión real directa según densidad poblacional surge de la fórmula:

$$= \text{Inversión Real Directa} / \text{Densidad} \times 100.000$$

donde Densidad = habitantes/ Km²

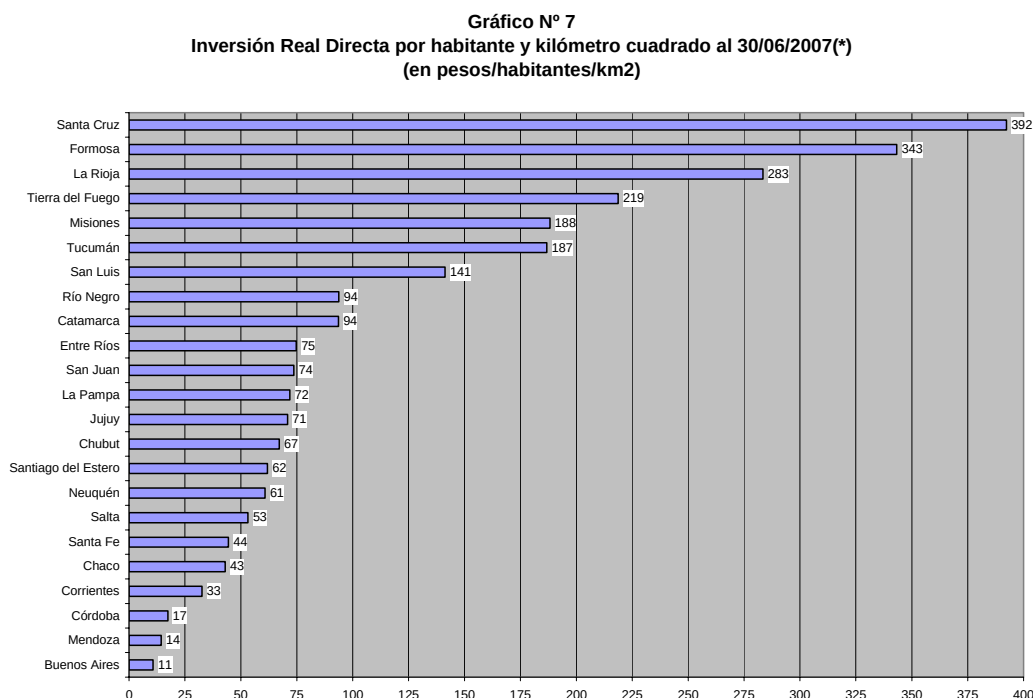

(*) En el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires por razones de escala (la Inversión Real Directa de la C.A.B.A. ascendió a 38.849 pesos por habitante/km²)

De acuerdo a este indicador la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz presentan los valores más elevados mientras que, en el otro extremo, se ubican la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

III- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este capítulo se hace referencia a la ejecución física de los proyectos de inversión. Para ello se tomó un subconjunto que representa alrededor del 88,9% del costo total de la cartera de inversión y 83,9%, aproximadamente, de la ejecución al cierre del primer semestre del ejercicio. Cabe destacar que los proyectos mencionados tienen gran relevancia económica y un importante impacto social.

Cuadro N° 4
Principales Proyectos de Inversión ordenados según monto devengado al 30/06/2007 (en pesos)

Servicio Administrativo	Programas/Proyectos	Costo Total	Devengado al 30/06/2007	% s/total deveng. Inversión Real Directa
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Construcciones de Rutas	28.352.175.000	1.561.640.596	57,0%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento	9.097.882.000	242.039.915	8,8%
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos de Mantenimiento de Rutas	517.618.000	140.058.016	5,1%
CNAE	Misiones Satelitales	530.619.181	37.685.262	1,4%
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	80.000.000	33.726.724	1,2%
OCCOVI	Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP II Florencio Varela Buenos Aires	92.573.559	31.832.107	1,2%
ENHOSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	119.804.416	25.585.713	0,9%
Secretaría de Transporte	Modernización Línea A Subterráneo	78.826.513	24.977.773	0,9%
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 Año II – I Etapa	78.884.802	24.273.676	0,9%
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 Año II – I Etapa	21.009.204	19.973.056	0,7%
Secretaría Obras Públicas	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picassa	164.845.659	18.241.969	0,7%
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 Año II – I Etapa	81.169.651	16.993.635	0,6%
ENHOSA	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación	78.500.345	15.955.446	0,6%
OCCOVI	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia de Mendoza I	78.918.314	15.938.533	0,6%
OCCOVI	Aumento de Capacidad Construcciones Viales Pcia de Buenos Aires V	80.266.598	15.551.942	0,6%
ENHOSA	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	105.672.929	15.446.314	0,6%
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	139.827.069	14.939.969	0,5%
ENHOSA	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham Morón	88.532.217	14.902.414	0,5%
ENHOSA	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable – Formosa	106.928.313	14.366.377	0,5%
OCCOVI	Aumento de Capacidad en Construcciones Viales Pcia de Buenos Aires	54.550.762	14.359.786	0,5%
Subtotal		39.948.604.532	2.298.489.223	83,9%
Total I.R.D.		44.922.528.678(*)	2.738.715.623	100,0%

(*) Costo Total de IRD según Formulación Anteproyecto 2007

El costo total considera los fondos calculados para toda la vida del proyecto de inversión (abarcando todos los ejercicios que involucran la fecha inicial y la fecha de terminación del mismo). La construcción de rutas, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad, aparece como la principal acción prevista en la actual cartera de proyectos de inversión.

A continuación se detallan los principales proyectos de inversión según el cuadro precedente, presentados primeramente los Organismos Descentralizados (por contener los proyectos más relevantes) y posteriormente la Administración Central:

Organismos Descentralizados

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional. Para este fin se han establecido diferentes sistemas de gestión que obedecen al nivel de tránsito de las rutas:

Cuadro N° 5			
Composición de la Red Vial (kilómetros)			
Comparativo al II Trimestre de 2006/2007			
Sistema	Ejec. Año 2006	Ejec. Año 2007	Var. %
	II trimestre	II trimestre	
Contratos Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.	9.355	10.697	14,3%
Concesión	8.895	8.895	0,0%
Transferencia Funciones Operativas (T.F.O.)	7.290	7.002	-4,0%
Mantenimiento Administración Propia	7.063	6.894	-5,4%
Obras (Construcciones)	3.148	4.977	58,1%
Intervenciones en Rutas Provinciales Concesionadas o no Incluidas en la Red	657	3.487	430,7%
Sistema Modular	1.855	2.197	18,4%
Construir-Operar-Transferir (C.O.T.)	626	626	0,0%
Red Accesos a la CABA - R.A.B.A.	290	290	0,0%
Red Accesos a Ciudad de Córdoba - R.A.C.	276	276	0,0%
Sistema Km/mes	195	0	-100,0%
Total Red Troncal	38.336	38.154	-0,5%

A continuación se detalla el avance físico al 30/06/2007 para cada programa y subprograma presupuestario:

-Mantenimiento por Administración

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó el mantenimiento de rutas en forma directa por 6.681 kilómetros. Se realizaron trabajos en la Red Vial, no incorporados a los otros sistemas de gestión, utilizando equipos y mano de obra propios.

-Mantenimiento Sistema Km/mes

Se finalizó el tramo Mendoza-límite con San Juan/San Martín-Mendoza/André en Rutas N.Nº 40N-7-142, con 194,7 kilómetros de longitud.

-Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (T.F.O.)

En este sistema se fija la inversión prevista para el período del convenio y se renueva la misma, previa aprobación de la certificación correspondiente. Las funciones de transferencia a las Direcciones Provinciales de Vialidad (D.P.V.) comprenden la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical. Los kilómetros mantenidos alcanzaron los 7.002.

En este subprograma se están realizando trabajos en 2.690 kilómetros. Están previstos la finalización de 2.857 kilómetros de señalización para el segundo semestre de 2007

-Obras de Emergencia

Se realizaron 8 obras de emergencia y están en ejecución otras 11 obras.

-Mantenimiento por Sistema Modular

Las obras en el sistema modular, durante el primer semestre, incluyen la ejecución de trabajos en 2.197 kilómetros y comprenden los siguientes tramos:

Cuadro N° 6
Sistema Modular
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N° 34/81	Empalme R.N.N° 50 – Límite Bolivia - Pluma de Pato	Salta	259,0
R.N.N° 25	Los Altares - Empalme Ruta N.N° 40 (S)	Chubut	277,7
R.N.N° 16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
R.N.N° 40S	Empalme R.N.N° 25 - Empalme R.P.N° 56	Chubut	289,1
R.N.N° 16	Empalme R.N.N° 95 - Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
R.N.N° 40S	Pareditas/Malargüe	Mendoza	229,7
A007	Av. B.Parera-A.Nivel R.N.N° 11 - A. Nivel R.N.N° 11- C.J.Garay	Santa Fe	14,5
R.N.N°60	Tinogasta Límite con Chile	Catamarca	254,2
R.N.N°142/40N/7	G.Andre - Empalme R.N.N°20	Mendoza	194,7
R.N.N°40/260	Empalme R.P.N°22 - Límite con Chubut - Santa Cruz - Empal.R.N.N°40 Límite con Chile	Chubut	147,1
Total			2.197,1

-Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración

Se finalizó el tramo en R.N.N°40 Malargüe/Barrancas Sección I y II (36 kilómetros en la provincia de Mendoza). Asimismo se mantenían en obra los siguientes tramos:

Cuadro N° 7
Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N°14	Guauguaychú-Paso de los Libres, Sección Intersección Empalme R.P.N° 16 - Intersección Empalme R.P.N° 20 y Sección Empalme R.P.N° 20 - Empalme R.P."J" (Colonia Elía)	Entre Ríos	45,9
R.N.N°40	Río Agua Clara Km. 809 - El Eje Km. 847	Catamarca	38,0
R.N.N°16	Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos - El Caburé y Sección Límite con Chaco - Los Pirpintos	Santiago del Estero	67,9
R.N.N°158	Villa María-Gral. Deheza	Córdoba	64,3
Total			216,1

-Obras por Convenio con Provincias

En Obras por Convenio con Provincias finalizaron los tramos R.P.N° 11 Famatina - Límite con Catamarca Secciones Campana – Límite con Catamarca y Km 25 - Campana (46,9 kilómetros en la provincia de La Rioja), R.P.N°73 Los Cajones-Anguinan (17,6 kilómetros en la provincia de La Rioja), R.N.N°14 Dos de Mayo-San Pedro Sección IV (47,4 kilómetros en la provincia de Misiones) y R.P.N°19 Wanda - Deseado (45 kilómetros en la provincia de Misiones). Al cierre del primer semestre de 2007 estaban en ejecución 1.084 kilómetros.

-Mejoramiento y Reposición de Rutas

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se finalizaron los tramos:

Cuadro N° 8
Mantenimiento y Reposición de Rutas
(Kilómetros terminados al 30/06/2007)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N°03	Laguna Khami - Rancho Hambre	Tierra del Fuego	23,0
R.N.N°40	Perito Moreno - Bajo Caracoles Sección Perito Moreno	Santa Cruz	48,8
R.N.N°81	Las Lomitas - Juan G. Bazán Km 1473-1503	Formosa	30,0
R.N.N°81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez Sección Pozo del Mortero - Laguna Yema	Formosa	27,2
R.N.N°81	Las Lomitas - Empalme R.N.N°34 Pluma del Pato	Salta	90,0
C.V.R.N.N°38/75	Emp.R.N.N°34 Secciones I, II y III		
Varías	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja		10,0
S.N°	Rehabilitaciones menores	Nacional	310,0
	Acc. Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España) Primera Etapa	Buenos Aires	2,6
R.N.N°34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia Sección 857-883	Santiago del Estero	25,0
R.N.N°134	Salto de la Rosa - San Rafael	Mendoza	5,4
Total			572,0

Además, al 30/6 estaban en ejecución 3.676 kilómetros correspondientes a obras de mejoramiento y reposición de rutas.

-Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

Comprendió trabajos de reparación de obenques en puentes sobre el Río Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas (1200 metros), sobre el Río Gallegos e/ Río Gallegos - Güer Aike (90 metros), el Puente Nuevo en Tramo Arroyo Batel y Batelito (70 metros), el Puente sobre el Río San Lorenzo e/ San Pedro - Calilegua (330 metros) y puentes sobre arroyo Feliciano e/ Cerrito-La Paz (126 metros).

-Concesión sin Peaje

Por el sistema Construir, Operar y Transferir (C.O.T.) se mantienen dos corredores que cubren 626 kilómetros (Corredor 28: Resistencia-Límite c/ Paraguay con 297,3 kilómetros y Corredor 31: Bahía Blanca-Empalme R.N.N° 5 con 329,2 kilómetros). El concesionario efectúa la inversión necesaria para que el tramo asignado llegue al nivel establecido en los términos del contrato, recibiendo un monto mensual durante la concesión de 10 años. La fecha de finalización de los contratos está prevista para el año 2011.

-Obras en Corredores Viales Concesionados

Las obras en corredores viales concesionados comprendieron la finalización de los siguientes tramos:

Cuadro N° 9
Corredores Viales Concesionados
(Kilómetros terminados al 30/06/2007)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud en kilómetros
R.N.N°03	CVN° 1 - Obra N° 10B - Villa Dorna-Empalme R.P.N°61	Buenos Aires	38,0
R.N.N°11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	Santa Fe	36,0
R.N.N°36	CVN°4 - ObraN°22 - Emp.RNN°8 - Emp.RNN°A005 -	Córdoba	42,0
A005	Emp.RNN°8-Emp.RNN°36		
R.N.N°08	CVN° 4 - Obra N° 204 - Empalme R.N.N°36 - Acceso a Suco	Córdoba	4,0
R.N.N°34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme R.P.N°80 S Emp. R.P.N°33	Santa Fe	31,0
R.N.N°7	CVN°2 Obra 23B km 568-km 585/km 613-km 616/km 866-km 871	Mendoza	5,0
R.N.N°9	CVN°3 Obra 1 Campana-Río Areco	Buenos Aires	29,0
R.N.N°5	CVN°2 Obra 11B Cruce F.C. Sarmiento Empalme R.P.N°1	Buenos Aires	33,0
Total			218,0

Asimismo, al cierre del primer semestre se encontraban en ejecución 773 kilómetros de obras correspondientes a corredores viales concesionados.

-Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

En el C.Re.Ma. I se encontraban en ejecución las siguientes mallas:

Cuadro N° 10
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Malla	Longitud en kilómetros
R.N.N°3	Malla 107A – Chubut	124,5
R.N.N°3-26	Malla 107B – Chubut	140,7
R.N.N°22	Malla 111 – Neuquén	134,8
R.N.N°40S-258-259	Malla 113 – Chubut	201,3
R.N.N°258-237	Malla 114 - Río Negro	141,9
R.N.N°3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	183,6
R.N.N°229-249-22	Malla 206 – Buenos Aires	167,1
R.N.N°3	Malla 208 – Buenos Aires	258,3
R.N.N°228	Malla 211 – Buenos Aires	139,9
R.N.N°68	Malla 401B – Salta	114,8
R.N.N°12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	271,5
R.N.N°127	Malla 506 - Entre Ríos	259,2
R.N.N°95	Malla 508 – Chaco	222,3
R.N.N°18-130	Malla 510 - Entre Ríos	173,0
R.N.N°118	Malla 512A – Corrientes	84,3
R.N.N°40-68	Malla 401A – Salta Tucumán	142,3
R.N.N°118	Malla 512B – Corrientes	113,5
Total		2.873,0

Para el C.Re.Ma. II las obras en ejecución totalizaron 2.256 kilómetros, enumeradas a continuación:

Cuadro N° 11
Contratos de Recuperación y Mantenimiento II
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Malla	Longitud en kilómetros
R.N.N°35	Malla 116A - La Pampa - Buenos Aires	138,0
R.N.N°35	Malla 116B - La Pampa	113,9
R.N.N°35	Malla 117A - La Pampa	111,3
R.N.N°35-188	Malla 117B - La Pampa	158,3
R.N.N°250	Malla 123B - Río Negro	145,3
R.N.N°40S	Malla 131 - Neuquén	104,5
R.N.N°9-11-33-34-A012	Malla 202B - Santa Fe	95,7
R.N.N°33	Malla 215 - Buenos Aires	69,3
R.N.N°33	Malla 216A - Buenos Aires	72,8
R.N.N°33	Malla 216B - Buenos Aires	71,9
R.N.N°40N-150	Malla 306 - San Juan	313,8
R.N.N°188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	161,5
R.N.N°81	Malla 338 - Formosa	171,0
R.N.N°60-157	Malla 408A - Catamarca-Santiago del Estero - Tucumán	114,6
R.N.N°38-60	Malla 408B - La Rioja-Catamarca	166,7
R.N.N°60	Malla 408C - Catamarca	171,9
R.N.N°157	Malla 409A - Tucumán	75,4
Total		2.255,9

En referencia al C.Re.Ma. III las mallas en ejecución alcanzaron los 4.291 kilómetros, detalladas a continuación:

Cuadro N° 12
Contratos de Recuperación y Mantenimiento III
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Malla	Longitud en kilómetros
R.N.N°3-25	Malla 102A - Chubut	250,4
R.N.N°3	Malla 102B - Chubut	230,4
R.N.N°22-151	Malla 103 - Río Negro	163,8
R.N.N°7	Malla 104 - La Pampa	128,5
R.N.N°22	Malla 108A - Río Negro	146,5
R.N.N°231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	291,2
R.N.N°188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	129,4
R.N.N°38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	334,0
R.N.N°146-147	Malla 301 - San Luis	253,8
R.N.N°20-141	Malla 302 - San Juan	286,1
R.N.N°143-144-146	Malla 312 - Mendoza	223,4
R.N.N°40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	105,1
R.N.N°9	Malla 402A - Santiago del Estero	96,7
R.N.N°9	Malla 402B - Santiago del Estero	120,9
R.N.N°9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	148,9
R.N.N°64	Malla 407- Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	152,0
R.N.N°157	Malla 408D - Tucumán - Santiago del Estero	128,0
R.N.N°12-136	Malla 509 - Entre Ríos	151,8
R.N.N°18	Malla 513A - Entre Ríos	90,3
R.N.N°12-131	Malla 513B - Entre Ríos	99,9
R.N.N°7	Malla 330 - Mendoza	182,5
R.N.N°34	Malla 431 - Santiago del Estero	251,9
R.N.N°178-177	Malla 205 - Santa Fe	179,8
R.N.N°38	Malla 437 - Tucumán	145,7
Total		4.291,0

En relación al C.Re.Ma. IV las mallas en ejecución sumaron 1.278 kilómetros, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 13
Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV
(Kilómetros en ejecución al 30/06/2007)

Ruta	Malla	Longitud en kilómetros
R.N.º38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	300,7
R.P.º6-39	Malla 513C - Entre Ríos	86,0
R.N.º14-122-123	Malla 501 - Corrientes	144,5
R.N.º143-40S	Malla 313B - Mendoza	238,5
R.N.º38-75	Malla 303 - La Rioja	237,9
R.N.º143	Malla 313A - Mendoza	113,0
R.N.º9-60	Malla 204 - Córdoba	157,4
Total		1.278,0

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

La CONAE continuó durante el primer semestre del ejercicio 2007, su Programa de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014. Para ello trabaja asociada a la contratista INVAP S.E., encargada de la construcción de los satélites del Plan y de las pruebas de ensayo.

La CONAE cuenta con el apoyo de otros entes del Sistema Científico Tecnológico, que cooperan en diferentes desarrollos tales como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (I.A.R.), la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y la empresa CONSULFEM S.A.. Asimismo se continuó con la adaptación de los satélites a las exigencias del SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias) mediante un acuerdo entre la CONAE y la Agencia Espacial Italiana (A.S.I.). Los proyectos relevantes de la CONAE son Infraestructura Terrestre y Misiones Satelitales.

Durante el primer semestre del ejercicio 2007 se realizaron importantes inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, en la obra Misión SAC-D Aquarius (ex Misión Cesar, siendo socia la NASA). Las principales inversiones corresponden a la primera certificación del contrato con la contratista principal INVAP S.E., que entregó toda la documentación correspondiente a la ingeniería básica y parte de la documentación correspondiente a la ingeniería de detalle. También se certificaron avances con entes del sistema científico tecnológico que están trabajando en el desarrollo y la construcción de partes de la carga útil argentina (radiómetros), como el Instituto Argentino de Radioastronomía y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata. Por otra parte se adquirieron componentes de vuelo para la carga útil del satélite y para la construcción de los modelos de ingeniería de los subsistemas de la plataforma. Las misiones satelitales en curso son:

Cuadro N° 14

Misiones Satelitales en Curso		
	Misión	Socios
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/Francia
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (A.S.I.)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)

La CONAE ha definido dos familias de misiones satelitales, según los instrumentos argentinos principales que llevan a bordo:

- La Serie SAC con instrumentos argentinos centrados en el rango óptico: cumplieron misión los satélites SAC A (Misión tecnológica) y SAC B (Astrofísica), encontrándose en operación el satélite SAC C. Se encuentran en desarrollo los satélites SAC D /Aquarius, SAC E /SABIA y SAC-F/ALSAT-2.
- La Serie SAOCOM con instrumentos argentinos centrados en el rango de microondas (radar): contempla las plataformas 1 A/B y 2 A/B, donde las componentes A/B son similares mientras que la serie 2 incorporó los avances tecnológicos (resultado de las misiones anteriores). Se encuentra en desarrollo el SAOCOM 1.

Los satélites SAC-A, SAC-B y SAC-C fueron concebidos por la CONAE y construidos totalmente en nuestro país con la participación de la empresa INVAP S.E., como contratista principal. Los satélites SAOCOM y SAC-D, actualmente en construcción, también cuentan con INVAP S.E. como contratista principal.

Organo de Control de las Concesiones Viales

Programa Infraestructura en Concesiones Viales

A través de este programa, el OCCOVI desarrolla las tareas preparatorias para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revisten carácter de obra pública en rutas nacionales concesionadas.

Las obras de la doble vía en los departamentos de Santa Rosa y Gral. San Martín a la altura del Km. 965,5 de la R.N.N° 7, que se desarrollan en el marco del proyecto de aumento de la capacidad en corredores viales de la provincia de Mendoza, mostraron una ejecución, al primer semestre de 2007, de \$15,9 millones. El proyecto tiene como objeto la duplicación de calzada existente en una longitud de 34 kilómetros y formará parte del corredor bioceánico central que permitirá la vinculación directa de las provincias del centro y oeste del país (Mendoza, San Juan y La Rioja) con la República de Chile.

El proyecto “Aumento de capacidad en corredores viales provincia de Buenos Aires V”, corresponde a la Ruta Nacional Nº 9. El sector se inicia en Campana (en la finalización del tramo de la ruta anteriormente mencionada que cuenta con tres carriles por calzada) y se desarrolla hasta el distribuidor de la R.N. Nº 193, acceso al complejo Zárate – Brazo Largo.

El tramo de ruta en cuestión, tiene una importancia fundamental en la logística del transporte de carga del área que hace imperiosa la incorporación de un nuevo carril. Durante el primer semestre del 2007 devengó \$15,6 millones.

Programa Infraestructura en Areas Urbanas

A través de este programa, el OCCOVI satisface la demanda de obras en áreas urbanas no concesionadas, ejecutando tareas de vinculación, mejoramiento y reordenamiento urbano (controlando que se construyan de forma de garantizar las condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas) con especial cuidado del impacto ambiental y en el marco económico y jurídico legalmente establecido.

El proyecto de vinculación y remodelación de la R.P. Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. Nº 2 - Florencio Varela, devengó, al 30/06/2007, la suma de \$38,3 millones. Por medio de esta obra se prevé mejorar un tramo de 6.450 metros y los trabajos incluyen la repavimentación desde el Km. 34,5 al Km. 40,9 con el objetivo de transformar en autovía el citado tramo de la R.P. Nº 36.

Programa Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

Con este nuevo sistema la concesionaria tiene a su cargo las tareas de mantenimiento, reparación y conservación, mientras el concedente licita obras mejorativas de las calzadas en tramos del corredor, a su único y exclusivo juicio, tanto las incluidas en los listados de los pliegos como obras adicionales no previstas en dichos listados. Los corredores se evaluaron y se dividieron en tramos A (no requieren obras mejorativas) y tramos B (donde se realizarán obras mejorativas).

Las obras mejorativas en un principio las licitaba e inspeccionaba la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), ya que tenía facultades para realizar obras de acuerdo a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. Con el Decreto 1915 de fecha 28/12/2004, las facultades del organismo fueron ampliadas, para propender a la mayor celeridad y eficiencia en la resolución de las distintas situaciones planteadas en las rutas nacionales concesionadas, de eliminar las funciones y/o responsabilidades superpuestas o duplicadas y de unificar la actuación del Estado Nacional en dicha jurisdicción. Es así que se delegan en el OCCOVI de acuerdo a lo previsto por el Artículo 2º de la Ley Nº 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra.

Por Acta de Acuerdo entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Organo de Control de Concesiones Viales, refrendada por Resolución MPFIPyS N° 1223/2005, se determina que la D.N.V. continuará con la ejecución de las obras ya licitadas y en trámite de licitación, correspondientes al año I de concesión y parcialmente las del año II, y el OCCOVI licitaría las restantes obras del Año II y de aquí en adelante sería el único organismo habilitado para realizar obras mejorativas para los restantes años de la concesión.

Las obras mejorativas son de dos tipos: de corrección superficial, para brindar una mejor fricción y de refuerzo estructural, repavimentación y reconstrucción.

Los proyectos Obras Mejorativas en Corredor Vial N° 2 Año II-I Etapa, Obras Mejorativas en Corredor Vial N° 4 Año II-I Etapa, Obras Mejorativas en Corredor Vial N° 5 Año II-I Etapa, devengaron \$24,3 millones, \$19,9 millones y \$15,9 millones respectivamente.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Programa Asistencia Técnica Financiera para Saneamiento

El programa se encarga de la habilitación de obras, la rehabilitación, optimización y ampliación de los servicios existentes y el fortalecimiento institucional de los entes subprestatarios del servicio.

Entre los proyectos más relevantes que mostraron ejecución al 30/06/2007 se destaca la Construcción del Acueducto Centro Oeste (en la provincia de Santa Fe), que devengó \$ 25,6 millones. Se prevé la construcción de una planta depuradora cloacal del primero y segundo tramo de las colectoras cloacales y estaciones elevadoras en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, beneficiando a 135.000 personas.

Este sistema de recolección y tratamiento de líquidos cloacales se ha proyectado para zonas urbanizadas de los departamentos de Rawson, Rivadavia, Capital y norte de Pocito.

El proyecto "Construcción Planta de Tratamientos Cloacales Subsistema Rawson- San Juan", está formado por los colectores principales y una planta de tratamiento de líquidos localizada cerca del Cerrillo Barboza, entre la calle 11 y la calle 14 y el límite este del arroyo de Agua Negra. Tiene aproximadamente 400 hectáreas y se conformará con cinco series de lagunas, obras complementarias y laboratorio, con una superficie ocupada de 100 hectáreas y en el predio del lugar está prevista la forestación que conformará un pulmón de oxígeno.

Se anularán 34.000 pozos absorbentes (colapsados y saturados) y se permitirá mejorar la calidad de vida de 160.000 habitantes y de una población futura estimada en 200.000 personas.

Al cierre del primer semestre de 2007, el citado proyecto devengó \$15,4 millones, sobre un costo total de \$105,7 millones.

Administración Central

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Programa Ejecución de Obras de Arquitectura

El Hospital Interzonal El Cruce (Florencio Varela) es un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorios externos.

El programa médico asistencial que se propone ha sido diseñado como un establecimiento polivalente de agudos con posibilidad de dar respuesta a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondientes al 3° nivel de atención de salud de la población de su área programática (distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes). Al 30/06/2007 devengó la suma de \$33,7 millones, se incorporó instrumental médico no previsto originalmente y se recuperó el ritmo de ejecución, que mostraba atrasos.

Secretaría de Transporte

Programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires devengó, al 30/06/2007, la suma de \$ 24,9 millones, correspondiente a las obras de Modernización de la Línea "A" del Subterráneo.

El proyecto "Construcción de Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario por encima de la Laguna La Picasa" restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad de Buenos Aires con la República de Chile, pasando por la Provincia de Mendoza. Al cierre del primer semestre devengó \$18,2 millones.

Programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y Vías Navegables

El puerto de Caleta Paula se encuentra ubicado próximo a la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Se proyecta la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros en sentido este-oeste. Además, se prevé una obra de control de deriva litoral en el lado sur del acceso al Puerto.

El proyecto tiene un costo total de \$140 millones y al cierre del primer semestre del ejercicio devengó \$14,9 millones.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2007

1-Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 15
Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/2007 (en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	6.481.694.676	6.350.376.998	3.151.908.829	49,6%
Organismos Descentralizados	233.178.243	627.925.001	482.184.569	76,8%
TOTAL	6.714.872.919	6.978.301.999	3.634.093.398	52,1%

Dentro de la Administración Central, sobresalieron las transferencias a acciones para Planes Federales de Vivienda (\$1.320,0 millones), para la formulación y ejecución de la política energética (\$472,8 millones), para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$255,9 millones), los traspasos a los gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social y obras municipales (\$112,9 millones), para el Mejoramiento de Barrios-PROMEBA (\$87,3 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) (\$ 70,8 millones), Benito Roggio e Hijos S.A. (\$69,3 millones), a Metrovías S.A. (\$59,0 millones), a Trenes de Buenos Aires S.A. (\$54,2 millones) y a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$55,0 millones). Asimismo se destacaron las transferencias destinadas a Emergencia Habitacional (\$55,4 millones), la asistencia financiera para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$51,7 millones), para la atención de emergencias por inundaciones (\$48,5 millones), a Ferrovías S.A. (\$ 48,2 millones), acciones para desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$33,4 millones), a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (\$19,1 millones), a Herso S.A. (\$27,7 millones) y a Transportes Metropolitanos General Roca (\$15,5 millones). Por otra parte resultaron relevantes las transferencias para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y para infraestructura y equipamiento (efectuadas por el Ministerio de Educación, por \$61,4 millones y \$36,8 millones, respectivamente).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad y destinadas a la construcción de rutas por convenio con provincias, por \$400,7 millones (Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires por \$370,0 millones \$22,6 millones y \$7,8 millones, respectivamente) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas con cooperativas de trabajo, por \$64,8 millones).

Gráfico N° 8
Transferencias de Capital - Devengado al 30-06

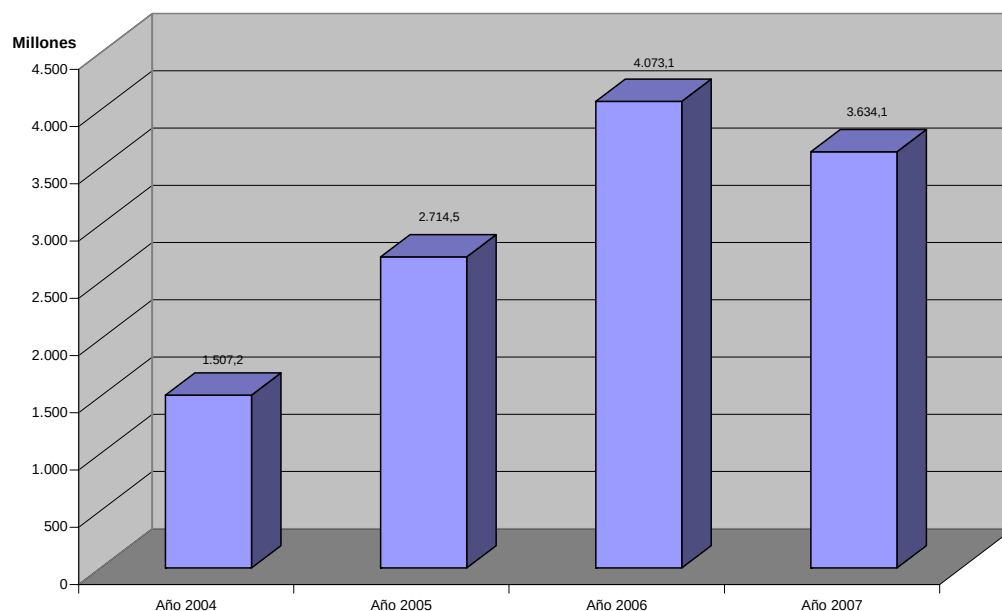

En resumen, las transferencias de capital mostraron una disminución, respecto al primer semestre de 2006, de \$439,0 millones (-10,7%). Entre otras causas que explican esa baja sobresale, a partir de lo dispuesto por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 25.917 y su reglamentación), la exclusión del Presupuesto Nacional de los recursos inherentes al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), manteniéndose solamente el Programa de Reactivación de Planes de Vivienda. Asimismo se transfirieron menores recursos vinculados con la política energética. Dichas disminuciones fueron compensadas, parcialmente, con mayores aportes a las provincias (para construcciones viales y de viviendas) y al Sistema de Transporte Ferroviario.

Por otra parte, el monto devengado al primer semestre de 2007 arrojó importantes aumentos nominales, comparado con los años 2005 y 2004, de \$919,6 millones y de \$ 2.126,9 millones (34,0% y 141,0%, respectivamente), según se observa en el gráfico.

2-Según Fuente de Financiamiento


Cuadro N° 16
Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/06/2007 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.604.273.252	5.838.931.604	3.210.258.158	55,0%
Recursos con Afectación Específica	229.752.055	232.452.055	104.767.519	45,1%
Otros recursos internos	32.270.000	38.120.000	14.757.604	38,7%
Financiamiento Externo	848.577.612	868.798.340	304.310.117	35,0%
TOTAL	6.714.872.919	6.978.301.999	3.634.093.398	52,1%

Desde el punto de vista del financiamiento el Tesoro Nacional alcanzó el 88,3% de las transferencias, sobresaliendo los citados Planes Federales de Vivienda (\$1.320,0 millones), la construcción de rutas por convenio con provincias (\$400,7 millones), la formulación y ejecución de la política energética (\$367,1 millones), las asistencias para infraestructura social, en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (\$101,5 millones) y las acciones para Emergencia Habitacional (\$55,4 millones).

También se realizaron transferencias con destino a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de Políticas para Transporte Ferroviario (\$347,1 millones), las acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$80,1 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.) (\$70,8 millones), al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$57,6 millones), para el financiamiento del Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$51,7 millones) y para Mejoramiento de Barrios (\$51,3 millones). Asimismo fueron relevantes las transferencias para aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (\$61,4 millones) y aquellas realizadas para infraestructura y equipamiento (\$36,8 millones); estas últimas ejecutadas por el Ministerio de Educación y Cultura.

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/06/2007

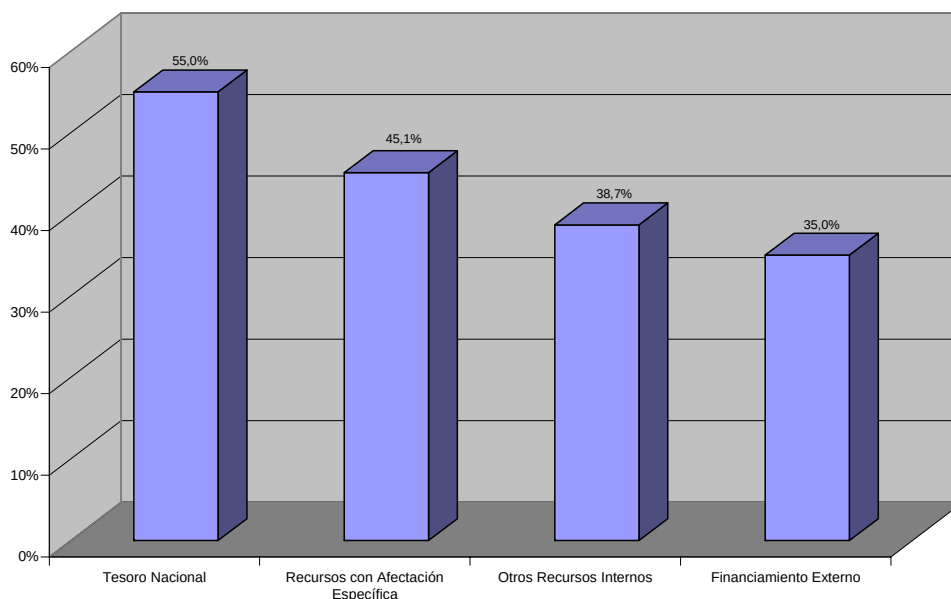

Los recursos afectados correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (F.E.D.E.I.) por \$99,6 millones. El crédito externo fue aplicado, principalmente, al plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$175,8 millones), al programa Mejoramiento Barrial -PROMEBA (\$36,0 millones) y para atención de emergencias por inundaciones (\$43,7 millones).

II-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Las transferencias de capital, al cierre del primer semestre del ejercicio 2007, se registraron, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las tres jurisdicciones concentraron alrededor del 50% del total registrado al 30/06/2007.

Las transferencias inherentes a la provincia de Buenos Aires (19,2%) comprendieron, mayormente a los Planes Federales de Vivienda (\$517,2 millones), al plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$40,3 millones) y las destinadas a obras hídricas y saneamiento (\$21,8 millones), al apoyo financiero para obras municipales (\$18,5 millones) y a instituciones provinciales de enseñanza para innovación y desarrollo de la formación tecnológica (\$15,6 millones).

Las transferencias a la provincia de Santa Cruz (14,4% del total) incluyeron las obras viales realizadas por convenio (\$370,0 millones), para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$55,0 millones), para infraestructura social (\$31,2 millones), para Planes Federales de Vivienda (\$27,6 millones) y para el aprovechamiento de los recursos hídricos (\$13,0 millones).

Las transferencias asignadas geográficamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16,7%) se destinaron a la formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario (\$347,1 millones), a energía (\$106,1 millones), al desarrollo urbano (\$23,6 millones) y al mejoramiento de la calidad educativa (\$14,1 millones).


Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial (asociadas a dos o más jurisdicciones), se concentraron principalmente en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$244,4 millones).

Se presenta a continuación el indicador de transferencias de capital según densidad poblacional, cuya formula responde a:

$$= \text{Transferencias de capital} / \text{Densidad} \times 100.000$$

$$\text{donde Densidad} = \frac{\text{Habitantes}}{\text{Km}^2}$$

Gráfico N° 10
Transferencias de Capital por habitante y kilómetro cuadrado (*)

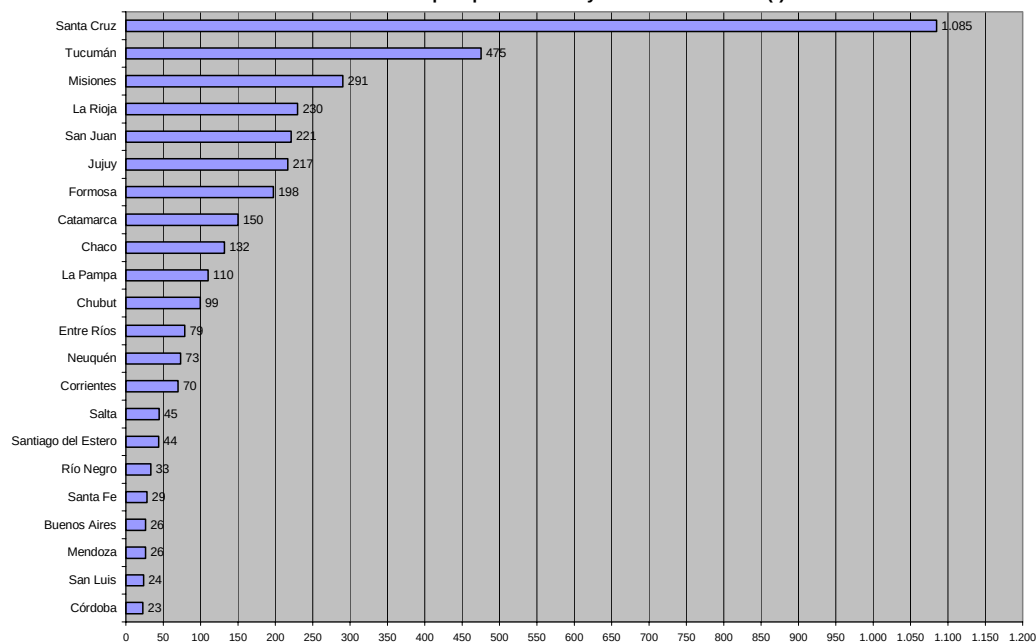

(*) En el gráfico no se incluye la jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego por razones de escala (indicador: 109.613 y 2.688)

Resultó, al 30/06/2007, que las transferencias de capital por habitante son mayores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Santa Cruz, Tucumán y Misiones y menores en Córdoba, San Luis y Mendoza.

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	45.812.191	3.390.524	8,0%
Presidencia de la Nación	33.461.134	35.085.182	1.624.048	4,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	4.360.000	-1.640.000	-27,3%
Ministerio del Interior	11.236.020	6.938.020	-4.298.000	-38,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	120.283.958	-84.589	-0,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	55.062.000	-308.000	-0,6%
Ministerio de Defensa	64.237.643	82.316.443	18.078.800	28,1%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	31.348.127	-4.188.000	-11,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	4.755.144.604	923.717.126	24,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	360.000	160.000	80,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	4.894.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	4.098.102	-2.426.111	-37,2%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	5.145.702.627	934.025.798	22,2%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	8.795.660	931.660	11,8%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	30.664.222	-15.152.164	-33,1%
Ministerio Público	6.075.133	6.215.133	140.000	2,3%
Presidencia de la Nación	24.394.427	30.760.264	6.365.837	26,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	36.755.923	2.940.000	8,7%
Ministerio del Interior	123.048.617	155.290.834	32.242.217	26,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	10.980.110	5.690.265	107,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	9.550.000	1.264.000	15,3%
Ministerio de Defensa	86.676.181	232.636.728	145.960.547	168,4%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	112.926.319	9.072.681	8,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	131.887.230	17.936.425	15,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	79.074.450	22.830.450	40,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	41.096.242	1.729.500	4,4%
Ministerio de Salud	41.980.323	44.073.735	2.093.412	5,0%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	8.995.850	3.300.850	58,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	965.597.700	237.345.680	32,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	6.111.300.327	1.171.371.478	23,7%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	45.812.191	24.647.285	5.268.601	11,5%
Presidencia de la Nación	33.461.134	35.085.182	14.733.109	10.904.671	31,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	4.360.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	11.236.020	6.938.020	470.745	470.745	6,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	120.283.958	42.534.793	40.018.739	33,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	55.062.000	4.198.125	537.701	1,0%
Ministerio de Defensa	64.237.643	82.316.443	2.418.141	1.632.804	2,0%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	31.348.127	16.940.269	9.141.287	29,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	4.755.144.604	2.477.837.171	2.419.369.591	50,9%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	360.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	4.894.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	4.098.102	603.768	509.479	12,4%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	5.145.702.627	2.584.383.407	2.487.853.619	48,3%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	8.795.660	2.905.105	2.048.127	23,3%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	30.664.222	16.154.378	8.097.989	26,4%
Ministerio Público	6.075.133	6.215.133	1.483.849	1.173.317	18,9%
Presidencia de la Nación	24.394.427	30.760.264	8.402.754	5.400.931	17,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	36.755.923	589.425	532.983	1,5%
Ministerio del Interior	123.048.617	155.290.834	47.188.266	26.263.881	16,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	10.980.110	2.723.116	2.188.015	19,9%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	9.550.000	2.275.067	1.073.110	11,2%
Ministerio de Defensa	86.676.181	232.636.728	115.155.996	110.656.900	47,6%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	112.926.319	44.724.565	14.789.107	13,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	131.887.230	36.452.754	28.434.881	21,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	79.074.450	31.140.662	28.594.163	36,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	41.096.242	11.828.458	11.610.311	28,3%
Ministerio de Salud	41.980.323	44.073.735	8.405.683	7.371.093	16,7%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	8.995.850	3.440.930	2.627.181	29,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	965.597.700	332.871.020	250.861.991	26,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	6.111.300.327	2.917.254.435	2.738.715.623	44,8%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2007	Crédito Devengado al 30/06/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado al 30/06/2007	% Ejec./Progr. anual
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	3.280.497	99.974	0	0,00	24,00	s/i	
					51	Adecuación para Instalación Subdirección de Notificaciones	3.280.497	99.974	0	0,00	24,00		
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	4.487.919	4.079.376	0	0,00	100,00	s/i	
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	4.487.919	3.538.015	0	0,00			
					68	Construcción de Locales Subsuelo Av. de los Inmigrantes 1950	0	541.361	0	0,00			
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.546.745	2.506.663	0	0,00	80,00	s/i	
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.506.745	2.273.569	0	0,00	100,00		
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal (1)	40.000	233.094	0	0,00	13,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	516.872	914.212	457.601	0,00	100,00	s/i	
					52	Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle 1	516.872	914.212	457.601	0,00	100,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	678.660	178.655	21,00	1,00	s/i	
					52	Lavalle 1220 Cap.Fed., Reparación de Cubiertas, Fachadas y C	0	178.660	178.655	21,00	1,00		
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal (1)	40.000	500.000	0	0,00	1,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	7.447.946	10.112.697	309.430	0,00	79,00	s/i	
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de seis Juzgados	7.447.946	10.112.697	309.430	0,00	79,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	452.000	587.383	526.616	20,00	5,00	s/i	
					51	Adecuación Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal	452.000	587.383	526.616	20,00	5,00		
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.640.547	400.000	0	0,00	25,00	s/i	
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	1.000.248	200.000	0	0,00	100,00		
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edifi	600.299	200.000	0	0,00	100,00		
					53	Secretaría Electoral de La Plata - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				10		Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	786.796	786.796	0	0,00	20,00	s/i	
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre, San Juan. Adecuación Sector Electc	746.796	746.796	0	0,00	100,00		
					52	Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	40.000	40.000	0	0,00	1,00		
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	3.462.796	1.346.631	0	0,00	24,00	s/i	
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edif.Calle Garibay	3.074.497	958.332	0	0,00	24,00		
					52	Edif. Primera. Junta 2687, Santa Fe - Adecuación	388.299	388.299	0	0,00	23,00		
				12		Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.039.796	500.000	0	0,00	20,00	s/i	
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Gen	999.796	400.000	0	0,00	100,00		
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (1)	40.000	100.000	0	0,00	1,00		
				14		Área Cámara Posadas							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					1	Construcción de Sedes Judiciales (1)	40.000	0	0	0,00	1,00	s/i	
					51	Tribunales Federales de Posadas Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				15		Área Cámara Resistencia							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	384.486	384.486	5,00	1,00	s/i	
					51	Adecuación y Obras del Juzgado Federal de Formosa	40.000	384.486	384.486	53,00	1,00		
					2	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (1)	0	600.000	0	0,00	100,00	s/i	
					51	Juzgado de Roque Saenz Peña, Remodelaciones y Reparacion	0	600.000	0	0,00	100,00		
				16		Área Cámara de Córdoba							
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	683.548	300.000	0	0,00	100,00	s/i	
					51	Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	683.548	300.000	0	0,00	100,00		
				17		Área Cámara San Martín							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	880.135	874.463	301.505	45,00	40,00	s/i	
					51	Adecuacion Edificio de la Camara Federal y Tribunal Oral N° 4	0	374.463	301.505	91,00	9,00		
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	800.135	100.000	0	0,00	100,00		
					53	Edificio Calle Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio (1)	40.000	300.000	0	0,00	7,00		
					54	Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir (1)	40.000	100.000	0	0,00	4,00		
				18		Área Cámara Tucumán							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.586.242	2.958.022	660.881	0,00	100,00	s/i	
					52	Juzg. Fed. Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	2.586.242	2.958.022	660.881	0,00	100,00		
				22		Fuero Penal Económico							
					1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	665.000	0	0	71,00	29,00	s/i	
					52	Adecuación Juzg. Penal Económ. Av. de los Inmigrantes 1950	665.000	0	0	71,00	29,00		
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)							
				21		Justicia de Máxima Instancia							
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.962.451	4.916.451	1.115.412	15,00	50,00	s/i	
					51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	659.999	2.779.999	1.115.412	44,25	35,00		
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	367.520	520	0	0,00	37,00		
					57	Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	852.632	852.632	0	0,00	100,00		
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	973.353	973.353	0	0,00	100,00		
					63	Reforma de las Instalaciones Eléctricas Palacio de Justicia (2)	0	1.000	0	100,00	0,00		
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia	108.947	308.947	0	0,00	100,00		
					2	Refacciones en Sedes Periciales	1.894.737	4.106.237	227.426	0,00	83,00	s/i	
					56	Refac. y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú 92	1.894.737	4.004.737	227.426	0,00	83,00		
					69	Reparación y Mantenimiento de Ascensores B. Mitre 718 y Maip	0	1.500	0	0,00	100,00		
					70	Adecuación de Locales para el Traslado del Cuerpo Médico For	0	100.000	0	0,00	100,00		
					3	Refacciones Varias	156.316	258.816	0	0,69	98,00	s/i	
					73	Reparación y Mantenimiento de Ascensores Edificio Lavalle (2)	0	2.500	0	100,00	0,00		
					76	Reformas - Edificio Lavalle 1250 (1)	156.316	256.316	0	0,00	100,00		
					4	Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	4.500	0,00	75,00	s/i	
					51	Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	4.500	0,00	75,00		
					5	Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.102.089	54,00	46,00	s/i	
					51	Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.102.089	54,00	46,00		
					6	Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justi	608.663	858.663	0	0,00	17,00	s/i	
					51	Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justi	608.663	858.663	0	0,00	17,00		
					7	Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	573.684	0	0,00	52,00	s/i	
					51	Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	573.684	0	0,00	52,00		
					8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00	s/i	

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2007	Crédito Devengado al 30/06/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado al 30/06/2007	% Ejec./Progr. anual
20						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00		
	107					Presidencia de la Nación							
				17		ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
						Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas							
					3	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	3.619.478	1.012.911	0,00	100,00	32,00	32,00
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	3.619.478	1.012.911	0,00	100,00	32,00	32,00
				20		Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR							
					36	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	380.000	923.960	805.754	96,00	4,00	0,80	20,00
					58	C.de Interpretación en San Martín de los Andes - 2da. Etapa	380.000	923.960	805.754	0,00	100,00	20,00	20,00
					37	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.672.000	2.367.360	2.354.434	80,25	19,75	3,46	17,50
					53	Albergue para Voluntarios en Villa La Angostura	152.000	707.360	153.497	61,00	39,00	5,85	15,00
					54	Camino Tronador-Los Rápidos	1.140.000	1.140.000	1.213.483	66,00	34,00	6,80	20,00
					58	Senderos y Miradores en Isla Victoria	76.000	76.000	360.977	16,00	84,00	16,80	20,00
					59	Infraestructura Isla Victoria Area Central	304.000	444.000	626.477	79,00	21,00	3,15	15,00
					42	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	152.000	480.680	421.604	87,56	12,44	0,00	0,00
						54 Construcción Albergue para Voluntarios en Lago Verde (2)	152.000	480.680	421.604	100,00	0,00	0,00	0,00
	21					Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	3.137.007	3.137.007	308.271	35,00	45,00	16,00	35,56
					52	Obras en Junta de la Palca	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Obras en Agua del Godo	1.537.007	1.537.007	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Terminación Viviendas en Rodeo	1.200.000	1.200.000	308.271	0,00	100,00	100,00	100,00
					39	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condo	301.517	304.087	192.518	86,00	14,00	14,00	100,00
					56	Mejoramiento Camino de Acc.al Parque Nac. Quebrada del Con	301.517	304.087	192.518	86,00	14,00	14,00	100,00
					40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo (4)	1.161.476	1.161.476	0	7,00	1,00	7,00	700,00
					53	Centro Operativo Area Pobladores	591.326	591.326	0	0,00	100,00	15,00	15,00
					54	Centro Operativo Area Robles	570.150	570.150	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación M	1.800.000	1.800.000	1.291.808	15,00	85,00	35,11	41,31
					51	Obras 1º Etapa Infraestructura (4)	1.000.000	1.000.000	1.291.808	39,00	61,00	69,19	113,43
					52	Adecuación Galpón de Esquila como Centro de Interpretación	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	22					Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004							
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	960.020	36,00	64,00	26,23	40,98
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	960.020	39,00	61,00	26,23	43,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	840.000	156.647	8,00	92,00	10,15	11,03
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	840.000	156.647	18,00	82,00	10,15	12,38
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	1.364.000	864.000	972.234	33,00	67,00	49,02	73,16
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	1.364.000	864.000	972.234	45,00	55,00	49,02	89,13
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	1.437.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	1.437.200	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	116					BIBLIOTECA NACIONAL							
				25		Servicios de la Biblioteca Nacional							
					1	Construcción Edificio Las Heras- Museo del Libro (1)	2.100.934	800.934	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro (1)	2.100.934	800.934	0	0,00	50,00	0,00	0,00
	301					SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION							
				1		Actividades Centrales							
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4)	140.000	945.000	88.696	99,66	0,34	0,95	279,41
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4)	140.000	945.000	88.696	99,66	0,34	0,95	279,41
					3	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	8.095.000	1.749.414	36,90	63,10	27,14	43,01

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

							FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006	anual vigente	30/06/2007	anual
25	337	36			4	51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	8.095.000	1.749.414	36,90	63,10	27,14	43,01
						Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.223.000	453.217	0,00	100,00	37,27	37,27
						51 Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.223.000	453.217	0,00	100,00	37,27	37,27
						SECRETARIA DE CULTURA							
						Difusión de la Música y Danza							
						1 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	115.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	115.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Preservación y Exhibición Artística-Cultural							
						1 Mejoras en Museos (1)	430.000	430.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas (1)	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de M:	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Mejoras en el Museo Roca (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Museo Mitre (1)	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Desarrollo y Promoción Cultural							
						5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1 (1)	880.000	691.000	4.114	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear (1)	135.000	135.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña (1)	15.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina (1)	230.000	144.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Edificio de la Calle México (1)	260.000	157.000	4.114	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Mejoras en el Palais de Glace (1)	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos (1)	160.000	160.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						6 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	4.000.000	133.029	0,00	100,00	32,00	32,00
						51 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	4.000.000	133.029	0,00	100,00	32,00	32,00
						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE							
						Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento(**)							
						1 Construcción de Instalaciones Deportivas (1)	6.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salón Cubierto de Atletismo (1)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
52 Construcción Gimnasio Ezeiza (1)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
Ministerio del Interior													
POLICIA FEDERAL ARGENTINA													
Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes													
22 Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
51 Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
34 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
37 Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
51 Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
40 Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
51 Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
43 Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
51 Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00						
47 Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00						
51 Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00						
48 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00						
51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00						

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
			22			Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
				4		Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	310.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
375						GENDARMERIA NACIONAL							
			40			Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	250.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	250.000	0	15,00	24,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional	1.493.953	1.493.953	470.745	20,70	79,30	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	1.493.953	1.493.953	470.745	23,60	37,97	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional I	783.567	783.567	0	62,40	37,60	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	158.000	158.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	178.000	178.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón 4 "Concordia" (1)	125.000	125.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Refacción Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez" (1)	124.567	124.567	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (1)	38.000	38.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					61	Ampliación Escuadrón 55 "Tucumán" (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Grupo "Alférez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahue	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				22		Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1	96.500	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1	96.500	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
380						PREFECTURA NAVAL ARGENTINA							
			31			Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial							
				1		Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				2		Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				5		Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				6		Construcción Prefectura Zona Mar Argentina Norte (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Estructura Basamento Edificio (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			37			Formación y Capacitación Profesional de la PNA							
				2		Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cult							
			106			COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
				1		Actividades Centrales							
					3	Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00
			16			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
				1		Infraestructura Terrestre	2.036.000	7.588.000	1.011.168	40,64	59,36	0,49	0,83

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
						0 Infraestructura Terrestre	53.000	53.000	0				
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	5.000	5.780.000	812.836	76,30	14,45	3,45	23,88
						52 Construcción del Instituto Gulich	188.000	20.000	0	13,50	0,12	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	775.000	890.000	33.952	12,05	11,11	0,75	6,75
						56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00
						58 Construcción de Antenas Educativas	700.000	410.000	89.380	2,65	1,99	0,59	29,65
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	300.000	20.000	0	0,08	0,07	0,00	0,00
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	405.000	75.000	0,00	8,91	0,00	0,00
				2		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	110.293.301	103.546.301	37.685.262	32,79	10,00	4,11	41,10
						0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.552.000	381.184				
						52 Misión SAOCOM	79.472.030	59.663.030	10.313.272	26,60	11,76	2,01	17,09
						53 Misión SABIA	5.000	5.000	40.666	14,19	0,69	0,67	97,10
						54 Misión CESAR	28.816.271	41.326.271	26.950.140	22,60	34,99	19,44	55,56
				4		Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
						52 Antena Multipropósito N° 6	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
				5		Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	39,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	0,25	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	13.200	0,00	44,00	0,29	0,66
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	13.200	0,00	22,22	0,29	1,31
17						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
				1		Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	367.000	937.000	432.781	1,18	1,00	0,84	84,00
						0 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	360.000	455.000	288.233	14,32	5,12	4,65	90,82
						52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	479.000	144.547	0,00	1,01	0,19	18,81
18						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
				1		Actividades Centrales							
				2		Remodelación Palacio San Martín	710.849	710.849	372.738	50,00	10,00	9,55	95,50
						51 Remodelación Palacio San Martín	710.849	710.849	372.738	50,00	10,00	9,55	95,50
				3		Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	2.403.532	0	0,00	100,00	80,00	80,00
						0 Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	0	0				
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	2.403.532	0	0,00	100,00	80,00	80,00
				16		Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16						Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia	0	488.063	281.792	2,15	97,85	70,00	71,54
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	488.063	281.792				
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	0	0	2,15	97,85	70,00	71,54
				8		Remodelación Embajada en Roma	508.195	100.000	85.890	0,00	30,00	25,00	83,33
						0 Remodelación Embajada en Roma	0	100.000	85.890				
						51 Remodelación Embajada en Roma	508.195	0	0	0,00	30,00	25,00	83,33
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	40,00	100,00

AI 30/06/2007

						FINANCIERO											
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación	Ejecutado al	% Ejec./Progr.				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006	anual vigente	30/06/2007	anual				
40	332	1				51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	40,00	100,00				
						11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	25,00	100,00				
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	25,00	100,00				
						12 Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	150.000	135.909	0,00	100,00	30,00	30,00				
						0 Remodelación de la Embajada en Francia	0	150.000	135.909								
						51 Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	0	0	0,00	100,00	30,00	30,00				
						20 Desarrollo del Plan Antártico											
						15 Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	191.513	191.513	0	0,00	30,00	30,00	100,00				
						51 Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	191.513	191.513	0	0,00	30,00	30,00	100,00				
						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos											
						MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS											
						Actividades Centrales											
						3 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	130.987	86,11	13,89	7,74	55,72				
						51 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias (2)	180.000	180.000	120.423	100,00	0,00	0,00	0,00				
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	1.882	90,00	10,00	0,40	4,00				
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos (2)	45.000	45.000	8.682	100,00	0,00	0,00	0,00				
						18 Política e Infraestructura Penitenciaria											
						10 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs..	2.864.938	2.328.200	0	0,00	1,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs..	2.864.938	2.328.200	0	0,00	1,00	0,00	0,00				
						11 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00				
						12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00				
						15 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00				
						51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00				
						16 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00				
						51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00				
						17 Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.067.138	406.714	0,00	100,00	6,00	6,00				
						51 Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.067.138	406.714	0,00	100,00	6,00	6,00				
						18 Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00				
						51 Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00				
						19 Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00				
						51 Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00				
	20 Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00									
	51 Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00									
	21 Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00									
	51 Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00									
	22 Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00									
	51 Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00									
	45	370	18				Ministerio de Defensa										
MINISTERIO DE DEFENSA																	
Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas																	
1 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)							7.502.000	24.021.800	0	0,00	14,00	0,00	0,00				
0 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)							945.000	945.000	0								
372						51 RSMA - Fabricación e Instalación de Radares (1)	6.557.000	23.076.800	0	0,00	14,00	0,00	0,00				
						INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A											
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa											

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					2	Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
374				16		ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
						Adiestramiento Operacional y Apoyo							
					52	Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdto. Riv:	0	450.000	133.220	0,00	s/i	s/i	
					51	Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdto. Riv:	0	450.000	133.220	0,00			
					53	Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - f	0	625.000	149.758	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - f	0	625.000	149.758	0,00			
379				16		ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
						Capacidad Operacional de la Armada							
					3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puert	1.250.000	1.250.000	357.193	29,22	50,00	19,66	39,32
					51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puert	1.250.000	1.250.000	357.193	29,22	50,00	19,66	39,32
				18		Formación y Capacitación							
					1	Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,13	0,87
					51	Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,13	0,87
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	22.682.603	667.644	12,70	59,00	2,33	3,95
					0	Construcción de Alojamiento para Personal Militar (1)	0	0	114.430				
					51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	22.682.603	553.214	12,70	59,00	2,33	3,95
					4	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	0,00	0,00
					5	Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	12.951	47,80	52,20	1,75	3,35
					51	Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	12.951	47,80	52,20	1,75	3,35
					7	Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00
450				16		INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
						Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	166.424	14,26	28,00	11,00	39,29
					51	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	166.424	14,26	28,00	11,00	39,29
50						Ministerio de Economía y Producción							
						MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
				1		Actividades Centrales							
					6	Reciclaje Edificio Ex-Aerolíneas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reciclaje Edificio Ex-Aerolíneas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	640.300	273.763	15,43	84,57	64,00	75,68
					51	Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	640.300	273.763	15,43	84,57	64,00	75,68
				14		Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J. A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J.A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				15		Restauración Integral del Patio Principal- Edificio PAHAC	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	100,00	100,00
					51	Restauración Integral Piso 1 Edificio PAHAC Y.H.250	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	100,00	100,00
				16		Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Provisión e Instalación Cielorrasos Suspendidos	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				19		Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					20	Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunió	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunió	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I (1)	700.000	700.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00
					51	Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive (1)	400.000	400.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					52	Instalación de Sistema Contra Incendios - Hidr. y Rociad. Autom	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera							
					1	Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	197.465	39,64	60,36	60,00	99,40
					51	Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	197.465	39,64	60,36	60,00	99,40
				16		COMISION NACIONAL DE VALORES							
						Control y Fiscalización de la Oferta Pública							
					1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	371.000	371.000	40.311	74,49	25,51	11,04	43,28
					53	Modernización del Archivo	371.000	371.000	40.311	74,49	25,51	11,04	43,28
				606		INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
						Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T							
					3	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	744.355	384.355	2.429	62,81	2,00	0,00	0,00
					0	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	367.004	367.004	2.429				
					86	Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	377.351	17.351	0	42,00	2,00	0,00	0,00
					5	Construcción y Ampliaciones Inst. de Investigación -Etapa II	329.387	149.387	49.800	71,63	28,37	4,18	14,73
					58	Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	329.387	149.387	49.800	71,63	28,37	4,18	14,73
					8	Construcción y Ampliaciones Instit. de Invest. Etapa III (2)	492.029	17.029	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Sala de Proc. Satelitales en Instit. Clima y Agua (2)	185.370	5.370	0	98,32	1,68	0,00	0,00
					53	Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virología (2)	22.884	2.884	0	54,72	17,28	0,00	0,00
					54	Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología (2)	137.307	7.307	0	94,00	6,00	0,00	0,00
					55	Remodelación Alojamiento Inst. Microbiología y Zool. Agríc. (2)	22.884	884	0	79,13	10,87	0,00	0,00
					59	Sala de Equipos de Frío en el Inst. de Patobiología-Castelar (2)	123.584	584	0	94,75	4,00	0,00	0,00
					12	Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	2.600.695	431.258	33,00	57,00	7,40	12,98
					51	Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	2.600.695	431.258	33,00	57,00	7,40	12,98
					17	Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronóm	771.403	4.412.403	2.339.015	8,00	92,00	41,90	45,54
					51	Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronóm	771.403	4.412.403	2.339.015	8,00	92,00	41,90	45,54
				17		Investigación Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT							
					4	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - EtapaI	109.787	399.787	10.812	0,00	28,00	0,00	0,00
					56	Construcción Oficinas AER Río Grande	109.787	399.787	10.812	0,00	28,00	0,00	0,00
					5	Construcción y Ampliaciones Centros del interior -EtapaII (2)	443.297	323.297	83.175	100,00	0,00	0,00	0,00
					58	Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay (2)	443.297	323.297	83.175	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (2)	819.281	238.281	37.000	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leale	27.459	173.459	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Ofic. Baños y Sala Reuniones Estación Exper. Anq	389.049	21.049	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce (2)	68.654	1.654	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Rioja (2)	228.846	38.846	37.000	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur (2)	22.884	1.884	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. E)	82.389	1.389	0	50,52	0,00	0,00	0,00
					13	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -EtapaV	1.619.937	1.386.937	794.648	73,00	27,00	14,16	52,44
					51	Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	192.848	89.848	25.647	42,03	57,97	2,50	4,31
					52	Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	771.403	81.403	40.382	91,57	8,43	3,00	35,59
					53	Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	38.572	572	0	0,00	60,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

							FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006	anual vigente	30/06/2007	anual
609	16					54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa	385.695	1.183.695	728.620	79,14	20,86	16,22	77,76
						55 Obras Varias C.R. Misiones	231.419	31.419	0	68,87	31,13	0,00	0,00
						Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapla VI	925.703	1.376.703	537.029	60,57	39,43	10,30	26,12
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	77.144	22.144	36.641	28,87	71,13	2,37	3,33
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	154.288	34.288	40.927	93,88	6,12	5,20	84,97
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	385.695	85.695	80.512	71,95	28,05	6,00	21,39
						54 Obras Varias C.R. Córdoba	154.288	684.288	239.526	39,39	60,61	22,70	37,45
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	154.288	550.288	139.424	94,64	5,36	5,36	100,00
						Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapla V	1.928.513	82.513	59.844	25,00	35,00	1,02	2,91
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	1.928.513	82.513	59.844	25,00	35,00	1,02	2,91
						Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapla VIII	925.690	925.690	175.922	73,00	27,00	2,46	9,11
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	385.695	255.695	42.591	79,79	20,21	2,00	9,90
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	154.288	4.288	0	58,40	41,60	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	154.288	594.288	56.114	72,53	27,47	2,50	9,10
						54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur	231.419	71.419	77.218	80,71	19,29	11,00	57,02
						Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San .	2.314.220	2.304.220	429.108	8,00	92,00	12,65	13,75
						51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San .	2.314.220	2.304.220	429.108	8,00	92,00	12,65	13,75
						Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires I	1.928.513	1.728.513	3.651	2,00	34,00	0,00	0,00
						51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires I	1.928.513	1.728.513	3.651	2,00	34,00	0,00	0,00
						Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	1.542.818	1.174.883	1,00	3,00	21,00	700,00
						51 Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	1.542.818	1.174.883	1,00	3,00	21,00	700,00
						Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	154.220	37.990	0,00	52,00	25,00	48,08
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	154.220	37.990	0,00	52,00	25,00	48,08
						Construcción y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy	1.542.818	22.818	0	38,00	62,00	0,00	0,00
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	1.542.818	22.818	0	38,00	62,00	0,00	0,00
						Construcción Laboratorios y Oficinas. Estación Agrop. Manfredi	1.928.513	228.513	221.993	50,00	50,00	11,00	22,00
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas. Estación Agrop. Manfredi	1.928.513	228.513	221.993	50,00	50,00	11,00	22,00
						Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	142.818	11.188	82,00	18,00	0,10	0,56
						51 Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	142.818	11.188	82,00	18,00	0,10	0,56
						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
						Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	410.000	76.649	41,74	58,26	3,76	6,45
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	410.000	76.649	30,50	40,25	9,07	22,53
						Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	0	27,90	12,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	0	27,90	12,00	0,00	0,00
						Equipamiento Analítico	447.660	377.660	27.851	50,16	13,00	0,78	6,00
51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	447.660	377.660	27.851	50,16	13,00	0,78	6,00						
Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.960	109.477	97,31	2,69	5,28	196,28						
51 Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.960	109.477	97,31	2,69	5,28	196,28						
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA													
Servicios de Laboratorios													
Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidac	3.800.000	3.800.000	1.084.577	10,00	60,00	5,00	8,33						
51 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidac	3.800.000	3.800.000	1.084.577	10,00	60,00	5,00	8,33						
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio:													
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA													
Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear													
Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	428.554	90,00	4,00	0,79	19,75						

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	428.554	90,00	4,00	0,79	19,75
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	128.000	6.699	95,00	3,00	0,16	5,33
					51	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	128.000	6.699	95,00	3,00	0,16	5,33
				3		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	450.000	73.784	39,00	7,00	1,04	14,86
					51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	450.000	73.784	39,00	7,00	1,04	14,86
				4		Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	500.000	0	28,00	4,00	0,00	0,00
					51	Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	500.000	0	28,00	4,00	0,00	0,00
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	130.000	2.990	0,00	10,00	0,28	2,80
					51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	130.000	2.990	0,00	10,00	0,28	2,80
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.075.000	1.705.000	0,00	50,00	40,17	80,34
					51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.075.000	1.705.000	0,00	50,00	40,17	80,34
				9		Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustible	250.000	250.000	3.191	0,00	10,00	0,46	4,60
					51	Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustible	250.000	250.000	3.191	0,00	10,00	0,46	4,60
				10		Ampliación Laboratorios CAB	500.000	1.000.000	110.774	52,16	30,00	4,10	13,67
					51	Ampliación Laboratorios CAB	500.000	1.000.000	110.774	52,16	30,00	4,10	13,67
				11		Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	108.810	25,84	20,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	108.810	25,84	20,00	0,00	0,00
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
				1		Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	0	88,28	8,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	0	88,28	8,00	0,00	0,00
				2		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	235.000	10.323	94,71	4,00	0,21	5,25
					51	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	235.000	10.323	94,71	4,00	0,21	5,25
				3		Saneamiento del CAE	250.000	250.000	173.514	88,93	11,00	3,80	34,55
					51	Saneamiento del CAE	250.000	250.000	173.514	88,93	11,00	3,80	34,55
				4		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	0	27,05	20,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	0	27,05	20,00	0,00	0,00
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	6.426	0,00	6,00	0,52	8,67
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	6.426	0,00	6,00	0,52	8,67
				8		Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
				9		Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	100.000	7.811	0,00	8,00	0,13	1,63
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	100.000	7.811	0,00	8,00	0,13	1,63
				11		Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.l	130.000	130.000	13.100	0,00	3,00	0,30	10,00
					51	Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.l	130.000	130.000	13.100	0,00	3,00	0,30	10,00
				12		Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (:	390.000	390.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (:	390.000	390.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				14		Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	6.824.150	51.689	0,00	12,00	0,17	1,42
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	6.824.150	51.689	0,00	12,00	0,17	1,42
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.453.000	1.558.000	45.791	79,49	9,81	0,37	3,77
					51	Área Gestión Ezeiza	1.350.000	1.425.000	7.442	62,89	15,00	0,04	0,27
					52	Laboratorio Control y Verificación	103.000	133.000	38.348	91,68	6,00	2,20	36,67
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.832.000	950.000	277.898	24,37	5,74	0,88	15,33
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.635.000	643.000	242.363	15,82	20,00	2,97	14,85
					52	Repositorio Fase 1	197.000	307.000	35.535	27,21	1,00	0,19	19,00
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	815.000	226.410	48,70	18,00	17,34	96,33
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	815.000	226.410	48,70	18,00	17,34	96,33
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad	10.400.000	10.018.450	492.862	24,47	13,19	0,74	5,61
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	7.199.700	7.291.850	276.501	30,08	14,00	0,65	4,64
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	1.761.000	1.611.900	91.905	18,46	12,00	0,64	5,33
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.289.300	1.112.200	121.956	8,25	11,00	1,21	11,00
					54	Remodelación Casa Guayra	150.000	2.500	2.500	72,68	27,32	0,50	1,83
					5	Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	57.900	53,95	2,00	1,14	57,00
					51	Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	57.900	53,95	2,00	1,14	57,00
					6	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	25.650	95,19	4,81	3,53	73,39
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	25.650	95,19	4,81	3,53	73,39
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	255.000	6.354	0,00	6,00	0,15	2,50
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	255.000	6.354	0,00	6,00	0,15	2,50
				23		Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no Nucleares							
					1	Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	519.502	35,53	3,00	2,34	78,00
					51	Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	519.502	35,53	3,00	2,34	78,00
					2	Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	880.000	692.880	42,35	26,00	34,30	131,92
					51	Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	880.000	692.880	42,35	26,00	34,30	131,92
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	165.467	0,00	4,00	3,30	82,50
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	165.467	0,00	4,00	3,30	82,50
				108		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
					16	Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	100.000	0	98,00	1,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	100.000	0	98,00	1,00	0,00	0,00
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	720.000	190.366	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	190.366	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras y Recuperación Bco. de Bombas del Laboratorio de Hid	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				354		MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
					17	Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR							
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	10.654.800	10.654.800	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.854.800	3.854.800	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	3.400.000	3.400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	3.400.000	3.400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	886.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	886.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	687.200	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	687.200	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricos	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricos	862.000	862.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

						FINANCIERO						
						Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Vigente al 30/06/2007	Devengado al 30/06/2007	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr. anual
					19	Recursos Hídricos						
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (2)	200.000	12.575.000	299.593	100,00	0,00	0,00
					56	Aliviador Cildanez - Etapa II (2)	0	6.775.000	299.593	100,00	0,00	0,00
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II (2)	200.000	5.800.000	0	100,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	457.041	0	0,00	100,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	457.041	0	0,00	100,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	9.264.462	476.792	0,00	90,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	9.264.462	476.792	0,00	90,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.624.290	1.074.000	0,00	1,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.624.290	1.074.000	0,00	1,00	0,00
					31	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	0,00
					51	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	0,00
					32	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Cr	900.000	0	0	0,00	18,00	0,00
					51	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Cr	900.000	0	0	0,00	18,00	0,00
					25	Ejecución de Obras de Arquitectura						
					1	Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	18.657.382	8.320.642	40,35	11,00	3,63
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	18.657.382	8.320.642	40,35	11,00	3,63
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	3.550.000	5.350.000	251.473	58,31	8,00	0,63
					51	Edificios Fiscales	3.550.000	5.350.000	251.473	58,31	8,00	0,63
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	1.000.000	6.587.400	2.049.897	16,14	5,00	6,15
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	900.000	5.282.000	2.049.897	0,00	5,00	6,15
					52	Defensa Costera	100.000	1.305.400	0	49,70	42,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,19
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,19
					12	Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	241.763	99,34	0,66	0,00
					51	Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	241.763	99,34	0,66	0,00
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescenci	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescenci	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	32.027	100,00	0,00	0,00
					51	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	32.027	100,00	0,00	0,00
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	62.334.636	33.726.724	32,51	25,00	32,57
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	62.334.636	33.726.724	32,51	25,00	32,57
					21	Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	6.200.000	2.471.971	10,16	52,00	10,48
					51	Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	6.200.000	2.471.971	10,16	52,00	10,48
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	5.898.499	5.898.499	93.739	0,00	8,00	0,00
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	1.937.806	1.908.334	9.553			
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	3.960.693	3.990.165	84.186	0,00	8,00	0,00
					24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	1.906.322	0,00	45,00	0,00
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	1.906.322	0,00	45,00	0,00
					25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00
					26	Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	350.000	0	0,00	5,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	350.000	0	0,00	5,00	0,00
					27	Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	400.000	0	0,00	6,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	400.000	0	0,00	6,00	0,00
					28	Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00
					51	Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					29	CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					51	CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00
					30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
					33	Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	300.000	0	0,00			
	30					Prevención Sísmica							
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	522.000	122.639	57,80	4,70	1,80	38,30
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estruct	482.000	522.000	122.639	57,80	4,70	1,80	38,30
	32					Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)							
					3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.245.000	4.536.923	1.220.674	57,00	32,00	8,00	25,00
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	594.027	19.939	4.821				
					51	Huellas Varias Misiones	250.973	250.973	0	59,00	32,00	10,00	31,25
					52	Huellas Mineras NOA	750.000	1.794.081	297.116	59,00	32,00	7,00	21,88
					53	Huellas Mineras Cuyo	750.000	1.400.828	768.737	59,00	32,00	10,00	31,25
					54	Huellas Mineras Comahue	450.000	450.000	150.000	54,00	32,00	10,00	31,25
					55	Huellas Mineras Patagonia	450.000	621.102	0	54,00	32,00	6,00	18,75
	50					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
					2	Obras Viales. Construcción Concesión y Explotación de Acceso:	100.000	105.000	52.345	0,00	5,00	0,00	0,00
					52	Puente Encarnación - Posadas	100.000	105.000	52.345	0,00	5,00	0,00	0,00
	13					Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	3.807.297	0,00	100,00	34,37	34,37
					51	Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	3.807.297	0,00	100,00	34,37	34,37
	14					Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00
	55					Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario							
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	99.288.912	99.288.912	41.780.965	99,75	0,25	0,02	8,00
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	9.501.725	11.482.725	4.589.660				
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	81.949.712	55.468.712	24.977.773	13,02	86,98	17,47	20,09
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	4.837.475	17.337.475	3.225.977	72,06	27,94	9,31	33,32
					66	Paso a Diferente Nivel, Municipio de San Fernando - Tigre	3.000.000	15.000.000	8.987.554	64,00	36,00	10,00	27,78
					4	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF :	78.318.491	77.918.491	18.241.969	12,42	46,98	14,11	30,03
					0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF :	4.933.332	4.933.332	1.079.197				
					51	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	73.385.159	72.985.159	17.162.772	12,42	46,98	14,11	30,03
	89					Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345)							
					1	Escuela Nacional Fluvial (1)	0	16.178.567	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional Fluvial (1)	0	16.178.567	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	91					Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	20.500.000	14.939.969	7,52	49,00	10,05	20,51
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	20.500.000	14.939.969	7,52	49,00	10,05	20,51
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concep	1.000.000	1.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concep	1.000.000	1.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					4	Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					5	Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					6	Reparación Puente Uriburu	0	460.000	0	79,00	21,00	21,00	100,00
					51	Reparación de Estructura de Tablero y Calzada	0	460.000	0	79,00	21,00	21,00	100,00
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	3.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	3.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	2.000.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	2.000.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	1.000.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	50.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	50.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	50.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	50.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	50.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	50.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					15	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	3.000.000	50.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	3.000.000	50.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					17	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	2.400.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	2.400.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					22	Reparación Parque España (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (1)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO							
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
					2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituz	19.920.237	24.920.237	14.902.414	66,59	26,74	16,05	60,02
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituz	742.512	742.512	3.433.051	84,77	15,23	15,23	100,00
					52	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurling	14.136.489	16.136.489	5.927.590	75,47	10,00	9,68	96,80
					53	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurling	5.041.236	8.041.236	5.541.773	39,53	40,47	23,24	57,43
					3	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Ca	29.103.558	29.103.558	15.955.446	46,90	43,00	16,85	39,19
					51	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Ca	21.173.555	21.173.555	8.296.972	56,92	43,00	13,37	31,09
					52	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distr	7.930.003	7.930.003	7.658.475	46,79	43,00	20,47	47,60
					4	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vis	8.631.415	15.131.415	10.761.789	57,27	40,73	34,84	85,54
					51	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vis	8.631.415	15.131.415	10.761.789	57,27	30,73	34,84	113,37

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					5	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Cór	27.309.750	24.809.750	9.103.686	20,43	50,20	33,38	66,49
					51	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Cór	27.309.750	24.809.750	9.103.686	20,43	50,20	33,38	66,49
					6	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	20.745.213	9.904.521	74,08	25,92	17,65	68,09
					51	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	20.745.213	9.904.521	74,08	20,00	17,65	88,25
					7	Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.126.865	19.126.865	3.396.891	23,48	35,52	9,81	27,62
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	12.949.333	12.949.333	3.396.891	46,95	43,05	15,15	35,19
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	6.177.532	6.177.532	0	0,00	18,00	4,46	24,78
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	24.540.227	25.740.227	11.651.446	31,86	25,79	18,69	72,47
					51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	6.708.350	7.908.350	6.590.301	60,43	39,57	22,67	57,29
					52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	17.831.877	17.831.877	5.061.145	3,28	30,00	14,71	49,03
					10	Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui B.	172.600	2.672.600	574.952	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui B.	17.359	2.517.359	551.632	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Perforación 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	155.241	155.241	23.320	0,00	2,00	0,00	0,00
					11	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja	4.247.851	6.047.851	5.157.795	43,39	26,61	51,37	193,05
					51	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja	4.247.851	6.047.851	5.157.795	43,39	26,61	51,37	193,05
					12	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. /	2.584.891	4.384.891	1.549.483	0,00	52,64	12,34	23,44
					51	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. /	2.584.891	4.384.891	1.549.483	0,00	52,64	12,34	23,44
					13	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	9.964.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					51	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	9.964.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00
					14	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	206.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	206.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					15	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagü	57.359	1.557.359	588.950	0,00	0,00	2,94	
					51	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagü	57.359	1.557.359	588.950	0,00	0,00	2,94	
					16	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Form	27.463.825	27.463.825	14.366.377	15,42	24,00	24,56	102,33
					51	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Form	18.611.840	18.611.840	4.063.135	10,31	25,00	6,27	25,08
					52	Optimización de Sisema de Provisión de Agua Potable Formosa	8.851.985	8.851.985	10.303.242	20,53	23,00	43,26	188,09
					17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	7.700	0,00	19,00	5,05	26,58
					51	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	7.700	0,00	19,00	5,05	26,58
					18	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	3.589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	3.589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					20	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.222.597	1.222.597	0	0,00	13,00	4,35	33,46
					51	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro	1.222.597	1.222.597	0	0,00	13,00	4,35	33,46
					21	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi	3.283.550	2.883.550	281.407	0,00	33,00	6,84	20,73
					51	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi	3.283.550	2.883.550	281.407	0,00	33,00	6,84	20,73
					22	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawsor	20.840.944	20.840.944	15.446.314	20,92	18,00	8,80	48,89
					51	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawsor	6.482.420	6.482.420	8.498.243	31,14	21,00	35,18	167,52
					52	Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	14.331.165	14.331.165	6.948.071	31,62	33,00	21,86	66,24
					53	Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson Sar	27.359	27.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	44.058.202	25.585.713	9,68	37,00	24,51	66,24
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	44.058.202	25.585.713	9,68	37,00	24,51	66,24
					24	Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Col	9.213.656	9.213.656	7.590.508	2,74	30,00	12,79	42,63
					51	Constr. de Planta Depuradora Norte - Tandil Bs. As. (#)	7.359	7.359	16.280	2,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil	9.206.297	9.206.297	7.574.228	3,48	60,00	25,48	42,47

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					25	Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil Bs. As.	3.006.352	7.006.352	4.901.763	83,88	16,12	30,40	188,59
					51	Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil Bs. As.	3.006.352	7.006.352	4.901.763	83,88	16,12	30,40	188,59
					26	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					28	Construcción de Acueducto L. del Tafí - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto L. del Tafí - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs.	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs.	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Estación de Bombeo- San Isidro - Buenos Aires	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	14.718	14.718	0	0,00	10,00	3,84	38,40
					51	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	7.359	0	0,00	10,00	3,84	38,40
					52	Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	7.359	0	0,00	10,00	3,84	38,40
					31	C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - CI	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - CI	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					33	Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					36	Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras Integral Desagües y Tratamientos (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero - Villa C.Brochero Cba.	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovi	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovi	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					46	Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
						51 Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	2.607.359	2.439.910	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	2.607.359	2.439.910	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				50		Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				53		Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				54		Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				55		Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				56		Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				57		Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Table	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Table	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				58		Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				59		Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				61		Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungat	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungat	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				62		Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				63		Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				65		Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				69		Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				72		Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				81		Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				87		Obras de Agua Potable (1)	233.714	233.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Perf. de 12 Pozos y Centros de Mezcla - Corimayo AB Bs .As. (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción de Redes de Distrib. Primarias - V. Indepen Bs .As	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción de Redes Secundarias B° San Martín - Lan. - Bs. /	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Ampliación de Redes y Construcción de Tanques Elevados para	204.278	204.278	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción de Redes de Expansión Primarias - Quilmes - Bs. .	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					88	Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. (1)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Perf. de 27 Pozos - Batería Unión - Ezeiza - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Construcción de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande Sur - B	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					91	Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					92	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs .As. (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs .As. (	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					98	Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora	200.000	200.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					99	Construcción de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	155.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	155.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
				1		Actividades Centrales							
					1	Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	222.499	96,23	3,77	1,38	36,60
					51	Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	222.499	96,23	3,77	1,38	36,60
					3	Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	581.743	581.743	0	32,00	15,00	11,00	73,33
					51	Construcción Edificio 25	581.743	581.743	0	32,00	15,00	11,00	73,33
				19		Producción de Información Geológica de Base							
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.347.000	326.360	31,11	3,00	1,32	44,00
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.347.000	326.360	31,11	3,00	1,32	44,00
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
				17		Infraestructura en Concesiones Viales							
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bu	11.104.037	18.368.786	14.359.786	43,68	56,32	35,93	63,80
					51	Autovía Cañuelas - Monte Grande - R.N. 3 - Km. 87,82- Km. 97,	11.104.037	18.368.786	14.359.786	43,68	56,32	35,93	63,80
					2	Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buenos Aires	1.402.765	62.000	60.605	93,45	6,55	0,17	2,60
					51	Obra de Alteo R.N.3 - Km. 607,5 - Km. 608,5 Coronel Dorrego -	1.402.765	1.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					52	Mejora de Interseccion R.N. 3 con R.N. 249 Acceso a Punta Alta	0	61.000	60.605	99,83	0,17	0,17	100,00
					3	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Buen	5.747.342	10.047.342	7.949.987	99,46	0,54	0,08	14,81
					51	Autovía Mar del Plata - Balcarce I Tramo R.226 - Km. 20,5 -	5.747.342	10.047.342	7.949.987	99,46	0,54	0,08	14,81
					4	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia Buenos	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Autovía Mar del Plata - Balcarce II Tramo - R.226- Km. 31,7 -	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					5	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires	1.402.766	3.898.305	1.580.197	17,97	44,15	28,12	63,69
					51	Mejora en Travesía Urbana R.N. 205 Km. C66 - Cañuelas Buen	701.383	2.401.383	1.580.197	35,93	64,07	51,52	80,41
					52	Mejora Intersección e Iluminación R.N. 5 -Km. 260 9 de Julio Bu	701.383	1.496.922	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	2.104.148	1.951.067	0	0,00	88,88	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección R.N. 7 Km. 202,16 Chacabuco - Buenos Air	701.383	1.000	0	0,00	88,88	0,00	0,00
					52	Mejora en Travesía Urbana R.N. 188 Km. 156,80 - Junín Bueno	1.402.765	1.950.067	0	0,00	88,88	0,00	0,00
					7	Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	1.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bu	48.920.782	10.835.829	5.648.614	5,57	53,22	12,89	24,22
					51	Autopista Luján - Mercedes Sección I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,4	24.448.391	4.070.114	0	0,00	66,67	0,00	0,00
					52	Autopista Luján - Mercedes Sección III RN 5 Km. 85,78 - Km. 9	24.472.391	6.765.715	5.648.614	10,55	39,80	14,93	37,51
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bu	35.069.138	15.552.128	15.551.942	15,80	58,97	30,37	51,50
					51	Tramo Campana - Zárate R.N. 9 Entre Km. 72,62- Km. 85,20	35.069.138	15.552.128	15.551.942	15,80	58,97	30,37	51,50
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe I	1.402.765	5.000.000	0	0,00	90,00	9,26	10,29
					52	Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista Santa	1.402.765	5.000.000	0	0,00	90,00	9,26	10,29
					11	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Bueno	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
						51 Obra Vinculación ex RN 193 Tramo Empalme RN 8 - Empalme I	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				12		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Cór	3.506.913	1.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
						51 Obra en RN A005-Tramo Empalme RN 8 - Empalme RP 36 - Se	3.506.913	1.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
				13		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe II	2.104.148	4.001.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en Intersección R.N. 33 Km.699,95 Venado Tuerto - Sa	701.383	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Accesos R.N. 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.402.765	4.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				14		Seguridad en Corredores Viales I (4)	1.364.954	11.685.637	1.375.805	70,15	10,00	12,99	129,90
						52 Construcción Pasarelas Peatonales RN 3 Km 76,75 Cañuelas B	1.000	58.800	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Rotonda Acceso a Wheelwright Santa Fe RN 8 Km 294,60 (2)	1.000	843.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Travesía Urbana Río Cuarto Córdoba R.N.8 Km. 598,8;A-5 Km (	1.000	21.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Pasarelas Peatonales R.N.9 Km.1349,0 B.Paz Tuc	1.000	20.100	20.094	100,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora Intersección y Construcción Colectoras R.N.3 Km.109 1	1.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Construcción Canal Desagües Pluviales - Aparicio R.N.3 Km.55!	35.069	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						63 Travesía Urbana R.N.188 Km.8,0 - 112,0 C.Salles , Erezcano, A	20.000	1.049.273	556.670	57,82	42,18	0,00	0,00
						66 Mejora Acceso a Vedia Buenos Aires. R.N.7 Km 312,26 Buenos	17.535	1.317.535	72.902	0,00	100,00	49,68	49,68
						67 Mejora Acceso a Alberti e Iluminación R.N. 5 Km. 189,39 Bueno	44.000	247.000	246.901	100,00	0,00	0,00	0,00
						68 Mejora Acceso Canalizado a la Laguna de Lobos R.N. 205 Km1	30.000	37.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corri	1.000	235.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207,00 Buenos Aires.	280.553	980.553	43.776	0,00	100,00	47,86	47,86
						76 Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km 369,88	701.383	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	70.138	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						79 Mejora Intersección Acceso a San Esteban - Los Cocos Córdoba	10.000	1.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						80 Mejora de Acceso a Pinto Santiago del Estero RN 34 Km 496,0E	10.000	74.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						81 Adecuación Urbana R.N. 34 km 1135,892-1138,886 Güemes Sa	35.069	1.035.069	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						82 Construcción Intersección Canalizada R.N.12 Km. 1383,25 Sant	105.207	1.465.207	435.461	0,00	100,00	93,16	93,16
				16		Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	140.277	967.755	556.015	51,39	48,61	46,86	96,40
						51 Iluminación Intersección R.N. 19 R.P.10 - Río Primero Córdoba	140.277	967.755	556.015	51,39	48,61	46,86	96,40
				17		Construccion de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aire	10.000	60.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcion pasarela peatonal R.N. 5 Km. 74,18 Jauregui	10.000	60.100	0	96,40	3,60	0,00	0,00
				21		Obras de Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buen	54.028	514.028	0	33,32	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal R.N.8 Km. 78 - Exaltación de la	30.000	140.000	0	31,42	50,00	0,00	0,00
						52 Construcción Colectora R.N. 3 Km. 109/110 - San Miguel del Mc	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Rotonda R.N. 3 Km. 192,34 - Intersección R.P. 30- I	14.028	364.028	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Cr	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.8 Sección.Km. 606 - 619 Tramo R	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				24		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Si	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.9 Km.1547 - 1555 Cabeza de Bue	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				25		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Si	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.34 Km.1129-1135,5 - Cabeza de E	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				26		Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán I	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tuci	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				27		Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán II	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				28		Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - C	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - C	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrier	1.402.765	1.102.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrier	1.402.765	1.102.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	4.942.343	13.520.457	633.680	30,88	47,62	3,38	7,10
					51	Rotonda en Intersección R.N.3 Km.448,7 - R.P. 75 González Ch	701.383	2.587.315	0	0,00	100,00	18,21	18,21
					52	Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Buenos Air	701.383	3.500.411	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Adecuación de Acceso RN7 Km 139 Carmen de Areco - Buenos	350.691	4.349.793	156.764	0,00	100,00	16,47	16,47
					54	Mejora Intersección R.N. 11 - Calle Santiago Cabral - San Loren	701.383	2.599.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Adecuación Acceso R.N.34 Km.252,60 - Sunchales - Santa Fe	172.941	476.941	476.537	93,01	6,99	6,98	99,86
					56	Mejora de Acceso R.N.12 Km.1056 Paso de la Patria Corrientes	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					57	Mejora en Intersección R.N.12 Km. 1361 Candelaria Misiones (1	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					58	Readecuación de Acceso RN12 Km.1398 San Ignacio Misiones	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					59	Readecuación de Acceso RN12 Km.1416 Santo Pipa Misiones (	280.553	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					60	Readecuación de Acceso RN12 Km. 1445 Puerto Leoni Misione	280.553	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					61	Rotonda e Iluminación en RN 3 Intersección con Av. Piazza Azu	701.383	1.000	378	0,00	87,50	0,00	0,00
					31	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de M	5.895.816	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					51	Construcción de Terceras Trochas R.N.12 Km.1370 -1399 Arroy	5.895.816	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					32	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de M	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					51	Construcción 3°Trocha R.N.12 Km.1399 - 1436 San Ignacio - Ja	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					33	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de M	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					51	Construcción 3°Trocha R.N.12 Km. 1442 - 1470 Jardín América	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					34	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de M	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					51	Construcción 3°Trocha R.N.12 Km. 1472,06 - Km 1540,33 - Pue	6.807.613	0	0	5,19	34,73	14,09	40,57
					35	Construcción 3°Trocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provinc	6.807.613	14.408.849	11.934.849	5,19	34,73	14,09	40,57
					51	Construcción 3°Trocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provinc	6.807.613	14.408.849	11.934.849	5,19	34,73	14,09	40,57
					36	Construccion Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	858.621	871.354	99,87	0,13	0,00	0,00
					51	Construccion Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	858.621	871.354	99,87	0,13	0,00	0,00
					37	Seguridad en Corredores Viales en Provincia de La Pampa I	701.383	1.601.383	1.528.684	49,61	50,39	43,35	86,03
					51	Readecuación Acceso Planta Urbana R.N. 5 Km. 605 - 606 - Sa	701.383	1.601.383	1.528.684	49,61	50,39	43,35	86,03
					38	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de M	30.558.390	43.220.845	15.938.533	61,20	38,80	22,35	57,60
					51	Doble Vía Santa Rosa - General San Martín R.N.7 Km. 965,51-9	30.558.390	43.220.845	15.938.533	61,20	38,80	22,35	57,60
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Peaje Jaúregui	2.920.751	2.920.751	220.708	96,77	3,23	0,20	6,19
					51	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II R.N.5 Km. 72,42	2.920.751	2.920.751	220.708	96,77	3,23	0,20	6,19
					40	Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de San	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
					51	Ensanche Puente sobre Río Dulce R.N.9 Km.1205 - Termas Ríc	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
					48	Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Santa Fe	0	79.000	0	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN9 Km376 Cañada de Gomez	0	79.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San M	50.000	165.000	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San M	50.000	165.000	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00
					64	Iluminación RN 11 en Chaco	50.000	380.000	284.824	75,94	24,06	22,84	94,93
					51	Iluminación RN 11 Km1000 - 1002 Resistencia Chaco	50.000	380.000	284.824	75,94	24,06	22,84	94,93
					65	Construcción de Destacamentos Policiales Provincia de Buenos	2.496.922	1.000.000	0	0,00	30,71	13,00	42,33
					51	R.N.9 Km.54 Loma Verde - Escobar, RN9 - RP6 - Campana,RN	2.496.922	0	0	0,00	30,71	0,00	0,00
					52	R.N.205 y R.P.51 Saladillo, R.N.205 y 226 Bolivar, R.N.3 y RP8	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	R.N.22 Km. 714 Medanos, R.N.222 Km.769 Algarrobo - Punta A	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	R.N.188 Km.398 Banderale, R.N.33 entre R.P.65 Guamini, R.N.	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales - Km.31 Autopis	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					67	Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III	701.383	1.379.349	877.266	79,16	20,84	20,83	99,95
					51	Pavimentación Colectora, Construcción e Iluminación Pasarelas	701.383	1.379.349	877.266	79,16	20,84	20,83	99,95
					68	Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe	140.277	740.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
						51 Iluminación Distribuidor Funes - Autopista Rosario - Armstrong II	140.277	740.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				69		Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	1.403.467	9.494.489	1.029.598	0,00	76,66	30,64	39,97
						51 Intersección Canalizada R.N.188 - Construcción Bicisenda Amei	701.383	4.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Intersección Canalizada para Giro Camiones R.N. 33 Km. 711 -	701.383	3.701.383	1.029.598	0,00	100,00	75,84	75,84
						53 Mejora Travesía Urbana R.N. 8 Venado Tuerto Santa Fe (1)	701	1.793.106	0	0,00	30,00	11,05	36,83
				70		Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistenc	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistenc	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				71		Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	370.277	741.277	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Rama de Salida Km.21 Autopista Richieri Buenos Aires	140.277	740.277	0	1,00	100,00	0,00	0,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas (1)	230.000	1.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				72		Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	1.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
						51 Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	1.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00
				73		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires II (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en San Miguel del Monte y Punta Alta R.N	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				74		Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bueno	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00
						51 Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bueno	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00
				75		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba (1)	2.103	3.636.893	0	0,00	48,19	0,00	0,00
						51 Puente Sobre el Arroyo El Ajó R.N. 7 Km. 600 - Córdoba (1)	701	3.635.491	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9 - Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149 - 203 Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales (1)	80.000	2.090.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta (1)	80.000	2.090.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				77		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Santiago del Estero (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puente sobre el Río Dulce R.N. 34 Santiago del Estero (	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				78		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos (1)	112.000	5.000.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
						51 Acceso a Gualaguaychú R.N. 14 Entre Ríos (1)	112.000	5.000.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00
				80		Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provinc	701	3.575.734	0	0,00	88,88	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provinc	701	3.575.734	0	0,00	88,88	0,00	0,00
				81		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires III (1)	141.917	4.012.216	502.083	0,00	17,06	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección y Colectora R.N.3 Km. 186.72 - 187.29 Las	701	701	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						52 Mejora Intersección y Colectora R.N. 5 km 208 - 211 Bragado - I	701	4.000.000	502.083	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Tercer Puente La Niña R.N. 252 Buenos Aires. (1)	130.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Rotonda en Intersección R.N. 3 - R.N. 252 El Triángulo Buenos .	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg R.N. 3 Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Acceso Canalizado Dorrego (1)	701	701	0	0,00	85,72	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av Caseros y San Martín -Tres Arroyos (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Ilumación Rotondas R.N. 205 - R.P. 65 y R.P. 30 y R.N. 226 Bur	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Obras de Alcantarillado en Bolívar - Buenos Aires (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam R.N.5 Km.305 - 30	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191 - Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av Elguera - Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución - Córdoba (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias - Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Iluminación Acceso a Zárate R.N. 3 - Buenos Aires (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					82	Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II (1)	4.907	2.175.201	0	0,00	33,36	1,00	3,00
					51	Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo - Sant	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Iluminación de Empalme de Acceso a R.P. 26 - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Iluminación Ingreso Arroyo Seco R.N. 9 - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					55	Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo - Santa Fe	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Travesía Urbana en Murphy RN 33 - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Travesías Urbanas en RN 11 (1)	0	2.170.995	0	0,00	100,00	1,66	1,66
					83	Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					84	Travesía Urbana en Capióvi RN 12 - Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Travesía Urbana en Capióvi RN 12 - Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualaguaychú - Prov	200.000	16.974.826	5.693.707	0,00	1,00	2,94	294,00
					51	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualaguaychú - Prov	200.000	16.974.826	5.693.707	0,00	1,00	2,94	294,00
					86	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Bu	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Bu	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					88	Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (	0	3.710.416	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (	0	3.710.416	0	0,00	100,00	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas							
					1	Infraestructura en Áreas Urbanas	455.197	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					53	Rotonda en Intersección RN15 y Av. Monseñor Rosch - Concor	350.691	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					54	Iluminación en Intersección R.N.14 y R.N. 15 - Concordia - Entre	104.506	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					2	Seguridad en Áreas Concesionadas II	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00	0,00
					51	Repavimentación RP 42 Sección RP 51 Acceso a Rawson Bs.A:	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00	0,00
					3	Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 L	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 L	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	645.000	0	68,71	31,29	0,00	0,00
					51	Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	645.000	0	87,39	12,61	0,00	0,00
					5	Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P.	36.220.978	44.551.549	31.832.107	40,18	59,82	39,09	65,35
					51	Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P.	36.220.978	44.551.549	31.832.107	40,18	59,82	39,09	65,35
					6	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuel	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuel	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					7	Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido	701.383	3.201.383	1.977.895	29,77	70,23	61,53	87,61
					51	Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido	701.383	3.201.383	1.977.895	29,77	70,23	61,53	87,61
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	7.328.747	7.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Accesos Sur - R.N. 14 Km.252,60 Concordia - Entre	7.328.747	7.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					11	Obras Menores en Áreas Urbanas	701.383	3.119.799	73.991	0,00	100,00	28,50	28,50
					51	Pavimentación Tramos Urbanos RN 9 Km 100,49 Lima Buenos .	701.383	3.119.799	73.991	0,00	100,00	28,50	28,50
					12	Seguridad en Áreas no Concesionadas	210.415	2.966.205	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	210.415	2.966.205	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					13	Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiz	701.383	4.252.912	0	0,00	100,00	10,37	10,37
					51	Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiz	701.383	4.252.912	0	0,00	100,00	10,37	10,37
					14	R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aire	0	4.992.640	0	0,00	46,67	0,00	0,00
					51	R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aire	0	4.992.640	0	0,00	46,67	0,00	0,00
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	3.441.747	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	3.441.747	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado a	anual vigente	30/06/2007	Ejec./Progr.
								30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006			anual
					16	Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia d	0	4.992.640	0	0,00	87,50	0,00	0,00
					51	Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia d	0	4.992.640	0	0,00	87,50	0,00	0,00
				19		Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales							
				1		Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 - Año II - I Etapa	5.000.000	28.206.981	24.273.676	25,40	74,60	46,97	62,96
					51	Obra Mejorativa N°212 Corredor Vial 2 - RN5 Km.98 -107 Km.14	1.000.000	9.192.000	8.010.949	48,11	51,90	47,53	91,58
					52	Obra Mejorativa N°221 Carredor Vial 2-RN7 Km. 259 - 276	1.000.000	8.569.852	6.342.254	14,32	85,68	77,53	90,49
					53	Obra Mejorativa N°208 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Km. 457 - 492	1.000.000	4.439.166	3.914.792	91,20	8,80	8,80	100,00
					55	Obra Mejorativa N°211 R.N.7 Km. 399 - 406 Km.424 - 457	2.000.000	6.005.963	6.005.682	16,18	83,82	56,05	66,87
				2		Corredor Vial 3	5.000.000	3.425.729	2.391.699	0,91	68,83	19,68	28,59
					51	Obra Mejorativa N°214 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.157-206	2.000.000	2.221.000	1.187.200	1,82	58,75	10,72	18,25
					52	Obra Mejorativa N°201 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.96-106	3.000.000	1.204.729	1.204.499	0,00	100,00	30,80	30,80
				3		Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 - Año II - I Etapa	7.000.000	24.975.057	19.973.056	6,64	80,86	63,25	78,22
					51	Obra Mejorativa N°205 Corredor Vial 4 R.N.8 Km.661 - 695	3.500.000	13.578.213	11.322.212	19,93	80,07	60,47	75,52
					52	Obra Mejorativa N°206 Corredor Vial 4 R.N.33 Km.586 - 616, Ki	3.500.000	11.396.844	8.650.843	0,00	100,00	67,42	67,42
				5		Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa	29.138.939	29.775.505	16.993.635	15,54	66,65	33,67	50,52
					0	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa (1)	3.000.000	1.000.000	792.841				
					51	Obra Mejorativa N°217 Corredor Vial 5 - R.N.9 Km. 1215 - 1225,	9.273.024	7.968.503	5.991.453	75,92	24,08	19,89	82,60
					52	Obra Mejorativa N°203 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 584 - 612, I	5.000.000	7.300.089	7.299.296	8,87	91,13	64,92	71,24
					53	Obra Mejorativa N°227 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Km. 1164 - 11'	4.359.002	6.506.913	2.910.046	8,56	91,44	88,29	96,56
					54	Obra Mejorativa N°218 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 66,00 - 86,(	7.506.913	7.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				6		Obras de Mejoras en Corredor Vial 1 - Año II - Etapa II (1)	99.000	99.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra 236 Corredor Vial 1 - R.N. 3 y RN 252 - Km. 669-677 R.N.	98.000	98.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra 241 Corredor Vial 1 - R.N. 3 Acceso Barrow - Acceso Tres	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Obras de Mejoras en Corredor Vial 2 - Año II - Etapa II (1)	546.000	546.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra 209 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 10 Acceso a V	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra 222 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Límite San Luis / Mendoza - A	160.000	160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obra 224 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 6 - R.P. 41 Km	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obra 234 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Acceso Carlos Casares - Acce	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Obra 240 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Límite Buenos Aires / La Pam	145.000	145.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa (1)	729.000	729.000	0	0,00	1,91	0,00	0,00
					51	Obra 202 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Acceso a San Per	133.000	133.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Obra 215 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Río Tala (1)	120.000	120.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					53	Obra 216 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Tala - RP 51 (1)	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					54	Obra 223a Corredor Vial 3 - R.N. 11 Arosena - Santo Tobrae - S	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					55	Obra 223b Corredor Vial 3 - R.N. 11 Santo Tobrae - Santa Fe (1	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
					56	Obra 232 Corredor Vial 3 - R.N. 188 Empalme R.P. 1 Empalme	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				9		Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa (1)	327.000	327.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra 235 Corredor Vial 4 - R.N. 8 Arrecifes - Pergamino Km. 17;	197.000	197.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra 239 Corredor Vial 4 - R.N. 36 Almafuerte Acceso Los Molir	130.000	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Obra de Mejora en Corredor Vial 5 - Año II - II Etapa (1)	369.000	369.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra 210 Corredor Vial 5 - R.N. 9 Río Juramento Empalme - R.1	97.000	97.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obra 219 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Acceso Cañada Rosquín Ei	125.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obra 220 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Límite Santa Fe / Santiago c	147.000	147.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Obra de Mejora en Corredor Vial 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Obra de Mejora en Corredor Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

						FINANCIERO						
						Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado a	Programación anual vigente	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006		30/06/2007	anual
					13	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00
					14	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00
					15	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00
					16	Obra de Mejora en Corredor Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en Corredor Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS						
				16		Control del Sistema Nacional de Aeropuertos						
					10	Reacond. de Plataformas, Pistas y Calles Aerop. Villa Gesel (1)	2.950.000	2.950.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Nivelación y Puesta en Norma Franja de Seguridad Aeropuerto `	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00
					52	Cerco Operativo del Aeropuerto de Villa Gesell (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00
					11	Reacondicionamiento de Plataformas, Pistas y Calles Rodaje Ae	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Bacheo, Reparación Estruct. Sup. de Pista, Calle Rodaje y Baliz	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00
					12	Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje .	1.840.313	1.840.313	0	0,00	100,00	0,00
					51	Cerco Operativo del Aeropuerto de Junín (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00
					52	Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00
					13	Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Pe	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00
					51	Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Pe	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00
70						Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología						
				336		SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA						
				43		Formul.e Implementación de la Polit.de Ciencia y Tecnología						
					2	Acondicionamiento del Edificio Central (1)	200.000	360.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Implementación de Sistemas de Seguridad (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00
					52	Tendido de Red (1)	100.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social						
				350		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL						
				1		Actividades Centrales						
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)(***)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00
					3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00
					5	Reparación Edificio Callao Nº 114 (1)(***)	1.260.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	0,00	0,00
					52	Reparación Primer Subsuelo Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	0,00	0,00
				22		Regularización del Trabajo						
					6	Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.334.000	0	0,00	100,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.334.000	0	0,00	100,00	0,00
80						Ministerio de Salud						
				310		MINISTERIO DE SALUD						
				1		Actividades Centrales						
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.750.000	495.095	0	0,00	53,00	0,00
					52	Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central	1.750.000	495.095	0	0,00	53,00	0,00
				903		HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER						
				53		Atención a Enfermos						
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	750.000	0	0	32,05	67,95	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

							FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación	Ejecutado al	% Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/06/2007	30/06/2007	31/12/2006	anual vigente	30/06/2007	anual
						55 Refacción Integral de Pabellones N° 3 ,5 y 8	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Reparación y Mantenimiento en Hospital	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Reparación de Usina	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				11		Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	64.599	87,00	13,00	49,00	376,92
					51	Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	64.599	87,00	13,00	49,00	376,92
				13		Construcción de Quirofano	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Quirofano	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
906						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN							
				56		Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Dist. Areas del Ed. Cent. de A	1.605.413	466.007	381.788	0,00	100,00	70,00	70,00
					51	Reconst. de Veredas y Arm. de la Red Pluv. del Pabe. Ppal. de /	164.658	164.658	381.788	0,00	100,00	70,00	70,00
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanq	393.349	153.943	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Puesta en Valor y Consolid. de las Fachadas, Vestíbulo de Acce	914.765	14.765	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Adecuación de los Serv. de Higiene, Seguridad y Arquitectura (1	50.312	50.312	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Remodelación y Refuncionalización de la Amp. de las Of. del Dc	82.329	82.329	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				1		Desarrollo y Producción de Biológicos	0	600.000	0	0,00			
					3	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biológico:	0	600.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Remodelación de los Laboratorios para Envases de Inyectables	0	300.000	0	0,00		0,00	0,00
					52	Remodelación del Sector Liofilizador	0	300.000	0	0,00		0,00	0,00
				5		Control de Calidad de Biológicos (3)	0	115.000	0	0,00			
					3	Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad	0	115.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Adecuación de Laboratorios del Primer Piso	0	115.000	0	0,00		0,00	0,00
				8		Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias	0	600.000	0	0,00			
					3	Mejoramiento Edificio Instituto Nacional de Epidemiología "DR. J	0	600.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Interno	0	600.000	0	0,00		0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
				59		Atención de Pacientes							
					2	Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR							
				60		Atención a Discapacitados Psicofísicos							
					1	Construcción Natatorio	250.000	250.000	63.093	44,76	31,73	25,23	79,51
					51	Construcción Natatorio	250.000	250.000	63.093	44,76	31,73	25,23	79,51
				7		Remodelación del Inst. Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Su	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				8		Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	206.800	92.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Archivo General 2° Etapa (1)	64.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Departamento Residentes (1)	44.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Farmacia (1)	48.000	48.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Laboratorio (1)	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2007

							FINANCIERO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/06/2007	Crédito Devengado al 30/06/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado al 30/06/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción							

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercici

(**) Proyectos y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicic

(***) Los créditos del proyecto 5 fueron reasignados por Resolución M.T.E. y S.S. N° 236 al proyecto 2. El proyecto 5 fue dado de baja en el ejercicio 2007 por problemas licitato

s/i Sin información

(#) Proyectos y obras del ENOHSA que no pudieron cumplimentar la primera programación física debido a que el crédito vigente no es suficiente para el inicio de los mismos. (incluye los proyectos del 31

(1) Proyectos y obras nuevos ingresados en el ejercicio 2007 a través de la Ley de Presupuesto y en la D.A.

(2) Obra terminada físicamente, los devengados corresponden a certificaciones atrasadas.

(3) Proyectos y Obras incorporados durante el transcurso del ejercicio 2007.

(4) Proyectos y obras con ejecución mayor a la programada.

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico								
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs					
MANTENIMIENTO																								
Mantenimiento por Administración																								
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		31/12/2006	30/11/2007	27.930	5.765.000	35.483.623	33.707.715	25,0%	41,7%	6	B					
16	1	2	51	PAIS	VS	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		31/12/2006	30/11/2007	6.450	3.088.000	6.450.394	6.450.393	25,0%	41,7%	6	B					
Total Mantenimiento por Admininistración												34.380	8.853.000	41.934.017	40.158.108									
Mantenimiento por Contrato																								
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp.R.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	17/02/2007	15.251	68.000	429.311	429.304	0,0%	77,5%	7						
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-	11	403,4	29/04/1997	27/03/2004	3.616	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8						
Total Mantenimiento por Contrato												18.867	168.000	429.312	429.304									
Mantenimiento por Convenio																								
16	3	24	51	LA PAMPA	143,151,152	TFO La Pampa Convenio N 10		11	633,3	01/01/2006	31/12/2007	8.571	3.007.000	1.530.451	1.530.450	19,3%	58,2%	6						
16	3	25	51	NEUQUEN	22,40(S),234	TFO Neuquén Convenio N 10		11	528,4	01/01/2006	31/12/2007	7.489	2.163.000	1.913.155	1.781.472	14,3%	51,7%	6						
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Río Negro Convenio N 10		11	1.136,5	01/01/2006	31/12/2007	8.482	2.808.000	3.016.823	2.119.079	12,7%	72,4%	6						
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO Santa Cruz Convenio N 10		11	2.207,3	01/01/2007	31/12/2007	24.839	18.950.000	22.745.488	6.045.487	25,0%	41,7%	6	A					
16	3	28	51	FUEGO	3 com a,b,m,i	TFO Tierra del Fuego Convenio N 9		11	520,5	01/01/2006	31/12/2007	10.191	2.186.000	9.106.407	3.539.778	13,4%	78,1%	6						
16	3	30	51	JUJUY	52, 40(N), Ex RP16	TFO Jujuy Convenio N 10		11	392,8	01/01/2006	31/12/2007	3.495	455.000	881.422	881.421	14,2%	66,5%	6						
16	3	31	51	SALTA	51-40-86	TFO Salta Convenio N 10	Tramos Varios	11	482,4	01/01/2006	31/12/2006	2.614	11.000	11.000	0	0,0%	100,0%	7						
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO Formosa Convenio 8		11	236,0	01/01/2006	31/12/2007	3.626	1.925.000	726.297	726.296	6,9%	84,8%	6	A					
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	01/09/2006	30/08/2008	2.048	398.000	1	0	9,8%	34,7%	6						
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/2004	31/03/2006	4.895	2.669.000	496.140	496.138	0,0%	100,0%	7						
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	01/01/2004	30/12/2007	5.873	2.994.000	1	0	5,1%	51,2%	6	A					
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-150	TFO La Rioja Convenio 7		11	434,5	01/12/2006	30/11/2007	4.286	2.000.000	536.326	536.325	25,0%	50,0%	6						
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco Convenio 2		11	163,4	01/01/2006	31/12/2007	1.864	1.000.000	382.898	382.897	12,4%	64,1%	6						
16	3	39	51	TUCUMAN	9,38	TFO Tucumán Convenio N 6		11	67,4	01/01/2006	31/12/2007	2.558	1.000.000	1	0	9,7%	55,0%	6						
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO Convenio 8:Belén- Lte.c/Tucumán	km. 798,82- km 986,82	11	188,0	01/11/2007	30/10/2008	2.632	20.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO Convenio2: Emp. RP Nº20 - Emp. RP Nº17	km1056,32 - km1116,96	11	60,6	01/11/2007	30/10/2008	850	6.000	6.000	0	0,0%	0,0%	0						
Total Mantenimiento por Convenio												94.313	41.592.000	41.352.411	18.039.343									
Señalamiento																								
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal - Nacional	Nacional	12		30/11/2006	30/11/2007	38.755	5.714.000	50.355.258	41.656.396	25,0%	41,7%	6	B					
Total Señalamiento																								
Obras de Emergencia																								
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14		01/01/2007	31/12/2007	23.423	3.571.000	37.942.943	30.039.558	25,0%	41,7%	6	B					
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2007	31/12/2007	1.580	3.571.000	1.579.891	1.579.890	25,1%	41,8%	6	B					
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/2007	31/12/2007	0	143.000	1	0	0,0%	0,0%	6						
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2007	31/12/2007	2.000	4.286.000	2.154.921	2.101.620	25,1%	41,8%	6	B					
Total Obras de Emergencia												27.002	11.571.000	41.677.756	33.721.068									
Mantenimiento por Sistema Modular																								
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/2004	17/07/2008	5.951	29.000	1	0	4,3%	55,2%	6						
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional Nº 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	11	326,6	03/12/2004	02/04/2008	7.989	510.000	772.884	772.882	0,9%	80,4%	6						
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/2004	02/10/2007	10.314	1.387.000	297.857	297.856	5,3%	60,7%	6						
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional Nº 25 - Emp. Ruta Provincial Nº 56 (Río	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/2004	06/11/2007	9.742	205.000	630.000	629.269	15,3%	80,3%	6						
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 -	11	147,1	22/01/2007	20/01/2009	6.033	63.000	168.352	168.350	15,4%	18,2%	6						
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mdza - Lte S.Juan / S.Martin -	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 -	11	194,7	02/01/2007	31/12/2008	9.909	386.000	313.308	313.307	11,1%	18,4%	6						
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/2005	16/06/2007	15.118	1.109.000	553.754	553.753	12,8%	53,2%	6						
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN.N° 11 - A Nivel RN.N° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema	11	14,4	21/07/2005	20/07/2007	7.017	831.000	790.733	790.732	32,3%	90,2%	6						
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/2004	12/07/2008	9.048	54.000	1.188.061	1.188.060	5,7%	71,7%	6						
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 -	11	259,0	15/04/2004	13/04/2008	8.699	990.000	668.675	668.674	1,7%	69,7%	6						
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/11/2007	30/10/2009	7.037	27.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01/11/2007	30/10/2009	6.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	21	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. RN Nº105	km1336 - km1349	11	13,2	01/11/2007	30/10/2008	1.500	2.000	2.000	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. R.n. Nº 51	km 4433,87 - km 4594,22	11	160,4	01/10/2007	29/09/2009	5.950	23.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Lte con Chile / S.A. De los Cobres - Lte con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/10/2007	29/09/2009	7.736	30.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. Nº 40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	01/09/2007	30/08/2009	7.738	30.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	25	51	CHUBUT	40	Los Tamariscos - Emp. Ex. RNN 25	Km. 1467,67 - km 1739,73	11	259,1	31/10/2007	27/02/2009	9.300	35.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	26	51	CHUBUT	26	Emp (Ex) RN Nº 26 Emp RN Nº 40	km 102,47 - km 210,17 / km 1815,71 - km 1865,6	11	157,6	01/10/2007	29/09/2009	5.700	22.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	27	51	BUENOS AIRES	---	Mant., Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte Avellaneda	11		31/08/2007	29/04/2009	31.000	24.000	1	0	0,0%	0,0%	0						
16	6	29	51	MENDOZA	40 - 145	Lte Neuquén - Malargue y B Blancas - Acc C Grande		11	257,4	01/10/2007	29/09/2009	20.672				0,0%	0,0%	0						
16	6	30	51	SALTA	34-50	Lte. Con Jujuy - Lte. Inter. Con Bolivia/Emp RNN ° 34-Lte.con	km 1287 - km 1484 / 0,00 - km 71,1	11	17,0	01/07/2007	29/06/2009	17.300				0,0%	0,0%	0						

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
Total Mantenimiento por Sistema Modular												209.753	5.803.000	5.385.633	5.382.883					
Obras de Seguridad Vial																				
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	17	200,0	01/11/2007	01/05/2008	11.000	407.500	407.500	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	3	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)	200 Km	17	200,0	01/11/2007	01/05/2008	11.000	557.500	557.500	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	17	30,0	01/11/2007	31/08/2008	8.292	414.000	414.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/08/2007	30/11/2007	2.300	144.000	144.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/11/2007	01/03/2008	2.000	84.000	84.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. C/R.P.N° 6, R.P.N° 2 y Acc. A Bovril	Inter. R.N.N°127 - R.P.N°2 - Acc. Bovril	17	5,5	16/04/2007	18/10/2008	11.857	134.000	1	0	7,4%	7,4%	6		
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/2007	30/09/2008	2.000	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex		17	1,0	01/08/2007	31/12/2007	11.488	95.000	95.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	01/10/2007	01/03/2008	300	5.000	5.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/08/2007	31/12/2007	600	13.000	13.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	1,0	01/08/2007	30/01/2008	1.200	1.251.000	1.251.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/08/2007	30/01/2008	600	151.000	151.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RPN° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	01/08/2007	30/01/2008	500	125.000	125.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	54	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		17	1,0	01/08/2007	30/01/2008	2.000	56.000	56.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con Ruta N° 95 y R.P.N°2		17	1,0	01/10/2007	31/03/2008	1.800	28.000	28.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/RNN° 81	(Prog. Inic. 1184) Int. e Iluminación	17	1,0	01/10/2007	31/05/2008	3.000	63.000	63.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	51	ESTERO	89	Emp.RPN° 116 - Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116		17	1,0	01/08/2007	30/01/2008	450	112.000	112.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Int. RNN° 20 y RNN ° 79		17	1,0	01/09/2007	01/03/2008	2.937	31.000	31.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RNN 9)	17	1,0	07/11/2006	06/11/2007	7.724	134.000	670.915	670.914	23,0%	31,7%	6	A	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I: Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	8	12,2	01/09/2007	30/09/2008	10.000	27.000	27.000	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II: Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	8	4,0	01/09/2007	31/03/2008	3.500	18.000	18.000	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras de Seguridad Vial												94.548	3.950.000	4.352.916	670.914					
Total Mantenimiento												517.618	77.651.000	185.487.303	140.058.016					
CONSTRUCCIONES																				
Corredores Viales I																				
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/2001	23/03/2003	12.589	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués	8	33,0	03/02/1997	03/05/2007	9.362	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marqués - La Quiaca	8	48,3	03/02/1997	03/05/2004	13.596	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/1997	27/10/2003	18.814	1.065.000	1	0	0,0%	94,3%	7		
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III A: Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	8	9,8	21/02/2001	21/01/2004	28.314	576.000	1	0	0,0%	94,4%	7		
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/1997	26/10/2005	24.210	1.967.000	1	0	0,0%	91,9%	8		
Total Corredores Viales I												106.885	3.908.000	6	0					
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																				
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/2006	15/04/2008	89.010	10.031.000	42.151.623	26.307.035	13,7%	61,8%	6	C	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01/06/2007	30/05/2010	60.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	6	51	ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	17/06/2008	46.094	29.000.000	18.475.095	3.928.986	3,3%	9,7%	6		
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado	km 260 - km 278,69	8	18,7	01/06/2007	30/05/2008	6.938	116.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (Prog. 502 - Prog. 520)	8	18,0	04/01/2005	28/02/2007	15.139	304.000	7.833.127	29.126	0,0%	100,0%	8		
22	2	18	51	FUEGO	Comp.I	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/2007	30/10/2008	13.000	99.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2007	30/10/2010	60.000	115.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	23	51	ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/2006	16/04/2008	45.290	25.466.000	16.692.394	3.531.083	4,5%	10,3%	6		
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/2007	30/10/2009	26.400	67.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	5	64,3	31/05/2007	29/08/2008	94.071	367.000	9.407.162	9.407.161	0,0%	0,0%	4		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	01/11/2007	30/10/2008	28.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2007	30/10/2009	18.000	69.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		5	70,0	01/11/2007	30/10/2009	46.000	176.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04/01/2005	03/02/2007	12.835	28.000	7.528.000	0	0,0%	100,0%	8		
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		8	19,0	01/11/2007	01/05/2009	68.244	348.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/2007	01/05/2010	40.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/2002	14/12/2004	32.003	746.000	746.000	0	0,0%	97,7%	7		
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/2003	09/11/2004	33.502	218.000	218.000	0	0,0%	97,5%	7		
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - Prog. 393 (Emp. RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01/11/2007	30/10/2009	57.152	157.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/2005	16/05/2008	68.036	26.318.000	46.108.834	7.310.851	1,9%	36,0%	6		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elía)	8	27,7	30/06/2006	28/12/2008	101.021	20.000.000	64.845.023	14.930.487	1,0%	5,5%	6		
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elía) - A°Colman	8	34,8	01/06/2007	30/05/2010	171.447	32.222.000	32.222.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	01/06/2007	30/05/2010	228.409	32.222.000	32.222.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	01/06/2007	30/05/2010	254.938	32.222.000	32.222.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/2007	30/05/2010	190.399	32.224.000	32.224.000	19.039.928	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A° Ayuí Grande	8	32,7	01/06/2007	30/05/2010	225.310	10.208.000	10.208.000	45.371.922	0,0%	0,0%	2		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	01/06/2007	30/05/2010	186.989	32.222.000	32.222.000	18.698.872	0,0%	0,0%	15		
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	35,9	01/06/2007	30/05/2010	206.079	32.222.000	32.222.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	01/06/2007	30/05/2010	165.270	36.250.000	29.000.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	01/06/2007	30/05/2010	139.932	36.250.000	11.000.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/06/2007	30/05/2010	16.127	36.250.000	31.750.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	01/06/2007	30/05/2010	165.845	36.250.000	36.250.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	01/06/2007	30/05/2010	128.200	36.250.000	36.250.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	01/06/2007	30/05/2010	63.599	6.000.000	6.000.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/06/2007	30/05/2008	10.000	2.082.000	2.082.000	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/2007	30/10/2008	10.000	74.000		1	0	0,0%	0,0%	0	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración												3.123.279	506.986.000	569.879.270	148.555.451					

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	400,0	30/11/2006	30/11/2007	615	4.286.000	9.738.769	1.245.043	24,9%	41,5%	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A° Vinchina - A Jague y B: Acc a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	30/1/2008	67.373	7.845.000	16.344.949	15.757.036	9,9%	53,2%	6	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/1999	12/02/2008	99.657	12.787.000	7.186.261	7.186.079	0,4%	21,2%	6	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	8	46,1	17/05/1999	14/03/2008	78.886	18.001.000	20.691.272	17.961.270	21,0%	65,6%	6	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	25,0	05/07/1999	02/12/2007	38.151	3.733.000	31.328.223	14.220.005	6,8%	67,2%	6	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	la-lb-ll - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/1999	07/03/2008	65.261	7.686.000	1	0	10,5%	25,0%	6	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	11/11/2008	241.392	15.206.000	1	0	0,0%	0,0%	14	
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/1999	28/02/2007	45.524	3.748.000	11.900.511	9.588.037	0,0%	92,2%	7	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	30/12/2006	27.530	794.000	1.759.461	1.759.460	0,0%	100,0%	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/1992	29/03/2000	32.610	2.206.000	1	0	0,0%	88,2%	7	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	8	30,0	15/06/1999	11/06/2008	21.335	1.203.000	1	0	12,2%	26,6%	6	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19/02/2001	20/07/2004	28.524	40.000	40.000	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/1993	18/03/2007	47.155	52.000	4.063.661	0	0,1%	100,0%	7	A
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala - Emp. 52/ Perico-Jujuy/Emp 9- Lte. c/Chile	8	267,0	08/09/2000	08/03/2004	208.395	6.081.000	6.081.000	0	0,0%	97,1%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07/07/1999	02/02/2007	4.309	268.000	1	0	0,0%	89,9%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martín (R.N. N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	25/09/2007	98.654	15.270.000	11.893.784	11.893.783	9,1%	25,1%	6	A
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/2004	13/04/2006	12.688	228.000	45.726	45.724	0,0%	91,1%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20/11/2000	19/10/2004	11.890	1.478.000	979.014	979.013	0,0%	99,5%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02 DNU	5	49,7	01/09/2005	30/08/2008	84.500	521.000	24.653.138	20.050.922	16,1%	36,3%	6	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. R.P. N° 286 - Lte. C/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20 DNU	5	29,2	25/08/2006	24/11/2007	52.787	809.000	27.837.777	26.184.891	25,6%	68,2%	6	
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	km 10,125 - km 29,395	5	19,3	01/11/2007	30/10/2009	37.564	96.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	24/09/2001	30/06/2007	61.369	2.546.000	14.546.000	3.255.031	2,4%	97,5%	6	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/2004	03/01/2006	18.036	217.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/2003	31/08/2007	84.687	26.239.000	26.239.000	6.882.803	0,7%	99,0%	6	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/2004	01/04/2008	25.477	3.145.000	32.995.451	4.623.451	0,6%	99,6%	6	C
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Seccion II)	8	29,0	23/03/2006	21/09/2007	29.154	8.125.000	10.931.315	9.993.836	13,0%	32,7%	6	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mexía - km 137 - km 181	8	44,0	21/03/2006	19/03/2008	32.931	3.934.000	3.934.000	7.408.156	12,8%	44,9%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala - km 181 - km 201 (Sección	8	19,6	23/03/2006	21/09/2007	20.737	3.285.000	3.285.000	7.072.748	12,9%	66,3%	6	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada - km 201 - km 225 (Sección	8	23,9	23/03/2006	21/09/2007	21.728	3.468.000	3.468.000	7.551.508	14,6%	67,9%	6	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/2007	30/01/2009	56.498	589.000	589.000	11.251.709	20,6%	27,7%	6	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/2006	21/03/2009	90.999	4.403.000	9.403.000	17.353.358	4,9%	27,8%	6	A
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 340 - km 410	8	70,0	01/11/2007	30/10/2009	60.000	229.000	229.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	126,7	01/11/2007	01/05/2010	110.000	420.000	420.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Aduana - Límite con Chile		8	7,0	01/11/2007	30/12/2008	5.500	42.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	04/01/2009	107.720	331.000	34.771.910	34.771.908	3,1%	12,6%	6	
22	3	89	51	SANTA CRUZ	P15	RPN° 11(Eñ Cañafate) - Paso Zamora		8	58,0	01/11/2007	30/10/2009	116.000	295.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras por Convenio con Provincias												2.145.636	159.606.000	315.355.231	237.035.771				

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	PAIS	VS	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	200,0	30/11/2006	30/11/2007	9.440	1.129.000	20.873.000	17.754.256	25,0%	41,7%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/2007	06/01/2009	42.668	444.000	220.678	220.676	6,4%	9,6%	6	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/1999	11/04/2008	17.633	3.397.000	3.397.000	0	0,0%	0,0%	14	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01/11/2007	30/10/2009	40.000	313.000	1	0	0,0%	0,0%	4	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río Salado	8	6,7	22/10/1996	20/12/2003	3.045	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7	
22	4	22	51	FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/1999	30/01/2004	16.289	368.000	6.368.000	0	0,0%	99,0%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	15/08/2007	52.347	133.000	22.529.605	8.131.777	13,8%	88,1%	6	C
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	km. 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	29/09/2007	199.884	21.038.000	22.000.000	18.250.269	19,4%	68,1%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	km 37,86 - km 46,3	8	8,4	09/09/2005	08/11/2007	91.150	11.422.000	8.396.222	22.269.964	15,2%	89,4%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/2005	12/12/2007	27.830	4.275.000	946.062	946.061	13,5%	63,6%	6	C
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/11/2007	30/10/2009	56.000	214.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1909	8	41,6	01/11/2007	30/10/2009	106.000	382.000	1	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra																Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs				
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/2003	31/05/2006	23.681	897.000	1	0	0,0%	96,2%	8					
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén; Acceso a Bahía		5	23,2	17/12/2003	14/02/2005	1.738	100.000	4.100.001	0	0,0%	100,0%	7					
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec. II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10/11/2003	08/01/2006	39.924	832.000	1	0	0,0%	95,2%	7					
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec. I)	Las Heras - Km 78	5	78,0	24/09/2003	23/04/2006	34.798	725.000	1	0	0,0%	100,0%	7					
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		5	67,2	30/11/2007	30/07/2010	53.585	1.116.000	1	0	0,0%	0,0%	12					
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a	8	26,6	01/06/2007	30/05/2009	152.700	77.000	1	0	0,0%	0,0%	3					
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	31/07/2007	86.183	3.820.000	28.820.000	4.992.627	4,4%	94,8%	6	C				
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante Paso por Villa María		8	5,0	01/11/2007	01/05/2009	19.000	94.000	1	0	0,0%	0,0%	0					
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	01/03/2007	27/02/2010	111.058	681.000	8.474.205	3.481.829	0,0%	0,0%	4					
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/2003	31/05/2007	37.112	2.343.000	3.333.158	3.333.156	4,5%	97,5%	6					
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/2003	07/10/2005	7.038	589.000	1	0	0,0%	91,6%	7					
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/2004	13/05/2005	13.072	856.000	1	0	0,0%	93,5%	7					
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - James Craik	Villa María-James Craik; James Craik-	8	107,5	01/02/2001	31/12/2007	261.857	22.980.000	23.959.221	7.763.839	1,6%	86,6%	6					
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/2003	16/08/2007	494.836	6.734.000	64.699.941	20.586.955	2,2%	96,9%	6					
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - km. 500,59	5	11,3	09/09/2003	07/09/2004	7.693	100.000	1	0	0,0%	99,3%	7					
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/2004	17/08/2006	10.479	276.000	65.983	65.982	0,0%	95,3%	7					
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/2004	07/04/2009	56.333	8.073.000	1	0	0,3%	10,8%	6					
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia		8	7,0	01/09/2006	01/03/2009	146.111	244.000	8.449.419	8.449.417	0,0%	8,0%	6	S/D				
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/2004	20/07/2005	13.954	48.000	1	0	0,0%	98,3%	7					
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/2004	08/04/2006	1.291	1.039.000	209.676	209.675	0,0%	100,0%	7					
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza	5	6,0	02/09/2005	31/08/2007	25.022	3.144.000	9.497.433	9.497.432	5,8%	99,9%	6					
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/2003	02/12/2003	4.717	100.000	100.000	0	0,0%	95,4%	8					
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/2003	13/12/2004	15.758	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8					
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/R.Corrientes)	km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	01/11/2007	01/05/2009	2.782	11.000	11.000	0	0,0%	0,0%	0					
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltantes puentes)	A° Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A° Carumbé	8	1,0	01/06/2007	30/08/2008	9.575	83.000	1	0	0,0%	0,0%	2					
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/2004	20/07/2007	29.328	3.511.000	1.198.640	1.198.639	3,1%	46,8%	6					
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/2003	17/05/2009	58.666	637.000	8.637.000	2.596.744	4,1%	99,8%	6					
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/2003	17/06/2007	50.480	1.380.000	8.380.000	3.915.410	3,9%	92,9%	6					
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles	5	1,9	20/07/2004	20/05/2005	3.497	272.000	2.272.000	0	0,0%	92,2%	7					
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuntos	8	3,5	01/01/2003		6.541	847.000	1	0	0,0%	87,1%	7					
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/12/2006	23.840	931.000	39.362.046	96.360.132	0,0%	99,8%	7					
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a P. Del	8	25,0	14/10/2004	13/10/2006	34.499	314.000	314.000	0	0,0%	100,0%	8					
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/2004	14/04/2007	37.490	2.549.000	2.549.000	0	3,3%	100,0%	7					
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/2004	01/12/2007	38.556	6.071.000	6.071.000	0	12,5%	99,4%	6					
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/2004	31/08/2007	50.530	16.817.000	16.817.000	0	7,0%	66,6%	6					
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.c/Salta	Sección I: Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/2006	28/11/2007	47.363	9.711.000	9.711.000	0	34,1%	96,2%	6					
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.c/Salta	Sección I: Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	13/10/2004	13/05/2006	14.374				0,0%	0,0%	10					
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/2006	08/10/2008	40.949	10.289.000	10.289.000	0	31,0%	73,5%	6					
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/2005	14/06/2007	32.385	8.768.000	8.768.000	0	18,2%	77,5%	6	A				
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/2005	05/12/2008	25.178	6.259.000	6.259.000	0	12,8%	82,4%	6					
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/07/2005	11/07/2007	29.153	8.004.000	8.004.000	0	18,7%	92,6%	6					
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/2006	31/12/2006	13.666	4.635.000	4.635.000	0	0,0%	99,8%	7					
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN° 34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/2006	14/04/2007	20.917	8.028.000	8.028.000	0	15,7%	100,0%	7					
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN° 34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/2006	14/04/2007	20.534	8.072.000	8.072.000	0	4,0%	100,0%	7					
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Emp. RPN° 436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN° 12	8	16,0	05/05/2004	04/04/2005	5.454	101.000	1	0	0,0%	99,0%	7					
22	4	66	51	FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/2004	15/04/2006	52.151	1.976.000	8.976.000	535.389	0,0%	73,6%	7					
22	4	67	51	FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/2004	20/02/2007	37.652	317.000	16.317.000	8.989.917	0,0%	99,7%	7					
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5		8	8,0	29/05/2003	26/12/2004	9.402	98.000	98.000	0	0,0%	100,0%	7					
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		8	14,5	28/10/2003	27/07/2007	43.296	427.000	427.000	0	1,4%	59,1%	6	A/C				
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	12/10/2007	95.048	5.313.000	12.813.000	2.443.763	0,3%	66,6%	6	A/C				
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/2004	14/02/2007	72.397	7.047.000	14.547.000	389.763	0,0%	88,3%	7					
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/2004	31/10/2007	66.068	6.807.000	14.307.000	1.392.842	0,2%	95,9%	6	A/C				
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog.	8	42,3	27/05/2004	26/06/2007	50.692	4.285.000	11.785.000	241.744	0,0%	92,0%	6	S/D				
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	31/08/2007	32.190	686.000	686.000	0	0,0%	88,4%	6	S/D				
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	8	28,4	07/02/2003	07/06/2004	37.081	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7					
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/2000	25/12/2004	66.317	100.000	100.000	0	0,0%	80,4%	7					
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	8	25,0	02/05/2000	30/10/2004	28.335	1.098.000	1.098.000	0	0,0%	96,1%	7					
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/08/2001	21/05/2004	19.050	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7					
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	8	15,0	01/02/2006	02/06/2007	66.930	19.288.000	40.839.589	21.376.487	18,6%	99,6%	6					
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario - Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María -	8	91,0	17/04/2006	15/04/2008	337.139	226.963.000	123.885.428	99.233.519	10,0%	44,1%	6					
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario - Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05													

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	8	55,6	01/11/2007	30/10/2011	45.600	174.000	3.370.081	3.370.074	0,0%	0,0%	0		
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800	8	29,8	01/11/2007	30/10/2009	58.380	89.000	17.858.481	16.409.417	0,0%	0,0%	0		
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. RN. 81 - Lte. c/Chaco - Sec. II	Prog km. 29,800 - Emp. R.N. Nº 81	8	29,8	09/05/2006	07/05/2008	83.905	76.000	0	0	9,6%	40,7%	6		
22	4	85	51	ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN° 34		8	31,0	01/11/2007	30/10/2009	30.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	86	51	ESTERO	98	Lim. Sta. Fe - Bandera	km.180,79 - km.226,67	5	46,1	21/02/2006	22/08/2007	51.896	4.269.000	11.240.410	10.918.425	13,6%	46,0%	6		
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II - km 393 - km 445	8	52,0	01/11/2007	30/10/2009	70.000	267.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (Sección III)	Sección III km 445 - km 502	8	57,0	01/11/2007	30/10/2009	70.000	267.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	La Julia - Tres Lagos	8	142,0	31/08/2007	29/08/2012	193.000	232.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/2007	30/10/2008	4.400	34.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	17/09/2001	15/11/2004	21.266	100.000	1	0	0,0%	79,9%	7		
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de	km 217 - km 225	5	8,0	03/08/2005	02/08/2007	42.446	13.987.000	13.987.000	4.702.270	7,4%	60,6%	6		
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	01/06/2007	30/05/2010	70.400	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	14/09/2007	85.060	8.259.000	38.917.690	44.287.689	0,0%	78,5%	6	S/D	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cdte. Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	14/09/2007	105.020	22.210.000	7.210.001	0	0,0%	62,8%	6	S/D	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	01/12/2008	112.259	20.384.000	20.384.000	0	0,0%	42,0%	6	S/D	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/2006	24/11/2008	96.967	250.000	509.712	509.710	0,0%	0,7%	6	S/D	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (RPN° 39) - Río Olnie- Km. 2189,52 -	8	28,3	01/03/2007	29/08/2008	55.200	90.000	21.242.316	5.163.302	0,0%	1,1%	6	S/D	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km.	8	72,9	15/04/2007	13/04/2009	110.626	154.000	154.000	3.155.676	0,4%	0,4%	6		
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 -	8	55,4	15/09/2006	15/03/2009	80.201	75.000	675.000	5.388.267	0,0%	6,0%	6	S/D	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre	8	66,5	01/06/2007	30/05/2009	65.000	229.000	229.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPNº	8	57,0	01/06/2007	30/05/2009	55.000	178.000	178.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos	8	116,8	01/06/2007	30/05/2010	115.000	438.000	438.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	04/01/2009	123.783	264.000	87.763.608	79.110.578	7,2%	10,4%	6		
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Emp RP Nº 25 - km 245,00	8	204,0	30/12/2004	30/06/2007	102.677				0,0%	89,9%	6	S/D	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de	8	13,2	19/01/2006	20/07/2007	31.650	3.069.000	2.212.787	2.212.786	7,6%	50,8%	6		
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	27/11/2008	67.480	419.000	5.820.443	5.820.442	4,4%	19,2%	6		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												7.074.371	944.867.000	863.986.866	545.811.900					

22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/1998	28/05/2011	170.700	33.719.000	24.719.000	6.485.331	2,3%	59,7%	6		
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Emp. R.N.N° 5	13	329,2	02/02/1998	29/01/2011	162.439	15.517.000	15.742.659	6.709.648	2,4%	64,9%	6		
Total Obras por Concesión sin Peaje C.O.T.												333.139	49.236.000	40.461.659	13.194.979					

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																			
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Alviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	3.300	36.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/11/2007	01/04/2008	1.500	23.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01/11/2007	30/10/2008	6.700	34.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/2002	22/04/2004	6.344	130.000	1	0	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/2003	29/07/2004	8.112	100.000	1	0	0,0%	98,9%	7	
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		8	80,0	01/11/2007	30/10/2008	1.175	9.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/2003	24/11/2003	12.406	100.000	1	0	0,0%	67,0%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28/06/2005	30/06/2007	16.940	3.008.000	2.277.297	2.277.296	3,5%	77,8%	6	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.700	13.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.200	9.000	9.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	01/11/2007	30/10/2008	1.300	10.000	10.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/2007	30/01/2009	1.250	10.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	01/11/2007	01/05/2009	2.400	12.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	01/11/2007	30/10/2008	1.470	11.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/2007	30/10/2008	1.140	9.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/2007	30/10/2008	1.460	11.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.170	9.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pituil (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	8	30,0	01/11/2007	30/01/2009	4.700	24.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/2007	30/01/2009	2.100	16.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte s/Río Alumine)	8	30,0	01/06/2007	30/05/2009	18.487	42.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/2007	30/10/2008	1.900	15.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/11/2007	30/10/2008	3.000	23.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	12/03/2008	15.528	60.000	1.314.010	1.314.009	5,5%	15,6%	6	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/2007	30/10/2008	1.800	14.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/2007	01/05/2009	3.300	25.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/Aº El Chileno		8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.300	5.000	5.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	35	51	ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	8	100,0	01/11/2007	30/10/2009	4.500	34.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná	5	1.200,0	01/09/2004	31/08/2007	69.497	11.699.000	2.041.155	2.041.154	2,8%	69,4%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/2003	28/07/2004	10.687	100.000	100.000	0	0,0%	98,5%	7	
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		8	108,0	01/11/2007	01/05/2009	3.500	27.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	39	51	ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/11/2007	30/10/2008	1.400	7.000	7.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	05/03/2009	26.290	66.000	1	0	3,6%	3,6%	6	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	310,0	01/06/2007	29/11/2008	20.297	65.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/11/2007	30/10/2008	1.500	23.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/2007	01/05/2009	2.000	15.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000	11.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/2007	30/10/2008	1.200	8.000	8.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/2007	30/10/2008	1.350	11.000	11.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000	11.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	70,0	27/06/2006	26/12/2007	12.300	229.000	3.691.373	2.689.991	13,4%	69,9%	6	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/11/2007	30/10/2008	3.800	58.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	50	51	CORDOBA	-----	Nuvo Puente s/Río IV		8	50,0	01/11/2007	30/10/2009	17.000	345.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. a Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/11/2007	30/10/2008	2.500	19.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/11/2007	30/10/2009	50.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		8	200,0	01/11/2007	01/05/2009	30.000	416.000	333.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km.)	8	50,0	01/11/2007	01/05/2009	9.600	73.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km. 97,77	8	30,0	01/11/2007	01/05/2009	13.600	104.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	4.000	8.000	8.000	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												412.703	17.262.000	9.836.871	8.322.450				

Obras en Corredores Viales Concesionados																			
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/2004	13/01/2005	8.823	211.000	12.211.000	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/2004	03/02/2005	6.855	236.000	236.000	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN° 61	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/2006	28/03/2007	14.698	834.000	834.000	5.500.377	0,0%	100,0%	7	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/2004	19/12/2004	12.738	100.000	8.100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334	5	17,0	13/08/2004	12/12/2004	1.861	650.000	650.000	0	0,0%	11,1%	10	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/10/2005	17.275	100.000	100.000	621.456	0,0%	99,1%	7	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN° 3 - Emp. RNN° 35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/2004	08/06/2005	13.940	875.000	875.000	0	0,0%	95,5%	7	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/2004	21/09/2006	15.086	673.000	5.713.282	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/2004	22/04/2005	46.473	2.222.000	2.222.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/2005	29/05/2006	10.418	55.000	55.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/2004	19/04/2005	6.704	470.000	470.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	04/10/2006	7.637	1.000	1.000	41.281	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN° 38 - Emp. RPN° 98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/2004	04/12/2004	2.566	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN° 98 - Emp. RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/2005	06/08/2006	24.037	1.249.000	1.249.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/2004	05/05/2005	20.732	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-	5	63,0	05/08/2004	05/06/2005	16.386	100.000	100.000	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN° 8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/2004	23/12/2005	17.523	100.000	8.100.000	0	0,0%	99,6%	7	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN° 6 (S) - Emp. RPN° 18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28/07/2004	27/06/2005	18.418	111.000	111.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN° 9 - Emp. RNN° 8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/2005	19/05/2008	30.557	3.904.000	3.904.000	1.664.832	7,0%	22,1%	6	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-	5	42,0	19/05/2005	31/03/2007	26.202	2.038.000	2.038.000	8.195.525	5,3%	98,6%	7	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN° 64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20/07/2004	20/05/2005	24.083	211.000	8.211.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN° 13	km 225 km 247	5	22,0	14/07/2004	13/12/2004	1.626	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	7	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN° 33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/2005	16/12/2006	14.444	688.000	688.000	72.085	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN° 23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/2004	19/12/2004	2.742	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunv.de Rosario - RPN° 65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/2005	05/12/2005	29.150	100.000	100.000	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP° 65 - Emp. RNP° 66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/2005	13/10/2005	23.224	395.000	395.000	0	0,0%	98,3%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN° 95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/2004	20/05/2005	13.347	100.000	100.000	0	0,0%	98,4%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/2005	22/10/2007	7.544	753.000	3.753.000	167.130	7,2%	37,3%	6	C
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/2006	04/11/2006	1.483	175.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. R.P. N° 81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/2006	30/09/2007	13.513	1.401.000	34.445.802	22.557.054	13,4%	57,6%	6	C
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - La Francia - Río Primero	Km. 188 - Km. 193 / Km. 243 - Km. 245 / Km. 247 - Km.	13	40,0	18/05/2006	17/07/2007	22.346	6.704.000	1	0	30,3%	52,4%	6	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN° 188 - Emp. RPN° 6 (S)	Km 224 - Km 229 / Km 233 - Km 238 / Km 248 - Km 287	5	61,0	20/04/2006	19/12/2007	22.690	8.638.000	27.273.750	1.637.821	3,7%	15,6%	6	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	km442 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-	5	64,0	01/01/2006	31/12/2007	34.400	29.589.513	36.589.513	26.319.628	24,9%	99,9%	6	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/2007	07/08/2007	7.764	295.000	1.512.169	1.709.033	29,9%	35,0%	6	
22	7	12	52	ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN° 208 - Emp.RPN° 347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/2006	22/08/2007	32.151	8.717.000	24.171.441	17.787.156	0,6%	87,0%	6	C
22	7	12	52	TUCUMAN	9	CVN 5 - Obra 24 A Emp. RPN 288 - Emp. RPN 347	Km. 1250 - Km. 1280 / Km. 1285 - Km. 1289	5	34,0	03/05/2006	01/09/2007	28.026				26,0%	68,4%	6	C
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. R.P. N° 100 (S) - Emp. R.N. N° 16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/2006	08/10/2007	20.688	1.234.000	906.806	906.805	1,0%	95,7%	6	C
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N° 27 - Emp. R. Nac. N° 123 - Emp. R. Prov. N° 19	km 881 - km 890 / km 892 - km 898	5	14,0	01/03/2005	29/09/2005	4.363	100.000	100.000	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. R.P. N° 61 - Acc. A Parish	km. 199 - km. 217 / km. 244 - km. 252	5	26,0	01/01/2006	02/08/2007	10.795	8.996.000	27.443.665	9.703.825	14,7%	95,7%	6	C
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. R.P. N° - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/2006	30/08/2007	16.165	14.144.000	14.144.000	4.376.153	0,2%	99,6%	6	C
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.R.P.N° 61 - Emp. R.P. N° 65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/2006	06/09/2007	12.477	8.160	8.160	7.567.075	7,7%	96,6%	6	C

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17/01/2007	18/07/2007	10.220	9.189.840	19.617.840	3.060.010	12,5%	32,4%	6	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/2006	28/02/2007	25.189	5.470.000	6.697.882	6.697.882	2,2%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/2006	12/10/2007	21.603	6.496.000	9.403.359	9.266.173	18,5%	53,3%	6	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. R.N.N° 36 - Acceso a Suco	km 600 - km 604 y km 635 - km 657	5	4,0	06/04/2006	06/05/2007	17.910	6.312.000	137.850	137.849	7,6%	100,0%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenábar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/2004	30/08/2005	11.883	100.000	100.000	0	0,0%	99,4%	8	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. R.P. N° 13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/2006	31/12/2007	23.744	21.370.000	27.203.063	12.384.033	26,8%	77,9%	6	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. R.P. N° 34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	04/04/2006	31/08/2007	8.243	492.000	24.736.000	4.288.364	46,8%	77,0%	6	C
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. R.P.N°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/2006	23/06/2007	18.782	4.951.000	4.951.000	9.559.822	27,2%	82,3%	6	A/C
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. R.P.N° 3 - Emp. R.N.N° 148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-	5	64,0	01/05/2006	30/06/2007	33.642				25,5%	99,8%	6	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaquí	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/2007	29/08/2007	17.288	611.000	611.000	0	9,1%	10,5%	6	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. A Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/2006	01/08/2007	15.598	13.648.000	13.648.000	0	25,2%	37,5%	6	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												866.052	165.217.513	334.317.584	154.221.369				
Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES	-----	Corredor de las Misiones		8		01/11/2007	30/10/2009	9.000	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO	-----	Corredor de los Lagos		8		01/11/2007	30/10/2010	35.000	11.166.000	11.166.000	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos												44.000	14.166.000	14.166.000	0				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		8	69,0	01/07/2007	29/06/2010	12.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		8	250,0	01/11/2007	01/05/2011	18.000	69.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/2007	30/10/2010	7.000	53.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul		8	40,0	01/07/2007	29/06/2009	73.013	198.000	1	0	0,0%	0,0%	1	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		8	220,0	01/11/2007	30/10/2011	47.800	122.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	01/11/2007	30/10/2009	7.500	781.000	625.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/10/2007	29/09/2009	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-		8	160,0	01/10/2007	29/09/2011	73.000	1.111.000	889.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S.I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/2007	30/10/2009	120.000	43.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/2007	30/10/2009	120.000	38.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S.III	Molinos - Seclantás	8	16,0	01/11/2007	30/10/2008	48.000	23.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantás - Cachi	8	28,0	01/11/2007	30/10/2009	90.000	37.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		8	100,0	01/11/2007	30/10/2010	100.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	51	AL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8		01/11/2007	30/10/2009	40.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	15	51	MISIONES	14	Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		8	4,0	01/11/2007	31/08/2008	5.500	28.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		8	0,5	01/11/2007	01/05/2008	3.000	25.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp RPN° 63 - Emp RN N° 11 (PROG 0 - PROG 7,6)	8	7,3	18/10/2006	16/10/2008	38.792	111.000	13.206.301	12.564.288	8,9%	24,5%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp Av Sarmiento - Emp RN N 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/2006	16/10/2008	28.568				12,5%	21,8%	6	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/06/2007	30/05/2009	46.083	38.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	01/10/2007	29/09/2009	40.000	157.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	01/11/2007	30/10/2010	150.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	08/03/2007	06/03/2009	105.140	118.000	1	0	7,2%	7,2%	6	
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao		8	80,0	01/11/2007	30/10/2009	50.000	38.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	01/09/2007	30/08/2009	80.000	306.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo		8	0,2	01/11/2007	30/10/2008	8.000	82.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S.I)	Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	01/11/2007	30/10/2009	80.000	625.000	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S.II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	01/11/2007	30/10/2009	50.000	306.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S.III)	Autódromo Yaco Guarneri - Acc. M. Belén	8	14,7	01/11/2007	30/10/2009	70.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	27	51	CHACO	P12	Obras Empalme Ruta Provincial 12		8		01/11/2007	30/10/2010	17.000	233.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/2007	29/10/2012	200.000	1.184.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	51	AL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		8	513,0	01/11/2007	29/10/2012	5.000	155.000	125.001	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II)	Sección II	8	58,5	01/11/2007	29/10/2012	150.000	693.000	554.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III)	Sección III	8	79,3	01/11/2007	29/10/2012	210.000	852.000	682.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,0	01/11/2007	29/10/2012	150.000	648.000	518.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V)	Sección V	8	61,0	01/11/2007	29/10/2012	180.000	649.000	519.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	56	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	74,6	01/11/2007	29/10/2012	210.000	791.000	633.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	57	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII)	Sección II	8	64,0	01/11/2007	29/10/2012	180.000	692.000	554.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	64,6	01/11/2007	29/10/2012	180.000	670.000	536.000	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	30	51	CHACO															

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154		8	154,0	01/11/2007	30/10/2010	70.000	126.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01/11/2007	30/10/2011	300.000	1.782.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	01/11/2007	30/10/2009	50.000	244.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	km. 702 - km. 704 - A° Corralito	5	2,0	27/01/2006	27/11/2006	2.649	262.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		17		01/11/2007	30/10/2009	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de		5		01/11/2007	01/05/2009	5.000	84.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	01/11/2007	01/05/2009	40.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	45	51	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		8		01/11/2007	30/10/2009	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2007	30/10/2010	26.000	99.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	47	51	ENTRE RIOS	14	Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas		8	1,0	01/11/2007	30/10/2010	33.000	126.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	48	51	AL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General		8	0,2	01/11/2007	30/10/2010	7.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande		8	0,5	01/11/2007	30/01/2010	5.000	38.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio		8	0,5	01/08/2007	30/01/2008	3.500	45.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	82,0	01/06/2007	30/05/2010	192.983	1.146.000	61.622.879	53.378.878	0,0%	0,0%	2	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-		8	119,0	01/11/2007	30/10/2010	60.000	153.000	40.205.301	33.698.902	0,0%	0,0%	0	
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		8	51,0	01/11/2007	30/10/2009	29.000	111.000	1	0	0,0%	0,0%	11	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A	8	2,2	01/03/2006	30/06/2007	19.462	3.214.000	9.536.575	8.004.462	17,6%	84,4%	6	
22	9	57	51	MISSIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RP N°19		8	31,0	22/03/2006	20/03/2009	79.899	158.000	24.747.820	24.747.819	13,6%	73,5%	6	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza		5	0,1	01/08/2007	02/02/2008	2.750	20.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Rio de la Plata		8	6,0	01/11/2007	30/10/2009	20.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/2006	19/10/2007	39.312	4.961.000	6.338.145	5.552.778	15,2%	48,9%	6	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. Juan XXIII y Acc.a Parque. Ind. Chacabuco		8	2,8	01/11/2006	31/10/2007	13.659	285.000	1	0	11,0%	23,3%	6	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/2006	25/08/2007	40.757	3.027.000	13.929.875	12.482.367	11,3%	62,8%	6	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/2005	23/02/2007	21.618	843.000	4.216.786	4.216.785	0,0%	98,0%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V- DNU	8	10,7	31/05/2007	27/02/2009	50.430	139.000	10.086.045	10.086.044	0,0%	0,0%	4	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/10/2007	29/09/2008	6.000	10.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Empl Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/10/2007	31/03/2009	50.000	41.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	RPN° 33, Puente s/Rio del Valle - Puentes/Rio	8	4,7	01/10/2007	31/03/2009	13.000	25.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas		8	6,0	01/09/2007	30/08/2009	30.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Emp. R.P.N° 6		8	86,0	01/11/2007	30/10/2010	200.000	55.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01/11/2007	30/10/2011	36.000	92.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque		5		01/11/2007	30/10/2009	4.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RN N°40 - Gualjaina	RN N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	30/01/2009	37.643	64.963	10.906.952	8.292.260	11,2%	16,5%	6	
22	9	71	52	CHUBUT	P12	Emp. RPN° 14 (Gualjaina)- Emp. RNN° 40- Sec. II	km 27 - km 62	8	35,0	01/10/2007	29/09/2009	45.000	112.037	112.037	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km.	8	32,0	08/03/2007	06/03/2010	54.948	118.000	12.208.000	6.099.674	2,5%	2,5%	6	
22	9	72	52	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado - Sección II	km 26,28 - km 62	8	35,7	01/11/2007	30/10/2009	40.000	132.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Emp. RN N°40	km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección	8	35,0	31/06/07	29/05/2009	38.692	148.000	1	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Rio Senguer - Emp. RP N°20	km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/03/2008	26.321	2.938.000	3.863.730	3.863.728	9,0%	26,7%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/11/2007	30/10/2009	25.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RN N°7 - Emp. RN N°8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87)	5	0,1	27/12/2005	27/04/2006	228	14.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Rio San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/11/2007	30/10/2009	10.000	60.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa María		5	1,0	01/11/2007	01/05/2008	1.000	32.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	82	51	CORDOBA	PE90	Alcira Gigena - Gral. Cabrera	Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto Juarez Celman	8	47,8	15/09/2006	13/09/2008	42.558	122.000	1	0	9,3%	20,0%	6	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya		8	1,0	01/11/2007	29/10/2012	530.000	810.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RN N°81	km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/2006	22/11/2007	12.445	81.000	1.596.153	1.596.151	11,8%	32,5%	6	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/2007	30/08/2009	32.762	150.417	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	88	51	FORMOSA	86	Mision Tacaaagle - RN N°95	Emp. RN N°22 - Emp. RN N°95 y Acc. A Va. Gral.	8	29,6	28/11/2006	26/11/2008	46.816	117.583	1	0	13,2%	20,3%	6	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Guemes - Fortín Leyes	8	25,1	01/06/2007	30/05/2009	73.838	153.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín 2	8	25,1	01/07/2007	29/06/2009	83.335	160.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	01/09/2007	30/08/2009	60.329	122.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	01/09/2007	30/08/2009	85.815	138.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado		5	58,0	27/06/2005	26/09/2007	20.521	0	6.934.803	6.160.840	8,8%	84,9%	6	
22	9	91	51	FORMOSA	P2														

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	10	1	51	MENDOZA	-----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/2007	30/10/2008	25.000	95.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	2	51	MISIONES	----	Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0	01/11/2007	30/10/2010	10.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/2007	30/10/2008	1.500	23.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Choc Malal - Pte s/A° Pilmatue	Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/2007	14/07/2007	2.189	8.000	8.000	0	94,9%	94,9%	6		
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura		8	5,0	01/11/2007	30/10/2009	20.000	92.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. RN N°231	8	20,6	21/02/2006	21/08/2008	69.915	18.520.000	16.145.731	11.330.468	6,8%	29,9%	6		
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen		8	21,0	01/06/2007	30/05/2009	116.277	76.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II	8	64,0	01/10/2007	29/09/2010	86.400	176.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Norquincio	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	8	0,1	01/02/2006	01/11/2006	797	27.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche		8		01/10/2007	29/09/2008	1.000	15.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/2006	18/08/2007	18.883	621.000	32.667.015	26.212.172	11,0%	16,0%	6		
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km. 1462 - km. 1478	5	16,0	07/04/2006	07/07/2007	29.577	16.614.000	1	0	22,3%	65,3%	6		
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/2006	12/07/2007	34.862	19.602.000	1	0	13,5%	59,1%	6		
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/2007	01/05/2009	20.000	38.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. RNN° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	8	118,9	01/11/2007	30/10/2010	68.000	173.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Emp. R.N. N° 40	8	48,4	01/10/2007	29/09/2009	90.000	102.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN° 40	(Sección II - a 2)	8	10,0	01/10/2007	29/09/2009	40.000	100.000	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	8	12,2	01/06/2007	30/05/2010	82.250	72.000	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischyigualasto - RNN° 40	R. Bermejo - Emp. RNN ° 40 (Sección III)	8	34,4	01/06/2007	30/05/2009	71.945	87.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco km. 100	8	0,1	26/10/2005	25/10/2007	17.933	3.640.000	1	0	1,7%	27,6%	6		
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Río Santa Cruz	5	0,2	01/11/2007	30/10/2008	5.000	23.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastiné- Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	01/06/2007	30/05/2010	117.781	178.000	27.588.701	14.168.880	0,0%	0,0%	2		
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. S/Río Colastiné	5	3,5	01/03/2007	27/02/2010	140.269	127.000	1	0	0,0%	0,0%	4		
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146	8	31,0	01/09/2007	30/08/2009	90.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	01/11/2007	30/10/2008	20.000	153.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55	5	5,5	31/01/2007	02/05/2007	400	8.000	8.000	0	66,8%	100,0%	7		
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - km. 10,125	8	10,1	13/02/2006	14/08/2007	59.174	9.910.000	19.516.126	17.822.491	9,1%	64,0%	6		
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso alternativo transito pesado desde RNN°9	8	4,0	01/11/2007	30/10/2009	2.000	31.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	Pavimentación Urbana- 34 arterias urbanas	8	3,4	01/11/2007	30/10/2009	1.948	29.761	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	30	51	FUEGO	3	Portada Parque Nacional - Bahía Lapataia		8	16,0	01/09/2007	30/08/2008	20.000	23.239	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	19,9	01/10/2007	29/09/2009	130.000	626.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza actual - Principio Autopista	8	12,7	01/03/2007	27/02/2009	105.140	190.000	23.394.671	22.056.416	0,0%	0,0%	4		
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Intersección Av. Gral.Paz y Camino Negro		8	1,0	01/11/2007	30/10/2009	50.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	34	51	ENTRE RIOS	18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/11/2007	30/10/2009	6.500	99.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y RN N°14	8	1,0	01/11/2007	01/05/2008	653	20.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01/11/2007	30/10/2011	30.000	125.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/10/2007	31/03/2008	2.500	18.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección RN N°22 y RN N°237	8	1,5	01/10/2007	31/03/2008	2.500	4.000	4.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RP N°13	8	5,1	01/09/2007	30/08/2010	21.687	166.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. s/desvio	8	2,4	14/11/2006	13/02/2008	29.779	2.393.000	10.230.057	7.153.036	19,7%	34,3%	6		
22	10	41	51	FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac.	5	6,0	01/11/2007	01/05/2009	18.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	42	51	FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3		8	5,0	01/11/2007	01/05/2009	10.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		8	25,8	01/06/2007	30/05/2011	40.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - km. 173,77	8	111,9	01/11/2007	29/10/2012	275.740	527.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	km. 176,70 - km. 221,37	8	44,7	01/11/2007	29/10/2012	161.340	308.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	km. 64,50 - km. 72,00	8	7,5	01/11/2007	30/10/2009	30.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/11/2007	30/10/2010	170.000	183.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/10/2007	29/09/2010	130.000	158.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	41,0	01/08/2007	30/07/2010	100.000	322.000	322.000	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zudo - Ea. Bella Vista	8	75,0	01/09/2007	01/03/2010	200.000	140.000	140.000	49.667.838	0,0%	0,0%	0		
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	39,0	01/07/2007	29/06/2010	95.000	191.000	191.000	14.724.607	0,0%	0,0%	2		
22	10	68	51	SANTA CRUZ	40	Chimen Aike - Cabo Virgenes		8	130,0	01/07/2007	29/06/2010	300.000	229.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29/06/2006	28/06/2007	5.888	184.000	0	0	5,3%	78,1%	6	A	
22	10	69	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III)	Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota	8	9,8	01/11/2007	30/10/2008	6.000	94.000	0	0	0,0%	0,0%	3		
22	10	69	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V)	Fin pavimento - Acc. Hotel Villavicencio	8	8,2	01/11/2007	30/10/2008	6.000	75.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San Julián - (Dos Secciones)	km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/2005	19/12/2007	91.046	17.753.000	33.430.060	21.370.356	1,3%	15,4%	6		
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	18/05/2008	101.606	8.256.000	4.767.374	0	7,9%	38,4%	6		
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. RNN° 38 - Lte c/Catamarca		8	30,0	01/10/2007	29/09/2009	100.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Iltico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/2006	25/09/2007	1.333	151.000	737.030	737.029	1,3%	56,6%	6		
22	10	75	51	CORDOBA	9	Autopista Pilar - Villa María - Acc a dif localidades desde la autop		8		01/11/2007	01/05/2010	7.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	76	51	SALTA	34	Puente internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/06/2007	30/05/2009	35.550	115.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	77	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		8	15,0	01/08/2007	29/01/2009	20.000	57.597	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	01/08/2007	30/07/2008	5.017	730.403	1	0	0,0%	0,0%	15		
22	10	79	51	CORDOBA		Reordenamiento accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	01/11/2007	30/10/2009	31.609	110.535	6.321.774	6.321.773	0,0%	0,0%	0		
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de intersección RNN ° 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota		8	0,5	01/10/2007	31/03/2008	1.600	24.465	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/2007	01/05/2009	40.000	82.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	km 113	8	80,0	01/11/2007	30/10/2009	150.000	886.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	51	ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	01/07/2008	30/06/2010	60.000	134.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	85	51	ESTERO	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km. 857,52 - km. 883,38	5	25,0	28/06/2006	26/02/2007	1.281	18.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	86	51	SANTA CRUZ		Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia - Convenio		8	4,0	01/11/2007	30/10/2009	16.000	81.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	La Paz - Santa Rosa	8	66,0	01/09/2007	01/03/2010	180.000	437.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	km 198,65 - km 266,41	8	67,8	01/09/2007	31/03/2008	20.625	39.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	92	51	BUENOS AIRES		Acceso a Campo Universitario Tandil		8	1,0	01/11/2007	30/10/2008	3.000	41.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	93	51	BUENOS AIRES		Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez		8	0,5	01/11/2007	30/10/2009	12.000	88.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	96	51	BUENOS AIRES	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel RNN° 9 - Pergamino		8	7,8	01/11/2007	30/10/2008	6.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	97	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Limite con Santa Fe		8	50,0	01/11/2007	30/10/2008	8.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	98	51	SANTA FE	178	Limite con Buenos Aires- Emp. RNN° 33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	01/11/2007	30/10/2009	42.285	108.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	99	51	CORRIENTES		Isla Apipe San Antonio - Puerto Tonla		8		01/11/2007	30/10/2008	2.000	14.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III												5.859.320	115.636.000	292.964.483	214.631.509					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																				
22	11	4		CORDOBA	P21	RPN° 20- RPN° 19 - Puente sobre A El Gato y San Antonio		8	0,2	01/11/2007	30/10/2008	5.000	48.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	5		ENTRE RIOS	P42	Puente Mendez - Casariego (s/Río Gualaguaychú) hasta RNN°		8	15,0	01/11/2007	30/10/2008	6.000	73.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	6		SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Lím con Mendoza - Secciones I y II y Acc	8	35,3	20/09/2007	18/09/2009	42.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	9		SALTA	S/N	Ruta Nacional Tramo Tolombon - Hualinchay		8	40,0	01/11/2007	30/10/2009	15.000	76.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	11		CORRIENTES	123	Empalme RNN ° 12 - Mercedes		8	73,0	01/11/2007	30/10/2009	20.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01/11/2007	30/10/2009	6.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/10/2008	30/09/2011	230.600	4.572.000	2	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección RNN° 228 Y RPN° 73		8	0,5	01/11/2007	30/10/2008	3.000	46.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0	01/11/2007	29/10/2012	200.000	1.041.000	2	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	20	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. C/San Luis		8	18,0	01/11/2007	30/10/2009	12.000	299.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	21	51	CORDOBA	PU203	RNN° 9 - Capilla Los Remedios		8	8,1	01/11/2007	30/10/2009	15.000	924.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	28	51	MENDOZA	7	Acceso a Mercado Cooperativo	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	1,0	01/06/2007	30/11/2007	2.366	17.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	11	29	51	ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. RNN 9 (N) - Emp. RNN° 9 (S)	8	7,5	01/06/2007	30/05/2009	43.799	121.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	11	30	51	ENTRE RIOS	S/N°	Trama urbana Ciudad de Nogoyá	Emp. RNN° 12 - Emp. RPN° 26	8	3,8	01/06/2007	30/11/2007	7.260	46.000	1	0	0,0%	0,0%	15		
22	11	31	51	MISIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acc. A Garupá	Variante RNN° 12	8	21,5	01/04/2007	30/03/2009	40.000	417.000	1	0	0,0%	0,0%	4		
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/2007	30/10/2010	54.000	165.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Emp. Acceso a Dique Ballester		8		01/11/2007	30/10/2008	4.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. RPN 69		8		01/11/2007	30/10/2008	3.000	61.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. RN 66 - Emp. RN 34	8	13,0	01/11/2007	30/10/2010	60.000	469.000	375.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp.I RN IV 66 - Emp. RN 34	8	40,0	01/11/2007	30/10/2009	50.000	375.000	300.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte con Salta - Acc a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/2007	30/10/2011	150.000	750.000	600.001	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	39	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114,000 - 137,416	8	23,4	01/11/2007	30/10/2009	30.000	127.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte con Chile		8				42.846	298.000	1	0			7	K	
22	11	43	51	SANTA CRUZ		Desvio Transito Pesado por Asv. Asturias		8	10,0	01/11/2007	30/10/2010	60.000	255.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte Bella Vista - Emp Aut Ruta Nacional N° 38		8	8,0	01/09/2007	30/08/2009	50.000	102.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	46	51	SANTA FE		Remod. Av. 27 de Febrero y Av. Alem	Av. 27 de Febrero y L.N. Alem	5	2,7				282.000	1	0			7	K	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	11	53	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	01/11/2007	30/10/2009	30.000	107.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	54	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	01/11/2007	30/10/2009	30.000	112.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	55	51	ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	01/11/2007	30/10/2009	30.000	112.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	56	51	CORDOBA	PE86	Achiras - Sampacho		8	36,8	01/11/2007	30/10/2010	60.000	675.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	57	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo		8	6,2	01/11/2007	30/10/2008	10.000	207.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	58	51	CORDOBA	PS 358	La Palestina - Arroyo Cabral		8	15,2	01/11/2007	30/10/2009	20.000	293.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	59	51	CORDOBA	P23	Alpa Corral - El Esquinaso		8	39,8	01/11/2007	30/10/2009	35.000	374.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	60	51	CORDOBA	PE 79	Tancacha - Villa Ascasubi		8	13,3	01/11/2007	30/10/2009	25.000	395.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	61	51	CORDOBA		Acc. a Sanatorio J.J. Puente		8	8,1	01/11/2007	30/10/2008	12.000	270.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	62	51	CORDOBA	P 32	La Posta - Las Arrias		8	24,8	01/11/2007	30/10/2009	30.000	332.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. R.N. N° 13 - KM. 17		8	6,0	01/11/2007	30/10/2008	8.000	279.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	64	51	RIO NEGRO		Circuito turístico Tronador - Cascada Los Alerces		8	67,0	01/11/2007	30/10/2008	3.000	82.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	65	51	CORDOBA	RP N° 34	Puesto Bustos - Giulio Cesare	Intersecc.c/ Acc. Al P.N.Quebrada del Condorito y	8		01/11/2007	30/10/2008	5.000	138.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	66	51	SANTA CRUZ	RP N° 63	Emp. RN N°3 - Parque Nacional Monte León (Costa)	Acc. Parque Nacional Monte León	8	30,0	01/11/2007	30/10/2010	50.000	1.222.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	67	51	TUCUMAN	RP N° 330	Alpachiri - Río Jaya	Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos	8	12,7	01/11/2007	30/10/2009	10.000	183.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	68	51	ENTRE RIOS		Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque nacional Pre Delta	8	5,1	01/11/2007	30/10/2009	10.000	144.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	69	51	CHACO		Capitán Solari - Parque Nacional Chaco	Acceso a Parque Nacional Chaco	8	5,2	01/11/2007	30/10/2008	5.000	113.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/11/2007	30/10/2009	20.000	260.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	71	51	SAN JUAN		Chigua de abajo - Quebrada Alcaparrosa	Acc. Parque Nacional San Guillermo	8	60,0	01/11/2007	30/10/2009	20.000	611.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	72	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Limite con Salta - Abra Pampa	Sección: I	8	40,0	01/11/2007	30/10/2010	50.000	509.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	73	51	TUCUMAN	RP N° 307	Tafi del Valle - Limite con Catamarca		8	60,0	01/11/2007	30/10/2010	50.000	519.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	74	51	CATAMARCA	RP N° 46	Belen - Andalgalá	Belén - Cuesta de Belén	8	32,0	01/11/2007	30/10/2010	50.000	464.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	75	51	CATAMARCA	RP N° 219	Acc. Ruinas el Shincal		8	6,0	01/11/2007	30/10/2008	6.000	92.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	76	51	SAN LUIS	RP N° 29	Ruta de los Dinosaurios	La Chañarienta - Las Liebres - Ruta de los Dinosaurios	8	63,0	01/11/2007	30/10/2010	45.000	326.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/2007	30/10/2009	10.000	263.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. RN N° 35 - Emp. RN N° 22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)	8	25,5	01/11/2007	30/10/2009	15.000	330.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	79	51	SANTA FE	RN N° 177	Emp. RP N° 21 - Alto nivel RN N° 9		8	7,8	01/06/2007	31/03/2008	10.034	101.000	1	0	0,0%	0,0%	2		
22	11	80	51	BUENOS AIRES	RP N° 72	San Francisco de Bellocq - Capetonas - Acc. Balneario Reta	Puente sobre el Arroyo Claromecó	8	67,0	01/11/2007	30/10/2011	90.000	181.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	81	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. RN N° 141 - Caucete y	Seccion: I y la: Acc. Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	01/11/2007	30/10/2008	7.000	114.000	1	0	0,0%	0,0%	0		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												2.162.905	20.300.000	1.275.063	0					
Total Construcciones												28.352.175	2.106.376.513	2.765.787.288	1.561.640.596					
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.I																				
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 -	13	111,4	26/05/1997	23/08/2005	14.043	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Emp.	13	132,3	24/04/1997	21/12/2004	13.515	100.000	1	0	0,0%	99,7%	7		
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/1997	30/10/2004	9.733	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Emp. R.P.N° 31 -	13	243,8	18/06/1997	16/07/2004	11.169	256.000	1	0	0,0%	97,7%	8		
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. R.P.N° 307 - San Carlos / Emp. R.N.N° 40N - Río	13	142,3	04/06/1997	01/08/2007	21.090	43.000	455.679	455.678	3,4%	89,0%	6		
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/1997	31/08/2007	22.299	217.000	599.470	599.468	3,7%	82,3%	6		
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.R.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc.	13	226,3	04/07/1997	01/07/2004	17.762	583.000	1	0	0,0%	96,7%	7		
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-	13	148,9	05/04/1997	02/09/2004	12.938	100.000	232.900	232.898	0,0%	100,0%	8		
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco	13	178,6	22/05/1997	18/12/2005	22.231	832.000	925.809	925.807	0,0%	99,7%	7		
26	1	11	51	ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	13	79,7	10/04/1997	08/07/2006	19.845	461.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp.	13	144,7	07/07/1997	04/10/2006	27.283	581.000	1	0	0,0%	85,8%	7		
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 127-Lte. c/Corrientes -Emp. R.N. N° 12-	13	271,4	27/08/1997	24/03/2008	23.900	226.000	335.026	335.025	2,1%	99,7%	6		
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N°123 - Emp. R.N.N° 12 -	13	217,6	03/11/1997	02/04/2004	20.456	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/1998	06/02/2011	17.433	943.000	487.029	487.028	1,4%	99,1%	6		
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	13	122,5	07/07/1997	03/09/2004	15.340	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	13	272,6	14/10/1997	11/10/2004	20.028	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. R.N.N° 50 / Emp. R.N.N° 34 - Lte. C	13	204,7	18/07/1997	15/08/2004	16.672	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Emp.	13	286,8	15/08/1997	13/08/2003	16.006	100.000	2.057.815	2.057.815	0,0%	100,0%	7		
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/1997	31/07/2002	6.378	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/1998	12/04/2004	10.860	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN° 74 / Emp. RNN° 74 - Emp.	13	327,8	30/09/1997	28/02/2004	17.876	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11/11/1997	08/11/2007	19.794	193.000	425.941	425.940	2,2%	97,5%	6		
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Baje de San Julián	13	308,0	25/11/1997	24/04/2005	20.207	2.105.000	1	0	0,0%	89,6%	7		
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	13/01/1998	11/03/2008	21.453	262.000	1	0	0,6%	96,7%	6		
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Altá/Emp. RNN°3-Emp.RNN°	13	167,1	17/07/1997	13/04/2008	20.221	228.000	617.188	617.187	1,2%	99,2%	6		
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	13	123,4	09/12/1997	08/05/2004	26.066	121.000	1	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. Rn 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn	13	201,2	01/12/1997	29/03/2008	30.618	194.000	1.849.287						

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La	13	187,7	17/06/1998	14/11/2004	13.993	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	13	211,2	13/01/1998	11/08/2004	13.402	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesus Maria-Lte.S.del Estero-Emp. RN N° 9-	13	309,5	12/07/1997	09/06/2004	15.095	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. R.N.N° 20 - Emp. R.N.N° 147 / Emp. R.N.N° 7 -	13	245,6	20/06/1997	17/02/2004	14.250	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	136,8	23/06/1997	20/12/2004	18.091	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 86 - Emp. R.N.N° 3	13	139,9	04/03/1998	31/12/2007	24.383	196.000	392.552	392.550	2,5%	90,8%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°	13	223,3	13/08/1997	11/03/2004	15.295	100.000	88.875	88.874	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25/10/1997	21/02/2008	12.123	160.000	134.308	134.307	2,9%	94,4%	6	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa	13	220,0	05/09/1997	03/10/2004	18.064	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N° 12 - Emp. R.N.N° 14 Y 119	13	259,2	03/10/1997	30/04/2008	26.327	360.000	840.673	840.671	2,4%	99,3%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N° 3	13	258,3	05/11/1997	03/03/2008	24.589	308.000	644.845	644.844	2,3%	99,6%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Emp. R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/1997	12/06/2003	14.878	100.000	718.787	715.313	0,0%	100,0%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Emp. R.N.N° 152	13	221,6	31/07/1997	28/10/2004	17.642	239.000	331.034	331.033	0,0%	98,6%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/1997	27/05/2005	11.713	100.000	1	0	0,0%	85,4%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.c/Rio Negro- Emp.Rn N° 237-	13	275,5	14/11/1997	12/06/2005	17.348	171.000	1	0	0,0%	90,1%	7	
26	1	53	51	ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Rio Saladillo	13	96,7	03/12/1997	01/12/2002	6.976	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	28/01/2008	27.713	163.000	589.304	589.302	1,6%	84,0%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09/10/1997	06/10/2004	14.367	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN° 79 - Emp. RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D.	13	282,8	13/11/1997	11/06/2004	13.412	100.000	1	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N° 22 - Emp. R.N.N° 250	13	118,7	25/07/1997	23/03/2004	14.994	220.000	1	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.c/Santa Cruz-Emp. Rn N° 3-Emp. Rp	13	140,7	23/06/1997	19/11/2008	23.496	69.000	304.262	304.261	2,1%	83,3%	6	A
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. R.N.N° 33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/1999	17/08/2005	14.584	135.000	1	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14/11/1997	11/11/2004	20.165	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/1997	17/12/2003	21.313	100.000	1	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	17/11/1997	14/11/2007	19.278	43.000	194.486	194.485	0,8%	95,7%	6	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	13	183,6	23/02/1998	21/12/2008	24.458	98.000	6.866.477	3.046.296	5,9%	88,6%	6	A
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.I												1.011.611	12.702.000	24.593.071	18.092.275				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.II																			
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/2004	29/11/2009	46.074	2.099.400	8.233.566	2.892.889	0,6%	83,8%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	49.896	2.462.100	7.794.001	647.221	1,0%	92,4%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/2004	29/11/2009	45.667	2.238.200	8.405.032	1.246.321	0,8%	87,7%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbass - Lte. c/La Rioja / Emp.R.N.N° 40N -	13	313,8	09/09/2003	01/11/2007	19.509	3.940.100	9.211.106	1.940.104	4,9%	95,5%	6	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. -	13	138,0	01/03/2005	27/02/2010	44.813	4.384.100	7.414.001	487.648	0,7%	92,8%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	30/10/2010	49.375	7.986.300	17.076.001	12.288.325	12,8%	93,5%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	29/04/2010	42.652	6.639.500	8.646.292	2.914.259	3,5%	72,4%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/2003	17/01/2007	37.498	99.200	7.880.344	1.419.415	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/2004	08/01/2008	27.290	86.800	7.086.800	82.870	0,5%	93,8%	6	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 -	13	114,6	01/02/2005	30/01/2010	36.957	2.250.600	7.726.001	485.005	0,8%	91,6%	6	A
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 -	13	166,7	03/12/2004	01/12/2009	56.317	8.186.400	13.576.906	10.574.211	2,4%	97,0%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	02/05/2005	30/06/2010	52.946	7.653.900	7.572.227	601.049	0,7%	91,1%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. R.P.N° 329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/2001	16/11/2008	24.284	913.800	7.295.001	152.258	0,8%	97,3%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/2001	03/04/2008	30.706	1.848.300	7.634.222	196.431	0,4%	85,3%	6	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	13	69,2	01/02/2005	02/03/2010	42.472	2.638.100	7.851.001	349.044	0,6%	93,2%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.723	7.392.800	14.686.408	6.928.529	1,4%	94,9%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Córdoba / Emp.RNN° 35 - Acc.	13	158,3	01/04/2005	30/04/2010	39.546	4.374.100	6.436.904	614.822	1,1%	91,9%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	01/03/2005	27/02/2010	40.405	1.972.300	7.701.782	332.672	0,5%	94,4%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.II												730.130	67.166.000	162.227.595	44.153.073				

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.III																			
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/11/2007	29/11/2012	43.116	703.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios	Emp.R.N.N° 14 - Galarza - Emp. R.P.N° 20 - Lte.	13	151,8	01/01/2005	30/12/2009	44.902	3.121.000	5.366.845	745.843	1,2%	91,2%	6	A
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	41.470	1.181.100	4.073.471	392.370	0,9%	91,2%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 -	13	159,7	01/10/2005	29/09/2010	62.304	9.539.400	12.999.576	3.460.175	0,0%	0,0%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La	13	163,8	15/01/2005	14/11/2009	54.523	2.135.900	6.494.410	2.858.509	0,7%	81,6%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp.RNN° 259	13	149,1	01/09/2007	29/08/2012	97.343	2.274.700	2.274.700	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN° 20 - Emp.RNN° 147 / Emp.RNN° 7 - Emp.	13	253,8	01/02/2005	30/01/2010	43.938	2.061.500	3.937.540	376.039	0,9%	90,8%	6	A
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN° 3	13	129,4	01/09/2005	30/08/2010	40.518	8.841.200	22.806.419	12.620.315	0,9%	93,6%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN° 65 / Emp. RPN° 21 - Alto Nivel	13	179,7	31/05/2007	28/05/2012	54.970	5.966.800	5.966.800	0	0,0%	0,0%	16	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RN N° 40S - Lte. c/Chille	13	182,5	02/01/2007	31/12/2011	99.061	29.890.900	40.316.900	4.235.659	9,7%	17,4%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda.	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	73.467	9.829.400	25.067.453	9.332.376	0,6%	81,5%	6	
26	3	12	51	ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puen) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/12/2010	52.800	16.275.700	25.309.213	9.033.512	27,8%	80,5%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte. c/Jujuy/Lte. c/Salta-R.Yala/Emp.R9-	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	45.910	9.908.300	24.355.879	13.029.003	4,4%	78,6%	6	
26	3	14	51	ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN° 38	13	151,9	01/08/2005	30/10/2010	46.167	13.030.000	22.014.691	8.984.690	5,4%	87,4%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra																Avance Financiero				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs					
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN° 329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2010	43.830	5.471.500	9.388.269	3.916.768	1,4%	89,7%	6						
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	km 333,49 - Emp. R.P.N° 32 / Emp R.P.N° 11 - Emp.	13	99,9	01/03/2005	30/03/2010	45.230	5.221.100	5.672.532	451.430	0,9%	89,6%	6						
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp.	13	180,1	01/11/2007	29/10/2012		678.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río	13	250,4	01/12/2004	29/11/2009	47.004	7.837.500	8.347.357	509.855	1,2%	58,7%	6						
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/2004	29/01/2010	58.836	5.576.200	17.533.784	7.534.203	1,8%	51,8%	6						
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN° 35 - El	13	128,5	02/01/2006	31/12/2010	36.670	9.939.300	23.961.258	10.111.898	15,4%	76,6%	6						
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	49.030	6.857.200	10.081.749	3.224.548	1,0%	89,1%	6						
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-	13	291,2	01/02/2005	30/01/2010	47.996	5.467.700	11.374.684	5.906.983	1,9%	78,6%	6						
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Digue Cruz del Eje-Chamical / Emp. RPN°31-	13	334,0	01/07/2005	29/06/2010	51.440	6.501.400	8.158.827	1.657.426	0,9%	80,6%	6						
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°	13	286,1	01/06/2005	29/11/2010	49.000	8.769.200	15.235.144	5.027.464	1,4%	73,3%	6						
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-	13	223,3	01/03/2005	27/02/2010	37.642	2.773.800	3.129.514	355.712	1,2%	88,2%	6						
26	3	26	51	ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2010	44.867	10.241.700	23.811.821	13.429.489	2,1%	87,3%	6						
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN° 14 - km 139	13	108,2	01/11/2007	29/10/2012	48.847	1.758.887	1.758.887	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/06/2007	30/05/2011	35.536	905.000		1	0	0,0%	0,0%	11					
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2012	68.181	1.536.900	1.536.900	0	0,0%	0,0%	2						
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Río	13	140,0	31/08/2007	28/04/2012	43.943	1.403.600	9.892.249	3.802.491	0,0%	0,0%	4						
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RPN° 2 - Emp. RPN° 286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,0	01/11/2007	29/10/2012	39.722	1.367.800	1.367.800	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N° 8	13	203,3	01/11/2007	29/10/2012	91.463	2.101.100	2.101.100	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/11/2007	29/10/2012	60.000	908.300	908.300	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	34	51	ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	03/04/2012	97.636	2.625.000	15.065.548	7.014.450	6,5%	6,5%	6						
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	13	145,7	01/05/2007	29/04/2011	79.900	27.952.700	22.647.861	6.519.840	6,3%	6,3%	6						
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	13	63,0	01/11/2007	29/10/2012	45.990	623.800	623.800	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN° 123 - Emp. RNN°123	13	109,3	01/11/2007	29/10/2012	49.194	1.129.100	1.129.100	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	38	51	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/06/2007	29/05/2012	104.904	2.273.000	2.273.000	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	01/11/2007	29/10/2012	77.368	2.395.600	2.395.600	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	01/11/2007	29/10/2012	41.050	4.169.100	4.169.100	0	0,0%	0,0%	2						
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-	13	340,7	01/11/2007	29/10/2012	27.370	3.511.600	3.511.600	0	0,0%	0,0%	11						
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,9	01/11/2007	29/10/2012	50.784	1.165.600	1.165.600	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN° 33	13	104,8	01/11/2007	29/10/2012	47.183	1.084.300	1.084.300	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol	13	167,7	01/11/2007	29/10/2012	7.515	1.733.600	1.733.600	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	28/04/2013	50.554	1.590.300	11.205.823	4.290.469	0,0%	0,0%	4						
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho	13	105,4	01/11/2007	29/10/2012	65.849	1.097.400	1.097.400	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/11/2007	29/10/2012	91.000	2.693.900	2.693.900	0	0,0%	0,0%	0						
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN° 11 - Emp. RNN° 95	13	181,4	01/06/2007	29/05/2012	53.800	1.854.500	1.854.500	0	0,0%	0,0%	0						
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.III												2.589.823	255.974.587	427.894.807	138.821.517									

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/11/2007	29/10/2012	60.183	1.783.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río	13	233,8	01/11/2007	29/10/2012	69.000	2.556.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01/11/2007	29/10/2012	99.900	2.960.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	28/03/2013	47.890	20.844.000		1	0	4,2%	4,2%	6					
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN° 40S / Emp. RPN° 88 -	13	238,6	01/08/2006	30/07/2011	43.479	18.188.000	2.019.604	2.019.601	1,2%	7,3%	6						
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	13	98,0	01/11/2007	29/10/2012	44.100	479.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RN N° 131 - Emp. RN N° 127 / Emp. RN N° 12 -	13	133,3	01/07/2007	28/06/2012	77.854	1.990.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	101,6	01/07/2007	28/06/2012	70.907	1.355.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	9	51	FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/11/2007	29/10/2012	88.892	1.507.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	10	51	ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	13	140,7	01/11/2007	29/10/2012	39.758	1.767.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN° 117-Emp.R.P.N°155-Km139,00-Emp.	8	144,7	01/08/2006	29/07/2012	47.315	16.858.000	3.364.872	1.426.022	1,3%	7,4%	6						
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	13	259,2	01/11/2007	29/10/2012	116.618	2.073.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/2007	29/10/2012	32.670	968.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quiaca	13	220,3	01/11/2007	29/10/2012	101.300	1.933.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/11/2007	29/10/2012	62.618	1.855.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38	13	102,5	01/11/2007	29/10/2012	45.000	1.367.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01/06/2007	29/05/2012	106.245	3.148.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N. N° 11 - Emp. R.N. N° 22 / Emp. R.N. N° 95 -	13	171,0	01/06/2007	29/05/2012	30.689	1.364.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	01/11/2007	29/10/2013	114.700	3.399.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog.	13	115,3	01/11/2007	29/10/2012	50.117	1.451.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 -	13	140,7	01/07/2007	28/06/2012	98.720	2.605.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/11/2007	29/10/2012	60.633	1.797.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Emp. R.N.	13	222,0	01/11/2007	29/10/2012	85.046	2.196.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/2007	29/01/2013	64.644	29.297.000	5.885.002	2.353.046	1,1%	4,7%	6						
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Parque Sesquicentenario - Emp. R.P. Ex R.N	13	259,4	01/11/2007	29/10/2012	70.000	1.164.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	13	123,4	01/11/2007	29/10/2012	55.544	1.646.000		1	0	0,0%	0,0%	0					
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/2007	29/10/2012	125.100	3.707.000		1	0	0,0%	0,0%	0					

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 2º Trim	Avance Total	Est	Obs
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/2007	29/10/2012	51.503	1.526.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. R.N. N° 74 / Patquia - Emp. R.N. N°	13	300,8	01/07/2006	28/06/2012	68.138	30.427.000	6.867.897	3.282.695	4,7%	10,4%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40	13	146,3	01/11/2007	29/10/2012	65.849	994.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con	13	119,6	01/11/2007	29/10/2012	66.058	2.936.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy -	13	205,1	01/11/2007	29/10/2012	48.679	2.164.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	13	146,8	01/11/2007	29/10/2012	66.038	1.477.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Emp. R.N.N N° 14 -	13	195,0	01/11/2007	29/10/2012	87.512	1.868.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp.RNN° 14 - Emp.RNN° 14 - Villaguay	13	173,0	01/11/2007	29/10/2012	77.859	2.307.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 3	13	139,6	01/11/2007	29/10/2012	62.829	1.776.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	01/11/2007	29/10/2012	79.961	2.937.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/2007	29/10/2012	54.000	1.600.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. RP N°62/Km 207,27 - Km 310,8	13	103,5	01/11/2007	29/10/2012	98.433	1.069.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RN N°62 - Km 310,80 - Km 419,69	13	107,0	01/11/2007	29/10/2012	74.430	809.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RN N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/2007	29/10/2012	69.354	2.055.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja -	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	47.395	17.271.000	17.199.598	17.199.597	10,3%	44,2%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/2007	29/10/2012	56.174	610.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RN N°20	13	78,0	01/11/2007	29/10/2012	70.038	759.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. c/Chubut	13	144,0	01/11/2007	29/10/2012	42.319	1.881.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. RNN 251°- Pasaje A Verde- Emp. RNN 250°-	13	254,0	01/11/2007	29/10/2012	114.291	1.242.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. Con Santiago del Estero	13	143,0	01/11/2007	29/10/2012	64.278	698.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	01/11/2007	29/10/2012	92.309	1.003.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	01/11/2007	29/10/2012	37.930	1.124.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	13	113,5	01/11/2007	29/10/2012	51.053	1.513.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.N° 35 - Emp. R.N.N° 22	13	137,0	01/11/2007	29/10/2012	61.542	1.823.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Emp. R.P.N°31 ; Emp. R.N.N°79 - Lte.	13	212,0	01/11/2007	29/10/2012	100.000	2.830.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimgasta (S) - Acc. A	13	242,2	01/11/2007	29/10/2012	108.972	3.229.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/11/2007	29/10/2012	138.038	4.090.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	01/11/2007	29/10/2012	51.282	557.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya -	13	86,0	01/07/2006	28/06/2012	43.558	23.231.000	16.754.446	14.692.089	12,1%	52,9%	6	
26	4	58	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy		13	205,1	01/11/2007	29/10/2012	48.679	815.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Emp. R.N.N° 9 y N° 34	13	90,0	01/11/2007	29/10/2012	40.698	442.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	13	159,0	01/07/2007	28/06/2012	99.715	779.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La	13	188,0	01/11/2007	29/10/2012	84.465	2.503.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	62	51	AL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/2007	29/10/2012	76.500	831.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Rio Cuarto	13	231,0	01/11/2007	29/10/2012	62.312	677.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. RP N°3 - Acc. A Colonia Alvear	13	161,5	01/11/2007	29/10/2012	100.000	787.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/2007	29/10/2012	40.000	652.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arreuntin	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/2007	29/10/2012	40.000	652.000,00	1,00	0,00	0,0%	0,0%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Emp. Ex RPN° 20 - Emp. RNN° 40 / Rio Mayo - Acc.a	13	175,3	11/11/2007	08/11/2012	52.581	857.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Rio Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	01/11/2007	29/10/2012	78.000	1.143.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	161,0	01/11/2007	29/10/2012	84.624	1.086.000	1	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV												4.766.318	257.287.000	52.091.481	40.973.050				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												9.097.882	593.129.587	666.806.954	242.039.915				
Total general												37.967.675	2.777.157.100	3.618.081.545	1.943.738.527				

Nº	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

Nº	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

- A** Certificación demorada. Valor estimado
- B** Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito V
- C** Modificación de Obra en trámite
- D** Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E** Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F** Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H** Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I** Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J** Reinicio de obra en estudio
- K** Certificacion de Pago Diferido.
- S/D** Sin datos
- Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/06/2007
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	785.687.610	945.693.854	307.592.948	215.128.204	7,9%
Provincia de Buenos Aires	719.247.118	803.412.509	310.381.371	285.470.597	10,4%
Provincia de Catamarca	25.811.811	58.218.989	32.096.402	32.033.313	1,2%
Provincia de Córdoba	199.441.329	186.956.714	90.610.842	88.177.035	3,2%
Provincia de Corrientes	251.519.994	207.775.250	27.060.420	26.680.897	1,0%
Provincia del Chaco	30.955.245	71.133.291	46.962.632	42.100.696	1,5%
Provincia del Chubut	103.483.733	143.661.674	62.775.646	62.372.790	2,3%
Provincia de Entre Ríos	338.613.877	329.802.683	73.440.021	68.141.923	2,5%
Provincia de Formosa	131.479.216	184.107.105	132.792.032	120.152.308	4,4%
Provincia de Jujuy	29.816.394	42.420.291	23.077.438	23.077.437	0,8%
Provincia de La Pampa	54.660.537	76.227.830	31.323.735	30.774.695	1,1%
Provincia de La Rioja	157.326.893	136.751.151	73.780.927	73.667.789	2,7%
Provincia de Mendoza	180.518.328	166.119.529	36.863.191	33.672.895	1,2%
Provincia de Misiones	82.230.654	100.920.711	54.151.059	54.068.065	2,0%
Provincia del Neuquén	54.427.201	46.607.399	27.817.302	27.076.022	1,0%
Provincia de Río Negro	167.164.072	213.959.012	106.439.784	105.239.554	3,8%
Provincia de Salta	139.769.162	137.941.716	98.188.756	89.271.252	3,3%
Provincia de San Juan	56.720.462	78.887.296	47.393.719	41.093.411	1,5%
Provincia de San Luis	16.832.283	43.161.072	39.861.013	39.799.061	1,5%
Provincia de Santa Cruz	172.252.832	295.230.554	188.738.928	188.725.562	6,9%
Provincia de Santa Fe	246.745.172	395.051.898	184.637.374	176.837.809	6,5%
Provincia de Santiago del Estero	124.016.244	161.504.197	68.139.058	68.003.514	2,5%
Provincia de Tucumán	58.864.174	118.399.946	58.587.291	56.243.490	2,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	11.199.467	13.368.640	4.694.693	4.694.693	0,2%
Interprovincial	671.586.609	279.395.063	188.824.106	185.535.506	6,8%
Nacional	64.680.500	643.735.238	417.662.161	417.569.813	15,2%
Binacional	110.000	16.052.702	38.393.706	38.393.706	1,4%
No Clasificado	64.767.932	214.804.013	144.967.879	144.713.588	5,3%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	6.111.300.327	2.917.254.435	2.738.715.623	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	18.591.000	2.495.564	15,5%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	360.000	19,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	22.536.000	6.000.000	36,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	6.048.708.387	233.258.333	4,0%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	396.301.048	2.498.048	0,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	28.451.745	31.650.384	3.198.639	11,2%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	10.196.180	443.496	4,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	393.119.000	13.675.000	3,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	6.978.301.999	249.754.080	3,7%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	18.591.000	6.236.462	6.241.813	33,6%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	2.010.000	2.010.000	89,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	200.000	200.000	28,6%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	22.536.000	13.021.785	13.021.785	57,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	6.048.708.387	3.302.702.595	3.300.155.661	54,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	396.301.048	125.930.967	125.823.793	31,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	12.649.060	12.649.060	24,5%
Ministerio de Salud	28.451.745	31.650.384	8.703.174	8.364.036	26,4%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	10.196.180	3.983.481	3.983.481	39,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	393.119.000	160.267.400	160.267.400	40,8%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	6.978.301.999	3.637.081.293	3.634.093.398	52,1%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2007

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	176.370.000	160.358.497	67.064.429	41,8%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Acciones para Planes Federales de Vivienda	2.528.237.314	2.208.369.623	1.319.978.714	59,8%
Acciones para Emergencia Habitacional	154.501.046	154.501.046	55.351.440	35,8%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	208.561.221	205.561.221	101.513.582	49,4%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	80.000.000	80.000.000	33.391.052	41,7%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	155.352.698	183.652.698	87.300.161	47,5%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Metrovías S.A.	32.695.274	32.695.274	59.048.658	180,6%
Trenes de Buenos Aires S.A.	58.166.691	58.166.691	54.242.009	93,3%
Trenes Metropolitanos General Roca S.A.	67.903.261	67.903.261	15.454.678	22,8%
Herso S.A.	0	0	27.734.577	
Ferrovías S.A.	72.271.220	72.271.220	48.178.342	66,7%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	24.505.608	24.505.608	19.146.986	78,1%
Benito Roggio S. A.	0	0	69.342.529	
Sin discriminar	47.866.735	47.866.735	34.930.727	73,0%
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	424.466.000	424.466.000	244.351.626	57,6%
Cooperativas de Servicios Públicos	0	27.326.086	18.022.350	66,0%
Sin discriminar (a empresas privadas)	394.228.702	244.861.644	106.095.784	43,3%
Fondo Electrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	216.489.000	216.489.000	99.586.663	46,0%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	289.409.000	355.725.654	255.892.975	71,9%
<i>Atención de Emergencia para Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	85.845.285	85.845.285	48.461.322	56,5%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	90.780.000	473.265.422	400.713.421	84,7%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
<i>Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	81.850.452	81.625.452	51.348.943	62,9%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa BIRF 7353</i>				
Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales	14.100.000	14.720.728	14.120.728	95,9%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a Provincias e Institutos de Enseñanza Provinciales	141.713.606	141.713.606	36.770.323	25,9%
<i>Innovacion y Desarrollo de la Formacion Tecnologica</i>				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	201.664.500	199.929.500	63.323.606	31,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asist. Financiera a Empresas Publicas y Entes Binacionales</i>				
Agua y Saneamiento Básico AySA S.A.	166.000.000	166.000.000	70.800.000	42,7%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	155.549.000	155.549.000	54.950.000	35,3%
TOTAL	5.868.526.613	5.883.369.251	3.457.115.625	58,8%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	996.360.232	1.018.694.252	607.048.486	606.985.585	16,7%
Provincia de Buenos Aires	1.092.820.956	1.373.282.330	696.427.419	696.147.294	19,2%
Provincia de Catamarca	131.163.296	99.349.363	51.350.416	51.347.795	1,4%
Provincia de Córdoba	219.752.332	359.158.336	115.647.891	115.649.862	3,2%
Provincia de Corrientes	112.421.961	87.397.506	57.127.017	57.074.310	1,6%
Provincia del Chaco	180.537.323	182.755.893	129.421.066	129.358.690	3,6%
Provincia del Chubut	191.493.889	189.917.467	92.271.694	92.271.694	2,5%
Provincia de Entre Ríos	128.860.362	170.631.575	71.662.166	71.662.166	2,0%
Provincia de Formosa	126.025.266	128.027.258	69.156.164	69.156.164	1,9%
Provincia de Jujuy	167.899.530	155.942.525	71.690.403	70.518.826	1,9%
Provincia de La Pampa	77.905.708	79.066.309	47.064.646	47.064.646	1,3%
Provincia de La Rioja	150.353.907	128.878.905	60.855.160	59.779.828	1,6%
Provincia de Mendoza	152.197.384	147.336.733	61.050.753	61.050.753	1,7%
Provincia de Misiones	114.771.640	128.180.210	83.592.935	83.481.287	2,3%
Provincia del Neuquén	124.606.199	77.691.257	32.586.617	32.586.617	0,9%
Provincia de Río Negro	117.747.362	76.096.093	37.220.061	37.220.061	1,0%
Provincia de Salta	144.784.580	140.720.865	74.960.518	74.958.946	2,1%
Provincia de San Juan	192.761.108	201.885.342	123.410.181	123.410.181	3,4%
Provincia de San Luis	137.401.115	47.022.021	6.748.835	6.748.835	0,2%
Provincia de Santa Cruz	351.509.795	432.831.391	521.942.119	521.942.119	14,4%
Provincia de Santa Fe	336.895.360	299.029.443	113.682.307	113.682.307	3,1%
Provincia de Santiago del Estero	149.932.257	142.846.119	48.443.189	48.300.390	1,3%
Provincia de Tucumán	246.766.974	444.929.491	143.122.706	143.096.498	3,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	61.023.014	89.368.498	57.709.218	57.709.218	1,6%
Interprovincial	869.460.000	727.334.618	258.621.626	258.621.626	7,1%
Nacional	132.672.369	43.019.199	7.700	7.700	0,0%
No Clasificado	6.749.000	6.909.000	4.260.000	4.260.000	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	6.978.301.999	3.637.081.293	3.634.093.398	100,0%

CUADRO A
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 30/06/2007
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	857.602	0	857.602	0	0	0
Judicial	15.208.232	0	15.208.232	2.382	0	2.382
Dirección Superior Ejecutiva	7.693.554	2.720.088	10.413.642	0	0	0
Relaciones Exteriores	2.193.419	200.000	2.393.419	0	0	0
Relaciones Interiores	587.661	14.270.000	14.857.661	274.531	0	274.531
Administración Fiscal	3.226.148	0	3.226.148	56.148	0	56.148
Control de la Gestión Pública	1.972.257	0	1.972.257	284.320	0	284.320
Información y Estadística Básicas	273.065	0	273.065	0	0	0
Subtotal	32.011.938	17.190.088	49.202.026	617.381	0	617.381
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	28.773.455	0	28.773.455	0	0	0
Seguridad Interior	25.000.106	2.010.000	27.010.106	0	0	0
Sistema Penal	1.142.145	0	1.142.145	0	0	0
Inteligencia	250.273	0	250.273	0	0	0
Subtotal	55.165.979	2.010.000	57.175.979	0	0	0
Servicios Sociales						
Salud	39.952.675	11.104.367	51.057.042	1.618.755	0	1.618.755
Promoción y Asistencia Social	2.487.560	142.696.708	145.184.268	105.029	3.675.936	3.780.965
Seguridad Social	321.268	0	321.268	11.062.458	0	11.062.458
Educación y Cultura	20.126.698	390.305.474	410.432.172	228.674	592.622	821.296
Ciencia y Técnica	16.536.208	0	16.536.208	63.689.345	12.370.995	76.060.340
Trabajo	586.233	12.649.060	13.235.293	41.131	0	41.131
Vivienda y Urbanismo	78.429	1.469.432.626	1.469.511.055	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	1.859.275	136.204.748	138.064.023	154.221.162	64.831.597	219.052.759
Subtotal	81.948.346	2.162.392.983	2.244.341.329	230.966.554	81.471.150	312.437.704
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	1.246.098	584.241.182	585.487.280	535.825	0	535.825
Comunicaciones	64.166	12.247.400	12.311.566	869.452	0	869.452
Transporte	174.430.873	361.191.205	535.622.078	2.134.090.872	400.713.419	2.534.804.291
Ecología y Medio Ambiente	87.824	1.376.369	1.464.193	9.089.454	0	9.089.454
Agricultura	173.542	0	173.542	3.822.432	0	3.822.432
Industria	21.241	6.520.190	6.541.431	1.542.361	0	1.542.361
Comercio, Turismo y Otros Servicios	11.681.328	4.739.412	16.420.740	0	0	0
Seguros y Finanzas	0	0	0	349.957	0	349.957
Subtotal	187.705.072	970.315.758	1.158.020.830	2.150.300.353	400.713.419	2.551.013.772
TOTAL	356.831.335	3.151.908.829	3.508.740.164	2.381.884.288	482.184.569	2.864.068.857

RESUMEN	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Dir. %	Transf. %
-Administración Central	356.831.335	3.151.908.829	3.508.740.164	13,03%	86,73%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social	2.381.884.288	482.184.569	2.864.068.857	86,97%	13,27%
TOTAL	2.738.715.623	3.634.093.398	6.372.809.021	100,00%	100,00%
