

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2007


INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2007</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	7
<u>II- EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	9
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2007</u>	17
1- Según Nivel Institucional	17
2- Según Fuente de Financiamiento	18
3- Según Ubicación Geográfica	19
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO I	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/09/2007	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2007	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 30/09/2007	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 30/09/2007	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 30/09/2007	
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO II	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/09/2007	
Cuadro B: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/09/2007	
Cuadro C: Principales Transferencias de Capital al 30/09/2007	
Cuadro D: Transferencias de Capital según Ubicación Geográfica al 30/09/2007	
CUADRO ANEXO A LOS CAPITULOS I Y II	
Cuadro A: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 30/09/2007	

INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende todas las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 30/09/2007

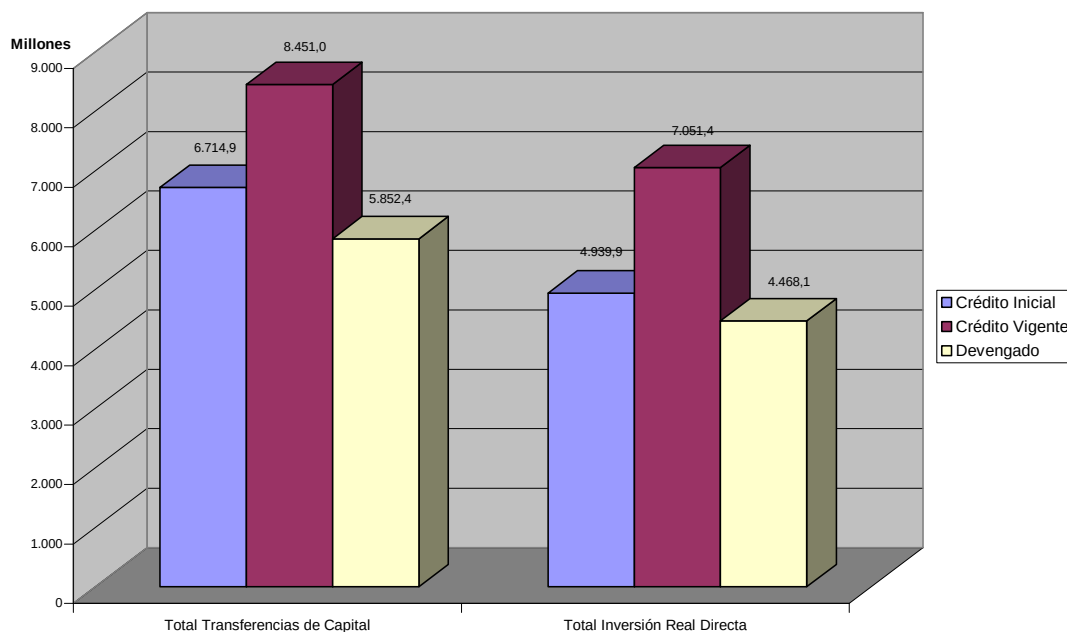


La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. El crédito inicial inherente a la IRD ascendió a \$4.939,9 millones y el vigente a \$7.501,4 millones, es decir, una variación de \$2.111,5 millones (42,7%) al cierre del tercer trimestre (ver Gráfico N° 1). El principal componente de la Inversión Real Directa, los proyectos de inversión, dispuso de una asignación de \$5.956,3 millones y la Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso contó con un crédito de \$1.095,0 millones (ver Gráfico N° 2).

Los proyectos de inversión incluyen gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De su asignación crediticia \$5.704,6 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de \$3.923,8 millones al cierre del tercer trimestre), \$101,2 millones a maquinarias y equipos (\$50,8 millones de ejecución) y \$150,5 millones a gastos vinculados a servicios no personales, bienes de consumo, activos intangibles y tierras y terrenos, entre otros (\$69,1 millones de devengado).


La Inversión Real Directa incluye además la adquisición de bienes de capital, desagregada en \$1.012,4 millones en maquinarias y equipos (ejecución de \$400,1 millones), \$38,5 millones en edificios e instalaciones (\$13,0 millones) y \$35,7 millones de activos intangibles (\$8,3 millones) y \$8,4 millones en otros conceptos (\$3,0 millones).

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/09/2007

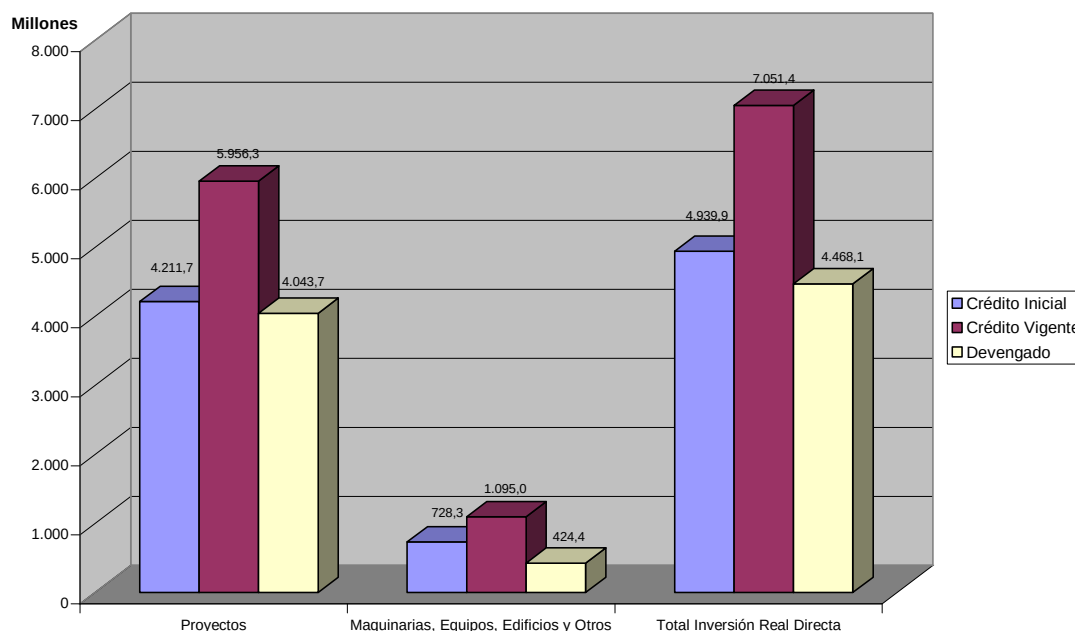

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al término del tercer trimestre, sobre un crédito de \$8.451,0 millones, la ejecución financiera de las transferencias de capital ascendió a \$5.852,4 millones. El Crédito Inicial en este concepto alcanzó \$6.714,9 millones, con un aumento del 25,3% (ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Ejecución Transferencias de Capital al 30/09/2007

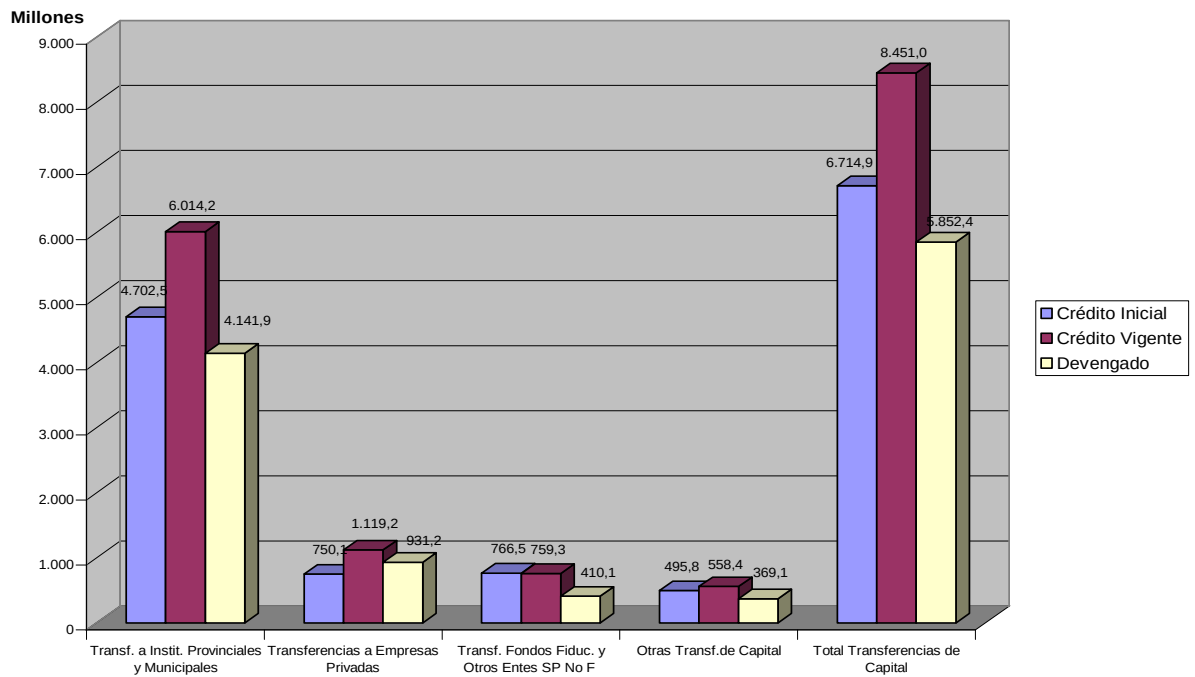

Al 30/09/2007 del monto de ejecución de las transferencias de capital, \$4.141,9 millones (70,8% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, \$931,2 millones (15,9%) a transferencias a empresas privadas, \$ 410,1 millones (7,0%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$ 369,1 millones (6,3%) a otros tipos de transferencias. El siguiente cuadro muestra el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la Ejecución de la Inversión Total durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/07 (en pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Inversión Real Directa	4.939.928.849	7.051.366.104	4.468.053.636	63,4%
Proyectos	4.211.676.829	5.956.342.409	4.043.695.181	67,9%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	728.252.020	1.095.023.695	424.358.455	38,8%
Transferencias de Capital	6.714.872.919	8.451.033.245	5.852.363.871	69,3%
Inversión Total	11.654.801.768	15.502.399.349	10.320.417.507	66,6%


El mismo permite destacar que las Transferencias de Capital registraron una mayor ejecución que la Inversión Real Directa al cierre del tercer trimestre. En efecto, las mismas tuvieron un incremento de \$1.736,2 (25,8%). Asimismo, el crédito inicial asignado a los proyectos de inversión se incrementó \$1.744,7 millones (41,4%) mientras que para la adquisición de bienes de uso aumentó \$366,8 millones (50,4%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2007

La ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) alcanzó a \$4.468,1 millones durante el tercer trimestre, lo que implica incrementos del 62,4% respecto a igual período de 2006 (al primer semestre el alza sobre igual período de 2006 ascendía al 67,8%), del 171,7% respecto a 2005 y del 442,2% en relación a 2004.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/09/2007

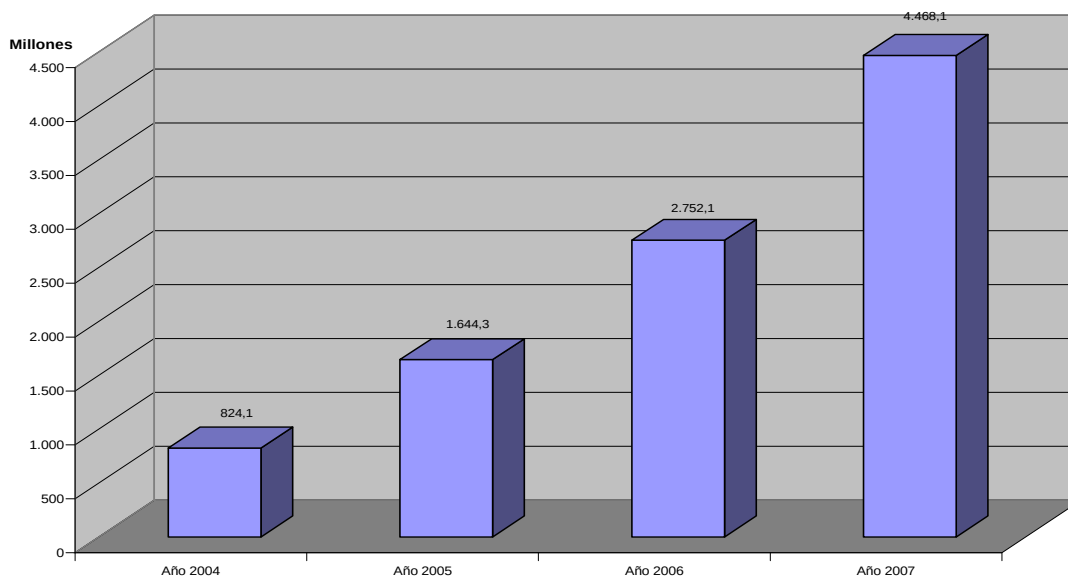

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la IRD, al 30/09/2007, aumentó en \$2.111,4 millones (42,7%), de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/07 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	1.147.116.081	1.537.958.712	592.363.379	38,5%
Organismos Descentralizados	3.765.769.068	5.471.963.692	3.855.976.244	70,5%
Instituciones de Seguridad Social	27.043.700	41.443.700	19.714.013	47,6%
TOTAL	4.939.928.849	7.051.366.104	4.468.053.636	63,4%

La ejecución en la Administración Central se concentró en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (\$284,5 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (\$92,7 millones), la Gendarmería Nacional (\$27,2 millones), el Ministerio del Interior (\$22,0 millones), el Consejo de la Magistratura (\$17,4 millones), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (\$16,9 millones), el programa Mejoramiento de la Calidad Educativa dependiente del Ministerio de Educación (\$13,5 millones) y el programa Fuerzas de Paz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (\$12,2 millones). En los Organismos Descentralizados el gasto se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad (\$3.120,8

millones), el Organo de Control de Concesiones Viales (\$325,3 millones), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$253,7 millones) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$69,5 millones). Lo expresado se resume en la siguiente tabla:

Tabla Nº 1. Evolución Trimestral de Ejecución de la IRD, por nivel de ejecución (en millones de pesos)


Organismo/Programa	Ejecución al 30/06/07	Ejecución al 30/09/07	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	1.949,5	3.120,8	60,1%
Organo de Control de Concesiones Viales	184,4	325,3	76,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	149,3	284,5	90,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	152,5	253,7	66,4%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	88,7	92,7	4,5%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	40,0	69,5	73,8%
Gendarmería Nacional	18,4	27,2	47,8%
Ministerio del Interior	2,2	22,0	900,0%
Consejo de la Magistratura	9,7	17,4	79,4%
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	14,3	16,9	18,2%
Programa Mejoramiento Calidad Educativa	13,5	13,5	0,0%
Programa Fuerzas de Paz	11,1	12,2	9,9%
Total	2.633,6	4.255,7	61,6%

Se observa una aceleración en el ritmo de ejecución, durante el tercer trimestre, en la mayoría de los proyectos analizados (con guarismos superiores al 47,5% sobre el ejecutado del primer semestre). Considerando la totalidad de los proyectos incluidos en la tabla, la ejecución del citado período representa el 61,6% de lo devengado en el primer semestre.

2-Según Fuente de Financiamiento

Al 30/09/07 el financiamiento de la IRD con Tesoro Nacional aumentó sustancialmente su participación respecto del mismo período de 2006 (83,6% versus 58,2%).

Gráfico Nº 5
Inversión Real Directa-Comparativo 2006/2007-Fuente de Financiamiento

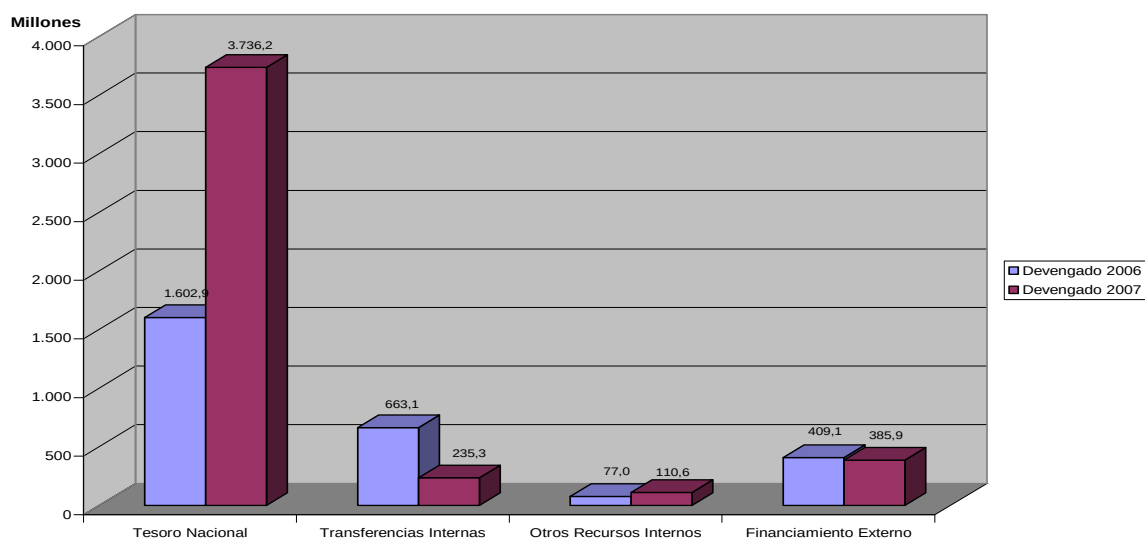

Al cierre del tercer trimestre la ejecución del devengado, respecto de igual período de 2006, se incrementó en la Fuente Tesoro Nacional (\$2.133,3 millones, 133,1%) y en otros

recursos internos (\$33,6 millones, 43,7%) y disminuyó en transferencias internas (\$427,8 millones, 64,5%) y en financiamiento externo (\$23,2 millones, 5,7%).


Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/07 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	2.707.071.933	4.889.207.302	3.736.213.119	76,4%
Transferencias Internas	975.131.260	994.936.332	235.343.932	23,7%
Otros Recursos Internos	376.730.007	384.242.356	110.581.537	28,8%
Financiamiento Externo	880.995.649	782.980.114	385.915.048	49,3%
Total	4.939.928.849	7.051.366.104	4.468.053.636	63,4%

De los \$3.736,2 millones de ejecución financiados con Tesoro Nacional, \$2.609,5 millones correspondieron a construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento y administración del sistema vial nacional, \$253,6 millones al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, \$301,1 millones al Órgano de Control de las Concesiones Viales, \$61,0 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y \$59,1 millones al programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario, \$58,1 millones al Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela, \$41,3 millones al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II y \$28,3 millones a la Ampliación Puerto Caleta Paula.

Con transferencias internas se financiaron proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, por \$209,5 millones y del Órgano de Control de Concesiones Viales por \$24,3 millones, a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

Con financiamiento externo se solventaron \$258,3 millones en proyectos de construcciones de rutas y \$ 38,5 millones del Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento y los proyectos Transporte Urbano de Buenos Aires (\$18,9 millones) y la Construcción Alteo Terraplén Laguna La Picasa (\$19,9 millones), dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el equipamiento conjunto para las Misiones de Paz en el Ministerio de Defensa (\$12,2 millones), entre otras iniciativas.

Gráfico N° 6
Inversión Real Directa- Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 30/09/2007

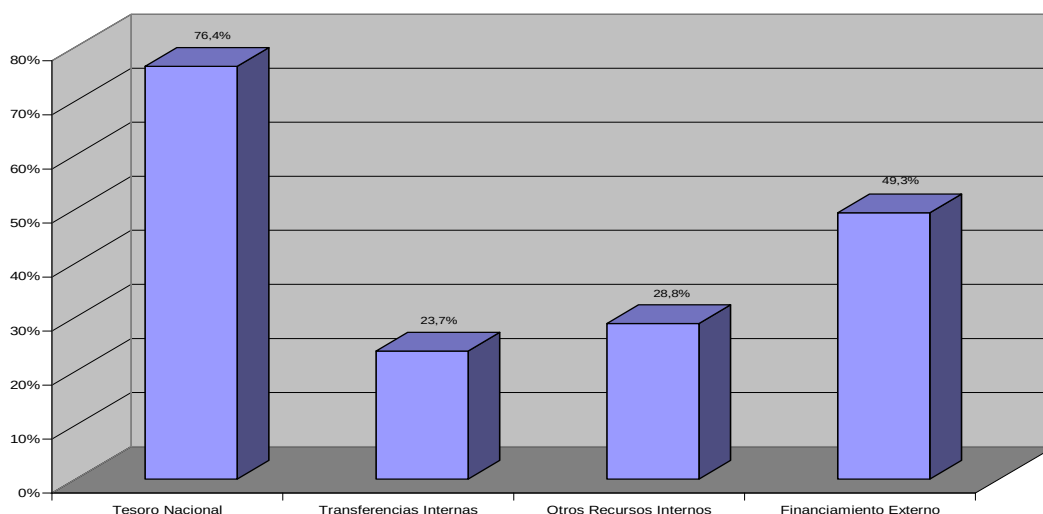

3-Según Ubicación Geográfica

La Inversión Real Directa se concentró un 37% en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Formosa y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los \$496,7 millones incluyendo, principalmente, los proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad (\$152,7 millones), del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$157,7 millones) y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$77,9 millones). Además, sobresalió la construcción del Hospital El Cruce Florencio Varela (\$58,1 millones). Las obras en ejecución bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad comprendieron, fundamentalmente, la Ruta Provincial N° 9 Campana-La Plata (\$31,1 millones), Avenida Vergara-Calle 23-Camino General Belgrano (\$15,3 millones), Avenida Mitre-Calle 55 (Estación Hudson)-Avenida Varela (\$11,2 millones) y el Corredor 5 Ruta Nacional N° 33 Bahía Blanca-Empalme Ruta Nacional N° 5 (\$10,4 millones).

En la provincia de Santa Cruz la ejecución alcanzó los \$282,8 millones, comprendiendo, entre otras, las obras Ruta Provincial N° 12 Empalme Ruta Provincial N° 25-Pico Truncado (\$114,3 millones), Ruta Nacional N° 288 Empalme Ruta Nacional N° 3-La Julia (\$53,4 millones) y la Ruta Nacional N° 3 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Puerto Deseado (\$34,3 millones).

En la provincia de Santa Fe la ejecución alcanzó los \$273,7 millones y correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$179,3 millones), obras por convenio en la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286-Límite con Chaco Secciones I y II (\$54,6 millones), obras de mejoramiento y reposición en la Ruta Nacional N° 7 tramo Variante Laguna La Picasa (\$26,3 millones), obras en la R008 Río Paraná-Autopista Rosario/Córdoba (\$28,7 millones), en la Ruta Nacional N° 168 Río Colastine-Túnel Subfluvial Hernandarias (\$14,8 millones), en la Ruta Nacional N° 11 Acceso Sur Mejoramiento Ferrovial-Intersección Ruta Nacional N° 11 (\$14,4 millones), en la Ruta Nacional N° 34 Cruce Urbano Ciudad de Rafaela (\$9,0 millones) y en el Corredor Vial 3 Ruta Nacional N° 11 (\$20,8 millones). Asimismo, mostraron avance los proyectos Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe (\$37,9 millones) perteneciente al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (\$29,9 millones) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En la provincia de Formosa la ejecución alcanzó los \$199,8 millones, concentrándose en las obras realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (principalmente \$106,3 millones de la Ruta Nacional N° 81 Las Lomitas-Límite con Salta Empalme Ruta Nacional N° 34 y \$26,2 millones en la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81-Límite con Chaco) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para optimización de sistemas de distribución de agua potable (\$26,2 millones).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una inversión de \$403,5 millones, principalmente destinados al programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario (\$59,2 millones), al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II (\$46,4 millones) y a la Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad (\$20,4 millones). Se aclara que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en la ciudad, siendo imputados a la jurisdicción por encontrarse el domicilio legal de los beneficiarios.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se analiza la ejecución física de los proyectos de inversión, tomando un subconjunto que representa alrededor del 90% del costo total de la cartera y el 84,5%, aproximadamente, de la ejecución al cierre del tercer trimestre.

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total al 30/09/2007 (en pesos)

Servicio Administrativo	Programas/Proyectos	Costo Total	Devengado del 01/01/07 al 30/09/07	% Devengado año2007/Costo Total
Dirección Nac. de Vialidad	Construcción de Rutas	28.352.175.000	2.478.593.189	8,74
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos C.Re.Ma.	9.097.882.000	371.077.129	4,08
CONAE	Misiones Satelitales	530.619.181	64.506.740	12,16
Dirección Nac. de Vialidad	Mantenimiento de Rutas	517.618.000	254.090.218	49,09
Secretaría de Transporte	Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	164.845.659	29.910.202	18,14
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	139.827.069	28.287.655	20,23
ENOHSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	119.804.416	37.888.050	31,62
ENOHSA	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	105.672.929	12.472.952	11,80
OCCOVI	Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP II Florencio Varela Buenos Aires	92.573.559	59.885.857	64,69
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 Año II.	81.169.651	31.114.152	38,33
OCCOVI	Aumento de Capacidad Construcciones Viales, Pcia de Buenos Aires V	80.266.598	30.530.923	38,04
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	80.000.000	58.050.926	72,56
ENOHSA	Optimización Sistema de Provisión de Agua Potable, Formosa	79.008.509	19.781.552	25,04
OCCOVI	Aumento de Capacidad en Corredores Viales, Mendoza	78.918.314	25.587.283	32,42
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 Año II	78.884.802	39.351.432	49,88
Secretaría de Transporte	Modernización Línea A Subterráneo	78.826.513	35.104.019	44,53
ENOHSA	Colector Cloacal y Planta Depuradora Villa Carlos Paz, Córdoba	64.830.751	21.101.454	32,55
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento de Desagües, Córdoba Capital	62.982.711	2.197.467	3,49
ENOHSA	Primer Tramo, Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras, Hurlingham	58.913.095	6.999.160	11,88
OCCOVI	Aumento de Capacidad en Construcciones Viales Pcia de Buenos Aires	54.550.762	27.353.121	50,14
ENOHSA	Construcción Acueducto Trelew - Pto. Madryn	54.373.534	16.877.792	31,04
ENOHSA	Planta Potabilizadora Ampliación y Optimización Sistema de Captación Paraná	51.054.587	12.202.702	23,90
ENOHSA	Construcción Acueducto Sur Salta	50.060.430	8.318.300	16,62
ENOHSA	Planta de Tratamientos Cloacales, Merlo	41.180.398	9.690.691	23,53
ENOHSA	Construcción Redes Cloacales, Rawson San Juan	40.623.373	11.034.196	27,16
ENOHSA	Optimización Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	38.302.479	6.462.103	16,87
ENOHSA	Construcción Planta Depuradora, Moreno	38.296.123	5.588.043	14,59
ENOHSA	Construcción Acueductos, El Pato Berazategui	34.663.731	2.938.749	8,48
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 Año II	33.561.813	33.561.813	100,00
ENOHSA	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución Paraná	33.383.577	11.015.253	33,00
ENOHSA	Remodelación Planta Depuradora y Colectores Aguirre, Tandil	32.813.573	9.369.558	28,55
ENOHSA	Construcción Planta Tratamientos Cloacales, Subsistema Rawson San Juan	29.993.037	12.472.952	41,59
ENOHSA	Sistema Cloacal, Castex La Pampa	22.181.318	2.705.389	12,20
Subtotal		40.419.857.492	3.776.121.022	9,34
Total I.R.D.		44.922.528.678	4.468.053.636	9,94

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2007

El costo total considera los fondos necesarios para toda la vida del proyecto de inversión (abarcando todos los ejercicios que involucran la fecha inicial y la fecha de terminación del mismo). La construcción de rutas, llevada a cabo por la Dirección Nacional de

Vialidad, aparece como la principal acción prevista en la actual cartera de proyectos. A continuación se detallan los principales proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional (a partir de diferentes sistemas de gestión).

Construcción de Rutas

En Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración se finalizó, al 30/09/2007, el tramo en Ruta Nacional N°40 Malargüe/Barrancas Secciones I y II (36 kilómetros en la provincia de Mendoza), manteniéndose en ejecución las siguientes obras:

Cuadro N° 5. Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración (Kilómetros en ejecución)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N°14	Guaqueguaychú-Paso de los Libres, Secciones Intersección Empalme R.P.N° 16 - Intersección Empalme R.P.N° 20; Empalme R.P.N° 20 - Empalme R.P."J" (Colonia Elía), Empalme R.P.N°29-Ubajay; Ubajay-Empalme R.N.N°18; A° Ayuí Grande-A° Mandisoví Grande; A° Mandisoví Grande-Río Mocoretá; A° Colman-Empalme R.P.N°29 (Colonia Hocker) y Empalme R.N.N°18-Ayúí Grande	Entre Ríos	253,1
R.N.N°40	Río Agua Clara Km. 809 - El Eje Km. 847	Catamarca	38,0
R.N.N°16	Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos - El Caburé y Sección Límite con Chaco - Los Pirpintos	Santiago del Estero	67,9
R.N.N°158	Villa María-Gral. Deheza	Córdoba	64,3
R.N.N°40	Empalme R.N.N°144-El Sosneado	Mendoza	18,7
Total			441,9

Las Obras por Convenio con Provincias que se encontraban en ejecución, al cierre del tercer trimestre, ascendían a 1.787 kilómetros de ruta, finalizándose los siguientes tramos:

Cuadro N° 6. Obras por Convenio con Provincias (Kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.P.N°11	Famatina - Límite con Catamarca Secciones Campana - Límite con Catamarca y Kilómetro 25 - Campana a acceso a Santo Domingo	La Rioja	46,9
R.N.N°73	Los Cajones Anguinan	La Rioja	16,6
R.N.N°14	Dos de Mayo San Pedro Sección IV	Misiones	47,4
R.P.N°19	Wanda-Deseado	Misiones	45,0
R.N.N°101	San Antonio-Piñalito	Misiones	30,0
R.N.N°23	Valcheta-Pilcaniyeu	Río Negro	28,1
Varias	Obras por Convenio con Provincias		54,0
R.N.N°101	Bernardo de Irigoyen-San Antonio	Misiones	32,0
Total			300,0

En Obras en Corredores Viales Concesionados se encontraban en ejecución, al 30/09/2007, 542 kilómetros de rutas, finalizándose los siguientes tramos:

Cuadro N° 7. Obras en Corredores Viales (Kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N°3	CVN° 1 - Obra N° 10B-Acceso Videla Dorna-Empalme R.P.N°61	Buenos Aires	38,0
R.N.N°11	CVN° 3 - Obra N° 233-San Justo-Gobernador Crespo	Santa Fe	36,0
R.N.N°36	CVN4 Obra N°22 Empalme R.N.N°8-A005	Córdoba	42,0
R.N.N°8	Emp.R.N.N°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36		
R.N.N°34	CVN° 4 - Obra N° 204-Empalme R.N.N°36-Acceso a Suco	Córdoba	4,0
R.N.N°7	CVN° 5 - Obra N° 6A-Empalme R.P.N°80 S Empalme R.P.N°33	Santa Fe	31,0
	CVN°2 - Obra 23B km 568-km 585/km 613-km 616/km 866-km 871	Mendoza	5,0
R.N.N°3	CVN°1- Obra 238-Empalme R.P.N°-Acceso a Azul	Buenos Aires	41,0
R.N.N°3	CVN°1 - Empalme R.P.N°61-Acceso a Parish	Buenos Aires	26,0
R.N.N°205	CVN°1 - Empalme R.P.N°61-Empalme R.P.N°65	Buenos Aires	16,0

R.N.Nº8	CVNº4-Empalme R.P.Nº3-Empalme R.N.Nº148	San Luis	64,0
R.N.Nº19	CVNº3 – Obra Nº21-San Francisco-Empalme R.P.Nº81 – A (S)	Córdoba	32,0
R.N.Nº12	CVNº6 – Obra Nº230-Empalme R.P.Nº34-Posadas	Misiones	10,0
R.N.Nº9	CVNº3 - Obra 1 Campana-Río Areco	Buenos Aires	29,0
R.N.Nº5	CVNº2- Obra 11B Cruce FC Sarmiento Empalme R.P.Nº1	Buenos Aires	33,0
Total			407,0

Por el sistema Construir, Operar y Transferir se mantuvieron, al 30/09/2007, 626 kilómetros (Corredor 28 de Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31 de Bahía Blanca-Empalme Ruta Nacional Nº 5). La fecha prevista de finalización de los contratos es el año 2011. En Mejoramiento y Reposición de Rutas se encontraban en ejecución, al cierre del tercer trimestre, 3.509 kilómetros, concluyéndose los siguientes tramos:

Cuadro Nº 8. Mantenimiento y Reposición de Rutas (Kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.Nº3	Laguna Khami-Rancho Hambre; Sección Kosovo La Herradura	Tierra del Fuego	23,0
R.N.Nº40	Perito Moreno-Bajo Caracoles; Sección Perito Moreno-km 29	Santa Cruz	48,9
R.N.Nº81	Las Lomitas-Juan G. Bazán; km 1473-1503	Formosa	30,0
R.N.Nº81	Las Lomitas- Empalme R.N.Nº34 Pluma del Pato Emp. R.N.Nº34 Secciones I, II, III y IV	Salta	121,1
R.N.Nº81	Las Lomitas-Ingeniero Juárez Secciones Pozo del Mortero-Laguna Yema y Laguna Yema-Los Chiriguano	Formosa	55,2
C.V.R.N.Nº38-75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 y Circunvalación La Rioja	La Rioja	10,0
Varias	Rehabilitaciones Menores en el Territorio Nacional		467,5
S.Nº	Acc.Autopista Buenos Aires-La Plata por Av. Iriarte (España)	Buenos Aires	2,6
R.N.Nº35	Aº El Gato-Empalme R.N.Nº8	Córdoba	2,0
R.N.Nº258	Variante desde R.N.Nº237 Paso por Bariloche	Río Negro	14,7
R.N.Nº7	Variante Laguna La Picasa	Santa Fe	15,0
R.N.Nº38	Río Marapa-Principio de Autopista	Tucumán	20,0
R.N.Nº11	Remodelación Cruce por ciudad de Clorinda	Formosa	6,0
R.P.Nº52	Calle San Martín-Acceso Planta Cementera	Mendoza	9,5
R.N.Nº40	Las Lajas-Chos Malal-Pte. s/ Aº Pilmatue	Neuquén	1,0
R.N.Nº14	Salto de la Rosa-San Rafael	Mendoza	5,4
R.N.Nº34	Límite con Santiago del Estero-Gobernador Garmendia; Sección 857-883	Santiago del Estero	25,0
Total			857,0

El Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes comprendió trabajos de reparación de obenques en estructuras sobre el Río Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas (1.200 metros), sobre el Río Gallegos entre Río Gallegos-Güer Aike (90 metros), el Puente Nuevo y accesos en tramo Arroyo Batel y Batelito (70 metros), el Puente sobre el Río San Lorenzo entre San Pedro-Calilegua (330 metros) y puentes sobre arroyo Feliciano entre Cerrito-La Paz (126 metros).

Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

Los siguientes cuadros muestran las mallas en ejecución, al cierre del tercer trimestre, para los C.Re.MA I, II, III y IV:

Cuadro Nº 9. Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (Kilómetros en ejecución)		
Ruta	Malla	Longitud
R.N.Nº3	Malla 107A – Chubut	124,5
R.N.Nº3-26	Malla 107B – Chubut	140,7
R.N.Nº22	Malla 111 – Neuquén	134,8
R.N.Nº40S-258-259	Malla 113 – Chubut	201,3
R.N.Nº258-237	Malla 114 - Río Negro	141,9
R.N.Nº3	Malla 120 - Río Negro-Buenos Aires	183,6
R.N.Nº229-249-22	Malla 206 – Buenos Aires	167,1
R.N.Nº3	Malla 208 – Buenos Aires	258,3
R.N.Nº228	Malla 211 – Buenos Aires	139,9
R.N.Nº68	Malla 401B – Salta	114,8
R.N.Nº12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	271,5
R.N.Nº127	Malla 506 - Entre Ríos	259,2
R.N.Nº95	Malla 508 – Chaco	222,3

R.N.Nº18-130	Malla 510 - Entre Ríos	173,0
R.N.Nº118	Malla 512A – Corrientes	84,3
R.N.Nº40-68	Malla 401A – Salta Tucumán	142,3
R.N.Nº118	Malla 512B – Corrientes	113,5
Total		2.873,0

Cuadro Nº 10. Contratos de Recuperación y Mantenimiento II (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.Nº35	Malla 116ª - La Pampa - Buenos Aires	138,0
R.N.Nº35	Malla 116B - La Pampa	113,9
R.N.Nº35	Malla 117ª - La Pampa	111,3
R.N.Nº35-188	Malla 117B - La Pampa	158,3
R.N.Nº250	Malla 123B - Río Negro	145,3
R.N.Nº40S	Malla 131 – Neuquén	104,5
R.N.Nº9-11-33-34-A012	Malla 202B – Santa Fe	95,7
R.N.Nº33	Malla 215 - Buenos Aires	69,3
R.N.Nº33	Malla 216ª – Buenos Aires	72,8
R.N.Nº33	Malla 216B – Buenos Aires	71,9
R.N.Nº40N-150	Malla 306 - San Juan	313,8
R.N.Nº188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	161,5
R.N.Nº81	Malla 338 – Formosa	171,0
R.N.Nº60-157	Malla 408ª - Catamarca-Santiago del Estero-Tucumán	114,6
R.N.Nº38-60	Malla 408B - La Rioja-Catamarca	166,7
R.N.Nº60	Malla 408C – Catamarca	171,9
R.N.Nº157	Malla 409ª – Tucumán	75,4
Total		2.255,9

Cuadro Nº 11. Contratos de Recuperación y Mantenimiento III (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.Nº3-25	Malla 102ª – Chubut	250,4
R.N.Nº3	Malla 102B – Chubut	230,4
R.N.Nº22-151	Malla 103 - Río Negro	163,8
R.N.Nº152-143	Malla 104 – La Pampa	128,5
R.N.Nº22	Malla 108ª - Río Negro	146,5
R.N.Nº231-237-40S	Malla 109 – Neuquén	291,2
R.N.Nº188	Malla 129 – La Pampa-San Luis	129,4
R.N.Nº38-79	Malla 207/304 - La Rioja-Córdoba	334,0
R.N.Nº146-147	Malla 301 - San Luis	253,8
R.N.Nº20-141	Malla 302 - San Juan	286,1
R.N.Nº143-144-146	Malla 312 – Mendoza	223,4
R.N.Nº40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	105,1
R.N.Nº9	Malla 402ª - Santiago del Estero	96,7
R.N.Nº9	Malla 402B - Santiago del Estero	120,9
R.N.Nº9-66-IV66	Malla 404 – Jujuy-Salta	148,9
R.N.Nº64	Malla 407- Sgo.del Estero-Catamarca-Tucumán	152,0
R.N.Nº157	Malla 408D – Tucumán-Santiago del Estero	128,0
R.N.Nº12-136	Malla 509 - Entre Ríos	151,8
R.N.Nº18	Malla 513ª - Entre Ríos	90,3
R.N.Nº12-131	Malla 513B - Entre Ríos	99,9
R.N.Nº7	Malla 330 – Mendoza	182,5
R.N.Nº34	Malla 431 - Santiago del Estero	251,9
R.N.Nº146	Malla 305 - San Luis-Mendoza	211,2
R.N.Nº38	Malla 437 – Tucumán	145,7
Total		4.322,0

Cuadro Nº 12. Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.Nº38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	300,7
R.P.Nº6-39	Malla 513C - Entre Ríos	86,0
R.N.Nº14-122-123	Malla 501 - Corrientes	144,5
R.N.Nº143-40S	Malla 313B – Mendoza	238,5
R.N.Nº38-75	Malla 303 - La Rioja	237,9
R.N.Nº143	Malla 313A – Mendoza	113,0
R.N.Nº9-60	Malla 204 – Córdoba	157,4
R.N.Nº14	Malla 534 – Corrientes	101,6
R.N.Nº12-18	Malla 533 – Entre Ríos	133,2
Total		1.513,0

Mantenimiento de Rutas

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó, al 30/09/2007, el Mantenimiento Directo de rutas por 6.813,0 kilómetros, utilizando equipos y mano de obra propios.

Mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (se fija por convenio la inversión prevista, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) se llevó a cabo la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical, alcanzando los 7.002,0 kilómetros mantenidos.

Cuadro N° 13. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	6.813,0
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	7.002,0
Total	13.815,0

Las obras del Sistema Modular, durante el tercer trimestre, incluyeron la ejecución de trabajos en 2.197,1 kilómetros, comprendiendo los siguientes tramos:

Cuadro N° 14. Sistema Modular (Kilómetros en ejecución)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N° 34/81	Empalme R.N.N° 50 – Límite Bolivia - Pluma de Pato	Salta	259,0
R.N.N° 25	Los Altares - Empalme Ruta N.N° 40 (S)	Chubut	277,7
R.N.N° 16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
R.N.N° 40S	Empalme R.N.N° 25 – Empalme R.P.N° 56	Chubut	289,1
R.N.N° 16	Empalme R.N.N° 95 - Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
R.N.N° 40S	Pareditas/Malargüe	Mendoza	229,7
A007	Av. B.Parera-A.Nivel R.N.N° 11 - A. Nivel R.N.N° 11- C.J.Garay	Santa Fe	14,5
R.N.N°60	Tinogasta Límite con Chile	Catamarca	254,2
R.N.N°142/40N/7	G.Andre - Empalme R.N.N°20	Mendoza	194,7
R.N.N°40/260	Empalme R.P.N°22 - Límite con Chubut - Santa Cruz -	Chubut	147,1
	Empal.R.N.N°40 Límite con Chile		
Total			2.197,1

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Misiones Satelitales

La CONAE continuó, durante el tercer trimestre, su programa de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014, trabajando con la contratista INVAP S.E., encargada de la construcción de los satélites del Plan y de las pruebas de ensayo.

Asimismo se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, en la obra Misión SAC-D Aquarius (ex Misión Cesar, siendo socia la NASA) y comenzaron las compras de grandes componentes de vuelo para los satélites SAOCOM, como los Sistema de posicionamiento global (GPS) y los posicionadores estelares (STAR TRACKERS). Por otra parte se continuaron los contratos con INVAP, CNEA, IAR y Consulfem SA para la plataforma, la antena de radar de apertura sintética (SAR) y los transmisores de banda s y banda x.

También se adquirieron componentes electrónicos de vuelo y la carga útil del SAC-D. Continuaron los contratos con INVAP, el IAR y la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional de La Plata para la construcción de la Plataforma, la computadora de a bordo para la carga útil y los radiómetros. Por otra parte, se continuó el contrato con el Instituto Nacional de Óptica, de Québec, Canadá, que provee la cámara infrarroja del SAC-D. Al 30/09/2007 las misiones en curso resultaron:

Cuadro N° 15. Misiones Satelitales en Curso		
Satélites	Misión	Socios
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/Francia
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1ª/1B	Observación de la tierra	Italia (A.S.I.)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)/Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA/Italia/Bélgica/Brasil/Dinamarca/Francia

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Proyectos Cloacales y de Saneamiento

Entre los proyectos más relevantes ejecutados al 30/09/07 se destaca el desarrollo del Acueducto Centro Oeste (en la provincia de Santa Fe). Se prevé la construcción de una planta depuradora cloacal del primero y segundo tramo de las colectoras cloacales y estaciones elevadoras en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, beneficiando a 135.000 personas. Ampliando la información del Cuadro N° 4, se expone la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Ejecución de los Proyectos con Mayores Costos Totales (en pesos)

Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Costo Total en pesos	Avance Físico acum.	Ejecución al 30/09/2007
Construcción Acueducto Centro Oeste, Santa Fe	18/03/2006	07/11/2007	119.804.416	48.68	61.576.180
Optimización Sistema de Agua Potable, Formosa	17/02/2006	17/02/2008	79.008.509	75.95	36.939.690
Colector Cloacal y Planta Depuradora, Villa Carlos Paz	01/03/2006	31/12/2007	64.830.751	78.44	45.591.851
Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	09/01/2007	29/12/2008	62.982.711	2.94	2.705.389
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	07/09/2005	31/12/2007	58.913.095	87.52	46.684.382
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo	07/09/2006	27/08/2008	57.667.660	4.46	33.000
Construcción Acueducto Trelew - Puerto Madryn	16/02/2006	31/12/2007	54.373.534	96.33	52.998.890
Planta Potabilizadora, Ampliación-Optimización, Paraná	27/04/2005	31/12/2007	51.054.587	86.23	43.153.731
Construcción Acueducto Sur Salta	21/03/2007	20/03/2008	50.060.430	35.00	8.318.300
Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo	16/09/2005	31/12/2007	41.180.398	90.61	35.912.393
Construcción Redes Cloacales, Rawson San Juan	20/02/2006	20/02/2008	40.623.373	57.38	23.580.278
Optimización Sistema de Distribución de Agua, Formosa	07/06/2006	27/05/2008	38.302.479	30.26	12.539.347
Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno	14/02/2006	31/12/2007	38.296.123	32.47	20.767.752
Construcción Acueductos 25 Pozos, El Pato	15/12/2006	08/02/2008	34.663.731	7.27	6.072.404
Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución Paraná	09/06/2005	31/12/2007	33.383.577	75.74	29.347.746
Construcción Perforaciones Agua Potable, Tandil	17/10/2006	31/12/2007	32.813.573	83.88	16.707.604
Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson, San Juan	13/03/2006	02/03/2008	29.993.037	73.63	21.788.437
Primer Tramo Colectores Cloacales Estaciones Elevadoras Morón-Tres de Febrero	18/01/2006	31/12/2007	23.031.958	71.64	16.517.089
Optimización Sistema Desagües Cloacales en Castex, La Pampa	26/04/2007	17/10/2008	22.181.318	11.06	2.705.389

Órgano de Control de las Concesiones Viales

Vinculación y Remodelación de la Ruta Provincial Nº 36 - Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial Nº 2 - Florencio Varela

Se ejecutaron tareas de mejoramiento y reordenamiento urbano (de forma de garantizar las condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas) con especial cuidado del impacto ambiental y dentro del marco económico y jurídico. La iniciativa prevé el mejoramiento de 6.450 metros e incluye la repavimentación desde el kilómetro 34,5 al kilómetro 40,9 con el objetivo de transformar en autovía el citado tramo.

Aumento de la Capacidad de los Corredores Viales Nacionales

El proyecto Provincia Buenos Aires V, corresponde a la Ruta Nacional Nº 9, comprendiendo el tramo Campana (hasta el distribuidor de la Ruta Nacional Nº 193 acceso al complejo Zárate–Brazo Largo) y atañe la incorporación de un nuevo carril al trazado.

Por otra parte se llevaron a cabo obras de doble vía en los departamentos de Santa Rosa y General San Martín (Ruta Nacional Nº 7) y se prevé la duplicación de la calzada existente en una longitud de 34 kilómetros, formando parte del corredor bioceánico central que vinculará las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja con la República de Chile.

Obras Mejorativas en los Corredores Viales Nacionales

El OCCOVI tiene delegadas facultades y obligaciones para la contratación de trabajos que revistan el carácter de obra. Por Acta de Acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se determinó que esa Dirección Nacional continuará con las obras licitadas y en trámite de licitación, correspondientes al primer año y parcialmente a las del Año II, mientras que el OCCOVI licitará las obras del Año II en adelante, siendo la única dependencia habilitada para realizar esa clase de iniciativas.

Al 30/09/2007 sobresalieron los proyectos Obras Mejorativas en Corredor Vial Nº 2 Año II-I Etapa, Obras Mejorativas en Corredor Vial Nº 4 Año II-I Etapa y Obras Mejorativas en Corredor Vial Nº 5 Año II-I Etapa.

Secretaría de Transporte

Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario por encima de la Laguna La Picasa

El proyecto restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad de Buenos Aires con la República de Chile, pasando por la Provincia de Mendoza. Al 30/09/2007 mostró un avance físico anual del 29,9%, mientras que el total físico acumulado ascendió al 42,3%.

Ampliación Puerto Caleta Paula

Se encuentra ubicado próximo a la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Se proyecta la ampliación del actual recinto portuario, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros en sentido este-oeste y la construcción de una obra de control de deriva litoral. El costo total asciende a \$140,0 millones y, al 30/09/2007 la ejecución física anual resultó del 16,7%, mientras que el total acumulado ascendió al 24,2%.

Modernización Líneas A Subterráneo – Obras Civiles

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires registró, al 30/09/2007, una ejecución física anual del 26,91%, mientras que el total acumulado ascendió al 30,94%.

Secretaría de Obras Públicas

Hospital Internacional El Cruce (Florencio Varela)

Se trata de un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorios externos. El programa médico asistencial ha sido diseñado responder a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondientes al Tercer Nivel de Atención de Salud de la Población (distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes). Durante el tercer trimestre fue inaugurado.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2007

1-Según Nivel Institucional


Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/2007 (en pesos)				
NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	6.481.694.676	7.655.594.487	5.217.732.894	68,2%
Organismos Descentralizados	233.178.243	795.438.758	634.630.977	79,8%
TOTAL	6.714.872.919	8.451.033.245	5.852.363.871	69,3%

Dentro de la Administración Central, sobresalieron las transferencias a acciones para Planes Federales de Vivienda (\$1.925,6 millones), para la formulación y ejecución de la política energética (\$811,5 millones), para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$439,4 millones). En materia energética fueron importantes los montos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$94,0 millones) y al Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$102,4 millones). Dentro del programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario y Automotor se destacaron las transferencias a Benito Roggio e Hijos S.A. (\$69,3 millones), a Metrovías S.A. (\$111,6 millones), a Trenes de Buenos Aires S.A. (\$104,0 millones), a Ferrovías S.A. (\$78,3 millones), a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. (\$20,0 millones) para material ferroviario, a Herso S.A. (\$27,7 millones), a Siemens S.A. (\$53,0 millones), Ferrocentral S.A. (\$17,3 millones) y a Transportes Metropolitanos General Roca (\$25,7 millones). También se destacaron los giros destinados a Emergencia Habitacional (\$84,2 millones), a los traspasos a los gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social y obras municipales (\$168,3 millones), para el Mejoramiento de Barrios, a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (\$112,3 millones), a acciones para el desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$77,9 millones) y para la atención de emergencias por inundaciones (\$92,4 millones). Asimismo resultaron relevantes las transferencias para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional para infraestructura y equipamiento (\$119,8 millones y \$56,9 millones, respectivamente), al apoyo a la infraestructura universitaria (\$23,5 millones) y al Programa Jefes de Hogar Préstamo BIRF 7369AR (\$17,6 millones).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron realizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad y destinadas a la construcción de rutas por convenio con las provincias de Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires (\$485,6 millones) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento en obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas con cooperativas de trabajo (\$120,1 millones).

Gráfico N° 8
Transferencias de Capital - Devengado al 30-09

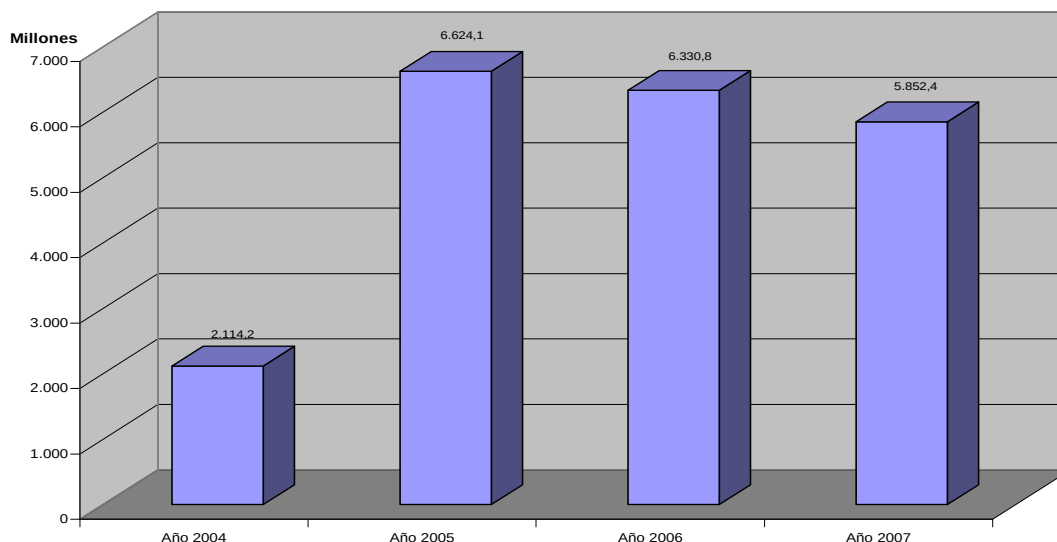

En resumen, las transferencias de capital mostraron una disminución, respecto al tercer trimestre de 2006, de \$478,4 millones (-7,6%). Entre las causas que explican esa baja interanual sobresale la exclusión del Presupuesto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), manteniéndose solamente el Programa de Reactivación de Planes de Vivienda. Asimismo se transfirieron menores recursos vinculados con la formulación y ejecución de la política energética, principalmente energía eléctrica (asignaciones destinadas a empresas privadas y al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal).

Las citadas disminuciones fueron compensadas, parcialmente, con mayores aportes a las provincias (para construcciones viales y de viviendas) y al Sistema de Transporte Ferroviario.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 17. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/09/2007 (en pesos)


Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.604.273.252	7.020.959.377	5.123.324.276	73,0%
Recursos con Afectación Específica	229.752.055	267.368.153	163.022.196	61,0%
Otros recursos internos	32.270.000	39.370.000	27.388.283	69,6%
Financiamiento Externo	848.577.612	1.123.335.715	538.629.116	47,9%
Total	6.714.872.919	8.451.033.245	5.852.363.871	69,3%

Desde el punto de vista de la fuente de financiamiento el Tesoro Nacional concentró el 87,5% de las transferencias, sobresaliendo los citados Planes Federales de Vivienda (\$1.925,6 millones), la construcción de rutas por convenio con provincias (\$485,6 millones), la

formulación y ejecución de la política energética (\$811,5 millones), las asistencias para infraestructura social y obras municipales, en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (\$185,7 millones), las acciones para Emergencia Habitacional (\$84,2 millones) y para desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$77,9 millones).

También se realizaron transferencias con destino a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de Políticas para Transporte Ferroviario (\$547,9 millones), las acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$125,1 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(\$112,3 millones), al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$106,1 millones), para el financiamiento del Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$102,4 millones), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$94,0 millones) y para Mejoramiento de Barrios (\$70,5 millones). Asimismo fueron relevantes las transferencias para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (\$119,8 millones) y para infraestructura y equipamiento (\$54,9 millones).

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/09/2007

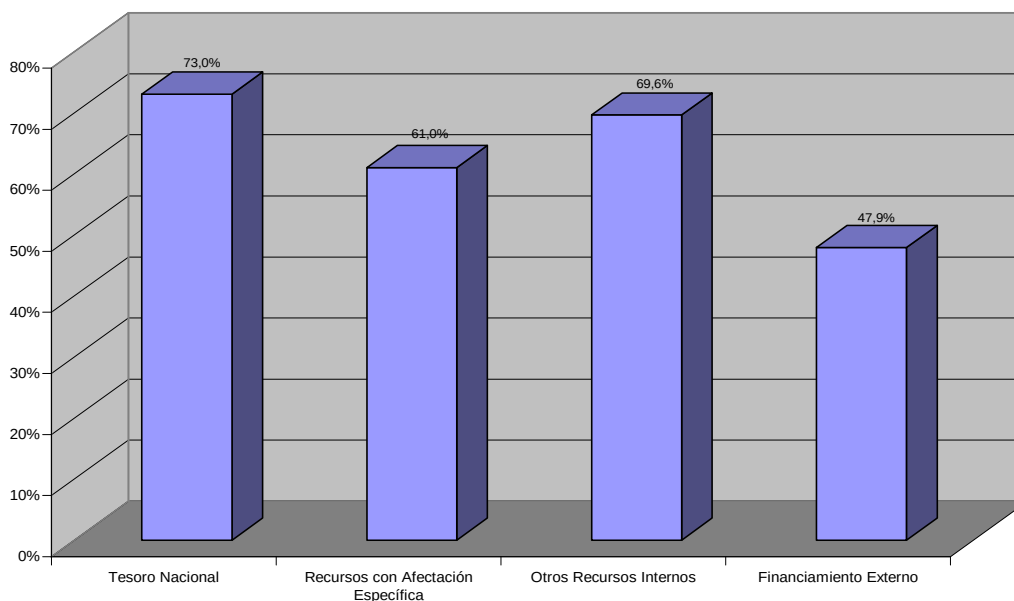

Los recursos afectados correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (F.E.D.E.I.) por \$152,7 millones. El crédito externo fue aplicado, principalmente, al plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$314,3 millones), al programa Mejoramiento de Barrios BID 940 OC-AR (\$53,0 millones), para Atención de Emergencias por Inundaciones Préstamo BID 1118 (\$73,4 millones) y asistencia financiera a Jujuy y San Juan para Hospitales provenientes de préstamo del Reino de España (\$24,9 millones).

3-Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital al 30/09/2007 se registraron, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicciones que concentraron alrededor del 50% del total ejecutado.

Las asignaciones inherentes a la provincia de Buenos Aires (18,4%) comprendieron, mayormente, a los Planes Federales de Vivienda (\$730,3 millones), a acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$86,9 millones), para infraestructura en municipios (\$48,0 millones), a obras hídricas de saneamiento (\$39,7 millones), a instituciones provinciales de enseñanza (\$30,5 millones) y a obras municipales e infraestructura social (\$26,2 millones).

En la provincia de Santa Cruz (12,0% del total) se incluyeron las obras viales realizadas por convenio (\$433,5 millones), para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$94,0 millones), para infraestructura social (\$61,0 millones), para Planes Federales de Vivienda (\$45,5 millones) y para el aprovechamiento de los recursos hídricos (\$13,0 millones). Asimismo, resultaron relevantes las obras de saneamiento en áreas de riesgo sanitario realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$38,4 millones).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (20,1%) se transfirieron fondos para la formulación y ejecución de políticas de transporte automotor y ferroviario (\$547,9 millones), a energía (\$363,7 millones), al desarrollo urbano (\$46,4 millones) y al mejoramiento de la calidad educativa (\$22,6 millones). Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial (asociadas a dos o más jurisdicciones), se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$372,5 millones).

CUADRO A
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 30/09/2007
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	1.686.918	0	1.686.918	0	0	0
Judicial	28.102.192	0	28.102.192	3.326	0	3.326
Dirección Superior Ejecutiva	16.190.989	4.341.088	20.532.077	0	0	0
Relaciones Exteriores	2.652.557	500.000	3.152.557	0	0	0
Relaciones Interiores	918.859	28.302.000	29.220.859	2.669.578	0	2.669.578
Administración Fiscal	6.468.701	0	6.468.701	167.891	0	167.891
Control de la Gestión Pública	2.620.099	0	2.620.099	455.544	0	455.544
Información y Estadística Básicas	852.011	0	852.011	0	0	0
Subtotal	59.492.326	33.143.088	92.635.414	3.296.339	0	3.296.339
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	49.840.034	0	49.840.034	0	0	0
Seguridad Interior	64.720.064	2.174.907	66.894.971	0	0	0
Sistema Penal	3.480.370	0	3.480.370	0	0	0
Inteligencia	250.889	0	250.889	0	0	0
Subtotal	118.291.357	2.174.907	120.466.264	0	0	0
Servicios Sociales						
Salud	66.849.693	46.053.519	112.903.212	3.202.370	0	3.202.370
Promoción y Asistencia Social	4.060.917	265.639.014	269.699.931	230.019	6.064.379	6.294.398
Seguridad Social	354.286	0	354.286	19.714.013	0	19.714.013
Educación y Cultura	26.020.259	683.409.029	709.429.288	1.253.077	1.026.380	2.279.457
Ciencia y Técnica	19.822.529	308.967	20.131.496	110.882.080	20.771.695	131.653.775
Trabajo	853.568	20.885.740	21.739.308	52.963	0	52.963
Vivienda y Urbanismo	86.043	2.143.080.813	2.143.166.856	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	5.006.355	239.242.643	244.248.998	253.684.777	121.119.260	374.804.037
Subtotal	123.053.650	3.398.619.725	3.521.673.375	389.019.299	148.981.714	538.001.013
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	1.713.658	1.177.743.039	1.179.456.697	1.208.410	0	1.208.410
Comunicaciones	64.841	19.441.300	19.506.141	1.226.827	0	1.226.827
Transporte	267.171.150	569.094.785	836.265.935	3.446.376.616	485.649.263	3.932.025.879
Ecología y Medio Ambiente	71.452	1.857.397	1.928.849	11.837.382	0	11.837.382
Agricultura	188.104	0	188.104	7.679.539	0	7.679.539
Industria	42.572	6.632.301	6.674.873	13.853.644	0	13.853.644
Comercio, Turismo y Otros Servicios	22.274.269	9.026.352	31.300.621	620.337	0	620.337
Seguros y Finanzas	0	0	0	571.864	0	571.864
Subtotal	291.526.046	1.783.795.174	2.075.321.220	3.483.374.619	485.649.263	3.969.023.882
TOTAL	592.363.379	5.217.732.894	5.810.096.273	3.875.690.257	634.630.977	4.510.321.234

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	34.551.212	-7.870.455	-18,6%
Presidencia de la Nación	33.461.134	34.225.787	764.653	2,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	37.150.000	31.150.000	519,2%
Ministerio del Interior	11.236.020	4.293.745	-6.942.275	-61,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	118.736.470	-1.632.077	-1,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	54.273.000	-1.097.000	-2,0%
Ministerio de Defensa	64.237.643	91.981.987	27.744.344	43,2%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	45.524.404	9.988.277	28,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	5.527.225.522	1.695.798.044	44,3%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	360.000	160.000	80,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	5.134.000	240.000	4,9%
Ministerio de Salud	6.524.213	2.886.282	-3.637.931	-55,8%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	5.956.342.409	1.744.665.580	41,4%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	9.137.010	1.273.010	16,2%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	46.068.566	252.180	0,6%
Ministerio Público	6.075.133	7.783.633	1.708.500	28,1%
Presidencia de la Nación	24.394.427	35.916.208	11.521.781	47,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	42.661.991	8.846.068	26,2%
Ministerio del Interior	123.048.617	176.734.964	53.686.347	43,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	15.213.110	9.923.265	187,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	11.219.000	2.933.000	35,4%
Ministerio de Defensa	86.676.181	218.803.913	132.127.732	152,4%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	109.262.542	5.408.904	5,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	192.315.308	78.364.503	68,8%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	84.985.450	28.741.450	51,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	68.346.242	28.979.500	73,6%
Ministerio de Salud	41.980.323	40.935.908	-1.044.415	-2,5%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	9.744.850	4.049.850	71,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	1.095.023.695	366.771.675	50,4%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.051.366.104	2.111.437.255	42,7%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	34.551.212	25.960.127	8.962.654	25,9%
Presidencia de la Nación	33.461.134	34.225.787	18.511.794	13.599.000	39,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	37.150.000	0	0	0,0%
Ministerio del Interior	11.236.020	4.293.745	470.745	470.745	11,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	118.736.470	72.892.458	68.417.388	57,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	54.273.000	4.289.177	1.513.416	2,8%
Ministerio de Defensa	64.237.643	91.981.987	4.351.025	3.315.233	3,6%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	45.524.404	31.055.023	16.507.681	36,3%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	5.527.225.522	3.980.638.322	3.930.122.990	71,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	360.000	160.502	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	5.134.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	2.886.282	1.919.158	786.074	27,2%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	5.956.342.409	4.140.248.331	4.043.695.181	67,9%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	9.137.010	3.546.331	3.287.765	36,0%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	46.068.566	20.824.364	16.106.232	35,0%
Ministerio Público	6.075.133	7.783.633	2.746.009	1.872.220	24,1%
Presidencia de la Nación	24.394.427	35.916.208	18.679.150	14.321.296	39,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	42.661.991	8.019.947	1.509.957	3,5%
Ministerio del Interior	123.048.617	176.734.964	102.184.919	70.031.237	39,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	15.213.110	9.819.068	4.118.875	27,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	11.219.000	4.359.582	2.759.675	24,6%
Ministerio de Defensa	86.676.181	218.803.913	156.990.270	133.460.737	61,0%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	109.262.542	49.596.524	26.478.899	24,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	192.315.308	92.095.017	84.015.404	43,7%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	84.985.450	37.399.110	31.834.629	37,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	68.346.242	21.194.644	20.483.266	30,0%
Ministerio de Salud	41.980.323	40.935.908	14.607.807	9.795.244	23,9%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	9.744.850	5.456.578	4.283.019	44,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	25.895.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	1.095.023.695	547.519.320	424.358.455	38,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.051.366.104	4.687.767.651	4.468.053.636	63,4%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	% Ejec./Progr. anual
5	320					Poder Judicial de la Nación							
		4				CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
				1		Mandamientos y Notificaciones							
						Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	3.280.497	0	0	0,00	24,00		s/i
		7				51 Adecuación para Instalación Subdirección de Notificaciones	3.280.497	0	0	0,00	24,00		
				3		Archivo General							
						Refacciones Varias	4.487.919	541.361	207.688	0,00	100,00		s/i
						61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	4.487.919	0	0	0,00			
						68 Construcción de Locales Subsuelo Av. de los Inmigrantes 1950 (1)	0	541.361	207.688	0,00			
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.546.745	704.015	0	0,00	80,00		s/i
						51 Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.506.745	512.458	0	0,00	100,00		
						52 Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal (1)	40.000	191.557	0	0,00	13,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	516.872	912.371	912.370	0,00	100,00		s/i
						52 Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle 1171	516.872	912.371	912.370	0,00	100,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	178.660	178.655	21,00	1,00		s/i
						52 Lavalle 1220 Cap.Fed., Reparación de Cubiertas, Fachadas y Contrafrente	0	178.660	178.655	21,00	1,00		
						53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	7.447.946	8.274.026	543.536	0,00	79,00		s/i
						51 Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de seis Juzgados	7.447.946	8.274.026	543.536	0,00	79,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	452.000	452.000	526.617	526.616	5,00		s/i
						51 Adecuación Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal	452.000	452.000	526.617	526.616	5,00		
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.640.547	0	0	0,00	25,00		s/i
						51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	1.000.248	0	0	0,00	100,00		
						52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	600.299	0	0	0,00	100,00		
						53 Secretaría Electoral de La Plata - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				10		Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	786.796	100.000	0	0,00	20,00		s/i
						51 Edificio La Rioja esq. Mitre, San Juan. Adecuación Sector Electoral	746.796	100.000	0	0,00	100,00		
						52 Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	40.000	0	0	0,00	1,00		
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	3.462.796	0	0	0,00	24,00		s/i
						51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edif.Calle Garibaldi	3.074.497	0	0	0,00	24,00		
						52 Edif. Primera. Junta 2687, Santa Fe - Adecuación	388.299	0	0	0,00	23,00		
				12		Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.039.796	100.000	0	0,00	20,00		s/i
						52 Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	999.796	100.000	0	0,00	100,00		
						53 Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				14		Área Cámara Posadas							
				1		Construcción de Sedes Judiciales (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		s/i
						51 Tribunales Federales de Posadas Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				15		Área Cámara Resistencia							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	384.486	384.486	5,00	1,00		s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO									
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual					
20	107	17	20	335	21	51 Adecuación y Obras del Juzgado Federal de Formosa	40.000	384.486	384.486	53,00	1,00								
						2 Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (1)	0	349.340	0	0,00	100,00		s/i						
						51 Juzgado de Roque Saenz Peña, Remodelaciones y Reparaciones (1)	0	349.340	0	0,00	100,00								
						16		Área Cámara de Córdoba											
						1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	683.548	100.000	0	0,00	100,00		s/i					
						17	51 Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	683.548	100.000	0	0,00	100,00							
							Área Cámara San Martín												
						1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	880.135	474.463	374.463	45,00	40,00		s/i					
							51 Adecuacion Edificio de la Camara Federal y Tribunal Oral Nº 4	0	374.463	374.463	91,00	9,00							
							52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	800.135	0	0	0,00	100,00							
							53 Edificio Calle Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio (1)	40.000	100.000	0	0,00	7,00							
						18	54 Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir (1)	40.000	0	0	0,00	4,00							
							Área Cámara Tucumán												
						1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.586.242	3.223.045	1.353.863	0,00	100,00		s/i					
						22	52 Juzg. Fed. Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio Fuero Penal Económico	2.586.242	3.223.045	1.353.863	0,00	100,00							
							1	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	665.000	0	0	71,00	29,00		s/i				
							52 Adecuación Juzg. Penal Económ. Av. de los Inmigrantes 1950	665.000	0	0	71,00	29,00							
								CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)											
								Justicia de Máxima Instancia											
							1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.962.451	4.916.451	1.418.393	15,00	50,00		s/i				
								51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	659.999	2.779.999	1.418.393	44,25	35,00						
								53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	367.520	520	0	0,00	37,00						
								57 Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	852.632	852.632	0	0,00	100,00						
								62 Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	973.353	973.353	0	0,00	100,00						
								63 Reforma de las Instalaciones Eléctricas Palacio de Justicia (2)	0	1.000	0	100,00	0,00						
								72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia	108.947	308.947	0	0,00	100,00						
							2	Refacciones en Sedes Periciales	1.894.737	4.106.237	1.345.205	0,00	83,00		s/i				
								56 Refac. y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú 92	1.894.737	4.004.737	1.262.305	0,00	83,00						
								69 Reparación y Mantenimiento de Ascensores B. Mitre 718 y Maipú 92	0	1.500	0	0,00	100,00						
								70 Adecuación de Locales para el Traslado del Cuerpo Médico Forense	0	100.000	82.900	0,00	100,00						
							3	Refacciones Varias	156.316	258.816	0	0,69	98,00		s/i				
								73 Reparación y Mantenimiento de Ascensores Edificio Lavalle (2)	0	2.500	0	100,00	0,00						
								76 Reformas - Edificio Lavalle 1250 (1)	156.316	256.316	0	0,00	100,00						
	4	Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	300.285	0,00	75,00		s/i										
		51 Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	3.727.647	300.285	0,00	75,00												
	5	Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.417.094	54,00	46,00		s/i										
		51 Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.417.094	54,00	46,00												
	6	Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00		s/i										
		51 Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00												
	7	Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	573.684	0	0,00	52,00		s/i										
		51 Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	573.684	0	0,00	52,00												
	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00		s/i										
		51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	0	0,00	99,00												
		Presidencia de la Nación																	
		ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES																	
		Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas																	
		3 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	2.964.278	1.433.985	0,00	100,00	45,00	77,00	77,00									
		51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	2.964.278	1.433.985	0,00	100,00	45,00	77,00	77,00									
		Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR																	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO						
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual		
						36		380.000	1.065.112	915.014		96,00	4,00	0,00	0,80	20,00
						58		380.000	1.065.112	915.014		0,00	100,00	0,00	20,00	20,00
						37		1.672.000	2.559.644	2.528.611		80,25	19,75	0,00	3,46	17,50
						53		152.000	723.915	182.480		61,00	39,00	0,00	5,85	15,00
						54		1.140.000	1.225.000	1.213.483		66,00	34,00	0,00	6,80	20,00
						55	Reparación Senderos y Miradores en Cascada los Alerces (5)	0	0	314		0,00	s/i	s/i	s/i	
						58		76.000	76.000	416.836		16,00	84,00	0,00	16,80	20,00
						59		304.000	534.729	715.499		79,00	21,00	0,00	3,15	15,00
						42		152.000	1.201.244	492.734		87,56	12,44	0,00	0,00	0,00
						54	Construcción Albergue para Voluntarios en Lago Verde (2)	152.000	1.201.244	492.734		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						38		3.137.007	3.137.007	308.271		35,00	45,00	0,00	16,00	35,56
						52		400.000	400.000	0		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54		1.537.007	1.537.007	0		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55		1.200.000	1.200.000	308.271		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						39		301.517	304.087	246.035		86,00	14,00	0,00	14,00	100,00
						56		301.517	304.087	246.035		86,00	14,00	0,00	14,00	100,00
						40		1.161.476	1.161.476	539.201		7,00	1,00	15,00	22,00	2200,00
						53		591.326	591.326	0		0,00	100,00	0,00	15,00	15,00
						54		570.150	570.150	539.201		0,00	100,00	47,00	47,00	47,00
						41		1.800.000	1.800.000	1.662.896		15,00	85,00	14,00	49,11	57,78
						51		1.000.000	1.000.000	1.498.375		39,00	61,00	97,00	166,19	272,44
						52		800.000	800.000	164.521		0,00	100,00	20,00	20,00	20,00
						1		1.850.000	1.850.000	1.153.554		36,00	64,00	22,00	48,23	75,36
						51		1.850.000	1.850.000	1.153.554		39,00	61,00	22,00	48,23	79,07
						2		1.340.000	1.340.000	224.644		8,00	92,00	5,00	15,15	16,47
						51		1.340.000	1.340.000	224.644		18,00	82,00	5,00	15,15	18,48
						3		1.364.000	2.379.000	1.093.324		33,00	67,00	18,00	67,02	100,03
						51		1.364.000	2.379.000	1.093.324		45,00	55,00	18,00	67,02	121,85
						4		1.437.200	422.200	0		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51		1.437.200	422.200	0		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						25										
						1	Construcción Edificio Las Heras- Museo del Libro (1)	2.100.934	800.934	0		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro (1)	2.100.934	800.934	0		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						1	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION									
						2	Actividades Centrales									
						2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4)	140.000	945.000	88.696		99,66	0,34	0,00	0,95	279,41
						51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4)	140.000	945.000	88.696		99,66	0,34	0,00	0,95	279,41
						3	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	6.463.430	1.972.413		36,90	63,10	1,94	29,08	46,09
						51	Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	6.463.430	1.972.413		36,90	63,10	1,94	29,08	46,09
						4	Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.254.570	527.739		0,00	100,00	5,50	42,77	42,77
						51	Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.254.570	527.739		0,00	100,00	5,50	42,77	42,77
						36	SECRETARIA DE CULTURA									
						1	Difusión de la Música y Danza									
						1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	166.805	800		0,00	100,00	2,17	2,17	2,17
						51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	166.805	800		0,00	100,00	2,17	2,17	2,17
						37										
						1	Preservación y Exhibición Artística-Cultural									
						1	Mejoras en Museos (1)	430.000	430.000	0		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO										
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%						
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr. anual						
25					38	51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas (1)	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
						52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (1)	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
						53 Mejoras en el Museo Roca (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
						54 Mejoras en el Museo Mitre (1)	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
						55 Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
						305	23	Desarrollo y Promoción Cultural												
								5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1 (1)	880.000	691.000	81.433	0,00	100,00	11,19	11,19	11,19				
								51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear (1)	135.000	135.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña (1)	15.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina (1)	230.000	144.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								54 Mejoras en el Edificio de la Calle México (1)	260.000	157.000	4.114	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								55 Mejoras en el Palais de Glace (1)	80.000	80.000	77.319	0,00	100,00	96,65	96,65	96,65				
								56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos (1)	160.000	160.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								6 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	3.290.000	329.647	0,00	100,00	34,57	66,57	66,57				
								51 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	3.290.000	329.647	0,00	100,00	34,57	66,57	66,57				
								Jefatura de Gabinete de Ministros												
								DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE												
								Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (**)												
								1 Construcción de Instalaciones Deportivas (1)	6.000.000	4.360.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								51 Construcción Salón Cubierto de Atletismo (1)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								52 Construcción Gimnasio Ezeiza (1)	3.000.000	1.360.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
								317	31	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
						Coordinación de Políticas Ambientales														
						1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (5)	0			2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (5)	0			2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
						2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (5)	0			500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (5)	0			500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
						3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (5)	0			1.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (5)	0			1.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
						4 Construcciones Accesorias al Relleno Sanitario San Juan (5)	0			2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcciones Accesorias al Relleno Sanitario San Juan (5)	0			2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
						5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (5)	0			1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (5)	0			1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
						6 Recuperación y Reciclaje de Residuos Rosario (5)	0			8.370.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Recuperación y Reciclaje de Residuos Rosario (5)	0			8.370.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						7 Construcción y Puesta en Marcha de Planta de Compostaje Rosario (5)	0			2.481.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción y Puesta en Marcha de Planta de Compostaje Rosario (5)	0			2.481.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						8 Construcción Puntos Verdes Rosario (5)	0			576.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Construcción Puntos Verdes Rosario (5)	0			576.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						9 Refacción Planta de Transferencia Rosario (5)	0			773.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
						51 Refacción Planta de Transferencia Rosario (5)	0			773.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
34	Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR																			
	1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (5)	0	13.090.000	0	0,00	s/i	s/i			s/i	s/i									
	51 Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (5)	0	3.854.800	0	0,00															
	52 Ampliacion Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (5)	0	3.400.000	0	0,00															
	53 Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (5)	0	3.400.000	0	0,00															
	54 Rectificación Av.Carlos Pellegrini Villa Diamante-Lanús (5)	0	886.000	0	0,00															
	55 Relleno Sanitario Cuenca Alta (5)	0	687.200	0	0,00															
	56 Construcción Puente Roca-Patricios (5)	0	862.000	0	0,00															
	Ministerio del Interior																			

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edilicia Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
				4		Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	375					GENDARMERIA NACIONAL								
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional								
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	0	0	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	0	0	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional	1.493.953	470.745	470.745	20,70	79,30	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	1.493.953	470.745	470.745	23,60	37,97	0,00	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	783.567	98.000	0	62,40	37,60	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	158.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	178.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón 4 "Concordia" (1)	125.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Refacción Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez" (1)	124.567	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					59	Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (1)	38.000	38.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ampliación Escuadrón 55 "Tucumán" (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Ampliación Grupo "Alfárez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahüe" (1)	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	380					PREFECTURA NAVAL ARGENTINA								
		31				Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial								
				1		Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Destacamento Chana Mini	0	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro Control de Tráfico Rosario	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura Tigre (1)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción Prefectura Zona Mar Argentina Norte (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO									
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual					
35	106	1	16	7	37	51 Construcción Estructura Basamento Edificio (1)	0	830.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1)	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Formación y Capacitación Profesional de la PNA													
						2 Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						51 Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	965.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto													
						COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES													
						Actividades Centrales													
						3	Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00	0,00				
						51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00	0,00				
						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos													
						1	Infraestructura Terrestre	2.036.000	8.103.000	1.930.372	40,64	59,36	2,35	2,84	4,78				
						0	Infraestructura Terrestre	53.000	83.000	0									
						51	Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	5.000	6.235.000	1.496.000	76,30	14,45	5,37	8,82	61,04				
						52	Construcción del Instituto Gulich	188.000	20.000	0	13,50	0,12	0,00	0,00	0,00				
						55	Construcción Antena Multipropósito N° 3	775.000	890.000	43.567	12,05	11,11	0,21	0,96	8,64				
						56	Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00				
						57	Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00	0,00				
						58	Construcción de Antenas Educativas	700.000	440.000	195.806	2,65	1,99	0,70	1,29	64,82				
						59	Construcción e Instalación de Antenas Regionales	300.000	20.000	0	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00				
						60	Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	405.000	195.000	0,00	8,91	1,74	1,74	19,53				
						2	Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	110.293.301	97.175.221	64.506.740	32,79	10,00	4,58	8,69	86,90				
						0	Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.552.000	1.182.233									
						52	Misión SAOCOM	79.472.030	49.841.950	21.071.826	26,60	11,76	2,87	4,88	41,50				
						53	Misión SABIA	5.000	5.000	40.666	14,19	0,69	0,00	0,67	97,10				
						54	Misión CESAR	28.816.271	44.776.271	42.212.016	22,60	34,99	9,66	29,10	83,17				
						4	Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	20.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Antena Multipropósito N° 5	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00				
						52	Antena Multipropósito N° 6	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00				
						5	Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00				
						51	Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	762.500	0	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00				
						6	Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	13.200	0,00	44,00	0,00	0,29	0,66				
						51	Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	2.020.000	13.200	0,00	22,22	0,00	0,29	1,31				
						17	Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio												
1	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas (4)	367.000	1.487.000	826.676	1,18	1,00	0,20	1,04	104,00										
0	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0															
51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	360.000	755.000	515.115	14,32	5,12	0,26	4,91	95,90										
52	Configuración de Vehículo Espacial	4.000	729.000	311.561	0,00	1,01	0,23	0,42	41,58										
18	Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen																		
1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
0	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0															
51	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00										
307	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO																		
1	Actividades Centrales																		
2	Remodelación Palacio San Martín	710.849	530.849	372.738	50,00	10,00	0,00	9,55	95,50										
51	Remodelación Palacio San Martín	710.849	530.849	372.738	50,00	10,00	0,00	9,55	95,50										
3	Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	2.403.532	261.806	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00										
0	Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	0	0															
51	Culminación Auditorio Edificio Cancilleria (1)	0	2.403.532	261.806	0,00	100,00	0,00	80,00	80,00										

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO											
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%						
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr. anual						
40	332	1		16	6	16 Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Remodelación Archivo (1)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Acciones Diplomáticas de Política Exterior														
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	4.426.655	283.976	2,15	97,85	0,00	70,00	71,54						
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	693.063	283.976											
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	3.733.592	0	2,15	97,85	0,00	70,00	71,54						
						8 Remodelación Embajada en Roma	508.195	100.000	85.890	0,00	30,00	0,00	25,00	83,33						
						0 Remodelación Embajada en Roma	0	100.000	85.890											
						51 Remodelación Embajada en Roma	508.195	0	0	0,00	30,00	0,00	25,00	83,33						
						9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	0,00	40,00	100,00						
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	0,00	40,00	100,00						
						11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	0,00	25,00	100,00						
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	1.093.200	1.093.200	0	45,00	25,00	0,00	25,00	100,00						
						12 Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	150.000	135.987	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00						
						0 Remodelación de la Embajada en Francia	0	150.000	135.987											
						51 Remodelación de la Embajada en Francia	1.016.394	0	0	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00						
						20 Desarrollo del Plan Antártico														
						15 Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1)	191.513	191.513	0	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00						
						51 Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1)	191.513	191.513	0	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00						
						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos														
						MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS														
						Actividades Centrales														
						3 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias						270.000	270.000	212.799	86,11	13,89	3,87	11,61	83,59	
						51 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias (2)						180.000	180.000	169.902	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Equipamientos Varios						45.000	45.000	12.398	90,00	10,00	0,20	0,60	6,00	
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos (2)						45.000	45.000	30.499	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						18						Política e Infraestructura Penitenciaria								
												10 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	1.442.341	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
												51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	1.442.341	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
												11 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
												51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	0	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
												12 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
												51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
												15 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
												51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
												16 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
												51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
												17 Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.163.997	1.300.617	0,00	100,00	24,00	30,00	30,00
												51 Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.163.997	1.300.617	0,00	100,00	24,00	30,00	30,00
												18 Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
51 Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00							0,00	0,00	0,00						
19 Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
51 Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
20 Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
51 Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
21 Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
51 Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00							0,00	0,00	0,00						
22 Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00							0,00	0,00	0,00						
51 Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00							0,00	0,00	0,00						
Ministerio de Defensa																				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3º trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
	370					MINISTERIO DE DEFENSA								
		18				Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas								
				1		Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1) (6)	7.502.000	24.021.800	582.684	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
				0		Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)	945.000	945.000	154.985					
				51		RSMA - Fabricación e Instalación de Radares (1) (6)	6.557.000	23.076.800	427.700	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	372					INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A								
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				2		Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				51		Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
		16				Adiestramiento Operacional y Apoyo								
				48		Construcciones Etapa II (5) (7)	0	1.590.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Hangar y Planta de Combustible-Curuzu Cuatia (5)	0	1.590.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49		Construcción y Ampliación redes de Agua, Gas y Electricidad Etapa II (5)	0	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Red de Gas en Cuartel B y Barrio Militar Tartagal (5)	0	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				52		Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdro. Rivadavia (3)	0	450.000	443.415	0,00	100,00	69,96	100,00	100,00
				51		Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdro. Rivadavia (3)	0	450.000	443.415	0,00	100,00	69,96	100,00	100,00
				53		Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - Resia (3)	0	625.000	282.208	0,00	100,00	16,98	36,18	36,18
				51		Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - Resia (3)	0	625.000	282.208	0,00	100,00	16,98	36,18	36,18
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA								
		16				Capacidad Operacional de la Armada								
				3		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	601.377	29,22	50,00	13,83	33,49	66,98
				51		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	601.377	29,22	50,00	13,83	33,49	66,98
				5		Construcción Compuerta Corediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano (5)	0	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción Compuerta Corediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano (5)	0	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18				Formación y Capacitación								
				1		Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,00	0,13	0,87
				51		Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	145.615	69,67	15,00	0,00	0,13	0,87
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	23.604.603	837.248	12,70	59,00	4,54	6,87	11,64
				0		Construcción de Alojamiento para Personal Militar (1)	0	0	114.430					
				51		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	23.604.603	722.818	12,70	59,00	4,54	6,87	11,64
				4		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	2,15	2,15	4,78
				51		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	10.386.040	0	55,00	45,00	2,15	2,15	4,78
				5		Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	165.684	47,80	52,20	10,38	12,13	23,24
				51		Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	503.000	165.684	47,80	52,20	10,38	12,13	23,24
				7		Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	381					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA								
		1				Actividades Centrales								
				1		Ampliación Estructura Anexo Edificio Cóndor (5)	0	900.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Estructura Anexo Edificio Cóndor (5)	0	900.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
		19				Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
				2		Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Aeronáutico Central (5)	0	473.544	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Aeronáutico Central (5)	0	473.544	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
	450					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
		16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
				3		Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	257.000	14,26	28,00	17,00	28,00	100,00
				51		Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	257.000	14,26	28,00	17,00	28,00	100,00
50						Ministerio de Economía y Producción								
	357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
		1				Actividades Centrales								
			6			Reciclaje Edificio Ex-Aerolineas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reciclaje Edificio Ex-Aerolineas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13				Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	640.300	541.967	15,43	84,57	16,00	80,00	94,60
						51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	640.300	541.967	15,43	84,57	16,00	80,00	94,60
		14				Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J. A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J.A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		15				Restauración Integral del Patio Principal- Edificio PAHAC	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						51 Restauración Integral Piso 1 Edificio PAHAC Y.H.250	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		16				Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Provisión e Instalación Cielorrasos Suspendidos	500.000	475.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		17				Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		18				Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		19				Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		20				Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		21				Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicación - MEcyP (1)	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicación - MEcyP (1)	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		22				Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I (1)	700.000	700.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive (1)	400.000	400.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
						52 Instalación de Sistema Contra Incendios - Hidr. y Rociad. Automático (1)	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	26					Administración Financiera								
		1				Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	389.045	39,64	60,36	0,36	60,36	100,00
						51 Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	389.045	39,64	60,36	0,36	60,36	100,00
	602					COMISION NACIONAL DE VALORES								
		16				Control y Fiscalización de la Oferta Pública								
						1 Modernización de la Comisión Nacional de Valores	371.000	114.000	75.660	74,49	25,51	9,69	20,73	81,26
						53 Modernización del Archivo	371.000	114.000	75.660	74,49	25,51	9,69	20,73	81,26
	606					INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA								
		1				Actividades Centrales								
			1			Ampliación Edificio Ciudad de Buenos Aires (5)	0	95.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Ampliación Edificio Chile 460 - Capital Federal (5)	0	95.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		16				Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T								
			3			Parques de Innovación Tecnológicos PITS	744.355	241.755	2.229	62,81	2,00	0,00	0,00	0,00
						0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	367.004	241.404	2.229					
						86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	377.351	351	0	42,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		5				Construcción y Ampliaciones Inst. de Investigación -Etapa II	329.387	149.387	119.584	71,63	28,37	1,24	5,42	19,10
						58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	329.387	149.387	119.584	71,63	28,37	1,24	5,42	19,10
			8			Construcción y Ampliaciones Instit. de Invest. Etapa III (2)	492.029	11.729	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Sala de Proc. Satelitales en Instit. Clima y Agua (2)	185.370	70	0	98,32	1,68	0,00	0,00	0,00
						53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virología (2)	22.884	2.884	0	54,72	17,28	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología (2)	137.307	7.307	0	94,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						55 Remodelación Alojamiento Inst. Microbiología y Zool. Agríc. (2)	22.884	884	0	79,13	10,87	0,00	0,00	0,00
						59 Sala de Equipos de Frío en el Inst. de Patobiología-Castelar (2)	123.584	584	0	94,75	4,00	0,00	0,00	0,00
		12				Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	3.015.595	1.263.241	33,00	57,00	14,86	22,26	39,05
						51 Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	3.015.595	1.263.241	33,00	57,00	16,86	24,26	42,56
		17				Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	6.798.303	3.436.242	8,00	92,00	19,59	61,49	66,84

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
						51 Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	6.798.303	3.436.242	8,00	92,00	19,59	61,49	66,84
					18	Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar (5)	0	854.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción Box Bioseguridad en el Centro Investigación en Cs.Vet.y Agron. Castelar (5)	0	854.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
	17					Investigación Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT								
					4	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - Etapal	109.787	246.487	111.385	0,00	28,00	s/i	s/i	s/i
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	109.787	246.487	111.385	0,00	28,00	s/i	s/i	s/i
					5	Construcción y Ampliaciones Centros del interior -Etapall (2)	443.297	319.997	122.166	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay (2)	443.297	319.997	122.166	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (2)	819.281	138.281	37.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales (2)	27.459	93.459	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Ofic. Baños y Sala Reuniones Estación Exper. Anguil (2)	389.049	1.049	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce (2)	68.654	1.654	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Rioja (2)	228.846	38.846	37.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur (2)	22.884	1.884	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. Mendoza	82.389	1.389	0	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	13					Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapav	1.619.937	1.331.937	1.193.956	73,00	27,00	6,95	21,11	78,19
						51 Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	192.848	74.848	63.107	42,03	57,97	3,64	6,14	10,59
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy (4)	771.403	41.403	106.280	91,57	8,43	73,35	76,35	905,69
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	38.572	572	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa (4)	385.695	1.183.695	1.024.570	79,14	20,86	25,34	41,56	199,23
						55 Obras Varias C.R. Misiones	231.419	31.419	0	68,87	31,13	0,00	0,00	0,00
	14					Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VI	925.703	1.498.303	1.204.129	60,57	39,43	11,91	22,21	56,33
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	77.144	22.144	136.676	28,87	71,13	6,45	8,82	12,40
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan (4)	154.288	155.888	338.718	93,88	6,12	51,18	56,38	921,24
						53 Obras Varias C.R. Santa Fe	385.695	85.695	80.512	71,95	28,05	0,00	6,00	21,39
						54 Obras Varias C.R. Córdoba	154.288	684.288	415.372	39,39	60,61	17,00	39,70	65,50
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos (4)	154.288	550.288	232.850	94,64	5,36	12,60	17,96	335,07
	15					Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapa VII	1.928.513	82.513	81.533	25,00	35,00	0,47	1,49	4,26
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	1.928.513	82.513	81.533	25,00	35,00	0,47	1,49	4,26
	16					Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VIII	925.690	721.690	597.045	73,00	27,00	7,52	9,98	36,96
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	385.695	255.695	213.599	79,79	19,81	8,03	10,03	50,63
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	154.288	288	0	58,40	42,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	154.288	394.288	284.097	72,53	29,55	13,00	15,50	52,45
						54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur	231.419	71.419	99.349	80,71	19,44	3,00	14,00	72,02
	18					Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan	2.314.220	2.517.720	966.817	8,00	92,00	20,68	33,33	36,23
						51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan	2.314.220	2.517.720	966.817	8,00	92,00	20,68	33,33	36,23
	19					Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	2.586.613	376.090	2,00	34,00	6,65	6,65	19,56
						51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	2.586.613	376.090	2,00	34,00	6,65	6,65	19,56
	20					Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	1.342.818	0	1,00	3,00	0,00	21,00	700,00
						51 Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	1.342.818	0	1,00	3,00	0,00	21,00	700,00
	21					Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	94.220	55.736	0,00	52,00	11,20	36,20	69,62
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	94.220	55.736	0,00	52,00	11,50	36,50	70,19
	22					Construcción y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy	1.542.818	818	0	38,00	62,00	0,00	0,00	0,00
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	1.542.818	818	0	38,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	23					Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	1.928.513	769.113	394.552	50,00	50,00	8,63	19,63	39,26
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	1.928.513	769.113	394.552	50,00	50,00	8,63	19,63	39,26
	24					Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	42.818	42.393	82,00	18,00	15,34	15,44	85,78
						51 Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	42.818	42.393	82,00	18,00	15,34	15,44	85,78
	25					Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País (5)	0	4.505.300	203.766	0,00	52,00	4,60	4,60	8,85
						51 Construcción Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Sgo. del Estero (5)	0	150.000	7.650	0,00	17,00	1,00	1,00	5,88

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr.
						52 Construcción Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Salta (5)	0	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Sanitarios, Salón de Actos y Oficina Centro Regional Chaco - Formosa (5)	0	367.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Pabellón Fitomej. Algodón en Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña (5)	0	300.000	189.930	0,00	60,00	38,00	38,00	63,33
						55 Construcción Centro de Convenciones en el Centro Regional Misiones (5)	0	500.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Edificio en la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (5)	0	54.300	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Laboratorio, Sala Cámara y Depósito Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (5)	0	303.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						58 Ampliación Laboratorio y Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Junin (5)	0	115.000	6.186	0,00	100,00	5,00	5,00	5,00
						59 Construcción Torre p/Soporte Radar Meteorológico Estación Experimental Agropecuaria Anguil (5)	0	890.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Torre p/Soporte Radar Meteorológico Estación Experimental Agropecuaria Paraná (5)	0	890.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						61 Restauración Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (5)	0	518.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						65 Contrucción Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista (5)	0	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción Laboratorio Semillas Estación Experimental Agropecuaria Oliveros (5)	0	118.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (5)	0	4.047.443	1.384.679	0,00	70,00	24,00	24,00	34,29
						51 Ampliación Edificio Agronomía Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (5)	0	4.047.443	1.384.679	0,00	70,00	24,00	24,00	34,29
				27		Construcción y Ampliación Edificio p/Agencias de Ext.Rural y Campos (5)	0	2.011.900	325.360	0,00	45,00	27,00	27,00	60,00
						51 Ampliación Edificio Agencia de Extensión Rural Perico (5)	0	145.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
						52 Casa Campo Anexo Estaión Experimental Agropecuaria Colonia Benitez (5)	0	156.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Agencia Ext.Rural General Pinedo (5)	0	160.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción Edificio p/Agencia Ext.Rural Güemes y Viviendas Personal (5)	0	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Sanitarios, Depósito y SUM en Campo Anexo San Antonio (5)	0	146.000	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
						59 Ampliación Edificio Agencia Ext.Rural Lavalle (5)	0	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						60 Construcción Edificio p/Agencias Ext. Rural San Rafael (5)	0	447.000	255.703	0,00	94,00	53,00	53,00	56,38
						63 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural Ceres (5)	0	20.000	19.900	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						65 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Cruz del Eje (5)	0	24.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción Cochera y Galpón Agencia Ext.Rural San Antonio de Areco (5)	0	33.200	300	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						67 Ampliación Sanitarios Agencia Ext. Rural Carhue (5)	0	17.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						68 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural San Martin de los Andes (5)	0	60.000	400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						69 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural Cipolletti (5)	0	94.100	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						70 Ampliación Unidad Ext. y Experimentación Adapativa Gral.Pico (5)	0	100.000	8.668	0,00	50,00	5,00	5,00	10,00
						71 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Concaran (5)	0	117.000	0	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						72 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural San Luis (5)	0	144.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						73 Remodelación Edificio Agencia Ext. Rural Trevelín (5)	0	79.600	12.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Puerto Rico (5)	0	38.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Guatrache (5)	0	100.000	28.368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA								
	16					Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
		1				Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	422.600	266.392	41,74	58,26	9,31	13,07	22,43
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	422.600	266.392	30,50	40,25	22,46	31,53	78,34
		2				Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	20.920	27,90	12,00	2,40	2,40	20,00
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	20.920	27,90	12,00	2,40	2,40	20,00
		3				Equipamiento Analítico	447.660	377.660	104.151	50,16	13,00	2,14	2,92	22,46
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	447.660	377.660	104.151	50,16	13,00	2,14	2,92	22,46
		4				Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.960	135.677	97,31	2,69	1,26	6,54	243,12
						51 Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.960	135.677	97,31	2,69	1,26	6,54	243,12
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA								
						Servicios de Laboratorios								
				14		Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.800.000	3.217.934	2.124.518	10,00	60,00	0,00	5,00	8,33
						51 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria	3.800.000	3.217.934	2.124.518	10,00	60,00	0,00	5,00	8,33
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios								
	105					COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
20														
				1		Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
					1	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	434.261	90,00	4,00	0,00	0,79	19,75
				51		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.181.000	434.261	90,00	4,00	0,00	0,79	19,75
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	112.623	12.197	95,00	3,00	0,13	0,29	9,67
				51		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	112.623	12.197	95,00	3,00	0,13	0,29	9,67
				3		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	800.000	611.132	39,00	7,00	2,30	3,34	47,71
				51		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	800.000	611.132	39,00	7,00	2,30	3,34	47,71
				4		Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	491.637	460.001	28,00	4,00	3,60	3,60	90,00
				51		Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	491.637	460.001	28,00	4,00	3,60	3,60	90,00
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	120.000	50.695	0,00	10,00	3,62	3,90	39,00
				51		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	120.000	50.695	0,00	10,00	3,62	3,90	39,00
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.060.000	1.853.979	0,00	50,00	3,53	43,70	87,40
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.060.000	1.853.979	0,00	50,00	3,53	43,70	87,40
				8		Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	219.000	11.423	0,00	10,00	0,09	0,55	5,50
				51		Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	219.000	11.423	0,00	10,00	0,09	0,55	5,50
				10		Ampliación Laboratorios CAB	500.000	950.000	110.774	52,16	30,00	0,00	4,10	13,67
				51		Ampliación Laboratorios CAB	500.000	950.000	110.774	52,16	30,00	0,00	4,10	13,67
				11		Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	188.834	25,84	20,00	8,37	8,37	41,85
				51		Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	191.000	188.834	25,84	20,00	8,37	8,37	41,85
				12		Instalación y Puesta en Funcionamiento Reactores de Baja Potencia (5)	0	13.340.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2 (5)	0	13.340.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
21														
						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
				1		Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	62.076	88,28	8,00	5,80	5,80	72,50
				51		Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	62.076	88,28	8,00	5,80	5,80	72,50
				2		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	286.779	86.987	94,71	4,00	1,71	1,92	48,00
				51		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	286.779	86.987	94,71	4,00	1,71	1,92	48,00
				3		Saneamiento del CAE	250.000	400.000	173.514	88,93	11,00	3,00	6,80	61,82
				51		Saneamiento del CAE	250.000	400.000	173.514	88,93	11,00	3,00	6,80	61,82
				4		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	21.600	27,05	20,00	4,30	4,30	21,50
				51		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	100.000	21.600	27,05	20,00	4,30	4,30	21,50
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	26.806	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	150.000	26.806	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	43.544	0,00	6,00	1,90	2,42	40,33
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	75.000	43.544	0,00	6,00	1,90	2,42	40,33
				8		Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	175.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				9		Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				51		Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	260.000	67.250	0,00	8,00	0,70	0,83	10,38
				51		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	260.000	67.250	0,00	8,00	0,70	0,83	10,38
				11		Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	130.000	16.762	0,00	3,00	0,25	0,55	18,33
				51		Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	130.000	16.762	0,00	3,00	0,25	0,55	18,33
				12		Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	338.221	23.301	0,00	10,00	0,83	0,83	8,30
				51		Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	338.221	23.301	0,00	10,00	0,83	0,83	8,30
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	22.532	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	50.000	22.532	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3º trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
					14	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	9.424.150	1.228.588	0,00	12,00	2,00	2,17	18,08
					51	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	9.424.150	1.228.588	0,00	12,00	2,00	2,17	18,08
		22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
				1		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.453.000	1.604.000	508.561	79,49	9,81	3,41	3,78	38,53
					51	Área Gestión Ezeiza	1.350.000	1.466.000	466.683	62,89	15,00	4,00	4,04	26,93
					52	Laboratorio Control y Verificación	103.000	138.000	41.878	91,68	6,00	0,20	2,40	40,00
				2		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.832.000	831.000	318.499	24,37	5,74	0,19	1,07	18,64
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.635.000	514.000	277.688	15,82	20,00	0,40	3,37	16,85
					52	Repositorio Fase 1	197.000	317.000	40.811	27,21	1,00	0,12	0,31	31,00
				3		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	888.000	228.775	48,70	18,00	0,15	17,49	97,17
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	888.000	228.775	48,70	18,00	0,15	17,49	97,17
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad	10.400.000	10.018.450	1.272.022	24,47	13,19	0,84	1,58	11,98
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	7.199.700	7.276.250	983.267	30,08	14,00	1,15	1,80	12,86
					52	Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	1.761.000	1.627.500	136.548	18,46	12,00	0,30	0,94	7,83
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.289.300	1.112.200	149.707	8,25	11,00	1,19	2,40	21,82
					54	Remodelación Casa Guayra	150.000	2.500	2.500	72,68	27,32	0,00	0,50	1,83
				5		Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	99.944	53,95	2,00	0,60	1,74	87,00
					51	Laboratorio de Química Analítica	100.000	100.000	99.944	53,95	2,00	0,60	1,74	87,00
				6		Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	29.294	95,19	4,81	0,50	4,03	83,78
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	29.294	95,19	4,81	0,50	4,03	83,78
				7		Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	384.740	152.330	0,00	6,00	3,00	3,15	52,50
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	384.740	152.330	0,00	6,00	3,00	3,15	52,50
		23				Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no Nucleares								
				1		Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	630.889	35,53	3,00	0,10	2,44	81,33
					51	Centro Aceleración de Iones	670.000	670.000	630.889	35,53	3,00	0,10	2,44	81,33
				2		Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	880.000	816.017	42,35	26,00	5,75	40,05	154,04
					51	Lab.Integrado p/elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	880.000	816.017	42,35	26,00	5,75	40,05	154,04
				3		Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	199.999	0,00	4,00	0,70	4,00	100,00
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	200.000	199.999	0,00	4,00	0,70	4,00	100,00
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
		16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
				1		Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	98,00	1,00	1,00	1,00	100,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	98,00	1,00	1,00	1,00	100,00
				2		Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	530.000	385.512	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	110.850	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	60.000	274.662	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Mejoras y Recuperación Bco. de Bombas del Laboratorio de Hidráulica (1)	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
		17				Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR (8)								
				2		Saneamiento Cloacal en La Matanza	10.654.800	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.854.800	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	3.400.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	3.400.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				3		Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				4		Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Puente Roca-Patricios	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricios	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
		19				Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (2)	200.000	300.000	299.593	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Aliviador Cildanez - Etapa II (2)	0	300.000	299.593	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II (2)	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17				Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	437.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	437.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		18				Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	6.845.462	2.731.060	0,00	90,00	25,72	25,72	28,58
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	6.845.462	2.731.060	0,00	90,00	25,72	25,72	28,58
		19				Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.619.290	1.966.630	0,00	1,00	s/i	0,00	0,00
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.619.290	1.966.630	0,00	1,00	s/i	0,00	0,00
		31				Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	s/i	0,00	0,00
					51	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	s/i	0,00	0,00
		32				Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	s/i	0,00	0,00
					51	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	s/i	0,00	0,00
		44				Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	0	4.001.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	0	4.001.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura								
				1		Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	26.932.004	13.951.907	40,35	11,00	0,08	3,71	33,73
				51		Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	26.932.004	13.951.907	40,35	11,00	0,08	3,71	33,73
		2				Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	3.550.000	5.850.000	571.620	58,31	8,00	0,58	1,21	15,13
				51		Edificios Fiscales	3.550.000	5.850.000	571.620	58,31	8,00	0,28	0,91	11,38
		7				CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	1.000.000	6.587.400	2.364.836	16,14	5,00	2,33	8,48	169,60
				51		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	900.000	5.282.000	2.364.836	0,00	5,00	2,33	8,48	169,60
				52		Defensa Costera	100.000	1.305.400	0	49,70	42,00	0,00	0,00	0,00
		8				Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,00	0,19	0,38
				51		Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	628.000	10.783	49,52	50,48	0,00	0,19	0,38
		12				Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	258.127	99,34	0,66	0,65	0,65	98,48
				51		Protección Cueva de las Manos	338.972	338.972	258.127	99,34	0,66	0,65	0,65	98,48
		13				Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				51		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		14				Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	358.366	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	430.000	358.366	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20				Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	62.334.636	58.050.926	32,51	25,00	23,29	55,86	223,44
				51		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	62.334.636	58.050.926	32,51	25,00	23,29	55,86	223,44
		21				Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	6.200.000	5.691.521	10,16	52,00	14,93	25,41	48,87
				51		Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	6.200.000	5.691.521	10,16	52,00	14,93	25,41	48,87
		23				Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	5.898.499	7.398.499	1.337.444	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				0		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	1.937.806	990.472	21.764					
				51		Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	3.960.693	6.408.027	1.315.680	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		24				Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	2.523.859	0,00	45,00	3,78	3,78	8,40
				51		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	6.000.000	2.523.859	0,00	45,00	3,78	3,78	8,40
		25				Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				51		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		26				Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				51		Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		27				Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				51		Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		28				Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				51		Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		29				CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
						51 CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	0	0	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	0	0	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
				33		Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
						51 Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	
	30					Prevención Sísmica								
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	522.000	195.941	57,80	4,70	2,00	3,80	80,85
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	522.000	195.941	57,80	4,70	2,00	3,80	80,85
	32					Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)								
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.245.000	1.686.923	1.473.968	57,00	32,00	5,00	13,00	40,63
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	594.027	369.939	258.115					
					51	Huellas Varias Misiones	250.973	0	0	59,00	32,00	8,00	18,00	56,25
					52	Huellas Mineras NOA	750.000	393.416	297.116	59,00	32,00	6,00	13,00	40,63
					53	Huellas Mineras Cuyo	750.000	773.568	768.737	59,00	32,00	4,00	14,00	43,75
					54	Huellas Mineras Comahue	450.000	150.000	150.000	54,00	32,00	8,00	18,00	56,25
					55	Huellas Mineras Patagonia	450.000	0	0	54,00	32,00	0,00	6,00	18,75
	50					Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				2		Obras Viales. Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	100.000	210.000	157.034	0,00	5,00	s/i	0,00	0,00
					52	Puente Encarnación - Posadas	100.000	210.000	157.034	0,00	5,00	s/i	0,00	0,00
	13					Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	5.953.610	0,00	100,00	19,63	54,00	54,00
					51	Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	7.217.012	5.953.610	0,00	100,00	19,63	54,00	54,00
	14					Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	s/i	0,00	0,00
					51	Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	s/i	0,00	0,00
	55					Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario								
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	99.288.912	95.288.912	60.216.167	99,75	0,25	s/i	0,02	8,00
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	9.501.725	14.707.725	5.972.859					
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	81.949.712	48.243.712	35.104.019	13,02	86,98	9,44	26,91	30,94
					54	Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	4.837.475	17.337.475	5.014.903	72,06	27,94	3,10	12,41	44,42
					66	Paso a Diferente Nivel, Municipio de San Fernando - Tigre	3.000.000	15.000.000	14.124.386	64,00	36,00	s/i	10,00	27,78
				4		Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	78.318.491	75.918.491	29.910.202	12,42	46,98	15,84	29,95	63,75
					0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	4.933.332	4.933.332	1.944.399					
					51	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	73.385.159	70.985.159	27.965.803	12,42	46,98	15,84	29,95	63,75
	89					Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345)								
				1		Escuela Nacional Fluvial (1)	0	16.178.567	2.346.698	0,00	60,00	9,14	9,14	15,23
					51	Escuela Nacional Fluvial (1)	0	16.178.567	2.346.698	0,00	60,00	9,14	9,14	15,23
	91					Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	48.418.933	28.287.655	7,52	49,00	6,67	16,72	34,12
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	48.418.933	28.287.655	7,52	49,00	6,67	16,72	34,12
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	500.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	500.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	800.000	800.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				5		Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Reparación Puente Uriburu	0	441.067	441.067	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00
					51	Reparación de Estructura de Tablero y Calzada	0	441.067	441.067	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	1.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	1.000.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	1.000.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	1.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	50.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	50.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	50.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	50.000	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	50.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	50.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	50.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	50.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	50.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	50.000	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	3.000.000	50.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	3.000.000	50.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España (1)	2.000.000	1.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (1)	2.000.000	1.000.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
				24		Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451				16		DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
				1		Remodelación Fábrica Río Tercero (5)	0	9.700.000	3.917.934	0,00	100,00	41,92	41,92	0,00
					51	Remodelación Planta Amoniaco (5)	0	1.210.000	1.210.000	0,00	100,00	9,28	9,28	0,00
					52	Remodelación Planta Acido Nítrico (5)	0	4.189.000	813.606	0,00	100,00	71,62	71,62	0,00
					53	Remodelación Planta Acido Sulfúrico (5)	0	1.510.000	648.209	0,00	100,00	25,82	25,82	0,00
					54	Remodelación Planta Mecánica (5)	0	840.000	193.986	0,00	100,00	25,17	25,17	0,00
					55	Remodelación Infraestructura Laboratorios (5)	0	1.521.000	730.740	0,00	100,00	2,21	2,21	0,00
					56	Obras Menores (5)	0	430.000	321.394	0,00	100,00	74,24	74,24	0,00
				2		Remodelación Fábrica Azul (5)	0	2.300.000	257.819	0,00	100,00	9,98	9,98	0,00
					51	Remodelación Fábrica Azul (5)	0	2.106.000	100.707	0,00	100,00	9,99	9,99	0,00
					52	Obras Menores (5)	0	194.000	157.112	0,00	100,00	9,90	9,90	0,00
				3		Remodelación Fábrica Villa María (5)	0	2.200.000	2.200.000	0,00	100,00	64,97	64,97	0,00
					51	Remodelación Fábrica Villa María (5)	0	1.937.000	1.937.000	0,00	100,00	67,13	67,13	0,00
					52	Obras Menores (5)	0	263.000	263.000	0,00	100,00	49,05	49,05	0,00
				4		Remodelación Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	2.000.000	2.000.000	0,00	100,00	40,50	40,50	0,00
					51	Remodelación Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	1.794.000	1.794.000	0,00	100,00	40,13	40,13	0,00
					52	Obras Menores (5)	0	206.000	206.000	0,00	100,00	43,69	43,69	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual	
						5	Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes (5)	0	7.000.000	732.447	0,00	100,00	7,80	7,80	0,00
						51	Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes Fábrica Río Tercero (5)	0	5.255.000	546.396	0,00	100,00	9,15	9,15	0,00
						52	Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes Fábrica Azul (5)	0	1.389.000	0	0,00	100,00	4,18	4,18	0,00
						53	Obras Menores (5)	0	356.000	186.051	0,00	100,00	2,00	2,00	0,00
						6	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas (5)	0	6.800.000	1.997.645	0,00	100,00	26,19	26,19	0,00
						51	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Río Tercero (5)	0	4.257.268	1.029.908	0,00	100,00	16,34	16,34	0,00
						52	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	1.103.800	861.422	0,00	100,00	74,46	74,46	0,00
						53	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Azul (5)	0	1.034.055	0	0,00	100,00	19,19	19,19	0,00
						54	Obras Menores	0	404.877	106.314	0,00	100,00	16,01	16,01	0,00
613							ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
	20						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
						2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	19.920.237	23.795.237	17.249.919	66,59	26,74	3,75	19,80	74,05
						51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	742.512	742.512	3.452.961	84,77	15,23	0,00	15,23	100,00
						52	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (4)	14.136.489	13.511.489	6.999.160	75,47	16,00	2,37	12,05	75,31
						53	1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón - 3 de Febrero	5.041.236	9.541.236	6.797.797	39,53	40,47	8,87	32,11	79,34
						3	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación Paraná	29.103.558	30.973.558	23.217.955	46,90	43,00	12,21	29,06	67,58
						51	Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación Paraná	21.173.555	20.043.555	12.202.702	56,92	43,00	15,94	29,31	68,16
						52	Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución Paraná	7.930.003	10.930.003	11.015.253	46,79	43,00	8,48	28,95	67,33
						4	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.(4)	8.631.415	17.131.415	13.619.886	57,27	42,73	7,89	42,73	100,00
						51	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.(4)	8.631.415	17.131.415	13.619.886	57,27	42,73	7,89	42,73	100,00
						5	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba (4)	27.309.750	25.509.750	21.101.454	20,43	70,00	24,63	58,01	82,87
						51	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba (4)	27.309.750	25.509.750	21.101.454	20,43	70,00	24,63	58,01	82,87
						6	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	20.145.213	16.877.792	74,08	25,92	4,60	22,25	85,84
						51	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut) (4)	14.745.213	20.145.213	16.877.792	74,08	25,92	4,60	22,25	85,84
						7	Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51	Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.126.865	19.126.865	5.588.043	23,48	35,52	5,15	14,96	42,12
						51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	12.949.333	12.949.333	5.588.043	46,95	43,05	10,37	25,52	59,28
						52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	6.177.532	6.177.532	0	0,00	18,00	0,00	4,46	24,78
						9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	24.540.227	24.740.227	18.896.617	31,86	25,79	4,17	22,86	88,64
						51	Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	6.708.350	7.908.350	9.690.691	60,43	39,57	7,51	30,18	76,27
						52	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	17.831.877	16.831.877	9.205.925	3,28	30,00	10,48	25,19	83,97
						10	Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(4)	172.600	5.702.600	2.962.069	0,00	7,00	3,64	3,64	52,00
						51	Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(#)	17.359	5.547.359	2.938.749	0,00	9,00	7,27	7,27	80,78
						52	Perforación 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	155.241	155.241	23.320	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						11	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja (4)	4.247.851	11.247.851	10.410.053	43,39	56,61	5,24	56,61	100,00
						51	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja (4)	4.247.851	11.247.851	10.410.053	43,39	56,61	5,24	56,61	100,00
						12	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	4.884.891	3.610.216	0,00	52,64	11,61	23,95	45,50
						51	Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	4.884.891	3.610.216	0,00	52,64	11,61	23,95	45,50
						13	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	144.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						51	Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	144.899	0	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						14	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	406.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51	Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	406.531	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						15	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital (#) (4)	57.359	4.557.359	2.197.467	0,00	10,00	3,10	6,04	60,40
						51	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital (#) (4)	57.359	4.557.359	2.197.467	0,00	10,00	3,10	6,04	60,40
						16	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa (4)	27.463.825	34.463.825	26.243.655	15,42	50,00	12,92	37,48	74,96
						51	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	18.611.840	21.111.840	6.462.103	10,31	25,00	13,68	19,95	79,80
						52	Optimización de Sisema de Provisión de Agua Potable Formosa (4)	8.851.985	13.351.985	19.781.552	20,53	75,00	12,16	55,42	73,89
						17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	2.705.389	0,00	19,00	6,01	11,06	58,21
						51	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.508.938	2.705.389	0,00	19,00	6,01	11,06	58,21

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr.
														anual
					18	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	83.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	589.271	0	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
					20	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro (4)	1.222.597	2.222.597	916.098	0,00	25,00	11,34	15,69	62,76
					51	Construcción Acueducto V. Regina Río Negro (4)	1.222.597	2.222.597	916.098	0,00	25,00	11,34	15,69	62,76
					21	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	2.623.550	1.309.802	0,00	33,00	26,00	32,84	99,52
					51	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	2.623.550	1.309.802	0,00	33,00	26,00	32,84	99,52
					22	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	20.840.944	27.340.944	23.507.149	20,92	28,00	5,61	14,41	51,46
					51	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	6.482.420	12.982.420	12.472.952	31,14	50,00	7,31	42,49	84,98
					52	Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	14.331.165	14.331.165	11.034.196	31,62	33,00	3,90	25,76	78,06
					53	Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan (#)	27.359	27.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	46.898.202	37.888.050	9,68	50,00	15,29	39,80	79,60
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	46.898.202	37.888.050	9,68	50,00	15,29	39,80	79,60
					24	Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	9.213.656	10.443.656	9.385.838	2,74	30,00	4,29	17,08	56,93
					51	Constr. de Planta Depuradora Norte - Tandil Bs. As. (#)	7.359	37.359	16.280	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	9.206.297	10.406.297	9.369.558	3,48	60,00	8,58	34,06	56,77
					25	Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil - Bs. As.	3.006.352	7.006.352	6.631.273	83,88	16,12	0,00	16,12	100,00
					51	Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil - Bs. As.	3.006.352	7.006.352	6.631.273	83,88	16,12	0,00	16,12	100,00
					26	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción de Acueducto L. del Tafi - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto L. del Tafi - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	14.718	2.014.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	7.359	2.007.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Estación de Bombeo- San Isidro - Buenos Aires	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	14.718	1.644.718	284.988	0,00	14,00	6,49	10,33	73,79
					51	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	837.359	21.490	0,00	10,00	3,30	7,14	71,40
					52	Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	807.359	263.497	0,00	18,00	9,68	13,52	75,11
					31	C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32	Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33	Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35	Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36	Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obras Integral Desagües y Tratamientos (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37	Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38	Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero - Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39	Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40	Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
						51 Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41	Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42	Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43	Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44	Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45	Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46	Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47	Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	10.257.359	8.318.300	0,00	50,00	35,00	35,00	70,00
						51 Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	10.257.359	8.318.300	0,00	50,00	35,00	35,00	70,00
					49	Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50	Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58	Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famaillá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65	Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72	Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO										
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%						
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr. anual						
624	1					51 Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	701.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	900.000	701.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						81 Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						87 Obras de Agua Potable (1)	233.714	43.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						55 Perf. de 12 Pozos y Centros de Mezcla - Corimayo AB Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						60 Construcción de Redes de Distrib. Primarias - V. Indepen Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						62 Construcción de Redes Secundarias B° San Martín - Lan. - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						64 Ampliación de Redes y Construcción de Tanques Elevados para Refuerzo (1)	204.278	14.278	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						65 Construcción de Redes de Expansión Primarias - Quilmes - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						88 Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. (1)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						53 Perf. de 27 Pozos - Batería Unión - Ezeiza - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						60 Construcción de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande Sur - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						91 Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						92 Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						98 Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora (1)	200.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora (1)	200.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
						99 Consrucción.de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
						51 Consrucción.de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
						659	17					SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
												Actividades Centrales								
												1 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	222.499	96,23	3,77	1,50	2,88	76,39
												51 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	222.499	96,23	3,77	1,50	2,88	76,39
												3 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	581.743	581.743	0	32,00	15,00	2,50	13,50	90,00
												51 Construcción Edificio 25	581.743	581.743	0	32,00	15,00	2,50	13,50	90,00
												19 Producción de Información Geológica de Base								
												1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.147.000	564.669	31,11	3,00	0,81	2,13	71,00
												51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.147.000	564.669	31,11	3,00	0,81	2,13	71,00
												ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
Infraestructura en Concesiones Viales																				
1 Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires.	11.104.037	32.621.369	27.353.121	43,68	56,32							10,55	46,48	82,53						
51 Autovía Cañuelas - Monte Grande - R.N. 3 - Km. 87,82- Km. 97,561 Buenos Aires	11.104.037	32.621.369	27.353.121	43,68	56,32							10,55	46,48	82,53						
2 Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buenos Aires	1.402.765	62.000	60.605	93,45	6,55							0,00	0,17	2,60						
51 Obra de Alteo R.N.3 - Km. 607,5 - Km. 608,5 Coronel Dorrego - Buenos Aires.	1.402.765	1.000	0	0,00	9,00							0,00	0,00	0,00						
52 Mejora de Interseccion R.N. 3 con R.N. 249 Acceso a Punta Alta	0	61.000	60.605	99,83	0,17							0,00	0,17	100,00						
3 Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Buenos Aires II	5.747.342	10.047.342	10.047.342	99,46	0,54							0,00	0,08	14,81						
51 Autovía Mar del Plata - Balcarce I Tramo R.226 - Km. 20,5 -	5.747.342	10.047.342	10.047.342	99,46	0,54							0,00	0,08	14,81						
4 Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia Buenos Aires III	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00							0,00	0,00	0,00						
51 Autovía Mar del Plata - Balcarce II Tramo - R.226- Km. 31,7 -	28.055.304	1.000	0	0,00	25,00							0,00	0,00	0,00						
5 Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires. II	1.402.766	4.626.383	2.675.831	17,97	44,15							5,04	33,16	75,11						
51 Mejora en Travesía Urbana R.N. 205 Km. C66 - Cañuelas Buenos Aires.	701.383	4.026.383	2.675.831	35,93	64,07							10,08	61,60	96,14						
52 Mejora Intersección e Iluminación R.N. 5 -Km. 260 9 de Julio Buenos Aires	701.383	600.000	0	0,00	100,00							0,00	0,00	0,00						
6 Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	2.104.148	601.000	0	0,00	88,88							0,77	0,77	0,87						
51 Mejora Intersección R.N. 7 Km. 202,16 Chacabuco - Buenos Aires.	701.383	1.000	0	0,00	88,88							0,00	0,00	0,00						
52 Mejora en Travesía Urbana R.N. 188 Km. 156,80 - Junín Buenos Aires.	1.402.765	600.000	0	0,00	88,88							0,77	0,77	0,87						
7 Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	1.000	0	0,00	5,00							0,00	0,00	0,00						
51 Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	1.000	0	0,00	5,00							0,00	0,00	0,00						

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción								
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires. IV	48.920.782	20.321.829	10.252.422	5,57	53,22	7,49	20,38	38,29
					51	Autopista Luján - Mercedes Sección I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 Buenos Aires.	24.448.391	3.500.114	0	0,00	66,67	0,33	0,33	0,49
					52	Autopista Luján - Mercedes Sección III RN 5 Km. 85,78 - Km. 95,6 Buenos Aires.	24.472.391	16.821.715	10.252.422	10,55	39,80	12,67	27,60	69,35
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires. V	35.069.138	35.197.628	30.530.923	15,80	58,97	11,22	41,59	70,53
					51	Tramo Campana - Zárate R.N. 9 Entre Km. 72,62- Km. 85,20	35.069.138	35.197.628	30.530.923	15,80	58,97	11,22	41,59	70,53
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe I	1.402.765	1.595.407	505.386	0,00	90,00	21,20	30,46	33,84
					52	Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista Santa Fe	1.402.765	1.595.407	505.386	0,00	90,00	21,20	30,46	33,84
					11	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Buenos Aires. VI	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Vinculación ex RN 193 Tramo Empalme RN 8 - Empalme RP 39 Exaltación de La Cruz	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Córdoba I	3.506.913	2.500.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
					51	Obra en RN A005-Tramo Empalme RN 8 - Empalme RP 36 - Sección Km 0 - 12 Río Cuarto	3.506.913	2.500.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe II	2.104.148	1.001.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoras en Intersección R.N. 33 Km.699,95 Venado Tuerto - Santa Fe	701.383	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación de Accesos R.N. 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.402.765	1.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I (4)	1.364.954	9.234.364	3.942.965	70,15	10,00	5,85	18,84	188,40
					52	Construcción Pasarelas Peatonales RN 3 Km 76,75 Cañuelas Buenos Aires RN 33 Km751 (2)	1.000	58.800	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Rotonda Acceso a Wheelwright Santa Fe RN 8 Km 294,60 (2)	1.000	843.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Travesía Urbana Río Cuarto Córdoba R.N.8 Km. 598,8;A-5 Km 0-11,4; R.N. 36 (2)	1.000	21.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Pasarelas Peatonales R.N.9 Km.1349,0 B.Paz Tucumán ;RN.9 Km 1459,80 M (2)	1.000	20.100	20.094	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59	Mejora Intersección y Construcción Colectoras R.N.3 Km.109 110 San Miguel del Monte (2)	1.000	300.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61	Construcción Canal Desagües Pluviales - Aparicio R.N.3 Km.555,9 Coronel Dorrego	35.069	421.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					63	Travesía Urbana R.N.188 Km.8,0 - 112,0 C.Salles , Erezcano, Acevedo, Guerrero	20.000	1.178.000	556.670	57,82	42,18	0,00	0,00	0,00
					66	Mejora Acceso a Vedia Buenos Aires. R.N.7 Km 312,26 Buenos Aires.	17.535	1.317.535	1.045.632	0,00	100,00	38,91	88,59	88,59
					67	Mejora Acceso a Alberti e Iluminación R.N. 5 Km. 189,39 Buenos Aires. (2)	44.000	247.000	246.901	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68	Mejora Acceso Canalizado a la Laguna de Lobos R.N. 205 Km111,45 (2)	30.000	37.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	235.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					74	Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207,00 Buenos Aires.	280.553	980.553	717.929	0,00	100,00	49,09	96,95	96,95
					76	Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km 369,88	701.383	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					78	Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	70.138	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					79	Mejora Intersección Acceso a San Esteban - Los Cocos Córdoba R.N.38 Km75,3	10.000	1.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora de Acceso a Pinto Santiago del Estero RN 34 Km 496,08 (2)	10.000	74.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81	Adecuación Urbana R.N. 34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	35.069	1.035.069	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					82	Construcción Intersección Canalizada R.N.12 Km. 1383,25 Santa Ana - Misiones	105.207	1.465.207	1.355.738	0,00	100,00	6,84	100,00	100,00
					16	Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	140.277	967.755	659.999	51,39	48,61	0,00	46,86	96,40
					51	Iluminación Intersección R.N. 19 R.P.10 - Río Primero Córdoba.	140.277	967.755	659.999	51,39	48,61	0,00	46,86	96,40
					17	Construccion de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (2)	10.000	60.100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Construccion pasarela peatonal R.N. 5 Km. 74,18 Jauregui	10.000	60.100	0	96,40	3,60	0,00	0,00	0,00
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buenos Aires.	54.028	150.028	0	33,32	30,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela Peatonal R.N.8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz Buenos Aires.	30.000	140.000	0	31,42	50,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Colectora R.N. 3 Km. 109/110 - San Miguel del Monte Buenos Aires.	10.000	10.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					53	Iluminación Rotonda R.N. 3 Km. 192,34 - Intersección R.P. 30- Las Flores Buenos Aires.	14.028	28	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					23	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Córdoba II	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha R.N.8 Sección.Km. 606 - 619 Tramo Río IV - Holmberg	7.013.826	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
					24	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta I	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha R.N.9 Km.1547 - 1555 Cabeza de Buey - Salta	7.013.826	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					25	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta II	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha R.N.34 Km.1129-1135,5 - Cabeza de Buey - Zorzalit	3.506.913	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					26	Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán I	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					27	Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán II	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO				
						Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3º trim.	30/09/2007	Ejec./Progr.
													anual
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				28		Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				29		Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	2.102.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	2.102.765	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				30		Obras Menores en Concesiones Viales	4.942.343	7.020.457	2.439.249	30,88	47,62	8,66	12,04
						51 Rotonda en Intersección R.N.3 Km.448,7 - R.P. 75 González Chavez - Buenos Aires.	701.383	1.587.315	1.245.629	0,00	100,00	33,64	51,85
						52 Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Buenos Aires. (1)	701.383	1.000.411	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso RN7 Km 139 Carmen de Areco - Buenos Aires. (1)	350.691	1.849.793	716.705	0,00	100,00	31,37	47,84
						54 Mejora Intersección R.N. 11 - Calle Santiago Cabral - San Lorenzo -Santa Fe	701.383	599.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Adecuación Acceso R.N.34 Km.252,60 - Sunchales - Santa Fe	172.941	476.941	476.537	93,01	6,99	0,00	6,98
						56 Mejora de Acceso R.N.12 Km.1056 Paso de la Patria Corrientes (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						57 Mejora en Intersección R.N.12 Km. 1361 Candelaria Misiones (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						58 Readecuación de Acceso RN12 Km.1398 San Ignacio Misiones (1)	350.691	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						59 Readecuación de Acceso RN12 Km.1416 Santo Pipa Misiones (1)	280.553	1.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						60 Readecuación de Acceso RN12 Km. 1445 Puerto Leoni Misiones (1)	280.553	1.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						61 Rotonda e Iluminación en RN 3 Intersección con Av. Piazza Azul Buenos Aires. (1)	701.383	1.501.000	378	0,00	87,50	0,00	0,00
				31		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones I	5.895.816	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
						51 Construcción de Terceras Trochas R.N.12 Km.1370 -1399 Arroyo San Juan	5.895.816	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
				32		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones II	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
						51 Construcción 3ºTrocha R.N.12 Km.1399 - 1436 San Ignacio - Jardín Americano - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
				33		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones III	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
						51 Construcción 3ºTrocha R.N.12 Km. 1442 - 1470 Jardín Americano - Puerto Rico - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
				34		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones IV	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
						51 Construcción 3ºTrocha R.N.12 Km. 1472,06 - Km 1540,33 - Puerto Rico - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	7,15	21,24
				35		Construcción 3ºTrocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provincia de Misiones	6.807.613	23.489.199	18.742.783	5,19	34,73	7,15	21,24
						51 Construcción 3ºTrocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provincia de Misiones	6.807.613	23.489.199	18.742.783	5,19	34,73	7,15	21,24
				36		Construccion Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	858.621	871.354	99,87	0,13	0,00	0,00
						51 Construccon Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	858.621	871.354	99,87	0,13	0,00	0,00
				37		Seguridad en Corredores Viales en Provincia de La Pampa I	701.383	2.365.383	2.365.018	49,61	50,39	4,84	48,19
						51 Readecuación Acceso Planta Urbana R.N. 5 Km. 605 - 606 - Santa Rosa La Pampa	701.383	2.365.383	2.365.018	49,61	50,39	4,84	48,19
				38		Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Mendoza I (4)	30.558.390	68.460.143	25.587.283	61,20	38,80	18,60	40,95
						51 Doble Vía Santa Rosa - General San Martín R.N.7 Km. 965,51-998,80 Mendoza (4)	30.558.390	68.460.143	25.587.283	61,20	38,80	18,60	40,95
				39		Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Peaje Jaúregui	2.920.751	920.751	220.708	96,77	3,23	0,00	0,20
						51 Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II R.N.5 Km. 72,42	2.920.751	920.751	220.708	96,77	3,23	0,00	0,20
				40		Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Santiago del Estero I	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
						51 Ensanche Puente sobre Río Dulce R.N.9 Km.1205 - Termas Río Hondo Santiago del Estero.	701.383	151.383	112.206	99,72	0,28	0,00	0,00
				48		Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Santa Fe	0	79.000	0	50,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN9 Km376 Cañada de Gomez (2)	0	79.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				63		Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San Nicolás (2)	50.000	165.000	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San Nicolás (2)	50.000	165.000	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00
				64		Iluminación RN 11 en Chaco	50.000	380.000	374.992	75,94	24,06	0,00	22,84
						51 Iluminación RN 11 Km1000 - 1002 Resistencia Chaco	50.000	380.000	374.992	75,94	24,06	0,00	22,84
				65		Construcción de Destacamentos Policiales Provincia de Buenos Aires	2.496.922	1.700.000	575.045	0,00	30,71	9,34	22,34
						51 R.N.9 Km.54 Loma Verde - Escobar, RN9 - RP6 - Campana,RN8 - RP51 Arrecifes (4)	2.496.922	700.000	575.045	0,00	30,71	40,32	40,32
						52 R.N.205 y R.P.51 Saladillo, R.N.205 y 226 Bolivar, R.N.3 y RP86 Benito Juárez (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 R.N.22 Km. 714 Medanos, R.N.222 Km.769 Algarrobo - Punta Alta (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 R.N.188 Km.398 Banderale, R.N.33 entre R.P.65 Guamini, R.N.33 y Lima Provincia de Buenos Aires (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales - Km.31 Autopista Buenos Aires - La Plata (1)	0	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				67		Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III	701.383	2.360.349	877.266	79,16	20,84	0,00	20,83

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr.
														anual
						51 Pavimentación Colectora, Construcción e Iluminación Pasarelas R.N. 9 Tucumán (4)	701.383	2.360.349	877.266	79,16	20,84	78,56	99,39	476,92
					68	Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe	140.277	740.277	196.705	0,00	100,00	78,56	78,56	78,56
						51 Iluminación Distribuidor Funes - Autopista Rosario - Armstrong Intersección R.P. 34 - Funes Santa Fe	140.277	740.277	196.705	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					69	Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	1.403.467	5.018.075	3.205.982	0,00	76,66	23,20	53,84	70,23
						51 Intersección Canalizada R.N.188 - Construcción Bicisenda Ameghino - Provincia de Buenos Aires.	701.383	863.586	0	0,00	100,00	9,28	9,28	9,28
						52 Intersección Canalizada para Giro Camiones R.N. 33 Km. 711 - Chabas Santa Fe	701.383	3.061.383	2.772.210	0,00	100,00	18,81	94,65	94,65
						53 Mejora Travesía Urbana R.N. 8 Venado Tuerto Santa Fe (1) (4)	701	1.093.106	433.772	0,00	30,00	63,44	74,49	248,30
					70	Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco	140.277	350.277	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	370.277	741.277	173.695	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Rama de Salida Km.21 Autopista Richieri Buenos Aires	140.277	740.277	173.695	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas (1)	230.000	1.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	2.200.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	2.200.000	0	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00
					73	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires II (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en San Miguel del Monte y Punta Alta R.N.3 (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					74	Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Buenos Aires (1)	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Buenos Aires (1)	100.000	1.000	0	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
					75	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba (1)	2.103	2.636.893	0	0,00	48,19	19,32	19,32	40,09
						51 Puente Sobre el Arroyo El Ajó R.N. 7 Km. 600 - Córdoba (1)	701	2.635.491	0	0,00	66,67	27,36	27,36	41,04
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9 - Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149 - 203 Córdoba (1)	701	701	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales (1)	80.000	90.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta (1)	80.000	90.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Santiago del Estero (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puente sobre el Río Dulce R.N. 34 Santiago del Estero (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos (1)	112.000	1.650.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso a Gualaguaychú R.N. 14 Entre Ríos (1)	112.000	1.650.000	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provincia de Buenos Aires. (1)	701	875.734	0	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provincia de Buenos Aires. (1)	701	875.734	0	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00
					81	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires III (1)	141.917	712.216	502.083	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección y Colectora R.N.3 Km. 186.72 - 187.29 Las Flores Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora Intersección y Colectora R.N. 5 km 208 - 211 Bragado - Buenos Aires. (1)	701	700.000	502.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Construcción Tercer Puente La Niña R.N. 252 Buenos Aires. (1)	130.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Rotonda en Intersección R.N. 3 - R.N. 252 El Triángulo Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg R.N. 3 Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Acceso Canalizado Dorrego (1)	701	701	0	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av Caseros y San Martín -Tres Arroyos (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Ilumación Rotondas R.N. 205 - R.P. 65 y R.P. 30 y R.N. 226 Buenos Aires (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Obras de Alcantarillado en Bolívar - Buenos Aires (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam R.N.5 Km.305 - 307 Carlos Casares (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191 - Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av Elguera - Chacabuco (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución - Córdoba (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias - Buenos Aires. (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Iluminación Acceso a Zárate R.N. 3 - Buenos Aires (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82	Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II (1)	4.907	675.201	151.430	0,00	33,36	2,80	3,80	11,39

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%	
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr. anual	
18						51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Iluminación de Empalme de Acceso a R.P. 26 - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco R.N. 9 - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel - Santa Fe (1)	701	701	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Travesía Urbana en Murphy RN 33 - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Travesías Urbanas en RN 11 (1)	0	670.995	151.430	0,00	100,00	29,69	31,35	31,35	
	83					Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	84					Travesía Urbana en Capióvi RN 12 - Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Travesía Urbana en Capióvi RN 12 - Misiones (1)	701	701	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	85					Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (1)(4)	200.000	16.974.826	7.319.953	0,00	1,00	3,04	5,98	598,00	
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (1)(4)	200.000	16.974.826	7.319.953	0,00	1,00	3,04	5,98	598,00	
	86					Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	88					Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (1)	0	710.416	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (1)	0	710.416	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						Infraestructura en Áreas Urbanas									
	1					Infraestructura en Áreas Urbanas	455.197	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Rotonda en Intersección RN15 y Av. Monseñor Rosch - Concordia - Entre Ríos	350.691	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Iluminacion en Intersección R.N.14 y R.N. 15 - Concordia - Entre Ríos	104.506	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2					Seguridad en Áreas Concesionadas II	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Repavimentación RP 42 Sección RP 51 Acceso a Rawson Bs.As.	29.000	29.000	0	86,71	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 La Plata - Buenos Aires	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 La Plata - Buenos Aires	7.714.507	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4					Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	214.000	0	68,71	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	214.000	0	87,39	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	5					Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 - Florencio Varela - Buenos Aires	36.220.978	67.220.201	59.885.857	40,18	59,82	20,00	59,09	98,78	98,78
						51 Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 - Florencio Varela - Buenos Aires	36.220.978	67.220.201	59.885.857	40,18	59,82	20,00	59,09	98,78	98,78
	6					Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 - La Plata - Buenos Aires	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 - La Plata - Buenos Aires	1.402.765	1.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7					Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido - Pilar - Buenos Aires (4)	701.383	4.165.383	3.657.755	29,77	70,23	17,01	78,54	111,83	111,83
						51 Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido - Pilar - Buenos Aires (4)	701.383	4.165.383	3.657.755	29,77	70,23	17,01	78,54	111,83	111,83
	9					Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	7.328.747	1.500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en Accesos Sur - R.N. 14 Km.252,60 Concordia - Entre Ríos	7.328.747	1.500.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11					Obras Menores en Áreas Urbanas	701.383	1.962.799	650.220	0,00	100,00	43,41	71,91	71,91	71,91
						51 Pavimentación Tramos Urbanos RN 9 Km 100,49 Lima Buenos Aires	701.383	1.962.799	650.220	0,00	100,00	43,41	71,91	71,91	71,91
	12					Seguridad en Áreas no Concesionadas	210.415	1.740.097	740.097	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	210.415	1.740.097	740.097	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13					Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	701.383	2.154.425	1.730.967	0,00	100,00	59,54	69,91	69,91	69,91
						51 Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	701.383	2.154.425	1.730.967	0,00	100,00	59,54	69,91	69,91	69,91
	14					R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.050.000	0	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aires (1)	0	2.050.000	0	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	15					Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	1.502.747	0	0,00	100,00	4,95	4,95	4,95	4,95
						51 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	1.502.747	0	0,00	100,00	4,95	4,95	4,95	4,95
	16					Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.450.000	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.450.000	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19					Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales										
					1 Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 - Año II - I Etapa	5.000.000	44.245.730	39.351.432	25,40	74,60	7,79	54,76	73,40	73,40	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
							Crédito Original	Crédito Vigente al	Crédito Devengado al	% Acumulado	Programación anual vigente	Ejecutado	Ejecutado al	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		30/09/2007	30/09/2007	al 31/12/2006		en el 3° trim.	30/09/2007	Ejec./Progr. anual
					2	51 Obra Mejorativa Nº212 Corredor Vial 2 - RN5 Km.98 -107 Km.143 - 150 Km. 208 - 221	1.000.000	12.215.000	12.116.893	48,11	51,90	0,64	48,17	92,81
						52 Obra Mejorativa Nº221 Carredor Vial 2-RN7 Km. 259 - 276	1.000.000	13.418.601	12.652.328	14,32	85,68	8,15	85,68	100,00
						53 Obra Mejorativa Nº208 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Km. 457 - 492	1.000.000	5.105.166	5.070.262	91,20	8,80	0,00	8,80	100,00
						55 Obra Mejorativa Nº211 R.N.7 Km. 399 - 406 Km.424 - 457	2.000.000	13.506.963	9.511.949	16,18	83,82	19,76	75,81	90,44
						Corredor Vial 3	5.000.000	8.284.781	4.709.292	0,91	68,83	6,22	25,90	37,63
						51 Obra Mejorativa Nº214 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.157-206	2.000.000	4.051.000	1.187.200	1,82	58,75	0,00	10,72	18,25
						52 Obra Mejorativa Nº201 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.96-106	3.000.000	4.233.781	3.522.092	0,00	100,00	25,46	56,26	56,26
					3	Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 - Año II - I Etapa	7.000.000	39.435.238	33.561.813	6,64	80,86	13,72	76,97	95,19
						51 Obra Mejorativa Nº205 Corredor Vial 4 R.N.8 Km.661 - 695	3.500.000	21.501.337	17.147.994	19,93	80,07	19,24	79,71	99,55
						52 Obra Mejorativa Nº206 Corredor Vial 4 R.N.33 Km.586 - 616, Km. 673 - 675	3.500.000	17.933.901	16.413.819	0,00	100,00	7,18	74,60	74,60
					5	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa	29.138.939	38.443.284	31.114.152	15,54	66,65	14,50	48,17	72,27
						0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa (1)	3.000.000	1.600.000	1.212.910					
						51 Obra Mejorativa Nº217 Corredor Vial 5 - R.N.9 Km. 1215 - 1225, Km.1315 - 1325	9.273.024	8.054.503	6.036.726	75,92	24,08	0,00	19,89	82,60
						52 Obra Mejorativa Nº203 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 584 - 612, Km. 646 - 651, Km. 684 - 696	5.000.000	17.851.199	14.427.726	8,87	91,13	25,59	90,51	99,32
						53 Obra Mejorativa Nº227 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Km. 1164 - 1177	4.359.002	9.937.582	9.436.791	8,56	91,44	0,00	88,29	96,56
						54 Obra Mejorativa Nº218 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 66,00 - 86,00	7.506.913	1.000.000	0	0,00	90,00	8,34	8,34	9,27
					6	Obras de Mejoras en Corredor Vial 1 - Año II - Etapa II (1)	99.000	99.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 236 Corredor Vial 1 - R.N. 3 y RN 252 - Km. 669-677 R.N. 252 Km. 0 - 6.80 (1)	98.000	98.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 241 Corredor Vial 1 - R.N. 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos Buenos Aires (1)	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Obras de Mejoras en Corredor Vial 2 - Año II - Etapa II (1)	546.000	546.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 209 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 10 Acceso a Washington (1)	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 222 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Límite San Luis / Mendoza - Acceso La Dormida (1)	160.000	160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 224 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 6 - R.P. 41 Km. 63 - 103 (1)	120.000	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 234 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Acceso Carlos Casares - Acceso San Bernardo (1)	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Obra 240 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Límite Buenos Aires / La Pampa - Acceso Uriburu (1)	145.000	145.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa (1)	729.000	729.000	0	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 202 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Acceso a San Pedro (1)	133.000	133.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 215 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Río Tala (1)	120.000	120.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 216 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Tala - RP 51 (1)	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a Corredor Vial 3 - R.N. 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe (1)	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						55 Obra 223b Corredor Vial 3 - R.N. 11 Santo Tobrae - Santa Fe (1)	138.000	138.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						56 Obra 232 Corredor Vial 3 - R.N. 188 Empalme R.P. 1 Empalme R.P. 35 - La Pampa (1)	100.000	100.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					9	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa (1)	327.000	327.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 235 Corredor Vial 4 - R.N. 8 Arrecifes - Pergamino Km. 173 - 197 Buenos Aires (1)	197.000	197.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 239 Corredor Vial 4 - R.N. 36 Almafuerte Acceso Los Molinos - Córdoba (1)	130.000	130.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 - Año II - II Etapa (1)	369.000	369.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 210 Corredor Vial 5 - R.N. 9 Río Juramento Empalme - R.N. 34 - Salta (1)	97.000	97.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 219 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme - R.N. 62 Santa Fe (1)	125.000	125.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 220 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km. 39 (1)	147.000	147.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11	Obra de Mejora en Corredor Vial 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 1 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12	Obra de Mejora en Corredor Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 2 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 3 III Etapa (1)	210.000	210.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 4 III Etapa (1)	200.000	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 5 III Etapa (1)	211.000	211.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Obra de Mejora en Corredor Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

						FINANCIERO			FISICO					
							Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
						51 Obra en Corredor Vial 6 III Etapa (1)	236.608	236.608	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664					ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS								
		16				Control del Sistema Nacional de Aeropuertos								
				10		Reacond. de Plataformas, Pistas y Calles Aerop. Villa Gesel (1)	2.950.000	2.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Nivelación y Puesta en Norma Franja de Seguridad Aeropuerto Villa Gesel (1)	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Cerco Operativo del Aeropuerto de Villa Gesell (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Reacondicionamiento de Plataformas, Pistas y Calles Rodaje Aeropueto Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación Estruct. Sup. de Pista, Calle Rodaje y Balazamiento Aeropuerto Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje Aeropuerto de Junín (1)	1.840.313	1.840.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cerco Operativo del Aeropuerto de Junín (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70						Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología								
	336					SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
		43				Formul.e Implementación de la Polít.de Ciencia y Tecnología								
				2		Acondicionamiento del Edificio Central (1)	200.000	360.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Implementación de Sistemas de Seguridad (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Tendido de Red (1)	100.000	260.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
	350					MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
		1				Actividades Centrales								
				2		Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2) (***)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)	300.000	1.560.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Edificio Callao Nº 114 (1) (***)	1.260.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación Primer Subsuelo Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Regularización del Trabajo								
						6 Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.574.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	2.574.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
	310					MINISTERIO DE SALUD								
		1				Actividades Centrales								
				1		Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.750.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						52 Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central	1.750.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
903						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
		53				Atención a Enfermos								
				6		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	750.000	0	0	32,05	67,95	0,00	0,00	0,00
						55 Refacción Integral de Pabellones Nº 3 ,5 y 8	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Reparación y Mantenimiento en Hospital	0	350.000	115.141	0,00	100,00	0,33	0,33	0,33
						52 Reparación de Usina	0	350.000	115.141	0,00	100,00	0,33	0,33	0,33
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	64.599	87,00	13,00	0,00	49,00	376,92
						51 Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	64.599	87,00	13,00	0,00	49,00	376,92
				13		Construcción de Quirofano	0	850.000	161.453	0,00	100,00	0,19	0,19	0,19
						51 Construcción de Quirofano	0	850.000	161.453	0,00	100,00	0,19	0,19	0,19
906						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3° trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
				3		Puesta en Valor y Adecuación de Dist. Areas del Ed. Cent. de ANLIS (1)	1.605.413	466.007	381.788	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00
						51 Reconst. de Veredas y Arm. de la Red Pluv. del Pabe. Ppal. de ANLIS (1)	164.658	164.658	381.788	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque (1)	393.349	153.943	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Puesta en Valor y Consolid. de las Fachadas, Vestíbulo de Acceso (1)	914.765	14.765	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de los Serv. de Higiene, Seguridad y Arquitectura (1)	50.312	50.312	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Remodelación y Refuncionalización de la Amp. de las Of. del Dpto. de RRHH (1)	82.329	82.329	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1			Desarrollo y Producción de Biológicos								
				3		Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biologicos-Etapa III (3)	0	120.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación de los Laboratorios para Envases de Inyectables	0	120.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación del Sector Liofilizador	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
			5			Control de Calidad de Biológicos								
				3		Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad (3)	0	145.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Laboratorios del Primer Piso	0	145.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
				4		Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas c/ FHA								
				5		Red de Gas Natural del Instituto Nacional de Enfermedades Virales (5)	0	70.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						51 Red de Gas Natural del Instituto Nacional de Enfermedades Virales (5)	0	70.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
			8			Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias								
				3		Mejoramiento Edificio Instituto Nacional de Epidemiología "DR. Juan H. Jara" Fase III (3)	0	600.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Edificio Interno	0	600.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA								
		59				Atención de Pacientes								
				2		Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR								
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos								
				1		Construcción Natatorio	250.000	63.275	63.093	44,76	31,73	0,00	25,23	79,51
						51 Construcción Natatorio	250.000	63.275	63.093	44,76	31,73	0,00	25,23	79,51
				7		Remodelación del Inst. Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	206.800	92.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Archivo General 2° Etapa (1)	64.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Departamento Residentes (1)	44.000	44.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Farmacia (1)	48.000	48.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Laboratorio (1)	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Proyecto y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

(***) Los créditos del proyecto 5 fueron reasignados por Resolución M.T.E. y S.S. N° 236 al proyecto 2. El proyecto 5 fue dado de baja en el ejercicio 2007 por problemas licitatorios.

s/i Sin información

(#) Proyectos y obras del ENOHSa que no pudieron cumplimentar la primera programación física debido a que el crédito vigente no es suficiente para el inicio de los mismos. (incluye los proyectos del 31 al 92)

(1) Proyectos y obras nuevos iniciados en el ejercicio 2007.

(2) Obra terminada físicamente, los devengados corresponden a certificaciones atrasadas.

(3) Proyectos y Obras iniciados en el 2° trimestre del ejercicio.

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2007

							FINANCIERO			FISICO				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente al 30/09/2007	Crédito Devengado al 30/09/2007	% Acumulado al 31/12/2006	Programación anual vigente	Ejecutado en el 3º trim.	Ejecutado al 30/09/2007	% Ejec./Progr. anual

- (4) Proyectos y obras con ejecución mayor a la programada.
(5) *Proyectos y Obras iniciados en el 3º trimestre del ejercicio.*
(6) El devengado corresponde al pago de la dirección de obra.
(7) Esta obra no se va a realizar en el ejercicio. La licitación quedo nula.

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
						MANTENIMIENTO												
						Mantenimiento por Administración												
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	-	01/01/2007	31/12/2007	63.200	5.765.000	71.950.668	63.618.905	25%	67%	6	B
16	1	2	51	PAIS	VS	Compra de Materiales para Seguridad Vial	DNU	-	01/01/2007	31/12/2007	22.000	3.088.000	9.331.914	9.331.913	11%	28%	6	B
						Total Mantenimiento por Administración					85.200	8.853.000	81.282.582	72.950.818				
						Mantenimiento por Contrato												
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza - Limite con San Juan San Martín-Mendoza - Empalme	Varias (Sistema Km-Mes)	194,66	22/08/1995	17/02/2007	15.251	68.000	429.311	429.304	0%	77%	7	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Empalme RNN° 86 / Empalme R11 - Villa Gral	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	403,37	29/04/1997	27/03/2004	3.616	100.000	1	0	0%	100%	8	
						Total Mantenimiento por Contrato					18.867	168.000	429.312	429.304				
						Mantenimiento por Convenio												
16	3	24	51	LA PAMPA	143,151,152	TFO LA PAMPA Convenio N 10	Chacharramendy - Empalme R.N.N° 151	633,34	01/01/2006	31/12/2007	8.571	3.007.000	3.920.506	3.920.504	12%	67%	6	A - F
16	3	25	51	NEUQUEN	22,40(S),234	TFO NEUQUEN Convenio N 10		528,43	01/01/2006	31/12/2007	7.489	2.163.000	3.081.473	2.748.820	20%	61%	6	A - F
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO RIO NEGRO Convenio N 10		1136,48	01/01/2006	31/12/2007	8.482	2.808.000	3.573.625	3.237.852	13%	86%	6	A
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO SANTA CRUZ Convenio N 10	Prog. 2,13 - Prog 126,55	2207,28	01/01/2007	31/12/2007	24.839	18.950.000	24.647.265	24.647.265	23%	96%	6	A
16	3	28	51	FUEGO	3com a,b,m,i	TFO TIERRA DEL FUEGO Convenio N 9	C. Santo Espiritu - S. Sebastian	520,48	01/01/2006	31/12/2007	10.191	2.186.000	5.355.962	5.355.961	5%	87%	6	A
16	3	30	51	JUJUY	52, 40(N), Ex RP16	TFO JUJUY Convenio N 10		392,75	01/01/2006	31/12/2007	3.800	455.000	1.087.532	1.087.526	33%	94%	6	A - F
16	3	31	51	SALTA	51-40-86	TFO SALTA Convenio N 10	Tramos Varios	482,44	01/01/2006	31/12/2006	2.614	11.000	747.719	747.718	0%	100%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO FORMOSA Convenio N 8	Villa General Güemes - El Remanso	236,00	01/01/2006	31/12/2007	3.626	1.925.000	1.642.941	1.642.939	3%	99%	6	A
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso	Ftin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto	144,60	04/05/2007	04/05/2009	2.048	398.000	62.688	62.687	9%	18%	6	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO MENDOZA Convenio N 6	Tramos varios	266,65	01/04/2004	31/03/2006	4.895	2.669.000	496.140	496.138	0%	100%	7	
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO CHUBUT Convenio N 8	Tramos Varios	537,18	01/01/2004	30/12/2007	5.873	2.994.000	1	0	5%	56%	6	A - I
16	3	37	51	LA RIOJA	40-76-78-150	TFO LA RIOJA Convenio N 7		434,45	01/12/2006	30/11/2007	4.286	2.000.000	536.326	536.325	25%	53%	6	A
16	3	38	51	CHACO	89	TFO CHACO Convenio N 2		163,39	01/01/2006	31/12/2007	1.864	1.000.000	808.582	808.581	18%	82%	6	
16	3	39	51	TUCUMAN	9,38	TFO TUCUMAN Convenio 6		67,37	01/01/2006	31/12/2007	2.558	1.000.000	449.366	0	8%	64%	6	A
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO Convenio N 8 Belén- Limite con Tucumán	Km 798,82- Km 986,82	188,00	01/11/2007	30/10/2008	2.632	20.000	1	0	0%	0%	0	
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO Convenio N 2 Empalme RP N°20 - Empalme RP N°17	Km 1056,32- Km 1116,96	60,64	01/11/2007	30/10/2008	850	6.000	1	0	0%	0%	0	
16	3	42	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288-193	TFO SANTA CRUZ - Convenio N 9 (3)		1714,86	01/01/2006	31/12/2006	23.944	0	0	0	0%	100%	7	
						Total Mantenimiento por Convenio					118.562	41.592.000	46.410.128	45.292.316				
						Señalamiento												
16	4	1	51	PAIS	VS	Señalamiento Horizontal		-	01/01/2007	31/12/2007	77.638	5.714.000	75.637.991	71.642.346	25%	67%	6	B
						Obras de Emergencia												
16	5	1	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia Menores	Nacional	100,00	01/01/2007	31/12/2007	49.843	3.571.000	42.566.839	38.328.422	25%	67%	6	B
16	5	2	51	PAIS	VS	Obras en Puentes	Nacional	-	01/01/2007	31/12/2007	3.571	3.571.000	6.165.068	5.095.909	30%	80%	6	B
16	5	3	51	PAIS	VS	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	-	01/01/2007	31/12/2007	1.000	143.000	61.565	46.474	0%	0%	6	B
16	5	4	51	PAIS	VS	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	-	01/01/2007	31/12/2007	57.516	4.286.000	2.622.678	2.622.677	1%	3%	6	B
						Total Obras de Emergencia					111.930	11.571.000	51.416.150	46.093.482				
						Mantenimiento por Sistema Modular												
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	254,18	19/07/2004	17/07/2008	5.951	29.000	1.144.559	1.144.558	2%	60%	6	
16	6	3	51	CHACO	16	Empalme Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 176,33 - km 502,92 - Sistema Modular	326,59	03/12/2004	02/04/2008	7.989	510.000	852.214	852.213	1%	81%	6	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	277,64	03/05/2004	02/10/2007	10.314	1.387.000	1.974.557	1.566.641	5%	66%	6	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Empalme RN N° 25 - Empalme RP N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	289,06	07/09/2004	06/11/2007	9.742	205.000	2.431.839	2.431.837	9%	89%	6	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Empalme RP N°22-Chubut-Sta Cruz / Empalme RN N°40-Limite	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km	147,08	22/01/2007	20/01/2009	6.033	63.000	1.707.053	1.457.648	14%	32%	6	
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Empalme RNN°20 Limite /Mendoza - San Juan	km 35 - km 112,5 / km3,27- km80,83 / km997,4 - km1041,8 -	194,66	02/01/2007	31/12/2008	9.909	386.000	2.855.993	2.345.355	15%	33%	6	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	229,64	17/03/2005	17/03/2009	15.118	1.109.000	2.557.636	2.557.634	9%	62%	6	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RN N° 11 - A Nivel RN N° 11- Calle Juan	km 0 - km 7,23 / km 0 - km 4,59 / km 0 - km 2,58 - Sistema	14,40	21/07/2005	31/03/2008	10.800	831.000	3.603.575	3.166.376	6%	65%	6	A
16	6	11	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	204,40	14/07/2004	12/07/2008	9.048	54.000	1.881.738	1.881.737	6%	78%	6	
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Empalme RN N° 50 - Limite con Bolivia / Pluma de Pato -	km 1329,12 - km 1488,40 / km 1763,6 - km 1863,30 - Sistema	258,98	15/04/2004	13/04/2008	8.699	990.000	1.979.784	761.393	6%	89%	6	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Empalme RP N°4 - Empalme RP N°6	km 18,90 - km 61,87	42,97	01/11/2007	30/10/2009	7.037	27.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		7,25	01/11/2007	30/10/2009	6.000	46.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	21	51	MISIONES	12	Sistema Modular Acceso Aeroparque General San Martín -	Km1336 - Km1349	13,20	01/11/2007	30/10/2008	1.500	2.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Empalme RN N° 51	Km 4433,87 - Km 4594,22	160,35	01/10/2007	29/09/2009	5.950	23.000	1	0	0%	0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	C.Quijano - Limite con Chile / S.A. De los Cobres - Limite con	Km 26,39-Km 296,44 /Km 4607,03- 4666,62	329,64	01/10/2007	29/09/2009	7.736	30.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme R.N. N° 40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	214,93	01/11/2007	30/08/2009	7.738	30.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme RN N°25 - Empalme RP N ° 56	km.1556,60- km 1815,71	259,11	01/11/2007	27/02/2009	9.300	35.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	26	51	CHUBUT	26	Empalme (Ex) RN N° 26 Empalme RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1815,71 - km 1865,6	157,58	01/10/2007	29/09/2009	5.700	22.000	1	0	0%	0%	0	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral. Acceso Ciudad	Puente Nuevo Pueyrredón y Puente Avellaneda	-	27/06/2007	25/06/2009	36.995	24.000	1.763.177	0	13%	13%	6	
16	6	28	51	JUJUY	S/N	Puente Sobre el Rio Grande - Bajo la Viña		-	01/11/2007	31/05/2010	15.000	1.500.000	0	0	0%	0%	0	
						Total Mantenimiento por Sistema Modular					196.559	7.303.000	22.752.133	18.165.392				
Obras de Seguridad Vial																		
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	200,00	01/11/2007	01/05/2008	11.000	407.500	407.500	0	0%	0%	0	
16	7	3	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)	200 Km	200,00	01/11/2007	01/05/2008	11.000	557.500	557.500	0	0%	0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	30,00	01/11/2007	31/08/2008	8.292	414.000	414.000	0	0%	0%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		1,00	01/11/2007	30/11/2007	2.300	144.000	144.000	0	0%	0%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		1,00	01/11/2007	01/03/2008	2.000	84.000	84.000	0	0%	0%	0	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readequación Intersección RP N° 6, RP N° 2 y Acceso A Bovril	INTER. R.N. N°127 - R.P. N°2 - ACC. BOVRIL	5,47	16/04/2007	14/10/2008	11.857	134.000	1.778.212	1.778.211	21%	28%	6	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		1,00	01/11/2007	30/09/2008	2.000	100.000	100.000	0	0%	0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RN N° 251-Tratamiento de la circulación nocturna (Ex		1,00	01/11/2007	31/12/2007	11.488	95.000	95.000	0	0%	0%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna (Ex iluminación)		1,00	01/10/2007	01/03/2008	300	5.000	5.000	0	0%	0%	0	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		1,00	01/11/2007	31/12/2007	600	13.000	13.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Sur y Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		1,00	01/11/2007	30/01/2008	1.200	1.251.000	1.251.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		1,00	01/11/2007	30/01/2008	600	151.000	151.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RP N° 6 (Prog. Inic. 1054,6)		1,00	01/11/2007	30/01/2008	500	125.000	125.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	54	SANTA FE	98	km 155,79 - km 155,87		1,00	01/11/2007	30/01/2008	2.000	56.000	56.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con Ruta N° 95 y RP N°2		1,00	01/10/2007	31/03/2008	1.800	28.000	28.000	0	0%	0%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección con RN N° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	1,00	01/10/2007	31/05/2008	3.000	63.000	63.000	0	0%	0%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Empalme RP N° 116-Intersección en T sucesiva en Empalme RN		1,00	01/11/2007	30/01/2008	450	112.000	4.581.542	0	0%	0%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Intersección RN N° 20 y RN N° 79		1,00	01/11/2007	01/03/2008	2.937	31.000	31.000	0	0%	0%	0	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Empalme RN N° 60 (Alto Nivel Empalme RN N° 9)	1,00	07/11/2006	07/05/2008	10.198	134.000	670.915	4.033.622	33%	64%	6	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección RN N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Intersección RP N° 7 - Intersección RP N° 60	12,20	01/11/2007	30/09/2008	10.000	27.000	27.000	0	0%	0%	0	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección RN N° 7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Intersección RP N° 60 - Intersección RPN° 2	4,00	01/11/2007	31/03/2008	3.500	18.000	18.000	0	0%	0%	0	
16	7	39	51	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado		-	01/11/2007	31/01/2007	798	0	0	0	0%	0%	2	
						Total Obras de Seguridad Vial					97.820	3.950.000	10.600.669	5.811.833				
						Total Mantenimiento					706.576	79.151.000	288.528.965	260.385.491				
CONSTRUCCIONES																		
Corredores Viales I																		
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Limite con Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	6,36	21/02/2001	23/03/2003	12.589	100.000	1	0	0%	100%	7	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	33,00	03/02/1997	03/07/2004	9.362	100.000	1	0	0%	100%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	Arroyo Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	48,30	03/02/1997	03/05/2004	13.596	100.000	1	0	0%	100%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	34,96	28/01/1997	27/10/2003	18.814	1.065.000	1	0	0%	94%	7	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección III: Río Caucheta - Empalme RN N° 7	9,76	21/02/2001	21/01/2004	28.314	576.000	1	0	0%	94%	7	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	29,70	28/01/1997	26/10/2005	24.210	1.967.000	1	0	0%	92%	8	
						Total Corredores Viales I					106.885	3.908.000	6	0				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																		
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	38,00	17/04/2006	15/04/2008	89.010	10.031.000	41.983.091	38.335.030	13%	75%	6	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Limite con Santa Cruz	(1940-1979)	46,00	01/11/2007	30/05/2010	60.000	153.000	1	0	0%	0%	2	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Limite con Chaco - Los Pirpintos	38,63	18/12/2006	17/06/2008	46.094	29.000.000	18.867.541	5.103.346	5%	15%	6	
22	2	13	51	MENDOZA	40	Empalme R.N. 144 - El Sosneado	Km 260 - Km 278,69 (El Sosneado - Pocitos)	18,69	24/04/2007	22/04/2008	7.373	116.000	1	0	0%	3%	9	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	18,00	04/01/2005	03/01/2007	15.139	304.000	2.833.127	29.126	0%	100%	8	
22	2	18	51	FUEGO	Comp.i	Empalme RN N° 3 - Limite con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	11,00	01/11/2007	30/10/2008	13.000	99.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Limite con Jujuy	km 1352 - km 1412	60,00	01/11/2007	30/10/2010	60.000	115.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Limite con Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	29,20	17/10/2006	16/04/2008	45.290	25.466.000	14.962.302	6.255.277	6%	17%	6	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Limite con Salta - Empalme RN N° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	35,00	01/11/2007	30/10/2009	26.400	67.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - General Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	64,25	04/04/2007	02/10/2008	94.071	367.000	13.387.531	11.697.599	6%	9%	6	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	19,00	01/11/2007	30/10/2008	28.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		6,00	01/11/2007	30/10/2009	18.000	69.000	1	0	0%	0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Límite con Chile		70,00	01/11/2007	30/10/2009	46.000	176.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	18,00	04/01/2005	03/02/2007	12.835	28.000	2.528.000	0	0%	100%	8	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Límite con Chile		19,00	01/11/2007	01/05/2009	68.244	348.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		22,57	01/11/2007	01/05/2010	40.000	153.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	29,00	16/12/2002	14/12/2004	32.003	746.000	746.000	0	0%	98%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	26,00	12/05/2003	09/11/2004	33.502	218.000	218.000	0	0%	98%	7	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Límite. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (EmpalmeRNN°145) y Vte. Chihuido	63,00	01/11/2007	30/10/2009	57.152	157.000	1	0	0%	0%	0	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Intersección Empalme RP N° 16 - Intersección Empalme RP	18,17	16/11/2005	16/05/2008	68.036	26.318.000	35.967.475	10.108.868	8%	44%	6	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RP N°20 - Empalme RP"J" (Colonia Elía)	27,74	30/06/2006	28/12/2008	101.021	20.000.000	124.845.023	18.286.484	4%	10%	6	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RP"J" (Cnia Elía) - Arroyo Colman	34,78	01/11/2007	27/09/2010	171.447	32.222.000	21.662.000	17.144.670	0%	0%	4	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Colman - Empalme RPN°29 (Col. Hocker)	33,27	28/06/2007	26/06/2010	228.409	32.222.000	4.112.000	7.885.740	4%	4%	6	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RP N° 29 - Ubajay	35,58	01/06/2007	30/05/2010	254.938	32.222.000	16.112.000	33.692.766	4%	4%	6	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Empalme RN N°18	34,97	01/06/2007	30/05/2010	190.399	32.224.000	32.224.000	26.070.858	4%	4%	6	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RN N° 18 - Arroyo Ayuí Grande	32,74	28/06/2007	26/06/2010	225.310	10.208.000	10.208.000	45.389.922	4%	4%	6	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Ayuí Grande - Arroyo Mandisovi Grande	34,76	01/06/2007	30/05/2010	186.989	32.222.000	16.112.000	24.138.050	4%	4%	6	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Mandisovi Grande - Río Mocoretá	35,85	01/06/2007	30/05/2010	206.079	32.222.000	16.112.000	23.904.758	4%	4%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - Arroyo Curupicay	33,56	01/11/2007	30/05/2010	165.270	36.250.000	13.697.000	16.526.998	0%	0%	2	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Arroyo Curupicay - Empalme RN N°127	29,34	01/11/2007	30/05/2010	139.932	36.250.000	0	0	0%	0%	2	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RN N° 127 - Estab. San Agustín	32,38	01/11/2007	30/05/2010	16.127	36.250.000	31.750.000	0	0%	0%	2	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Empalme RPN°126	30,39	01/11/2007	30/05/2010	165.845	36.250.000	36.250.000	16.584.539	0%	0%	2	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RP N°126 - Empalme RNN°117	27,63	01/11/2007	30/05/2010	128.200	36.250.000	36.250.000	12.820.000	0%	0%	2	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Empalme RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8,04	01/11/2007	30/05/2010	63.599	6.000.000	6.000.000	0	0%	0%	2	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	4,00	01/11/2007	30/05/2008	10.000	2.082.000	2.082.000	0	0%	0%	2	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalacion Acceso a Los Alisos		5,00	01/11/2007	30/10/2008	10.000	74.000	1	0	0%	0%	0	
						Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración					3.123.714	506.986.000	498.909.102	313.974.031				
Obras por Convenio con Provincias																		
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		400,00	01/01/2007	31/12/2007	10.275	4.286.000	1.540.110	1.438.314	25%	67%	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A Jague y B:Acc a Alto Jague	39,00	04/06/1999	30/11/2008	67.373	7.845.000	18.235.829	18.235.828	8%	63%	6	A
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	30,00	17/05/1999	12/02/2008	99.657	12.787.000	8.039.614	8.039.613	0%	22%	6	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas	46,09	17/05/1999	14/03/2008	78.886	18.001.000	33.002.880	33.002.879	0%	66%	6	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras	25,00	05/07/1999	02/12/2007	38.151	3.733.000	15.395.198	15.395.197	1%	68%	6	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	27,88	10/05/1999	07/03/2008	65.261	7.686.000	8.888.456	8.888.447	5%	28%	6	A
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	29,61	15/09/1999	11/11/2008	241.392	15.206.000	1	0	0%	0%	14	
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - Ruta Nac. N° 75 - Pampa de la Viuda	16,65	01/07/1999	30/04/2007	45.524	3.748.000	10.624.657	10.624.656	0%	92%	7	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	22,86	03/05/1999	30/12/2006	27.530	794.000	1.759.461	1.759.460	0%	100%	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	Arroyo Uruguay - I - Deseado	45,00	01/05/1992	29/03/2000	32.610	2.206.000	1	0	0%	88%	7	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua	30,00	15/06/1999	11/06/2008	21.335	1.203.000	5.487.671	5.487.670	10%	35%	6	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	40,00	19/02/2001	20/07/2004	28.306	40.000	40.000	0	0%	100%	8	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	47,42	20/09/1993	18/03/2007	47.155	52.000	52.001	0	0%	99%	7	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala - Empalme 52/Perico-Jujuy/Empalme 9 - Limite con	267,00	08/09/2000	08/03/2004	208.395	6.081.000	6.081.000	914.494	0%	97%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Sto.Domingo)	24,04	07/07/1999	02/02/2007	4.309	268.000	1	0	0%	88%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martin (R.N. N°3) - 1° Etapa	6,40	26/09/2005	25/09/2007	98.654	15.270.000	16.893.784	11.893.783	2%	89%	6	A-C
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	0,14	13/10/2004	13/04/2006	12.688	228.000	45.726	45.724	0%	91%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	22,90	20/11/2000	19/10/2004	11.890	1.478.000	979.014	979.013	0%	100%	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Empalme RN N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	11,00	25/02/1997	31/08/2000	15.305	0	11.001	0	0%	95%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Empalme RP N° 286 - Límite con Chaco	Sección I km. 862,31 - 912,02 DNU	49,71	01/09/2005	30/08/2008	99.265	521.000	37.270.969	32.113.158	20%	51%	6	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Empalme RP N° 286 - Límite con Chaco	Sección II km. 912,02 - 941,20 DNU	29,18	25/08/2006	24/11/2007	52.787	809.000	31.127.410	29.772.771	18%	86%	6	
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Rio Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 10,125 - km 29,395	19,27	01/11/2007	30/10/2009	37.564	96.000	1	0	0%	0%	0	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	Km 0 - km 32,05	32,05	24/09/2001	24/03/2007	64.295	2.546.000	14.546.000	3.255.031	0%	100%	7	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	46,43	04/10/2004	03/01/2006	18.036	217.000	1	0	0%	100%	8	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	30,00	19/08/2003	16/02/2007	83.842	26.239.000	26.239.000	6.882.803	0%	100%	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - Km 105 (Sección I)	28,20	01/12/2004	28/02/2007	25.520	3.145.000	54.142.353	4.623.451	0%	99%	7	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	29,00	23/03/2006	21/09/2007	29.154	8.125.000	10.931.315	12.009.816	10%	77%	6	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mexía - Km 137 - Km 181 (Sección	43,97	21/03/2006	19/03/2008	35.778	3.934.000	3.934.000	11.451.744	13%	57%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	19,59	23/03/2006	21/09/2007	20.737	3.285.000	3.285.000	8.143.479	12%	78%	6	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	23,85	23/03/2006	21/09/2007	21.728	3.468.000	3.468.000	8.754.699	3%	71%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	43,81	01/02/2007	30/01/2009	56.498	589.000	589.000	18.229.041	11%	39%	6	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	72,00	23/03/2006	21/03/2009	90.999	4.403.000	9.403.000	22.415.287	5%	42%	6	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 340-km 410	70,00	01/11/2007	30/10/2009	60.000	229.000	229.000	0	0%	0%	0	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537	126,70	01/11/2007	01/05/2010	110.000	420.000	420.000	0	0%	0%	0	
22	3	87	51	NEUQUEN	231	Aduana - Límite con Chile		7,00	17/04/2007	16/03/2008	5.500	42.000	1	0	17%	30%	6	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián	km 1970,40 - km 2026	55,60	06/01/2007	04/01/2009	107.720	331.000	42.812.044	42.812.043	0%	12%	6	A
22	3	89	51	SANTA CRUZ	P15	RPN° 11(En Calafate) - Paso Zamora		58,00	01/11/2007	30/10/2009	116.000	295.000	1	0	0%	0%	0	
						Total Obras por Convenio con Provincias					2.190.119	159.606.000	365.473.500	317.168.401				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas												
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	200,00	01/01/2007	31/12/2007	30.019	1.129.000	39.547.272	35.974.811	25%	67%	6	B
22	4	2	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - IIa y IIb (km 485 - km 522)	51,07	08/01/2007	06/01/2009	42.668	444.000	2.591.957	1.815.251	7%	16%	6	
22	4	2		LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	I y II (Km 485 - Km 522)	44,00	01/11/1996	01/04/2003	3.845				0%	100%	10	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde RN N°237	Variante Paso por Bariloche	14,73	14/10/1999	31/05/2007	17.633	3.397.000	3.397.000	954.088	0%	95%	7	
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco Secciones I y II	S I: S Roque -pr 22,82 ; S II: p 22,82 -Huaco	41,45	01/11/2007	31/05/2009	78.815	313.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Puente sobre Río Salado	6,72	22/10/1996	20/12/2003	3.045	0	63.361	0	0%	100%	7	
22	4	22	51	FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (Paso Garibaldi)	11,52	01/02/1999	30/01/2004	16.289	100.000	1	0	0%	99%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	9,40	16/05/2005	31/12/2007	53.634	0	270.257	270.256	10%	98%	6	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km. 29,2 - Km. 37,86	8,66	30/09/2005	29/04/2008	199.884	368.000	6.368.000	0	9%	77%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - Km 46,3	8,44	09/09/2005	08/02/2008	116.028	133.000	88.249.727	17.225.070	13%	90%	6	
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	6,83	12/04/2005	31/12/2007	27.830	21.038.000	22.000.000	63.924.182	7%	71%	6	C
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	22,30	01/11/2007	30/10/2009	56.000	11.422.000	8.396.222	37.496.696	0%	0%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1909	41,60	01/11/2007	30/10/2009	106.000	4.275.000	7.027.021	7.027.020	0%	0%	0	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Límite con Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	0,50	01/10/2003	31/05/2006	22.803	214.000	1	0	0%	100%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	P23	Puente sobre Río Las Vueltas - El Chaltén; Acceso a Bahía Túnel	Inter. R.P.N° 23 - Bahía Túnel	20,51	27/09/2006	26/09/2007	31.253	382.000	1	0	0%	42%	6	S/D
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección II)	km 78 - Perito Moreno	90,00	10/11/2003	08/01/2006	39.924	897.000	1	0	0%	0%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sección I)	Las Heras - Km 78	78,00	24/09/2003	23/04/2006	34.798	100.000	18.673.798	14.573.793	0%	100%	7	
22	4	37	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		67,21			53.585	832.000	1	0	0%	0%	12	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sección III)	Acc a Concep-Acc a Monteros y Acc a Concep	26,60	01/11/2007	30/05/2009	152.700	725.000	1	0	0%	0%	3	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Empalme RNN° 38 (Actual)	20,00	15/10/2004	31/07/2007	86.183	1.116.000	1	0	3%	93%	7	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		5,00	01/11/2007	01/05/2009	19.000	77.000	17.300.001	0	0%	0%	0	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite con Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	67,51	17/11/2006	15/11/2009	111.058	3.820.000	28.820.000	7.898.262	3%	9%	6	A
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	10,00	01/11/2003	31/08/2007	38.656	94.000	1	0	0%	95%	7	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puesto - Río La Troya	9,34	08/09/2003	07/10/2005	7.038	681.000	7.236.789	6.657.386	0%	100%	8	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	3,23	14/05/2004	13/05/2005	13.072	2.343.000	7.413.053	7.413.050	0%	94%	7	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-	107,54	01/02/2001	30/11/2008	261.857	589.000	1	0	1%	87%	6	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	187,00	18/05/2003	31/12/2007	498.569	856.000	1.311.726	1.311.724	1%	99%	6	A
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme RN N° 127	Km. 489,25 - Km. 500,59	11,34	09/09/2003	08/10/2004	7.653	22.980.000	23.959.221	10.153.435	0%	100%	8	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	11,00	18/03/2004	17/08/2006	10.501	6.734.000	64.699.941	31.133.543	0%	100%	8	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Empalme RN N° 231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	25,90	08/10/2004	07/04/2009	56.333	100.000	1	0	0%	11%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Av Circunvalación Caleta Olivia	6,00	01/09/2006	30/08/2009	152.163	276.000	65.983	65.982	1%	14%	6	A
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	54,62	20/01/2004	20/07/2005	13.868	8.073.000	1	0	0%	100%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Empalme RP N° 10 - Santa Isabel	II a: Km 58,70 y II b: (Parcial) Km 0,00 - Km 11,077	14,40	08/10/2004	08/04/2006	1.291	244.000	11.958.923	11.958.922	0%	100%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av Juan Marana hasta calle Mendoza	6,00	02/09/2005	03/05/2007	25.022	48.000	1	0	0%	94%	7	
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite con Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	3,00	03/06/2003	02/12/2003	4.717	1.039.000	209.676	209.675	0%	95%	8	
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	48,00	15/10/2003	13/12/2004	15.758	3.144.000	9.497.433	9.497.432	0%	100%	8	
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Puente sobre Río Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	0,46	01/11/2007	01/05/2009	2.782	100.000	100.000	0	0%	0%	0	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé -	1,00	01/06/2007	30/08/2008	9.575	100.000	1	0	7%	7%	6	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	7,40	10/03/2004	08/11/2007	29.328	11.000	1	0	12%	60%	6	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	4,70	18/11/2003	17/05/2009	62.265	83.000	1	0	4%	98%	6	C
22	4	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	2,90	18/11/2003	17/12/2007	50.480	3.511.000	3.419.583	2.262.482	4%	97%	6	
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN° 29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	1,87	20/07/2004	20/05/2005	3.497	637.000	8.637.000	5.109.856	0%	92%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	3,49	01/01/2003	30/11/2003	6.541	1.380.000	8.380.000	5.878.608	0%	87%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km. 1473,00 - Km. 1503,10	30,00	14/10/2004	13/12/2006	23.840	272.000	2.272.000	0	0%	100%	7	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a P. Del Mortero	25,00	14/10/2004	13/10/2006	34.499	847.000	1	0	0%	100%	8	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	27,25	14/10/2004	14/04/2007	37.490	931.000	94.433.712	157.368.852	0%	100%	7	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	28,00	13/10/2004	13/04/2007	38.556	314.000	314.000	0	0%	96%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ingeniero Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ingeniero Juarez	44,89	13/10/2004	12/10/2007	50.530	2.549.000	2.549.000	0	18%	85%	6	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ingeniero Juarez - Limite con Salta	Sección I: Ingeniero Juarez - km 25,5	24,40	29/11/2006	28/11/2007	47.363	6.071.000	6.071.000	0	2%	98%	6	
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ingeniero Juarez - Limite con Salta	Sección I: Ingeniero Juarez - km 25,5	24,40	13/10/2004	13/05/2006	14.374	16.817.000	16.817.000	0	0%	100%	10	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	km 25,5 - Limite con Salta	27,00	10/10/2006	08/10/2008	40.949	9.711.000	9.711.000	0	20%	94%	6	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	km 25,5 - Limite con Salta	25,50	13/10/2004	14/03/2006	9.950	10.289.000	10.289.000	0	0%	100%	10	
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Limite con Formosa - Los Blancos - Sección VI	29,39	15/07/2005	14/10/2007	32.385	8.768.000	8.768.000	0	20%	98%	6	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Sección V	30,00	07/06/2005	30/11/2008	25.178	6.259.000	6.259.000	0	15%	98%	6	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Pluma de Pato-Coronel Juan Solá - Sección IV	31,13	12/07/2005	11/07/2007	29.153	8.004.000	8.004.000	0	4%	97%	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Pluma de Pato - Empalme RN N° 34 (Sección III)	30,00	01/04/2006	31/03/2007	13.666	4.635.000	4.635.000	0	0%	99%	7	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Pluma de Pato - Empalme RN N° 34 (Sec.II)	30,00	15/04/2006	14/04/2007	20.971	8.028.000	8.028.000	0	0%	100%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RN N° 34	Pluma de Pato - Empalme RN N° 34 (Sec.I)	30,00	15/04/2006	14/04/2007	21.398	8.072.000	8.072.000	0	0%	100%	8	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Empalme RP N° 436 (Quebr.de Las Burras) - Empalme RP	16,00	05/05/2004	04/04/2005	5.454	101.000	1	0	0%	99%	7	
22	4	66	51	FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	25,00	16/04/2004	15/04/2006	52.151	1.976.000	8.976.000	1.551.855	0%	74%	7	
22	4	67	51	FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	23,00	22/10/2004	20/02/2007	37.637	317.000	16.317.000	8.989.917	0%	100%	8	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RP N° 5		8,00	29/05/2003	26/12/2004	9.402	98.000	98.000	0	0%	100%	7	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla		14,51	28/10/2003	31/12/2007	43.296	427.000	427.000	0	0%	56%	6	S/D
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	29,00	12/11/2003	31/12/2007	95.048	5.313.000	12.813.000	2.443.763	0%	68%	6	C
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	48,92	16/02/2004	14/02/2007	80.693	7.047.000	14.603.390	11.719.210	0%	84%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme RP N° 11	Sección I: Tres Lagos - km 50	50,14	27/05/2004	31/12/2007	66.068	6.807.000	14.307.000	1.392.842		95%	6	S/D
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme RP N° 11	Sección III: km 86 - Empalme RPN°11 (Prog. 86 - Prog.	42,30	27/05/2004	25/12/2007	63.914	4.285.000	15.785.000	12.611.038		91%	6	S/D
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme RP N° 11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	34,00	22/11/2003	31/12/2007	32.190	686.000	686.000	0		88%	6	S/D
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme RP N° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Empalme RPN° 11	28,40	07/02/2003	07/06/2004	37.081	100.000	1.043.610	0	0%	100%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		40,28	27/10/2000	25/12/2004	66.317	100.000	100.000	0	0%	80%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Puente sobre Río Turbio	Km 2839,55 - Km 2872,18	25,00	02/05/2000	30/10/2004	28.335	1.098.000	1.098.000	0	0%	96%	7	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Puente sobre Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	7,49	22/08/2001	21/05/2004	20.383	100.000	1	0	0%	93%	7	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km. 380 - Km. 390,5	15,00	01/02/2006	02/06/2007	67.006	19.288.000	34.565.374	26.293.626	1%	100%	8	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo	90,95	17/04/2006	15/04/2008	337.139	226.963.000	298.987.872	193.682.764	13%	57%	6	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	63,00	16/05/2006	14/05/2008	361.816	307.858.000	1	0	6%	24%	6	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RNN°9 Actual	45,00	01/11/2007	30/05/2009	323.703	82.206.000	1	0	0%	0%	2	
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc IV: Int. Con R.N. N°9 Actual - Empalme RN. N° 178	36,00	15/11/2006	13/11/2008	248.500	4.008.000	0	675.000	9%	20%	6	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc V: Empalme RN N° 178 - Carcaraña	39,60	02/10/2006	30/09/2008	303.405	4.974.000	1	675.000	12%	28%	6	
22	4	83	51	FORMOSA	86	General Belgrano - General Güemes	km 1432,18 - km 1487,81	55,63	01/11/2007	30/10/2011	45.600	174.000	11.960.709	11.373.585	0%	0%	0	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Empalme R.N. N° 81 - Limite con Chaco- Sección I	Lte. C/Chaco- Prog 29,800	29,80	14/05/2007	12/05/2009	98.554	89.000	27.143.193	26.522.016	10%	13%	6	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Empalme RN N° 81 - Limite Con Chaco - Sección II	PROG KM. 29,800 - Empalme R.n. N° 81	29,80	09/05/2006	07/05/2008	83.905	76.000	0	0	13%	54%	6	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Empalme RN N° 34		31,00	01/11/2007	30/10/2009	30.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Límite Santa Fe - Bandera	Km.180,79 - Km.226,67	46,08	21/02/2006	21/04/2008	76.612	4.269.000	24.329.299	24.329.292	15%	51%	6	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - Km 393 - Km 445	52,00	01/11/2007	30/10/2009	70.000	267.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (S III)	Sección III Km 445 - Km 502	57,00	01/11/2007	30/10/2009	70.000	267.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		221,00	01/11/2007	29/03/2012	193.000	232.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		6,00	01/11/2007	30/10/2008	4.400	34.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	7,00	17/09/2001	15/11/2004	21.266	100.000	1	0	0%	80%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ Cdad Rafaela - Cr.Urbano por la Cdad de	Km 217 - Km 225	8,00	03/08/2005	02/08/2008	44.244	13.987.000	13.987.000	8.964.329	12%	71%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	42,00	01/11/2007	30/05/2010	70.400	153.000	1	0	0%	0%	0	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte Luis Piedrabuena	111,70	15/09/2005	14/09/2007	85.060	8.259.000	118.432.195	81.389.522	0%	66%	6	S/D
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	118,00	15/09/2005	15/03/2008	112.949	22.210.000	560.570	0	1%	95%	6	A
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	112,00	03/12/2005	01/12/2008	112.259	20.384.000	5.382.749	0	0%	50%	6	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	40,00	24/11/2006	24/05/2009	96.967	250.000	1.429.010	1.429.009	0%	5%	6	S/D
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles(RPN° 39) - Río Olmie- Km. 2189,52 - Km.	28,34	01/03/2007	29/08/2008	55.200	90.000	27.867.946	8.051.592	0%	18%	6	S/D
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olmie - Las Horquetas -Sec. I - II - Km 2215,91 - Km.	72,85	15/04/2007	13/04/2009	110.626	154.000	154.000	3.655.502	0%	4%	6	S/D
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acc. Pte. S/Río Chico - Km. 2289,64 - Km.	55,35	15/09/2006	15/03/2009	80.201	75.000	675.000	13.176.731	0%	24%	6	S/D
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Acc.Pte s/Río Chico- Gdor. Gregores- Sec. I/II -S/RPN° 25	66,50	01/11/2007	30/05/2009	65.000	229.000	229.000	0	0%	0%	0	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II- Sobre RPN° 29	57,00	01/11/2007	30/05/2009	55.000	178.000	178.000	0	0%	0%	0	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel- Tres Lagos -Sección I-II-III y Acceso Tres	116,81	01/11/2007	30/05/2010	115.000	438.000	438.000	0	0%	0%	0	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Empalme RPN°25 - Pico Truncado	Km. 245,00 - Pico Truncado	105,00	06/01/2007	04/01/2009	123.783	264.000	114.318.694	114.318.153	0%	23%	6	A
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Empalme RPN°25 - Pico Truncado	Emp RP N° 25 - Km 245,00	204,00	30/12/2004	31/12/2007	102.677				0%	88%	6	S/D
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	13,19	19/01/2006	12/01/2008	37.742	3.069.000						

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas					7.321.725	944.867.000	1.351.972.117	998.687.941				
Obras por Concesión sin Peaje COT																		
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. C/Paraguay	297,28	01/06/1998	28/05/2011	170.700	33.719.000	24.719.000	10.376.172	2%	62%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahia Blanca - Empalme R.N.N° 5	329,21	02/02/1998	29/01/2011	162.439	15.517.000	15.742.659	10.600.042	2%	67%	6	
						Total Obras por Concesión sin Peaje COT					333.139	49.236.000	40.461.659	20.976.214				
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																		
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	30,00	01/11/2007	30/10/2008	3.300	36.000		1	0	0%	0%	0
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) metros	Prog. 735,68	30,00	01/11/2007	01/04/2008	1.500	23.000		1	0	0%	0%	0
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	150,00	01/11/2007	30/10/2008	6.700	34.000		1	0	0%	0%	0
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	200,00	23/08/2002	22/04/2004	6.344	130.000		1	0	0%	100%	7
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	200,00	29/01/2003	29/07/2004	8.112	100.000		1	0	0%	100%	8
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		80,00	01/11/2007	30/10/2008	1.175	9.000		1	0	0%	0%	0
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	200,00	24/01/2003	24/11/2003	12.406	100.000		1	0	0%	67%	8
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	90,00	28/06/2005	31/12/2007	17.989	3.008.000	5.394.800	5.394.799	0%	80%	6	S/D
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.700	13.000		1	0	0%	0%	0
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.200	9.000		1	0	0%	0%	0
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	37,00	01/11/2007	30/10/2008	1.300	10.000		1	0	0%	0%	0
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	37,00	01/11/2007	30/01/2009	1.250	10.000		1	0	0%	0%	0
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	80,00	01/11/2007	01/05/2009	2.400	12.000		1	0	0%	0%	0
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	43,00	01/11/2007	30/10/2008	1.470	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	32,00	01/11/2007	30/10/2008	1.140	9.000		1	0	0%	0%	0
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	32,00	01/11/2007	30/10/2008	1.460	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.170	9.000		1	0	0%	0%	0
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	22	51	CORDOBA	9	EmpalmeRPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	23	51	LA RIOJA	40N	Chilecito - Pitui (Pte. s/Río Capayán)	Prog. 600,42	30,00	01/11/2007	30/01/2009	4.700	24.000		1	0	0%	0%	0
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	80,00	01/11/2007	30/01/2009	2.100	16.000		1	0	0%	0%	0
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte S/Río Alumine)	30,00	01/11/2007	30/05/2009	18.487	42.000		1	0	0%	0%	2
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	50,00	01/11/2007	30/10/2008	1.900	15.000		1	0	0%	0%	0
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		90,00	01/11/2007	30/10/2008	3.000	23.000		1	0	0%	0%	2
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	330,00	12/09/2006	12/03/2008	15.528	60.000	3.223.496	3.223.494	19%	34%	6	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	60,00	01/11/2007	30/10/2008	1.800	14.000		1	0	0%	0%	0
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	90,00	01/11/2007	01/05/2009	3.300	25.000		1	0	0%	0%	0
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.300	5.000		1	0	0%	0%	0
22	6	35	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Taboada (Pte. s/Río Salado)	Prog. 492,54	100,00	01/11/2007	30/10/2009	4.500	34.000		1	0	0%	0%	0
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y	1200,00	01/07/2005	30/12/2007	13.909	11.699.000	4.937.934	4.937.932	19%	80%	6	
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		20,00	29/08/2003	28/07/2004	10.687	100.000	100.000		0	0%	98%	7
22	6	38	51	ENTRE RIOS	12	Puente s/Río Guayquiraró		108,00	01/11/2007	01/05/2009	3.500	27.000		1	0	0%	0%	0
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	39,00	01/11/2007	30/10/2008	1.400	7.000		1	0	0%	0%	0
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	126,00	07/03/2007	05/03/2009	26.290	66.000	1.118.552	1.118.551	9%	12%	6	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	310,00	01/11/2007	29/11/2008	20.297	65.000		1	0	0%	0%	2
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	60,00	01/11/2007	30/10/2008	1.500	23.000		1	0	0%	0%	0
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	80,00	01/11/2007	01/05/2009	2.000	15.000		1	0	0%	0%	0
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Empalme RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	70,00	01/11/2007	30/10/2008	1.200	8.000		1	0	0%	0%	0
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	20,00	01/11/2007	30/10/2008	1.350	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	30,00	01/11/2007	30/10/2008	1.500	11.000		1	0	0%	0%	0
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	70,00	27/06/2006	26/12/2007	15.611	229.000	3.925.843	3.547.105	20%	79%	6	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	60,00	01/11/2007	30/10/2008	3.800	58.000		1	0	0%	0%	0
22	6	50	51	CORDOBA	-----	Nuvo Puente s/Río IV		50,00	01/11/2007	30/10/2009	17.000	345.000		1	0	0%	0%	0
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta.. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclín	100,00	01/11/2007	30/10/2008	2.500	19.000		1	0	0%	0%	0
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte.S/ FF.CC. Belgrano,S/ A° del Zanjón,S/Río Negro	400,00	01/11/2007	30/10/2009	50.000	153.000		1	0	0%	0%	0
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		200,00	01/11/2007	01/05/2009	30.000	416.000	333.001		0	0%	0%	0
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km.)	50,00	01/11/2007	01/05/2009	9.600	73.000		1	0	0%	0%	0
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	km. 97,77	30,00	01/11/2007	01/05/2009	13.600	104.000		1	0	0%	0%	0

Datos de obra													Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo		Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco			30,00	01/11/2007	30/10/2008	4.000	8.000	1	0	0%	0%	0		
						Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes						361.475	17.262.000	19.033.669	18.221.881					
Obras en Corredores Viales Concesionados																				
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - EmpalmeRNN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4		57,40	15/07/2004	13/01/2005	8.823	211.000	12.211.000	0	0%	98%	7		
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp.RPN° 6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118		33,08	05/08/2004	03/02/2005	6.855	236.000	236.000	0	0%	97%	7		
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - EmpalmeRPN° 61	km 118 - km 156		38,00	27/01/2006	28/03/2007	14.698	834.000	834.000	5.500.377	0%	100%	7		
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-	km 500 - km 539		39,00	20/07/2004	19/12/2004	12.738	100.000	8.100.000	0	0%	100%	8		
22	7	2	52	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11A - Salida Mercedes - Pehuajó	km 107 - km 120 / km 330 - km 334		17,00	13/08/2004	12/12/2004	1.861	650.000	650.000	0	0%	11%	10		
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480		33,00	04/10/2004	03/10/2005	17.420	100.000	100.000	621.456	0%	100%	8		
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme RPN° 3 - Empalme RNN° 35	km 568 - km 606,65		39,00	08/10/2004	08/06/2005	13.940	875.000	875.000	0	0%	96%	7		
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106		29,00	23/07/2004	21/09/2006	15.086	673.000	5.983.168	0	0%	100%	8		
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN° 191 - RNN° A012	km 188 - km 278		90,00	23/07/2004	22/04/2005	46.473	2.222.000	2.222.000	0	0%	100%	8		
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN° 11	km 0 - km 12		12,00	28/09/2005	29/05/2006	10.418	55.000	55.000	0	0%	100%	8		
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Empalme RNN° 9	km 0 - km 42		42,00	20/07/2004	19/04/2005	6.704	470.000	470.000	0	0%	100%	8		
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN° 168 - Empalme RPN° 39	km 476 - km 607		131,00	04/01/2006	04/10/2006	7.637	1.000	1.000	311.167	0%	100%	8		
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme RPN° 38 - Empalme RPN° 98	km 684 - km 720		36,00	05/08/2004	04/12/2004	2.566	100.000	100.000	0	0%	100%	8		
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN° 40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787		50,00	06/12/2005	06/08/2006	24.037	1.249.000	1.249.000	865.030	0%	100%	8		
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163		70,00	05/08/2004	05/05/2005	20.732	100.000	100.000	0	0%	100%	7		
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN° 101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-		63,00	05/08/2004	05/06/2005	16.386	100.000	100.000	0	0%	100%	7		
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN° 8	km 535,55 - km 631		95,45	23/11/2004	23/12/2005	17.560	100.000	18.580.706						

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
Obras en Circuitos Turísticos																		
22	8	1	51	MISIONES	-----	Corredor de las Misiones		-	01/11/2007	30/10/2009	9.000	3.000.000	0	0	0%	0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO	-----	Corredor de los Lagos		-	01/11/2007	30/10/2010	35.000	11.166.000	1.166.000	0	0%	0%	0	
Total Obras en Circuitos Turísticos											44.000	14.166.000	1.166.000	0				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																		
22	9	1	51	JUJUY	73 - 83	Quebrada de Humahuaca - Parque Nacional Calilegua		69,00	01/11/2007	29/06/2010	12.000	46.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Corredor Minero		250,00	01/11/2007	01/05/2011	18.000	69.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro		59,00	01/11/2007	30/10/2010	7.000	53.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	3	Enlace con Ruta 21 y RNN° 226 - Olavarría - Azul		40,00	01/11/2007	29/06/2009	73.013	198.000	1	0	0%	0%	1	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		220,00	01/11/2007	30/10/2011	47.800	122.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		32,00	01/11/2007	30/10/2009	7.500	781.000	625.001	0	0%	0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		35,00	01/10/2007	29/09/2009	10.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-		160,00	01/10/2007	29/09/2011	73.000	1.111.000	889.001	0	0%	0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SI	La Dársena - Angastaco	43,00	01/11/2007	30/10/2009	120.000	43.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	39,00	01/11/2007	30/10/2009	120.000	38.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantas	16,00	01/11/2007	30/10/2008	48.000	23.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantas - Cachi	28,00	01/11/2007	30/10/2009	90.000	37.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		100,00	01/11/2007	30/10/2010	100.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		-	01/11/2007	30/10/2009	40.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	15	51	MISIONES	14	Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		4,00	01/11/2007	31/08/2008	5.500	28.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		0,50	01/11/2007	01/05/2008	3.000	25.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp RPN° 63 - Emp RN N° 11 (PROG 0 - PROG 7,6)	7,27	18/10/2006	16/10/2008	47.499	111.000	20.834.596	17.410.788	9%	34%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp Av Sarmiento - Emp RN N° 11 (Prog 7,6 - Prog 13)	5,40	18/10/2006	16/10/2008	35.025				10%	32%	6	
22	9	18	51	CHACO	16	Empalme RNN 95 - Calle 128 - Paso por la ciudad de Roque		5,00	01/06/2007	30/05/2009	46.083	38.000	4.608.267	4.608.265	2%	2%	6	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		77,00	01/10/2007	29/09/2009	40.000	157.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		50,00	01/11/2007	30/10/2010	150.000	95.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	7,20	02/11/2007	31/10/2009	67.426	118.000	1	0	0%	0%	1	
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Pque.Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao		80,00	01/11/2007	30/10/2009	50.000	38.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		25,00	01/11/2007	30/08/2009	80.000	306.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo		0,18	01/11/2007	30/10/2008	8.000	82.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Empalme RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Empalme RNN° 89 - Cem. Parque Jazmín	16,90	01/11/2007	30/10/2009	80.000	625.000	0	0	0%	0%	2	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (SII)	Cementerio - Autódromo y accesos	10,60	01/11/2007	30/10/2009	50.000	306.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (SIII)	Autódromo Yaco Guarneri - Acc. M. Belén	14,70	01/11/2007	30/10/2009	70.000	229.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	27	51	CHACO	P12	Obras Empalme Ruta Provincial 12		-	01/11/2007	30/10/2010	17.000	233.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		12,04	01/11/2007	29/10/2012	200.000	1.184.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai		513,00	01/11/2007	29/10/2012	5.000	155.000	125.001	0	0%	0%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S II)	Seccion II	58,52	01/11/2007	29/10/2012	150.000	693.000	554.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III)	Sección III	79,25	01/11/2007	29/10/2012	210.000	852.000	682.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S IV)	Sección IV	55,00	01/11/2007	29/10/2012	150.000	648.000	518.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S V)	Seccion V	61,00	01/11/2007	29/10/2012	180.000	649.000	519.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	56	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VI)	Sección VI	74,60	01/11/2007	29/10/2012	210.000	791.000	633.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	57	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII)	Sección II	64,00	01/11/2007	29/10/2012	180.000	692.000	554.000	0	0%	0%	0	
22	9	29	58	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	64,59	01/11/2007	29/10/2012	180.000	670.000	536.000	0	0%	0%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa		0,12	01/11/2007	30/10/2008	50.000	38.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		0,20	01/11/2007	30/10/2008	6.000	46.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		0,16	01/11/2007	30/10/2008	7.000	38.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 (Emp RNN 40) - Cholila	Km 0 - Km 30	30,00	15/12/2005	14/12/2007	23.202	7.230.000	4.493.604	4.493.602	1%	46%	6	
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Empalme RN N° 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As	Km 6,074 - Km 18,175 (1S40)-Km 0,00 - Km 28,896 (P70)-	44,84	22/11/2005	21/11/2007	31.571	8.813.000	11.145.761	11.145.757	2%	73%	6	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Empalme R.N. N° 40	1ra. Sección Km 0 - Km 30	30,00	01/02/2006	31/01/2008	36.641	3.963.000	13.914.892	11.789.554	2%	49%	6	
22	9	36	51	CHUBUT		Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel	KM. 9,14 - KM. 15,45 (Pte. s/A° Seco)	6,31	01/04/2007	30/03/2008	15.905	28.000	2.486.008	2.486.005	6%	12%	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Limite c/Catamarca km 154		154,00	01/11/2007	30/10/2010	70.000	126.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		185,00	01/11/2007	30/10/2011	300.000	1.782.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		16,00	01/11/2007	30/10/2009	50.000	244.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - EmpalmeR.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	2,00	27/01/2006	27/12/2006	2.649	262.000	1	0	0%	100%	8	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		-	01/11/2007	30/10/2009	10.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de		-	01/11/2007	01/05/2009	5.000	84.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		79,00	01/11/2007	01/05/2009	40.000	95.000	1	0	0%	0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	9	45	51	CORDOBA	36	RNN° 36 - Prolongación		-	01/11/2007	30/10/2009	10.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		0,60	01/11/2007	30/10/2010	26.000	99.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	47	51	ENTRE RIOS	14	Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador		1,00	01/11/2007	30/10/2010	33.000	126.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Pte S Juan, Rosario Sta Fé, Damas Patricias en General Roca		0,20	01/11/2007	30/10/2010	7.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande		0,50	01/11/2007	30/01/2010	5.000	38.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en 30 km RNN° 151 Barda del Medio		0,50	01/11/2007	30/01/2008	3.500	45.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte Luis Piedrabuena - Ea La Julia	73,24	01/03/2007	27/02/2010	225.760	1.146.000	53.378.879	53.378.878	1%	5%	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno-Bajo Caracoles,Chimen Aike,Punta Loyola,Carrera-		119,00	01/11/2007	30/10/2010	60.000	153.000	35.801.248	35.801.246	0%	0%	0	
22	9	54	51	SANTA CRUZ	40	Tres Lagos - Ruta 11 / Tres Lagos - La Leona		51,00	01/11/2007	30/10/2009	29.000	111.000	1	0	0%	0%	11	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Empalme RNN°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	2,20	01/03/2006	30/10/2007	19.468	3.214.000	10.331.058	10.331.057	11%	95%	6	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Empalme RP N°19		31,00	22/03/2006	20/03/2009	83.775	158.000	38.950.661	38.950.659	13%	87%	6	
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza		0,10	01/11/2007	02/03/2007	2.750	20.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Rio de la Plata		6,00	01/11/2007	30/10/2009	20.000	102.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	S/N	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	7,20	20/04/2006	19/05/2008	60.090	4.961.000	15.482.517	11.180.781	21%	56%	6	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Av. Juan XXIII y Acc.a Parque. Ind. Chacabuco		2,80	01/11/2006	31/10/2007	13.659	285.000	5.514.771	5.514.761	25%	59%	6	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral Belgrano	Partido de Berazategui	4,60	24/02/2006	25/10/2007	44.279	3.027.000	17.343.000	15.300.805	13%	75%	6	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autp. Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	2,60	24/01/2005	23/02/2007	25.238	843.000	7.789.706	7.789.696	0%	100%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,IV,V- DNU	10,73	15/03/2007	13/03/2009	50.430	139.000	14.439.533	12.081.513	6%	11%	6	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	2,54	01/10/2007	29/09/2008	6.000	10.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Empl Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	16,24	01/10/2007	31/03/2009	50.000	41.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	RPN° 33, Puente s/Rio del Valle - Puentes/Rio	4,74	01/10/2007	31/03/2009	13.000	25.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Paso San Francisco- Quebrada de las Angosturas		5,98	01/11/2007	30/08/2009	30.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	66	51	CHACO	12	Charata - Empalme R.P.N° 6		86,00	01/11/2007	30/10/2010	200.000	55.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		0,47	01/11/2007	30/10/2011	36.000	92.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque		-	01/11/2007	30/10/2009	4.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Empalme RN N°40 - Gualjaina	RN N°40 - KM 27,00	27,00	01/02/2007	30/01/2009	37.643	64.963	9.415.110	9.207.833	4%	20%	6	
22	9	71	52	CHUBUT	P12	Empalme RPN° 14 (Gualjaina)- Empalme RNN° 40- Sec. II	km 27 - km 62	35,00	01/10/2007	29/09/2009	45.000	112.037	0	0	0%	0%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Corcovado - Trevelin	Sec. I :Km. 0 - Km. 26,28 y Acc. a C. Centinela (Km. 15,24-	31,98	08/03/2007	06/03/2010	54.948	118.000	6.099.674	6.099.674	0%	3%	6	
22	9	72	52	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado - Sección II	km 26,28 - km 62	35,72	01/11/2007	30/10/2009	40.000	132.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Rio Pico - Empalme RN N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2° Seccion	35,00	01/11/2007	29/05/2009	38.692	148.000	1	0	0%	0%	2	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Rio Senguerr - Empalme RP N°20	Km 0 - Km 7,735 (R40) - Km 0 - Km 28,896 (P56) - DNU	39,00	09/03/2006	07/03/2008	28.365	2.938.000	6.563.577	6.563.574	0%	25%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Rio Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		6,40	01/11/2007	30/10/2009	25.000	102.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Empalme RN N°7 - Empalme RN N°8	Puente s/A° El Gato (Km 669,87) - DNU	0,08	27/12/2005	27/04/2006	228	14.000	1	0	0%	100%	8	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río san Antonio en Carlos Paz		0,30	01/09/2006	30/08/2008	10.000	60.000	1	0		14%	6	C
22	9	80	51	CORDOBA	158	Cruce Urbano por Villa Maria		1,00	01/11/2007	01/05/2008	1.000	32.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	81	51	CORDOBA	P10	Lte. C/Ls Pampa - Gral. Levalle	prog. 18.500 - Jovita - Inciso 5	36,20	01/09/2006	30/08/2008	41.141				11%	99%	6	
22	9	82	51	CORDOBA	RPE90	Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Inciso 5	Alcira Gigena - Gral. Cabrera - Dpto Juarez Celman	47,80	15/09/2006	13/09/2008	42.558	122.000	1	0	2%	25%	6	
22	9	83	51	CORDOBA	E57	Intersección RPN°53 - Intersección RNN°38	Intersección RPN°E53 - Prog. 22,900 - INCISO 5	22,90	13/03/2006	11/03/2009	38.361				3%	45%	6	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	1,00	01/11/2007	29/10/2012	530.000	810.000	11.700.001	2.899.278	0%	0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Empalme RN N°81	Km1167 - Km 1184,44 DNU	10,94	23/11/2006	22/11/2007	12.445	81.000	5.041.118	3.409.705	27%	59%	6	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		20,36	01/11/2007	30/08/2009	32.762	150.417	1	0	0%	0%	0	
22	9	88	51	FORMOSA	86	Mision Tacaagle - RN N°95	Empalme RN N°22 - Empalme RN N°95 y Acc. A Va. Gral.	29,60	28/11/2006	26/11/2008	46.816	117.583	1	0	16%	36%	6	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Guemes - Fortin Leyes	25,14	07/05/2007	05/05/2009	80.423	153.000	12.842.239	1.805.834	9%	11%	6	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortin Leyes - San Martín 2	25,14	01/11/2007	29/06/2009	83.335	160.000	0	0	0%	0%	0	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	24,77	01/11/2007	30/08/2009	60.329	122.000	0	1.833.826	0%	0%	0	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta a Zalazar	37,48	01/11/2007	30/08/2009	85.815	138.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado		58,00	27/06/2005	26/09/2007	20.521	0	8.312.261	6.512.350	10%	99%	6	A
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Empalme RN N°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	70,00	20/05/2005	18/01/2008	28.652	3.855.000	1.413.159	1.413.158	4%	77%	6	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorriti - Empalme R.N. N°9	8,00	07/08/2006	04/02/2009	77.986	102.000	15.900.820	15.900.813	14%	36%	6	
22	9	93	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra		44,00	01/11/2007	01/05/2009	40.000	102.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Lujan - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destileria YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	5,00	05/02/2007	30/09/2007	617	8.000	607.707	0	0%	98%	6	S/D
22	9	95	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Empalme RN N°7 - Ugarteche	13,60	25/01/2005	31/12/2007	36.540	1.893.000	10.249.921	10.249.910	4%	98%	6	A
22	9	96	51	SANTA FE	A 008	Av. Circunvalación de Rosario		2,80	01/11/2007	30/10/2008	5.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande	20,90	01/11/2007	01/05/2009	25.427	16.445.000	7.156.001	0	0%	0%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	16,84	02/01/2007	31/12/2008	67.458	18.976.000	12.398.909	5.217.907	0%	8%	6	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Seccion III - a	Acc. A Cajon Grande - Lte, c/Chile (Km0 - Km13,6) DNU	13,60	15/01/2007	13/01/2009	59.429	12.820.000	16.254.638	9.456.780	2%	16%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II											6.383.254	109.192.000	386.104.695	322.834.009				

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																		
22	10	1	51	MENDOZA	----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		-	01/11/2007	30/10/2008	25.000	95.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	----	Puente Internacional Encarnacion - Posadas		1,00	01/11/2007	30/10/2010	10.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		2,50	01/11/2007	30/10/2008	1.500	23.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue	Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquen y R° Neuquen	1,00	15/03/2007	14/07/2007	2.189	8.000	1	0	5%	99%	7	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura		5,00	01/11/2007	30/10/2009	20.000	92.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Empalme RN N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Empalme RN N°231 DNU	20,63	21/02/2006	21/08/2008	71.196	18.520.000	13.834.136	13.802.352	0%	32%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen		21,00	01/11/2007	30/05/2009	116.277	76.000	1	0	0%	0%	2	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Empalme RN N°237	Seccion I y II	64,00	01/10/2007	29/09/2010	86.400	176.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Empalme RN N°23 - Norquínco	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	0,06	01/02/2006	01/11/2006	797	27.000	1	0	0%	100%	7	
22	10	11	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche		-	01/10/2007	29/09/2008	1.000	15.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1:Empalme RPN°3- Emp RNN°34	KM 1448 - KM 1462	14,00	18/12/2006	18/10/2007	19.472	621.000	47.527.306	39.760.181	42%	59%	6	
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2: Empalme RPN°3- Emp RNN°34	KM. 1462 - KM. 1478	16,00	07/04/2006	06/09/2007	29.577	16.614.000	1	0	16%	81%	6	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3:Empalme RPN°3- Emp RNN°34	Km 1478 - Km 1500 - DNU	22,00	12/04/2006	11/09/2007	38.183	19.602.000	1	0	26%	86%	6	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Empalme RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez	1,37	01/11/2007	01/05/2009	20.000	38.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Empalme RNN° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	118,89	01/11/2007	30/10/2010	68.000	173.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Empalme R.N. N° 40	48,40	01/10/2007	29/09/2009	90.000	102.000	0	0	0%	0%	0	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN° 40	(Sección II - a 2)	10,00	01/10/2007	29/09/2009	40.000	100.000	0	0	0%	0%	0	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	12,23	01/11/2007	30/05/2010	82.250	72.000	0	0	0%	0%	2	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischyigualasto - RNN° 40	R. Bermejo - EmpalmeRNN ° 40 (Sección III)	34,40	01/11/2007	30/05/2009	71.945	87.000	1	0	0%	0%	2	
22	10	16	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	Puente Pachaco Km. 100	0,10	26/10/2005	26/03/2008	17.933	3.640.000	1	0	0%	25%	6	S/D
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Rio Santa Cruz	0,15	01/11/2007	30/10/2008	5.000	23.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hernandarias		9,00	01/11/2007	30/05/2010	117.781	178.000	14.789.175	14.789.174	0%	0%	2	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Interc.a Guardia- Pte. S/Rio Colastiné	3,50	01/11/2007	27/02/2010	140.269	127.000	1	0	0%	0%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Empalme RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115 - km 146	31,00	01/11/2007	01/03/2011	142.754	229.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Empalme R.N. 34	203-233	30,00	01/11/2007	30/10/2008	20.000	153.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km650 - km655,55	5,50	31/01/2007	02/05/2007	400	8.000	1	0	0%	100%	7	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Rio Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	Rio Parana - Av. Pellegrini - km. 0,00 - Km. 10,125	10,13	13/02/2006	31/01/2008	59.174	9.910.000	28.732.692	28.732.648	3%	66%	6	A
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acc altern transito pesado desde RN N° 9	4,00	01/11/2007	30/10/2009	2.000	31.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	pavim. urbana- 34 arterias urbanas	3,40	01/11/2007	30/10/2009	1.948	29.761	1	0	0%	0%	0	
22	10	30	51	FUEGO	3	Portada Parque Naciona - Bahia Lapataia		16,00	01/11/2007	30/08/2008	20.000	23.239	1	0	0%	0%	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa(Alberdi) - Principio Autopista	Seccion I: Rio Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	19,90	01/10/2007	29/09/2009	130.000	626.000	1	0	0%	0%	2	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	seccion V: Empalme Traza actual - Principio Autopista	12,70	01/03/2007	27/02/2009	105.140	190.000	33.976.164	33.976.163	17%	24%	6	
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro		1,00	01/11/2007	30/10/2009	50.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	1,00	01/11/2007	30/10/2009	6.500	99.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°a015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y RN N°14	1,00	01/11/2007	01/05/2008	653	20.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		46,00	01/11/2007	30/10/2011	30.000	125.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)		0,50	01/10/2007	31/03/2008	2.500	18.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	interseccion RN N°22 y RN N°237	1,50	01/10/2007	31/03/2008	2.500	4.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Interseccion Rot. Av.Fortabat -Rot. Empalme RPN°13	5,13	01/11/2007	30/08/2010	21.687	166.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. S/desvio	2,38	14/11/2006	13/02/2008	29.779	2.393.000	15.022.537	14.421.545	25%	59%	6	
22	10	41	51	FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Yrigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nac.	6,00	01/11/2007	01/05/2009	18.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	42	51	FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Empalme Vte. RNN°3		5,00	01/11/2007	01/05/2009	10.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	43	51	BUENOS AIRES	3	Cañuelas - San Miguel del Monte		25,83	01/11/2007	30/05/2011	40.000	102.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	44	51	BUENOS AIRES	8	Fatima - Arrecifes	Km. 61,90 - Km. 173,77	111,87	01/11/2007	29/10/2012	275.740	527.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	45	51	BUENOS AIRES	8	Arrecifes - Pergamino	Km. 176,70 - Km. 221,37	44,67	01/11/2007	29/10/2012	161.340	308.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km. 64,50 - Km. 72,00	7,50	01/11/2007	30/10/2009	30.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Empalme RPN°51	Seccion I y Seccion II	58,00	01/11/2007	30/10/2010	170.000	183.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Seccion I y Seccion II	47,00	01/10/2007	29/09/2010	130.000	158.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		41,00	01/11/2007	30/07/2010	100.000	322.000	322.000	0	0%	0%	0	
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion I	40,00	01/11/2007	30/07/2010	200.000	172.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion II	40,00	01/11/2007	30/07/2010	200.000	172.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	52	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III	37,00	01/11/2007	30/07/2010	200.000	172.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construccion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	1,00	05/06/2006	04/04/2008	35.563	4.850.000	12.591.489	9.825.478	7%	45%	6	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - EmpalmeR.N.N° 60	Km. 333 - Km374,50 (Sección II)	33,51	19/05/2006	17/11/2007	23.209	215.000	9.340.138	9.340.137	13%	58%	6	
22	10	57	51	SAN LUIS	20	Va. Dolores-Limite Córdoba/San Luis-Quines	Km.198,65- Km. 266,4	67,76	01/11/2007	31/03/2008	20.625	29.000	1	0	0%	0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	10	58	51	CHACO	89	Empalme RNN ° 11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S I	Prog. 0,00 - 22,05	22,00	01/11/2007	30/10/2010	80.000	130.000	104.001	0	0%	0%	0	
22	10	59	51	CHACO	89	Empalme RNN ° 11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S II	Prog. 22,05 - 43,28	22,00	01/11/2007	30/10/2010	80.000	130.000	104.001	0	0%	0%	0	
22	10	60	51	CHACO	89	Cotte-Lai - Empalme RPN° 7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80	Prog. 43,28 - 75,80	30,00	01/11/2007	30/10/2010	100.000	130.000	104.001	0	0%	0%	0	
22	10	61	51	CHACO	89	Empalme RPN°7 (Charadai) - Empalme RPN°4	Prog. 81,28	20,00	01/11/2007	30/10/2010	70.000	286.000	229.001	0	0%	0%	0	
22	10	62	51	CHACO	89	Samuhu Empalme RPN °4 - Empalme RNN ° 95 (Villa Angela)		36,00	01/11/2007	30/10/2010	120.000	130.000	104.001	0	0%	0%	0	
22	10	63	51	MISIONES	14	Empalme RPN° 20 (Gramado) - Empalme RPN ° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	34,00	01/11/2007	30/08/2010	140.000	851.000	681.001	0	0%	0%	0	
22	10	64	51	MISIONES	14	Empalme RPN ° 20 - Empalme RPN °17 (2 Sec.) (Dos	Prog. 1090 - 1117	27,00	01/11/2007	30/08/2010	120.000	1.167.000	934.001	0	0%	0%	0	
22	10	65	51	CORDOBA	S/N	Ciercunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8,00	01/10/2007	29/09/2009	200.000	286.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tr.: Emp RNN° 40 -Paso Fronterizo Laurita	75,00	01/08/2006	30/07/2009	144.144	172.000	82.352.199	10.300.284	0%	12%	6	A
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zudo - Ea. Bella Vista	75,00	01/11/2007	01/03/2010	200.000	140.000	140.000	50.381.367	0%	0%	0	0
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	39,00	01/11/2007	29/06/2010	95.000	191.000	191.000	14.820.495	0%	0%	0	2
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	42,00	01/11/2007	29/12/2008	100.000				0%	0%	2	
22	10	68	51	SANTA CRUZ	40	Chimen Aike - Cabo Vírgenes		130,00	01/11/2007	29/06/2010	300.000	229.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	9,50	29/06/2006	28/06/2007	5.888	184.000	3.689.310	3.689.306	0%	72%	6	S/D
22	10	69	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III)	Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota	9,80	01/11/2007	30/10/2008	6.000	94.000	0	0	0%	0%	3	
22	10	69	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V)	Fin pavimento - Acc. Hotel Villavicencio	8,20	01/11/2007	30/10/2008	6.000	75.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San julian - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	100,00	20/12/2005	19/12/2007	91.046	17.753.000	30.847.466	27.448.765	0%	19%	6	S/D
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km. 2026,00 - km 2088,55	62,55	20/05/2006	18/05/2008	115.925	8.256.000	10	0	0%	41%	6	A
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2088- 2164,79	76,79	01/11/2007	30/10/2009	91.045				0%	0%	4	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Empalme RNN° 38 - Lte c/Catamarca		30,00	01/10/2007	29/09/2009	100.000	46.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Ilitico	Puente s/Rio Chirimayo	0,03	27/07/2006	26/10/2007	1.333	151.000	737.030	737.029	31%	88%	6	
22	10	75	51	CORDOBA	9	Autopista Pilar - Villa María - Acc a dif localidades desde la autop		-	01/11/2007	01/05/2010	7.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente internacional Salvador Mazza - Yacuiba		9,70	01/11/2007	30/05/2009	35.550	115.000	1	0	0%	0%	2	
22	10	77	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		15,00	01/11/2007	29/01/2009	20.000	57.597	1	0	0%	0%	0	
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomus	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	15,00	01/09/2007	30/07/2008	5.017	730.403	1	0	0%	0%	15	
22	10	79	51	CORDOBA		Reordenamiento accesos a Cosquin - 2 Puentes		1,00	09/05/2007	06/11/2008	31.609	110.535	9.464.234	8.078.229	11%	15%	6	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de intersección RNN ° 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota		0,50	01/10/2007	31/03/2008	1.600	24.465	1	0	0%	0%	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8,00	01/11/2007	01/05/2009	40.000	82.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Empalme RNN°81 - Empalme RNN°86	Km 113	80,00	01/11/2007	30/10/2009	150.000	886.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	15,00	01/11/2007	30/06/2010	60.000	134.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	25,00	28/06/2006	26/02/2007	1.281	18.000	1	0	0%	100%	8	
22	10	86	51	SANTA CRUZ		Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia - Convenio		4,00	01/11/2007	30/10/2009	16.000	81.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	La Paz - Santa Rosa	66,00	01/11/2007	01/03/2010	180.000	437.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	km 198,65 - km 266,41	67,76	01/11/2007	31/03/2008	20.625	39.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	92	51	BUENOS AIRES		Acceso a Campo Universitario Tandil		1,00	01/11/2007	30/10/2008	3.000	41.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	93	51	BUENOS AIRES		Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez		0,50	01/11/2007	30/10/2009	12.000	88.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	96	51	BUENOS AIRES	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel RNN° 9 - Pergamino		7,84	01/11/2007	30/10/2008	6.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	97	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Limite con Santa Fe		50,00	01/11/2007	30/10/2008	8.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	98	51	SANTA FE	178	Limite con Buenos Aires- Empalme RNN° 33 - Acceso a Villa		110,00	01/11/2007	30/10/2009	42.285	108.000	1	0	0%	0%	0	
22	10	99	51	CORRIENTES		Isla Apipe San Antonio - Puerto Tonla		-	01/11/2007	30/10/2008	2.000	14.000	1	0	0%	0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III											6.122.629	115.636.000	305.816.958	280.103.153				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV																		
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	(El Leoncito - Lte con Mendoza - Secciones I y II y Acc	35,30	01/11/2007	18/09/2009	42.000	76.000	1	0	0%	0%	2	
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Rio Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		41,00	01/11/2007	30/10/2009	6.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	46,12	01/11/2007	30/09/2011	230.600	4.572.000	2	0	0%	0%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección RNN° 228 Y RPN° 73		0,50	01/11/2007	30/10/2008	3.000	46.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		40,00	01/11/2007	29/10/2012	200.000	1.041.000	2	0	0%	0%	0	
22	11	20	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. C/San Luis		18,00	01/11/2007	30/10/2009	12.000	299.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	21	51	CORDOBA	PU203	RNN° 9 - Capilla Los Remedios		8,10	01/11/2007	30/10/2009	15.000	924.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	28	51	MENDOZA	7	Acceso a Mercado Cooperativo	km 1034,9 (Acc a :mercado Cooperativo)	1,00	01/11/2007	30/11/2007	2.366	17.000	1	0	0%	0%	2	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Empalme RNN 9 (N) - Empalme RNN° 9 (S)	7,50	01/11/2007	30/05/2009	43.799	121.000	1	0	0%	0%	2	
22	11	30	51	ENTRE RIOS	S/N°	Trama urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN° 12 - Empalme RPN° 26	3,80	01/11/2007	31/05/2008	7.260	46.000	246.824	0	0%	0%	15	
22	11	31	51	MISIONES	12	Lte. C/Corrientes - A° Itaembé - Acc. A Garupá	Variante RNN° 12	21,50	01/11/2007	30/03/2009	40.000	417.000	1	0	0%	0%	4	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	39,78	01/11/2007	30/10/2010	54.000	165.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Empalme Acceso a Dique Ballester		-	01/11/2007	30/10/2008	4.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Empalme RPN 69		-	01/11/2007	30/10/2008	3.000	61.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN 66 - Empalme RN 34	13,00	01/11/2007	30/10/2010	60.000	469.000	375.001	0	0%	0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme RN IV 66 - Empalme RN 34	40,00	01/11/2007	30/10/2009	50.000	375.000	300.001	0	0%	0%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Acc.San Pedro de Jujuy - Lib. Gral.San Martin		57,00	01/11/2007	31/10/2011	400.000	750.000	600.001	0	0%	0%	0	
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114.000 - 137,416	23,42	08/05/2007	04/02/2009	35.236	127.000	1.076.353	0	4%	6%	6	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte con Chile		-	25/06/2004	25/12/2005	42.846	298.000	1	0	0%	100%	7	K
22	11	43	51	SANTA CRUZ		Desvio Transito Pesado por Asv. Asturias		10,00	01/11/2007	30/10/2010	60.000	255.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte Bella Vista - Emp Aut Ruta Nacional N° 38		8,00	01/09/2007	30/08/2009	50.000	102.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	46	51	SANTA FE		Remod. Av. 27 de Febrero y Av. Alem	Av. 27 de Febrero y L.N. Alem - pagada con inciso 5	2,65				282.000	1	0	0%	100%	7	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerte (Parana)	Acc Sur a Parana	3,10	01/11/2007	30/10/2009	15.000	73.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	48	51	SAN JUAN	P511	San Agustin del Valle Fertil - San Ramon		50,00	01/11/2007	30/10/2010	70.000	127.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	49	51	ENTRE RIOS	P20	I - RP N° 39 - Las Moscas	Seccion 1	30,60	01/11/2007	30/10/2010	50.000	132.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	50	51	ENTRE RIOS	P20	II - Las Moscas - Villaguay	SECCION II	24,40	01/11/2007	30/10/2010	50.000	125.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	51	51	ENTRE RIOS	P51	I - Larroque - Estacion Parera	SECCION I	27,35	01/11/2007	30/10/2009	40.000	95.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	52	51	ENTRE RIOS	P51	II - Estacion Parera - Urdinarrain	Seccion II	14,22	01/11/2007	30/10/2009	40.000	76.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog.48200 - 70000	21,80	01/11/2007	30/10/2009	30.000	107.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S II)	II - 70000 - 92000	22,00	26/04/2007	23/01/2009	41.947	112.000	3.620.001	3.619.969	9%	12%	6	
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Seccion III: 92.000 - 114.000	22,00	08/05/2007	04/02/2009	40.524	112.000	2.615.766	0	8%	11%	6	
22	11	56	51	CORDOBA	PE86	Achiras - Sampacho		36,80	01/11/2007	30/10/2010	60.000	675.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	57	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo		6,18	01/11/2007	30/10/2008	10.000	207.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	58	51	CORDOBA	PS 358	La Palestina - Arroyo Cabral		15,20	01/11/2007	30/10/2009	20.000	293.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	59	51	CORDOBA	P23	Alpa Corral - El esquinaso		39,80	01/11/2007	30/10/2009	35.000	374.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	60	51	CORDOBA	PE 79	Tancacha - Villa Ascasubi		13,30	01/11/2007	30/10/2009	25.000	395.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	61	51	CORDOBA		Acc. a Sanatorio J.J. Puente		8,10	01/11/2007	30/10/2008	12.000	270.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	62	51	CORDOBA	P 32	La Posta - Las Arrias		24,80	01/11/2007	30/10/2009	30.000	332.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Empalme R.N. N° 13 - KM. 17		6,00	01/11/2007	30/10/2008	8.000	279.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	64	51	RIO NEGRO		Circuito turistico Tronador - Cascada Los Alerces		67,00	01/11/2007	30/10/2008	3.000	82.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	65	51	CORDOBA	RP N° 34	Puesto Bustos - Giulio Cesare	Intersecc.C/ Acc. Al P.N.Quebrada del Condorito y Camino	-	01/11/2007	30/10/2008	5.000	138.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	66	51	SANTA CRUZ	RP N° 63	Empalme RN N°3 - Parque Nacional Monte Leon (Costa)	Acc. Parque Nacional Monte Leon	30,00	01/11/2007	30/10/2010	50.000	1.222.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	67	51	TUCUMAN	RP N° 330	Alpachiri - Rio Jaya	Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos	12,71	01/11/2007	30/10/2009	10.000	183.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N°	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque nacional Pre Delta	5,07	26/06/2007	25/03/2008	6.167	144.000	1	0	32%	32%	6	
22	11	69	51	CHACO		Capitan Solari - Parque Nacional Chaco	Acceso a Parque Nacional Chaco	5,20	01/11/2007	30/10/2008	5.000	113.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Empalme RP N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	46,00	01/11/2007	30/10/2009	20.000	260.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	71	51	SAN JUAN		Chigua de abajo - Quebrada alcaparrosa	Acc. Parque Nacional San Guillermo	60,00	01/11/2007	30/10/2009	20.000	611.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	72	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Limite con Salta - Abra Pampa	Seccion: I	40,00	01/11/2007	30/10/2010	50.000	509.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	73	51	TUCUMAN	RP N° 307	Tafi del Valle - Limite con Catamarca		60,00	01/11/2007	30/10/2010	50.000	519.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	74	51	CATAMARCA	RP N° 46	Belen - Andalgala	Belen - Cuesta de Belen	32,00	01/11/2007	30/10/2010	50.000	464.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	75	51	CATAMARCA	RP N° 219	Acc. Ruinas el Shincal		6,00	01/11/2007	30/10/2008	6.000	92.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	76	51	SAN LUIS	RP N° 29	Ruta de los Dinosaurios	La Chañarienta Las Liebres- Rta de los Dinosaurios	63,00	01/11/2007	30/10/2010	45.000	326.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas -Ctrol Policial(Dique los Sauces)	5,95	01/11/2007	30/10/2009	10.000	263.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Empalme RN N° 35 - Empalme RN N° 22	Km 111,00 - Km 136,48 (Empalme RN N° 22)	25,48	01/11/2007	30/10/2009	15.000	330.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	79	51	SANTA FE	RN N° 177	Empalme RP N° 21 - Alto nivel RN N° 9		7,82	01/11/2007	31/03/2008	10.034	101.000	120.903	0	0%	0%	2	
22	11	80	51	BUENOS AIRES	P72	San Francisco de Bellocq - Copetonas - Secc I - II	S I: Bellocq - Km 25 y Pte s/ A° Claromecó; S II: Km 25-	61,22	01/11/2007	31/08/2009	107.480	181.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	81	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Empalme RN N° 141 -	Seccion: I y Ia: Acc. Difunta Correa- Lado Norte	29,80	01/11/2007	30/10/2008	7.000	114.000	1	0	0%	0%	0	
22	11	82	51	JUJUY		Sistema Margen Izquierdo Río Grande		-	01/11/2007	24/11/2010	15.000	1.000.000	1	0	0%	0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV											2.423.259	21.001.000	8.954.902	3.619.969				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																		
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier		27,40	01/11/2007	30/10/2008	54.240	0	0	0	0%	0%	2	
22	12	22	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Autovia Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado	21,00	07/03/2007	05/03/2010	142.469	0	0	0	1%	6%	6	
22	12	28	51	SANTA CRUZ	281	Empalme RNN 3 - Pto Deseado	Empalme RNN 3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	67,55	01/04/2007	30/03/2009	108.048	0	0	0	6%	11%	6	A
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Empalme RNN A 010 / Empalme RNN 3 - Pto.	Empalme RNN 3 - Empalme RPN 1	87,25	01/11/2007	30/12/2009	134.301	0	0	0	0%	0%	2	
22	12	53	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2284,79 - km 2303,40	18,61	01/11/2007	30/05/2008	41.183	0	0	0	0%	0%	2	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V											480.241	0	0	0				
Total Construcciones											29.766.358	2.107.077.513	3.322.883.653	2.478.587.669				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																		
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																		
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.C/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog.1971,77	111,37	26/05/1997	23/08/2005	14.043	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82-Pto. Deseado - Empalme	132,25	24/04/1997	21/12/2004	13.515	100.000	742.585	0	0%	100%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme R.N.N° 35 - Chacharramendi	127,78	03/07/1997	30/10/2004	9.733	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. A C.Del Eje - Chemical / Empalme R.P.N° 31 - Chemical	243,83	18/06/1997	16/07/2004	11.169	256.000	1	0	0%	98%	8	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme R.P.N° 307 - San Carlos / Empalme R.N.N° 40N -	142,27	04/06/1997	30/09/2007	22.145	43.000	2.039.079	2.039.017	11%	97%	6	A
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	114,79	30/04/1997	31/12/2007	22.299	217.000	2.785.294	2.070.498	11%	93%	6	C
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	EmpalmeR.N.N°60 - Belén/Aimogasta-Acc. Tinogasta/Aminga	226,29	04/07/1997	01/07/2004	17.762	583.000	1	0	0%	97%	7	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Rio	148,87	05/04/1997	02/09/2004	12.938	100.000	232.900	232.898	0%	100%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. C/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco -	178,63	22/05/1997	18/12/2005	22.231	832.000	925.809	925.807	0%	100%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme R.N.N° 34	79,70	10/04/1997	08/07/2006	19.845	461.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	EmpalmeRNN° 117-EmpalmeR.P.N°155-Km139,00-Empalme	144,65	07/07/1997	04/10/2006	27.283	581.000	1	0	0%	86%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Empalme R.N. N° 127-Lte. C/Corrientes -Empalme R.N. N°	271,44	27/08/1997	24/03/2009	27.010	226.000	1.323.616	1.323.614	3%	92%	6	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme R.N.N° 14 - Empalme R.N.N°123 - Empalme	217,56	03/11/1997	02/04/2004	20.456	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	222,32	10/02/1998	06/02/2011	21.754	943.000	3.426.059	3.176.533	3%	92%	6	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. C/Misiones	122,47	07/07/1997	03/09/2004	15.340	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte c/ Corrientes - Emp R.P.N° 20	272,64	14/10/1997	11/10/2004	20.028	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme R.N.N° 50 / Empalme R.N.N° 34 - Lte.	204,71	18/07/1997	15/08/2004	16.672	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	20	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo. del Estero - Catamarca - Tucumán	Sgo. Del Estero (Salida) - Empalme R.N.N° 38	151,92	22/08/1997	20/08/2002	10.497				0%	65%	10	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.C/San Luis - San Juan / Lte. C/La Rioja - Empalme	286,81	15/08/1997	13/08/2003	16.006	100.000	2.057.815	2.057.815	0%	100%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme R.N.N° 74 - Lte. C/Catamarca / La Rioja - Aminga	231,62	02/08/1997	31/07/2002	6.378	100.000	263.335	263.252	4%	100%	8	
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Empalme R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	291,97	13/01/1998	12/04/2004	10.860	100.000	1.000.781	1.000.769	0%	100%	7	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme RNN° 74 / Empalme RNN° 74 -	327,81	30/09/1997	28/02/2004	17.876	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	124,49	11/11/1997	08/11/2007	20.294	193.000	1.368.679	1.368.677	2%	97%	6	C
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Empalme Rn N° 281- Gran Bajo de San Julián	308,03	25/11/1997	24/04/2005	20.207	2.105.000	1	0	0%	90%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Empalme R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguatú Porá	84,29	13/01/1998	11/03/2008	21.959	262.000	379.783	379.782	1%	95%	6	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/Empalme RNN°3-EmpalmeRNN°	167,12	17/07/1997	13/04/2008	21.921	228.000	1.358.183	1.358.181	2%	94%	6	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme R.N.N° 11 - Km 123,43	123,43	09/12/1997	08/05/2004	26.066	121.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Rio Negro-Empalme Rn 40S-Empalme Rn 258-	201,24	01/12/1997	29/03/2008	30.618	194.000	3.948.770	3.948.768	3%	95%	6	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme R.N.N° 25 -Prog. 1512.60-Rawson-Pte.S/R.Chubut	250,41	14/11/1997	11/11/2004	21.472	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme R.N.N° 11 - Acc. a Las Lomitas	285,59	01/08/1997	28/11/2004	17.069	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. C/ Chubut-Lte. C/ Neuquen- Ent. Bariloche	141,91	01/04/1998	27/12/2008	21.736	495.000	2.824.209	2.824.208	2%	99%	6	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	187,70	17/06/1998	14/11/2004	13.993	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme R.N.N° 7 - Pte.S/Río Diamante	211,16	13/01/1998	11/08/2004	14.109	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesus Maria-Lte.S.Del Estero-Empalme Rn N° 9-	309,51	12/07/1997	09/06/2004	15.095	100.000	100.413	100.411	0%	100%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Empalme R.N.N° 20 - Empalme R.N.N° 147 / Empalme	245,64	20/06/1997	17/02/2004	14.250	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme R.N.N° 35 - Empalme R.N.N° 22	136,76	23/06/1997	20/12/2004	18.091	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P.N° 86 - Empalme R.N.N° 3	139,87	04/03/1998	31/12/2007	24.383	196.000	2.129.736	1.845.942	3%	95%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.C/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Empalme RNN°	223,33	13/08/1997	11/03/2004	15.295	100.000	88.875	88.874	0%	100%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Empalme R.N.N° 14 - Empalme R.N.N° 14 -	173,02	25/10/1997	21/02/2008	12.968	160.000	745.886	745.885	3%	89%	6	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte.C/Cordoba / Lte.C/San Luis - Villa	219,96	05/09/1997	03/10/2004	18.064	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme R.N.N° 12 - Empalme R.N.N° 14 Y 119	259,15	03/10/1997	30/04/2008	28.724	360.000	2.939.609	1.385.042	5%	99%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Empalme R.P.Ex R.N.N° 3	258,31	05/11/1997	02/11/2007	28.883	308.000	4.478.887	4.478.886	4%	92%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Empalme R.N.N° 152 - Lte. La Pampa	281,31	14/06/1997	12/06/2003	14.887	100.000	718.787	715.313	0%	100%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Rio Colorado - Empalme R.N.N° 152	221,61	31/07/1997	28/10/2004	17.642	239.000	331.034	331.033	0%	99%	7	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	195,74	29/10/1997	27/05/2005	11.713	100.000	1	0	0%	85%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte.C/Rio Negro- EmpalmeRn N° 237-	275,54	14/11/1997	12/06/2005	17.348	171.000	71.872	0	0%	90%	7	
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. C/ Córdoba - Río Saladillo	96,66	03/12/1997	01/12/2002	6.976	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	134,74	31/10/1997	28/01/2008	27.713	163.000	1.325.931	1.325.930	2%	86%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme R.P.N° 65 - Acc. Larramendi	113,65	09/10/1997	06/10/2004	14.367	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN° 79 - Empalme RNN° 38 / Lte.C/San Luis - D.	282,81	13/11/1997	11/06/2004	13.412	100.000	1	0	0%	100%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Rio Negro	Empalme R.N.N° 22 - Empalme R.N.N° 250	118,70	25/07/1997	23/03/2004	14.994	220.000	1	0	0%	99%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte.C/Santa Cruz-Empalme Rn N° 3-Empalme	140,73	23/06/1997	19/11/2008	23.496	69.000	1.473.285	1.473.283	2%	85%	6	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Empalme R.N.N° 33 (obras faltantes)	104,83	20/05/1999	17/08/2005	14.584	135.000	1	0	0%	96%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	180,55	14/11/1997	11/11/2004	20.165	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme R.P.N° 2 - Lte. C/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	209,05	19/12/1997	17/12/2003	21.313	100.000	1	0	0%	100%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguatú Porá - Empalme R.N.N° 12 (Norte)	113,45	17/11/1997	14/11/2007	18.766	43.000	437.593	437.591	1%	99%</		

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

1.050.019 12.702.000 44.467.718 40.632.673

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II																		
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	104,50	01/12/2004	29/11/2009	46.074	2.099.400	8.233.566	3.157.096	1%	84%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	EmpalmeRN Nº 95 - Las Lomitas / Empalme RN Nº 81 - Villa	171,03	01/01/2005	30/12/2009	49.896	2.462.100	7.794.001	1.294.441	1%	93%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	145,23	01/12/2004	29/11/2009	45.667	2.238.200	8.405.032	1.633.881	1%	89%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbás - Lte. c/La Rioja / EmpalmeR.N.Nº 40N - Arrequeintín	313,77	09/09/2003	07/09/2007	22.079	3.940.100	4.915.149	4.705.249	0%	85%	6	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. -	138,00	01/03/2005	27/02/2010	44.813	4.384.100	7.414.001	780.236	1%	93%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme R.P.Nº 1 (D) - Est. Los Manantiales	113,97	01/11/2005	30/10/2010	49.375	7.986.300	21.076.001	15.671.539	1%	94%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Empalme R.P.Nº10	111,30	01/05/2005	29/04/2010	42.652	6.639.500	8.646.292	3.435.055	2%	75%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalmec/Avda. Belgrano	27,92	19/11/2003	17/01/2007	37.498	99.200	9.281.734	2.364.335	0%	100%	8	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	95,68	10/01/2004	08/01/2008	27.290	86.800	7.086.800	82.870	0%	93%	6	S/D
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Empalme R.N.Nº 157 / Empalme R.N.Nº 60 -	114,58	01/02/2005	30/01/2010	36.957	2.250.600	7.726.001	776.007	1%	92%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Empalme R.N.Nº38 - Aimogasta	166,71	03/12/2004	01/12/2009	56.317	8.186.400	15.576.906	10.949.749	1%	98%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	EmpalmeR.N.Nº 157 - EmpalmeR.N.Nº 38	171,92	02/05/2005	30/06/2010	52.946	7.653.900	7.675.482	1.197.507	1%	92%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme R.P.Nº 329 (Monteagudo) - Tucumán	75,32	19/06/2001	16/11/2008	24.284	913.800	8.234.586	1.373.455	1%	98%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme R.P.Nº 3 - Acceso a Colonia Alvear	161,51	05/06/2001	03/04/2008	30.706	1.848.300	7.634.222	304.552	0%	85%	6	S/D
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme R.N.Nº 5 - Est. El Recreo	69,22	01/02/2005	02/03/2010	42.472	2.638.100	7.851.001	698.089	1%	94%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	72,75	01/04/2005	30/03/2010	43.723	7.392.800	14.686.408	7.535.255	0%	95%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme R.P.Nº10 - Lte. C/Córdoba / EmpalmeRNNº 35 -	158,28	01/04/2005	30/04/2010	41.346	4.374.100	6.436.904	909.283	1%	89%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme R.N.Nº 7	71,90	01/03/2005	27/02/2010	40.405	1.972.300	7.701.782	532.842	0%	95%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II											734.500	67.166.000	166.375.868	57.401.441				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento III C.Re.Ma. III																		
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Empalme R.P. Sdaria Nº 286 - Lte./ Sta Fe/Chaco	79,04	01/11/2007	29/11/2012	43.116	703.000	1	0	0%	0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	EmpalmeR.N.Nº 14 - Galarza - Empalme R.P.Nº 20 - Lte.	151,79	01/01/2005	30/12/2009	45.290	3.121.000	3.045.415	1.485.460	1%	88%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Empalme R.P.Nº 32 - Empalme R.P.Nº 20	90,27	01/01/2005	30/12/2009	41.571	1.181.100	1.375.165	994.164	1%	92%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje Aº Verde - Alto Nivel RNNº 25 / Empalme RNNº 3 -	159,72	01/10/2005	23/03/2007	62.304	9.539.400	7.252.039	4.175.038	0%	42%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	163,78	15/01/2005	14/11/2009	54.523	2.135.900	4.239.335	3.550.334	1%	82%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -CHUBUT	Lte.c/Río Negro - EmpalmeRNNº 259	149,07	01/11/2007	29/08/2012	97.343	2.274.700	2.274.700	0	0%	0%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	EmpalmeRNNº 20 - EmpalmeRNNº 147 / EmpalmeRNNº 7 -	253,79	01/02/2005	30/01/2010	43.938	2.061.500	3.417.978	376.039	1%	92%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Empalme RPNº 3	129,39	01/09/2005	30/08/2010	40.518	8.841.200	16.051.977	13.199.977	1%	94%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino- EmpalmeRPNº 65/EmpalmeRPNº21 -A.N.RNNº9	179,74	01/11/2007	28/05/2012	54.970	5.966.800	1.925.000	0	0%	0%	2	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RN Nº 40S - Lte. c/Chile	182,52	02/01/2007	31/12/2011	99.061	29.890.900	29.894.000	18.326.041	2%	21%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ.	105,03	02/05/2005	29/11/2010	73.467	9.829.400	17.037.757	13.866.756	1%	82%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Rio Saladillo (Puente) - Sigo. Del Estero (Entrada)	120,89	01/01/2006	01/05/2011	52.800	16.275.700	33.469.750	28.219.748	15%	95%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/EmpalmeR9-	148,87	01/10/2005	29/09/2010	45.910	9.908.300	19.329.861	16.133.859	6%	89%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNNº 38	151,92	01/08/2005	30/10/2010	46.167	13.030.000	18.521.652	14.318.651	1%	89%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Empalme RPNº 329	127,96	01/04/2005	30/03/2010	45.437	5.471.500	6.510.541	4.745.539	1%	88%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme R.P.Nº 32 / Emp R.P.Nº 11 - Empalme	99,93	01/03/2005	30/03/2010	45.812	5.221.100	3.043.771	1.359.770	1%	90%	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme	180,05	01/11/2007	29/10/2012	81.023	678.000	1	0	0%	0%	0	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNNº 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río	250,41	01/12/2004	29/11/2009	47.004	7.837.500	3.356.688	828.687	1%	60%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	230,41	01/12/2004	29/01/2010	59.106	5.576.200	15.921.802	14.122.801	2%	55%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNNº 35 - El	128,49	02/01/2006	31/12/2010	37.385	9.939.300	13.317.899	10.111.898	5%	86%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	146,50	01/05/2005	29/04/2010	49.030	6.857.200	6.325.304	4.113.303	1%	90%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	EmpalmeRNNº40S-Lte. c/Chile / AºLa Teresa-	291,15	01/02/2005	30/01/2010	47.996	5.467.700	9.168.027	7.404.026	2%	80%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Digue Cruz del Eje-Chemical / Empalme RPNº31-	334,00	01/07/2005	29/06/2010	51.440	6.501.400	6.474.233	4.377.231	1%	82%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNNº	286,14	01/06/2005	29/11/2010	49.000	8.769.200	9.400.279	6.571.278	3%	76%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-	223,33	01/03/2005	27/02/2010	37.642	2.773.800	2.544.675	1.270.873	1%	89%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	96,66	01/07/2005	29/06/2010	44.867	10.241.700	18.049.550	14.745.549	1%	88%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNNº 14 - km 139	108,18	01/11/2007	29/10/2012	48.847	1.758.887	567.487	0	0%	0%	2	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	277,40	01/11/2007	30/05/2011	35.536	905.000	1	0	0%	0%	11	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro (Expte. 11170/05)	Empalme RNNº 3 - km 112,78	112,78	01/09/2007	29/08/2012	68.181	1.536.900	1.536.900	0	2%	2%	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNNº40 -Pichi Trafal y nuevo pte S/Río Aluminé	140,00	01/11/2007	28/04/2012	51.821	1.403.600	9.892.249	3.802.491	0%	0%	4	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Empalme RP Nº 2 - Empalme RP Nº 286 / Prog. 123 -	126,00	01/11/2007	29/10/2012	39.722	1.367.800	1.367.800	0	0%	0%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme R.N.Nº 8	203,25	01/11/2007	29/10/2012	91.463	2.101.100	678.000	0	0%	0%	0	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	156,64	01/11/2007	29/10/2012	60.000	908.300	908.300	0	0%	0%	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	251,90	03/04/2007	31/03/2012	86.813	2.625.000	20.799.674	12.826.485	13%	21%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LAS DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra										Avance Financiero				Avance Físico			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN° 9 - S.M.Tucumán	145,70	01/05/2006	29/04/2011	79.900	27.952.700	23.411.219	12.797.645	9%	15%	6
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. Con Tucumán	62,97	01/11/2007	29/10/2012	45.990	623.800	623.800	0	0%	0%	2
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN° 123 - Empalme RNN°123	109,32	01/11/2007	29/10/2012	49.194	1.129.100	1.129.100	0	0%	0%	0
26	3	38	51	CHUBUT	40S-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D)	159,62	01/11/2007	29/05/2012	104.904	2.273.000	1.952.524	0	0%	0%	4
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	195,44	01/11/2007	29/10/2012	77.368	2.395.600	773.000	0	0%	0%	2
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	129,49	01/11/2007	29/10/2012	41.050	4.169.100	464.000	0	0%	0%	11
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	EmpalmeRNN°22-EmpalmeRNN°250 / Lte.c/La Pampa-	340,70	01/11/2007	29/10/2012	27.370	3.511.600	1.133.000	0	0%	0%	11
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso a Larramendy	112,85	01/11/2007	29/10/2012	50.784	1.165.600	1.165.600	0	0%	0%	0
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme RNN° 33	104,83	01/11/2007	29/10/2012	47.183	1.084.300	1.084.300	0	0%	0%	0
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	EmpalmeRNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-	167,67	01/11/2007	29/10/2012	7.515	1.733.600	1.733.600	0	0%	0%	0
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N. N° 7 - Pte sobre Río Diamante	211,16	01/05/2007	28/04/2013	50.554	1.590.300	11.415.653	4.290.469	2%	2%	6
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal- Campo Quijano/Talapampa -Río Ancho(Pte)	105,39	01/11/2007	29/10/2012	65.849	1.097.400	1.097.400	0	0%	0%	0
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	125,88	01/11/2007	29/10/2012	91.000	2.693.900	869.000	0	0%	0%	2
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN° 11 - Empalme RNN° 95	181,41	01/11/2007	29/05/2012	53.800	1.854.500	1.854.500	0	0%	0%	2
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III C.Re.Ma. III											2.671.564	255.974.587	336.404.507	218.014.112			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV C.Re.Ma.IV																	
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	133,74	01/11/2007	29/10/2012	60.183	1.783.000	1	0	0%	0%	0
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Empalme R.N. N° 151 - Lte con Mendoza / Lte con Río Negro	233,82	01/11/2007	29/10/2012	69.000	2.556.000	1	0	0%	0%	0
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	222,00	01/11/2007	29/10/2012	99.900	2.960.000	1	0	0%	0%	0
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	113,04	31/03/2007	28/03/2013	47.890	20.844.000	2.256.574	2.256.571	1%	5%	6
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN° 40S / Empalme RPN°	238,56	01/08/2006	30/07/2011	43.479	18.108.000	2.918.162	2.918.159	3%	11%	6
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN° 144 - Malargüe	98,00	01/11/2007	29/10/2012	44.100	479.000	1	0	0%	0%	0
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RN N° 131 - Empalme RN N° 127 / Empalme RN N°	133,28	01/07/2007	28/06/2012	77.854	1.990.000	1	0	7%	8%	6
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guavirai - Cuay Grande	101,59	01/06/2007	28/06/2012	70.907	1.355.000	1	0	10%	10%	6
26	4	9	51	FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	183,81	01/11/2007	29/10/2012	88.892	1.507.000	1	0	0%	0%	2
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	140,66	01/11/2007	29/10/2012	39.758	1.767.000	1	0	0%	0%	0
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	EmpalmeRNN° 117-EmpalmeR.P.N°155-Km139,00-Empalme	144,65	01/08/2006	29/07/2012	47.315	16.858.000	2.579.741	1.833.456	3%	10%	6
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Empalme R.N. N° 12 - Empalme R.N. N° 14 y 19	259,15	01/11/2007	29/10/2012	116.618	2.073.000	1	0	0%	0%	0
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	72,60	01/11/2007	29/10/2012	32.670	968.000	1	0	0%	0%	0
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Empalme R.N. N° 52 - La Quiaca	220,26	01/11/2007	29/10/2012	101.300	1.933.000	1	0	0%	0%	2
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	139,15	01/11/2007	29/10/2012	62.618	1.855.000	1	0	0%	0%	0
26	4	16	51	LA RIOJA	77	Malla 333 - La Rioja	EmpalmeRNN° 79 - EmpalmeRNN° 38	102,51	01/11/2007	29/10/2012	45.000	1.367.000	1	0	0%	0%	0
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	236,10	01/11/2007	29/05/2012	106.245	3.148.000	1	0	0%	0%	0
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Empalme R.N. N° 11 - Empalme R.N. N° 22 / Empalme R.N.	170,99	01/11/2007	29/05/2012	30.689	1.364.000	1	0	0%	0%	0
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	254,89	01/11/2007	29/10/2013	114.700	3.399.000	1	0	0%	0%	0
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog.	115,25	01/11/2007	29/10/2012	50.117	1.451.000	1	0	0%	0%	0
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog.1818 -Lte.c/Santa Cruz/EmpalmeRNN° 3 -	140,73	01/11/2007	28/06/2012	98.720	2.605.000	1	0	0%	0%	2
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	134,74	01/11/2007	29/10/2012	60.633	1.797.000	1	0	0%	0%	0
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Empalme R.P. Ex R.N. N° 3 - Lte con Río Negro/Empalme	222,02	01/11/2007	29/10/2013	85.046	2.196.000	1	0	0%	0%	0
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte con Santiago del Estero	157,39	01/02/2007	29/01/2013	64.644	29.297.000	3.536.334	3.536.332	1%	6%	6
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Camino Pque Sesquicentenario - Empalme R.P. Ex R.N N°3	259,36	01/11/2007	29/10/2012	70.000	1.164.000	1	0	0%	0%	0
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Empalme RNN° 11 - Prog. 123	123,43	01/11/2007	29/10/2012	55.544	1.646.000	1	0	0%	0%	0
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	278,00	01/11/2007	29/10/2012	125.100	3.707.000	1	0	0%	0%	0
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	114,45	01/11/2007	29/10/2012	51.503	1.526.000	1	0	0%	0%	0
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Empalme R.N. N° 74 / Patquia - Empalme R.N. N°	300,75	01/07/2006	28/06/2012	68.138	30.427.000	4.481.800	4.481.798	3%	13%	6
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp R.N. N° 40 N -	146,33	01/11/2007	29/10/2012	65.849	994.000	1	0	0%	0%	0
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp R.P. N° 13 - Lte con Stgo del Estero / Lte con Chaco -	119,62	01/11/2007	29/10/2012	66.058	2.936.000	1	0	0%	0%	0
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte con Salta / Lte con Jujuy - Empalme	205,05	01/11/2007	29/10/2012	48.679	2.164.000	1	0	0%	0%	0
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Empalme R.N. N° 127 - Lte con Corrientes	146,75	01/11/2007	29/10/2012	66.038	1.477.000	1	0	0%	0%	0
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte con Misiones/Empalme R.N.N N° 14 -	194,97	01/11/2007	29/10/2012	87.512	1.868.000	1	0	0%	0%	0
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - EmpalmeRNN° 14 - EmpalmeRNN° 14 - Villaguay	173,02	01/11/2007	29/10/2012	77.859	2.307.000	1	0	0%	0%	0
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme R.P. N° 86 - Empalme R.N. N° 3	139,62	01/11/2007	29/10/2012	62.829	1.776.000	1	0	0%	0%	0
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Emp RPN°13	88,39	01/11/2007	29/10/2012	79.961	2.937.000	1	0	0%	0%	2
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Islotas- Pte. Gral. Lavalle	120,00	01/11/2007	29/10/2012	54.000	1.600.000	1	0	0%	0%	0
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Empalme RP N°62/Km 207,27 - Km 310,8	103,53	01/11/2007	29/10/2012	98.433	1.069.000	1	0	0%	0%	0
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme RN N°62 - Km 310,80 - Km 419,69	107,00	01/11/2007	29/10/2012	74.430	809.000	1	0	0%	0%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2007

Datos de obra											Avance Financiero				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio de Obra	Fin de Obra	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Avance 3° Trim	Avance Total	Est	Obs
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233		154,12	01/11/2007	29/10/2012	69.354	2.055.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme R.N. N° 74 - Lte con Catamarca / La Rioja - Aminga	237,92	01/08/2006	30/07/2011	47.395	17.271.000	21.971.875	21.310.438	14%	58%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martin - Lte. c/San Juan	122,04	01/11/2007	29/10/2012	56.174	610.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme RN N°20	78,00	01/11/2007	29/10/2012	70.038	759.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut	144,00	01/11/2007	29/10/2012	42.319	1.881.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Empalme RNN 251°- Pasaje A Verde- Empalme RNN 250°-	253,98	01/11/2007	29/10/2012	114.291	1.242.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Empalme RNN°95 - Lte. Con SantiagodDel Estero	143,00	01/11/2007	29/10/2012	64.278	698.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Empalme RPN°20	79,00	01/11/2007	29/10/2012	92.309	1.003.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Empalme R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaté Porá	84,29	01/11/2007	29/10/2012	37.930	1.124.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Empalme R.N.N° 12 (Norte)	113,45	01/11/2007	29/10/2012	51.053	1.513.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme R.N.N° 35 - Empalme R.N.N° 22	137,00	01/11/2007	29/10/2012	61.542	1.823.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. C/San Luis - Empalme R.P.N°31 ; Empalme R.N.N°79 -	212,00	01/11/2007	29/10/2012	100.000	2.830.000	1	0	0%	0%	2	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Empalme RNN°60 - Rio Agua Clara ; Aimogasta (S) - Acc. A	242,16	01/11/2007	29/10/2012	108.972	3.229.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Empalme R.N.N°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	307,00	01/11/2007	29/10/2012	138.038	4.090.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. C/chaco - Coronel Olleros	114,00	01/11/2007	29/10/2012	51.282	557.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RP 6 A° Altamirano - Gral Galarza/RP 39 Nogoya - Empalme	86,00	01/07/2006	28/06/2012	43.558	23.231.000	23.216.580	18.692.152	16%	69%	6	
26	4	58	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy		205,05	01/11/2007	29/10/2012	48.679	815.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Empalme R.N N° 9 y N° 34	90,00	01/11/2007	29/10/2012	40.698	442.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme R.N.N°50 - Lte. C/Bolivia	159,00	01/11/2007	28/06/2012	99.715	779.000	1	0	0%	0%	3	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.C/San Juan / Acc. Quines - Lte.C/La Rioja	188,00	01/11/2007	29/10/2012	84.465	2.503.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		170,00	01/11/2007	29/10/2012	76.500	831.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Rio Cuarto	231,00	01/11/2007	29/10/2012	62.312	677.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Empalme RP N°3 - Acc. A Colonia Alvear	161,51	01/11/2007	29/10/2012	100.000	787.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - Km 3568,79	141,51	01/11/2007	29/10/2012	40.000	652.000,00	1,00	0,00	0%	0%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/EmpalmeRN N°40 -Arrequeintin	Km 3608,95 - 3671,26 - Km 223,15 - 333,16	172,33	01/11/2007	29/10/2012	40.000	652.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Empalme Ex RPN° 20 - EmpalmeRNN° 40 / Rio Mayo -Acc.a	175,27	11/11/2007	08/11/2012	52.581	857.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Rio Negro - Empalme RPN° 14	119,77	01/11/2007	29/10/2012	78.000	1.143.000	1	0	0%	0%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Empalme Ex RN N°3	161,00	01/11/2007	29/10/2012	84.624	1.086.000	1	0	0%	0%	4	
26	4	75	51	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN 20	134,70	01/11/2007	29/12/2012	60.615				0%	0%	2	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV C.Re.Ma.IV											4.826.933	257.287.000	60.961.127	55.028.906				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.											9.283.016	593.129.587	608.209.220	371.077.132				
Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad											39.755.950	2.779.358.100	4.219.621.839	3.110.050.292				

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2007
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	785.687.610	1.071.433.643	525.376.820	403.530.402	9,0%
Provincia de Buenos Aires	719.247.118	908.163.578	536.973.312	496.744.457	11,1%
Provincia de Catamarca	25.811.811	66.544.674	47.714.889	47.690.889	1,1%
Provincia de Córdoba	199.441.329	218.244.605	137.446.531	134.496.200	3,0%
Provincia de Corrientes	251.519.994	191.336.141	84.338.300	84.058.780	1,9%
Provincia del Chaco	30.955.245	85.531.311	71.306.734	67.165.831	1,5%
Provincia del Chubut	103.483.733	137.147.021	102.160.839	100.674.872	2,3%
Provincia de Entre Ríos	338.613.877	236.480.125	138.249.472	133.929.476	3,0%
Provincia de Formosa	131.479.216	270.450.038	202.436.588	199.796.206	4,5%
Provincia de Jujuy	29.816.394	46.005.786	39.803.727	39.073.401	0,9%
Provincia de La Pampa	54.660.537	72.614.284	43.283.429	41.909.858	0,9%
Provincia de La Rioja	157.326.893	152.890.551	115.056.430	114.618.005	2,6%
Provincia de Mendoza	180.518.328	176.474.811	80.729.188	78.162.496	1,7%
Provincia de Misiones	82.230.654	102.401.690	75.789.688	75.279.455	1,7%
Provincia del Neuquén	54.427.201	42.239.617	40.050.601	39.573.966	0,9%
Provincia de Río Negro	167.164.072	206.767.050	150.376.092	148.199.493	3,3%
Provincia de Salta	139.769.162	175.864.381	147.041.534	142.638.471	3,2%
Provincia de San Juan	56.720.462	70.841.268	64.844.844	61.444.411	1,4%
Provincia de San Luis	16.832.283	36.578.140	48.610.665	48.610.665	1,1%
Provincia de Santa Cruz	172.252.832	307.595.016	282.951.173	282.792.063	6,3%
Provincia de Santa Fe	246.745.172	407.438.757	291.622.599	273.667.143	6,1%
Provincia de Santiago del Estero	124.016.244	186.998.728	127.569.146	127.541.096	2,9%
Provincia de Tucumán	58.864.174	144.660.942	85.769.812	84.143.717	1,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	11.199.467	9.218.195	7.043.624	7.043.624	0,2%
Interprovincial	671.586.609	520.241.354	343.423.802	340.135.202	7,6%
Nacional	64.680.500	910.600.866	646.920.870	646.772.549	14,5%
Binacional	110.000	29.053.308	59.208.154	59.208.154	1,3%
No Clasificado	64.767.932	267.550.224	191.668.788	189.152.754	4,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.051.366.104	4.687.767.651	4.468.053.636	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	24.171.000	8.075.564	50,2%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	360.000	19,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	23.894.059	7.358.059	44,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	7.472.421.107	1.656.971.053	28,5%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	401.459.368	7.656.368	1,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	28.451.745	39.399.531	10.947.786	38,5%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	10.321.180	568.496	5,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	414.167.000	34.723.000	9,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	8.451.033.245	1.701.437.326	25,3%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 30/09/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	24.171.000	12.299.312	12.299.312	50,9%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	2.174.907	2.174.907	96,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	500.000	500.000	71,4%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	23.894.059	18.277.705	18.277.705	76,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	7.472.421.107	5.278.772.345	5.277.646.710	70,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	401.459.368	229.587.390	229.608.390	57,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.550.000	20.921.676	20.885.740	40,5%
Ministerio de Salud	28.451.745	39.399.531	15.313.788	14.666.986	37,2%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	10.321.180	7.391.624	6.793.424	65,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	414.167.000	267.653.300	267.653.300	64,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	8.451.033.245	5.854.749.444	5.852.363.871	69,3%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2007

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	176.370.000	190.446.997	133.131.159	69,9%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Acciones para Planes Federales de Vivienda	2.528.237.314	2.678.369.623	1.925.612.215	71,9%
Acciones para Emergencia Habitacional	154.501.046	154.501.046	84.218.760	54,5%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	208.561.221	260.561.220	168.651.216	64,7%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	80.000.000	146.000.000	81.471.013	55,8%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	155.352.698	210.552.698	123.510.449	58,7%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Metrovías S.A.	32.695.274	222.532.912	111.578.848	50,1%
Trenes de Buenos Aires S.A.	58.166.691	148.228.999	104.014.982	70,2%
Trenes Metropolitanos General Roca S.A.	67.903.261	67.903.261	25.684.617	37,8%
Herso S.A.	0	0	27.734.577	-
Siemens S.A.	0	0	52.978.976	-
Ferrovías S.A.	72.271.220	89.205.206	78.312.484	87,8%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	24.505.608	33.782.701	19.950.986	59,1%
Benito Roggio S. A.	0	0	69.342.529	-
Sin discriminar	47.866.735	77.746.732	34.930.727	44,9%
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	424.466.000	619.466.000	409.466.000	66,1%
Cooperativas de Servicios Públicos	0	29.755.381	27.325.886	91,8%
Sin discriminar (a empresas privadas)	394.228.702	413.328.702	376.756.149	91,2%
Fondo Electrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	216.489.000	245.527.598	152.658.711	62,2%
<i>Acciones Energéticas para el Desarrollo Integrador del Norte Grande</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	341.996.200	139.195.816	0	0,0%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	289.409.000	505.809.830	439.403.550	86,9%
<i>Atención de Emergencia para Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	85.845.285	140.152.974	92.418.031	65,9%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	90.780.000	565.519.422	485.649.263	85,9%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	81.850.452	144.623.452	101.224.498	70,0%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa BIRF 7353</i>				
Transferencias a instituciones de enseñanza provinciales	14.100.000	22.613.000	16.613.207	73,5%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a Provincias e Institutos de Enseñanza Provinciales	141.713.606	136.313.606	56.857.628	41,7%
<i>Innovacion y Desarrollo de la Formacion Tecnologica</i>				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	201.664.500	199.929.500	121.750.973	60,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asist. Financiera a Empresas Publicas y Entes Binacionales</i>				
Agua y Saneamiento Básico AySA S.A.	166.000.000	166.000.000	112.300.000	67,7%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	155.549.000	155.549.000	93.950.000	60,4%
TOTAL	6.210.522.813	7.763.615.676	5.527.497.434	71,2%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 30/09/2007
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	996.360.232	1.495.184.201	1.174.567.813	1.174.238.365	20,1%
Provincia de Buenos Aires	1.092.820.956	1.645.612.908	1.078.018.763	1.077.936.957	18,4%
Provincia de Catamarca	131.163.296	124.011.061	79.401.390	79.398.769	1,4%
Provincia de Córdoba	219.752.332	386.834.971	181.783.717	181.804.717	3,1%
Provincia de Corrientes	112.421.961	115.572.591	90.656.011	90.370.085	1,5%
Provincia del Chaco	180.537.323	228.768.540	185.394.277	185.297.425	3,2%
Provincia del Chubut	191.493.889	219.297.721	123.316.571	123.316.571	2,1%
Provincia de Entre Ríos	128.860.362	179.110.175	107.244.449	107.244.449	1,8%
Provincia de Formosa	126.025.266	170.001.469	106.403.491	106.403.491	1,8%
Provincia de Jujuy	167.899.530	207.100.145	128.419.750	128.419.750	2,2%
Provincia de La Pampa	77.905.708	104.634.411	59.804.813	59.804.813	1,0%
Provincia de La Rioja	150.353.907	167.360.766	102.307.683	101.232.351	1,7%
Provincia de Mendoza	152.197.384	175.377.756	111.320.338	111.320.338	1,9%
Provincia de Misiones	114.771.640	161.619.055	112.094.424	111.982.775	1,9%
Provincia del Neuquén	124.606.199	92.079.656	42.850.030	42.845.630	0,7%
Provincia de Río Negro	117.747.362	91.943.618	64.036.389	63.836.389	1,1%
Provincia de Salta	144.784.580	175.860.110	129.267.807	129.266.235	2,2%
Provincia de San Juan	192.761.108	293.093.880	218.652.318	218.652.285	3,7%
Provincia de San Luis	137.401.115	47.348.642	10.699.756	10.699.756	0,2%
Provincia de Santa Cruz	351.509.795	473.112.729	700.918.771	700.918.771	12,0%
Provincia de Santa Fe	336.895.360	322.002.366	168.131.763	167.956.763	2,9%
Provincia de Santiago del Estero	149.932.257	138.493.147	70.525.186	70.509.461	1,2%
Provincia de Tucumán	246.766.974	492.902.211	271.129.414	271.103.205	4,6%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	61.023.014	111.225.542	81.675.839	81.675.839	1,4%
Interprovincial	869.460.000	785.382.618	450.778.774	450.778.774	7,7%
Nacional	132.672.369	40.193.956	0	0	0,0%
No Clasificado	6.749.000	6.909.000	5.349.907	5.349.907	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	8.451.033.245	5.854.749.444	5.852.363.871	100,0%
