

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2007


INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2007</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	6
<u>II- EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	8
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2007</u>	15
1- Según Nivel Institucional	15
2- Según Fuente de Financiamiento	16
3- Según Ubicación Geográfica	17
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO I	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 30/09/2007	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2007	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/2007	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2007	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/12/2007	
CUADROS ANEXOS AL CAPITULO II	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 30/09/2007	
Cuadro B: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2007	
Cuadro C: Principales Transferencias de Capital al 31/12/2007	
Cuadro D: Transferencias de Capital según Ubicación Geográfica al 30/09/2007	
CUADRO ANEXO A LOS CAPITULOS I Y II	
Cuadro A: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/12/2007	

INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

Gráfico N° 1
Inversión Pública Nacional al 31/12/2007

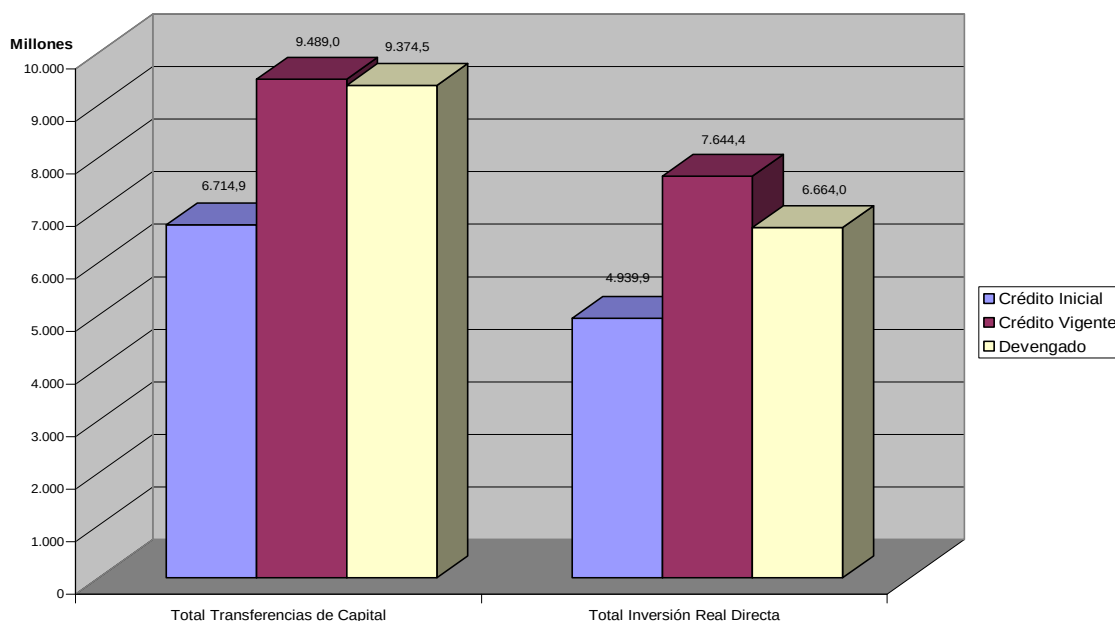


La Inversión Real Directa (IRD) comprende los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. El crédito inicial inherente a la IRD ascendió a \$4.939,9 millones y el vigente a \$7.644,4 millones, es decir, una variación de \$2.704,5 millones (54,7%) al cierre del ejercicio (ver Gráfico N° 1). El principal componente de la Inversión Real Directa, los proyectos de inversión, dispuso de una asignación de \$6.538,9 millones y la Adquisición de Maquinarias, Equipos, Edificios, Tierras y otros Bienes de Uso contó con un crédito de \$1.105,5 millones (ver Gráfico N° 2).

Los proyectos de inversión incluyen gastos vinculados con la generación de un bien de capital destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos. De su asignación crediticia \$6.295,3 millones correspondieron a construcciones (con una ejecución de \$5.648,0 millones al cierre del ejercicio), \$101,2 millones a maquinarias y equipos (\$90,9 millones de ejecución) y \$142,3 millones a gastos vinculados a servicios no personales, bienes de consumo, activos intangibles y tierras y terrenos, entre otros (\$129,4 millones de devengado).

La Inversión Real Directa incluye además la adquisición de bienes de capital, desagregada en \$1.002,8 millones en maquinarias y equipos (ejecución de \$731,2 millones),


\$52,2 millones de activos intangibles (\$32,9 millones), \$43,1 millones en edificios e instalaciones (\$24,8 millones) y \$7,4 millones en otros conceptos (\$6,8 millones).

Gráfico N° 2
Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2007

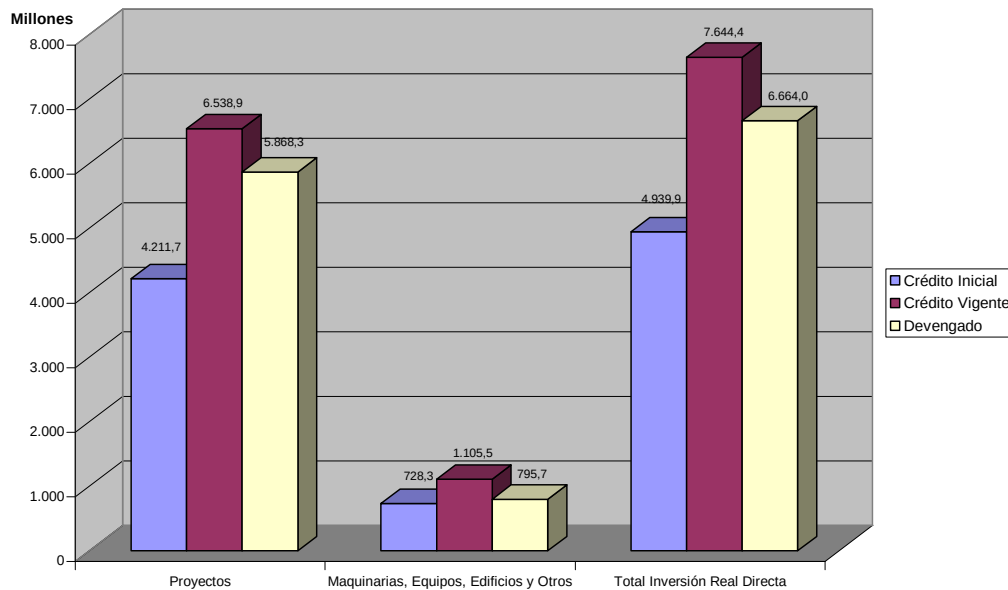

Asimismo, la Administración Nacional transfiere recursos a agentes económicos públicos o privados, para realizar gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al término del ejercicio, sobre un crédito de \$9.489,0 millones, la ejecución financiera de las transferencias de capital ascendió a \$9.374,5 millones. El Crédito Inicial en este concepto alcanzó \$6.714,9 millones, con un aumento del 41,3% (ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Ejecución Transferencias de Capital al 31/12/2007

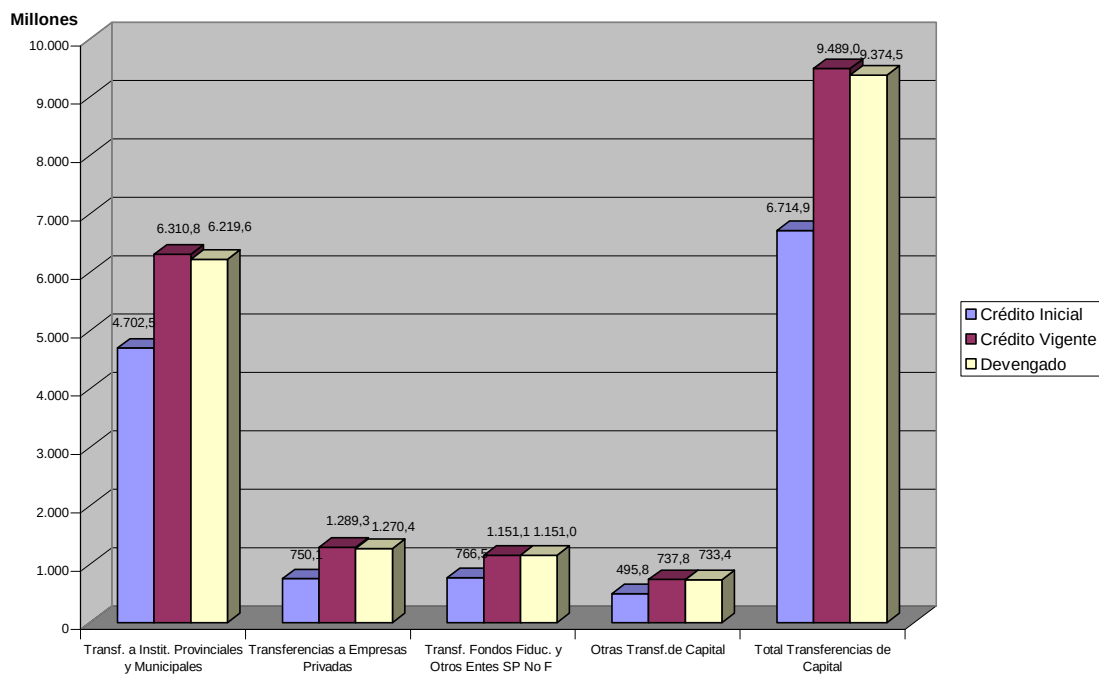

Al 31/12/2007 del monto de ejecución de las transferencias de capital, \$6.219,6 millones (66,3% del total) correspondieron a transferencias a instituciones provinciales y municipales, \$1.270,4 millones (13,6%) a transferencias a empresas privadas, \$1.151,0 millones (12,3%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$733,4 millones (7,8%) a otros tipos de transferencias. El siguiente cuadro muestra el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la Ejecución de la Inversión Total durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/07 (en pesos)				
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Inversión Real Directa	4.939.928.849	7.644.398.878	6.663.991.685	87,2%
Proyectos	4.211.676.829	6.538.865.625	5.868.266.025	89,7%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	728.252.020	1.105.533.253	795.725.660	72,0%
Transferencias de Capital	6.714.872.919	9.488.987.037	9.374.451.955	98,8%
Inversión Total	11.654.801.768	17.133.385.915	16.038.443.648	93,6%


El mismo permite destacar que las Transferencias de Capital registraron una mayor ejecución que la Inversión Real Directa al cierre del ejercicio. Las Transferencias de Capital tuvieron un incremento en el crédito inicial de \$2.458,6 (36,6%). Asimismo, el crédito inicial asignado a los proyectos de inversión se incrementó \$2.327,2 millones (55,3%) mientras que para la adquisición de bienes de uso aumentó \$377,3 millones (51,8%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2007

La ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) alcanzó a \$6.664,0 millones durante el cuarto trimestre, lo que implica incrementos del 30,0% respecto a igual período de 2006, del 134,2% respecto a 2005 y del 299,8% en relación a 2004.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 31/12

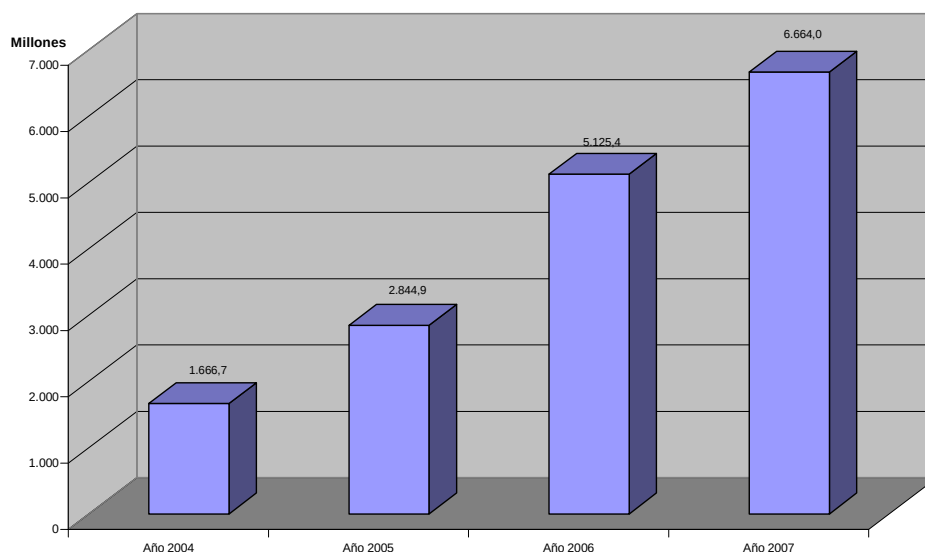

1-Según Nivel Institucional

El crédito destinado al financiamiento de la IRD, al 31/12/2007, aumentó en \$2.704,5 millones (54,7%), de acuerdo al detalle por nivel institucional incluido en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/12/07 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	1.147.116.081	1.405.807.031	1.034.712.442	73,6%
Organismos Descentralizados	3.765.769.068	6.172.821.122	5.586.841.527	90,5%
Instituciones de Seguridad Social	27.043.700	65.770.725	42.437.716	64,5%
Total	4.939.928.849	7.644.398.878	6.663.991.685	87,2%


La ejecución al 31/12/2007 en la Administración Central se concentró en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (\$394,4 millones), el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (\$116,8 millones), el programa Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad (\$72,6 millones) y el Estado Mayor General del Ejército (\$69,2 millones). En los Organismos Descentralizados el gasto se concentró en la Dirección Nacional de Vialidad (\$4.323,0 millones), el Órgano de Control de Concesiones Viales (\$514,3 millones) y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$434,7 millones) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$116,6 millones). Lo expresado se resume en la siguiente tabla:

Organismo/Programa	Ejecución al 30/09/07	Ejecución al 31/12/07	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	3.120,8	4.323,0	38,5%
Órgano de Control de Concesiones Viales	325,3	514,3	58,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	284,5	394,4	38,6%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	253,7	434,7	71,3%
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea	92,7	116,8	26,0%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	69,5	116,6	67,8%
Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad	20,3	72,6	257,6%
Estado Mayor General del Ejército	22,4	69,2	208,9%
Total	4.189,20	6.041,6	44,2%

Se observa una aceleración en el ritmo de ejecución, durante el cuarto trimestre, en la mayoría de los proyectos analizados. Considerando la totalidad de los proyectos incluidos en la tabla, la ejecución del citado período representa el 44,2% de lo devengado al 30/09/2007.

2-Según Fuente de Financiamiento

Al 31/12/07 el financiamiento de la IRD con Tesoro Nacional aumentó su participación respecto al 2006 (73,9% versus 64,2%).

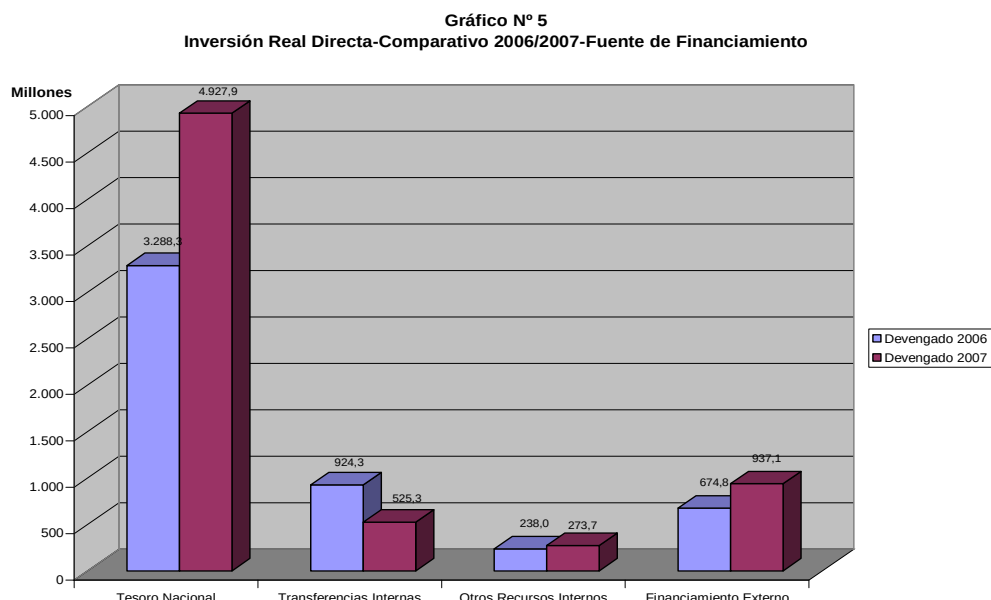

Al 31/12/07 la ejecución del devengado, respecto a 2006, se incrementó en la Fuente Tesoro Nacional (\$1.639,6 millones, 49,9%), en financiamiento externo (\$ 262,3 millones, 38,9%) y en otros recursos internos (\$35,8 millones, 15,0%), y disminuyó en transferencias internas (\$399,0 millones, 43,2%).


Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/07 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	2.707.071.933	5.111.371.021	4.927.875.468	96,4%
Transferencias Internas	975.131.260	994.937.332	525.307.235	52,8%
Otros Recursos Internos	376.730.007	440.257.108	273.710.120	62,2%
Financiamiento Externo	880.995.649	1.097.833.417	937.098.862	85,4%
Total	4.939.928.849	7.644.398.878	6.663.991.685	87,2%

De los \$4.927,9 millones de ejecución financiados con Tesoro Nacional, \$3.087,9 millones correspondieron a construcciones, contratos de recuperación y mantenimiento y

administración del sistema vial nacional, \$434,6 millones al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, \$438,0 millones al Órgano de Control de las Concesiones Viales, \$141,1 millones al programa Formulación y Ejecución de las Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario, \$105,3 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y \$68,6 millones al Hospital Interzonal El Cruce Florencio Varela.

Con transferencias internas se financiaron proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad, por \$445,2 millones y del Órgano de Control de Concesiones Viales por \$67,1 millones, a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte.

Con financiamiento externo se solventaron \$599,0 millones en proyectos de construcciones de rutas y \$127,9 millones del Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento, entre otros.

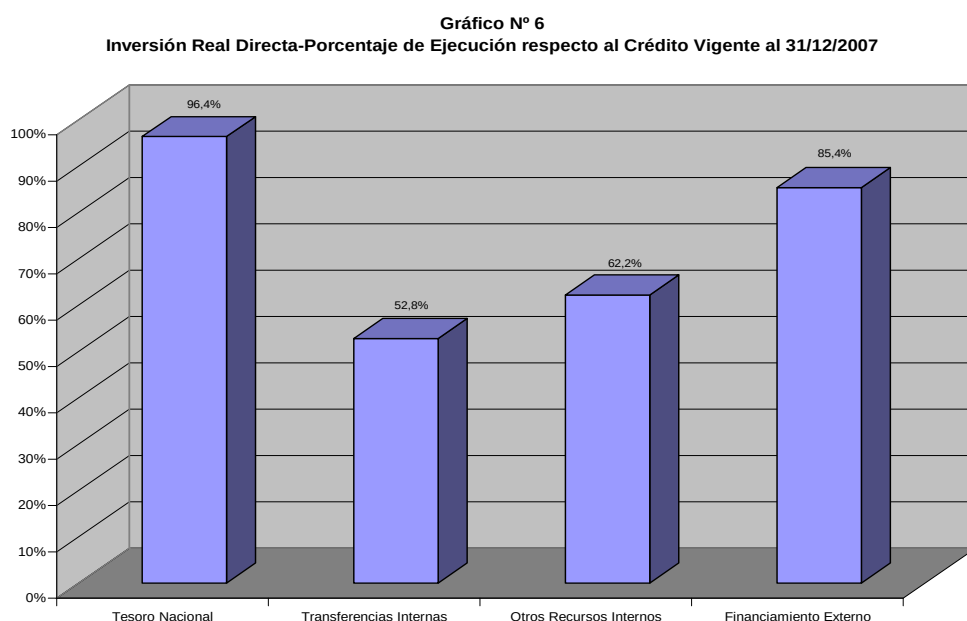

3-Según Ubicación Geográfica

La Inversión Real Directa se concentró (casi el 35%) en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los \$779,9 millones incluyendo, principalmente, los proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$236,4 millones), de la Dirección Nacional de Vialidad (\$217,5 millones) y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$121,7 millones). Además, sobresalió la construcción del Hospital El Cruce Florencio Varela (\$68,6 millones).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una inversión de \$747,6 millones, principalmente destinados a la Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad (\$72,6 millones), al proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa II (\$77,5 millones) y al programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario (\$66,8

millones). Se aclara que en algunos casos los fondos no se invierten efectivamente en la ciudad, siendo que son imputados a la jurisdicción por encontrarse allí el domicilio legal de los beneficiarios.

En la provincia de Santa Fe la ejecución alcanzó los \$385,3 millones y correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$227,9 millones) y a obras por convenio en la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286-Límite con Chaco Secciones I y II (\$68,3 millones). Asimismo, mostraron avance los proyectos Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe (\$59,6 millones) perteneciente al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (\$52,8 millones) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En la provincia de Santa Cruz la ejecución alcanzó los \$384,3 millones, comprendiendo, entre otras, las obras Ruta Provincial N° 12 Empalme Ruta Provincial N° 25-Pico Truncado (\$139,1 millones), Ruta Nacional N° 288 Empalme Ruta Nacional N° 3-La Julia (\$63,3 millones), Ruta Nacional N° 3 Caleta Olivia-Gran Bajo San Julián-Puerto Deseado (\$46,5 millones) y la ampliación del Puerto de Caleta Paula (\$51,3 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se analiza la ejecución física de los proyectos de inversión, tomando un subconjunto que representa alrededor del 90% del costo total de la cartera y el 80,5%, aproximadamente, de la ejecución al cierre del ejercicio.

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Servicio Administrativo	Programas/Proyectos	Costo Total	Devengado del 01/01/07 al 31/12/07	% Devengado año2007/Costo Total
Dirección Nac. de Vialidad	Construcción de Rutas	28.352.175.000	3.447.433.611	12,16
Dirección Nac. de Vialidad	Proyectos C.Re.Ma.	9.097.882.000	498.059.809	5,47
CONAE	Misiones Satelitales	530.619.181	106.980.072	20,16
Dirección Nac. de Vialidad	Mantenimiento de Rutas	517.618.000	359.062.729	69,37
Secretaría de Transporte	Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	164.845.659	50.207.141	30,46
Secretaría de Transporte	Puerto Caleta Paula	139.827.069	51.336.467	36,71
ENOHSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	119.804.416	59.577.274	49,73
ENOHSA	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	105.672.929	31.623.781	29,93
OCCOVI	Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP II Florencio Varela Buenos Aires	92.573.559	81.527.393	88,07
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 Año II.	81.169.651	44.843.203	55,25
OCCOVI	Aumento de Capacidad Construcciones Viales, Pcia de Buenos Aires V	80.266.598	39.534.718	49,25
Secretaría Obras Públicas	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	80.000.000	68.551.849	85,69
ENOHSA	Optimización Sistema de Provisión de Agua Potable, Formosa	79.008.509	35.315.854	44,70
OCCOVI	Aumento de Capacidad en Corredores Viales, Mendoza	78.918.314	55.972.480	70,92
OCCOVI	Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 Año II	78.884.802	47.049.313	59,64
Secretaría de Transporte	Modernización Línea A Subterráneo	78.826.513	6.144.756	7,80
ENOHSA	Colector Cloacal y Planta Depuradora Villa Carlos Paz, Córdoba	64.830.751	41.918.849	64,66
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento de Desagües, Córdoba Capital	62.982.711	6.296.966	10,00
ENOHSA	Primer Tramo, Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras, Hurlingham	58.913.095	9.942.446	16,88
Subtotal		39.919.369.519	5.082.081.303	12,73
Total I.R.D.		44.922.528.678	6.663.991.685	14,83

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2007

El costo total considera los fondos necesarios para toda la vida del proyecto de inversión (abarcando todos los ejercicios que involucran la fecha inicial y la fecha de terminación del mismo). La construcción de rutas, llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad, aparece como la principal acción prevista en la actual cartera de proyectos. A continuación se detallan los principales proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional (a partir de diferentes sistemas de gestión).

Construcción de Rutas

En Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración se finalizó, al 31/12/2007, el

tramo en Ruta Nacional N°40 Malargüe/Barrancas Secciones I y II (36 kilómetros en la provincia de Mendoza), manteniéndose en ejecución las siguientes obras:

Obras en Pasos Fronterizos y Corredores de Integración. Al 31/12/07.

Ruta	Tramo/Sección	Provincia	Kilómetros en ejecución
R.N.N°14	Intersección Empalme R.P.N°16-Intersección Empalme R.P.N°20	Entre Ríos	18,2
R.N.N°14	Empalme R.P.N°20-Empalme R.P."J" (Colonia Elia)	Entre Ríos	27,8
R.N.N°14	Ubajay-Empalme R.N.N°18	Entre Ríos	34,9
R.N.N°14	Empalme R.N.N°18-A°Ayuí Grande	Entre Ríos	32,7
R.N.N°14	A°Mandisoví Grande-Río Mocoretá	Entre Ríos	35,8
R.N.N°14	A°Colman-Empalme R.P.N°29	Entre Ríos	33,3
R.N.N°14	A° Ayuí Grande-A°Mandisoví Grande	Entre Ríos	34,7
R.N.N°14	Empalme R.P.N°29-Ubajay	Entre Ríos	35,6
R.N.N°14	Empalme R.P."J" (Colonia Elía)-A° Colman	Entre Ríos	34,7
R.N.N°14	Establecimiento San Agustín-Empalme R.P.N°126	Entre Ríos	30,4
R.N.N°14	Río Mocoretá-A° Curupicay	Entre Ríos	33,6
R.N.N°14	A° Curupicay-Empalme R.N.N°127	Entre Ríos	29,3
R.N.N°14	Empalme R.P.N°126-Empalme R.N.N°117	Entre Ríos	27,6
R.N.N°14	Empalme R.N.N°127-Establecimiento San Agustín	Entre Ríos	32,4
R.N.N°40	Río Agua Clara km 809-El Eje km 847	Catamarca	38,0
R.N.N°158	Villa María-Gral Deheza	Córdoba	62,9
R.N.N°16	Límite con Chaco-El Caburé Sección Los Pirpintos-El Caburé y Sección Límite con Chaco-Los Pirpintos	Santiago del Estero	67,8
Total			609,9

Las Obras por Convenio con Provincias que se encontraban en ejecución, al cierre del ejercicio, ascendían a 2.273 kilómetros de ruta, finalizándose los siguientes tramos:

Cuadro N° 6. Obras por Convenio con Provincias (Kilómetros terminados)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.P.N°11	Famatina - Límite con Catamarca Secciones Campana – Límite con Catamarca y Kilómetro 25 - Campana a acceso a Santo Domingo	La Rioja	46,9
R.N.N°73	Los Cajones Anguinan	La Rioja	16,6
R.N.N°14	Dos de Mayo San Pedro Sección IV	Misiones	47,4
R.P.N°19	Wanda-Deseado	Misiones	45,0
R.N.N°101	San Antonio-Piñalito	Misiones	30,0
Varias	Obras por Convenio con Provincias		70,0
R.N.N°101	Bernardo de Irigoyen-San Antonio	Misiones	32,0
Total			287,9

En Obras en Corredores Viales Concesionados se encontraban en ejecución, al 31/12/2007, 396 kilómetros de rutas, finalizándose los siguientes tramos:

Cuadro N° 7. Obras en Corredores Viales (Kilómetros terminados)

Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N°3	CVN° 1 - Obra N° 10B-Acceso Videla Dorna-Empalme R.P.N°61	Buenos Aires	38,0
R.N.N°11	CVN° 3 – Obra N° 233-San Justo-Gobernador Crespo	Santa Fe	36,0
R.N.N°36	CVN°4 Obra N°22 Empalme R.N.N°8-A005	Córdoba	42,0
R.N.N°8	Emp.R.N.N°A005/Emp.R.N.N°8-Emp.R.N.N°36		
R.N.N°34	CVN° 4 - Obra N° 204-Empalme R.N.N°36-Acceso a Suco	Córdoba	4,0
R.N.N°7	CVN° 5 - Obra N° 6A-Empalme R.P.N°80 S Empalme R.P.N°33	Santa Fe	31,0
R.N.N°7	CVN°2 - Obra 23B km 568-km 585/km 613-km 616/km 866-km 871	Mendoza	5,0
R.N.N°3	CVN°1- Obra 238-Empalme R.P.N°-Acceso a Azul	Buenos Aires	41,0
R.N.N°3	CVN°1 – Empalme R.P.N°61-Acceso a Parish	Buenos Aires	26,0
R.N.N°205	CVN°1 – Empalme R.P.N°61-Empalme R.P.N°65	Buenos Aires	16,0
R.N.N°8	CVN°4-Empalme R.P.N°3-Empalme R.N.N°148	San Luis	64,0
R.N.N°19	CVN°3 – Obra N°21-San Francisco-Empalme R.P.N°81 – A (S)	Córdoba	32,0
R.N.N°12	CVN°6 – Obra N°230-Empalme R.P.N°34-Posadas	Misiones	10,0
R.N.N°9	CVN°3 - Obra 1 Campana-Río Areco	Buenos Aires	29,0
R.N.N°5	CVN°2- Obra 11B Cruce FC Sarmiento Empalme R.P.N°1	Buenos Aires	33,0
R.N.N°12	C.V.N.6 Acceso a Itatí-Empalme R.P.N°13	Corrientes	40,0
R.N.N°9	Empalme R.P.N°208-Empalme R.P.N°347	Tucumán	34,0
Total			481,0

Por el sistema Construir, Operar y Transferir se mantuvieron, al 31/12/2007, 626 kilómetros (Corredor 28 de Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31 de Bahía Blanca-

Empalme Ruta Nacional N° 5). La fecha prevista de finalización de los contratos es el año 2011.

En Mejoramiento y Reposición de Rutas se encontraban en ejecución, al cierre del ejercicio, 3.941 kilómetros, concluyéndose los siguientes tramos:

Cuadro N° 8. Mantenimiento y Reposición de Rutas (Kilómetros terminados)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N°3	Laguna Khami-Rancho Hambre; Sección Kosovo La Herradura	Tierra del Fuego	23,0
R.N.N°40	Perito Moreno-Bajo Caracoles; Sección Perito Moreno-km 29	Santa Cruz	48,9
R.N.N°81	Las Lomitas-Juan G. Bazán; km 1473-1503	Formosa	30,0
R.N.N°81	Las Lomitas- Empalme R.N.N°34 Sección Pluma del Pato Emp. R.N.N°34 Secciones I, II y III	Salta	90,0
R.N.N°81	Solá-Los Blancos Sec. V; límite con Formosa-Los Blancos Sec. VI; Pluma del Pato-Cnel. Juan Solá	Salta	90,5
R.N.N°81	Las Lomitas-Ingeniero Juárez Secciones Pozo del Mortero-Laguna Yema y Laguna Yema-Los Chiriguanos	Formosa	55,3
C.V.R.N.N°38-75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 y Circunvalación La Rioja	La Rioja	10,0
Varias	Rehabilitaciones Menores en el Territorio Nacional		467,7
S.N°	Acc.Autopista Buenos Aires-La Plata por Av. Iriarte (España)	Buenos Aires	2,6
R.N.N°35	A° El Gato-Empalme R.N.N°8	Córdoba	2,0
R.N.N°7	Variante Laguna La Picasa	Santa Fe	10,5
R.N.N°38	Río Marapa-Principio de Autopista	Tucumán	20,0
R.N.N°11	Remodelación Cruce por ciudad de Clorinda	Formosa	6,0
R.N.N°40	Las Lajas-Chos Malal-Pte. s/ A° Pilmatue	Neuquén	1,0
R.N.N°14	Salto de la Rosa-San Rafael	Mendoza	5,5
R.N.N°34	Límite con Santiago del Estero-Gobernador Garmendia; Sección 857-883	Santiago del Estero	25,0
R.P.N°63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario Sección Avda. Gral. Paz-Acceso a Banfield	Buenos Aires	4,7
R.N.N°65	Concepción Lítico-Pte. s/ Río Chirimayo	Tucumán	0,3
R.N.N°7	Luján-Potrerrillos (Sector Agua de las Avispas)	Mendoza	5,0
Total			989,0

El Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes comprendió trabajos de reparación de obenques en estructuras sobre el Río Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas (1.200 metros), sobre el Río Gallegos entre Río Gallegos-Güer Aike (90 metros), el Puente Nuevo y accesos en tramo Arroyo Batel y Batelito (70 metros), el Puente sobre el Río San Lorenzo entre San Pedro-Calilegua (330 metros) y puentes sobre arroyo Feliciano entre Cerrito-La Paz (126 metros).

Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

Los siguientes cuadros muestran las mallas en ejecución, al cierre del ejercicio, para los C.Re.MA I, II, III y IV:

Cuadro N° 9. Contratos de Recuperación y Mantenimiento I (Kilómetros en ejecución)		
Ruta	Malla	Longitud
R.N.N°3	Malla 107A – Chubut	124,5
R.N.N°3-26	Malla 107B – Chubut	140,7
R.N.N°22	Malla 111 – Neuquén	134,8
R.N.N°40S-258-259	Malla 113 – Chubut	201,3
R.N.N°258-237	Malla 114 - Río Negro	141,9
R.N.N°3	Malla 120 - Río Negro-Buenos Aires	183,6
R.N.N°229-249-22	Malla 206 – Buenos Aires	167,1
R.N.N°3	Malla 208 – Buenos Aires	258,3
R.N.N°228	Malla 211 – Buenos Aires	139,9
R.N.N°68	Malla 401B – Salta	114,8
R.N.N°12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	271,5
R.N.N°127	Malla 506 - Entre Ríos	259,2
R.N.N°95	Malla 508 – Chaco	222,3
R.N.N°18-130	Malla 510 - Entre Ríos	173,0
R.N.N°118	Malla 512A – Corrientes	84,3
R.N.N°40-68	Malla 401A – Salta Tucumán	142,3
R.N.N°118	Malla 512B – Corrientes	113,5
Total		2.873,0

Cuadro N° 10. Contratos de Recuperación y Mantenimiento II (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.N°35	Malla 116ª - La Pampa - Buenos Aires	138,0
R.N.N°35	Malla 116B - La Pampa	113,9
R.N.N°35	Malla 117ª - La Pampa	111,3
R.N.N°35-188	Malla 117B - La Pampa	158,3
R.N.N°250	Malla 123B - Río Negro	145,3
R.N.N°40S	Malla 131 - Neuquén	104,5
R.N.N°9-11-33-34-A012	Malla 202B - Santa Fe	95,7
R.N.N°33	Malla 215 - Buenos Aires	69,3
R.N.N°33	Malla 216ª - Buenos Aires	72,8
R.N.N°33	Malla 216B - Buenos Aires	71,9
R.N.N°40N-150	Malla 306 - San Juan	313,8
R.N.N°188	Malla 314 - Mendoza - San Luis	161,5
R.N.N°81	Malla 338 - Formosa	171,0
R.N.N°60-157	Malla 408ª - Catamarca-Santiago del Estero-Tucumán	114,6
R.N.N°38-60	Malla 408B - La Rioja-Catamarca	166,7
R.N.N°60	Malla 408C - Catamarca	171,9
R.N.N°157	Malla 409ª - Tucumán	75,4
Total		2.256,0

Cuadro N° 11. Contratos de Recuperación y Mantenimiento III (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.N°3-25	Malla 102ª - Chubut	250,4
R.N.N°3	Malla 102B - Chubut	230,4
R.N.N°22-151	Malla 103 - Río Negro	163,8
R.N.N°152-143	Malla 104 - La Pampa	128,5
R.N.N°22	Malla 108ª - Río Negro	146,5
R.N.N°231-237-40S	Malla 109 - Neuquén	291,2
R.N.N°188	Malla 129 - La Pampa-San Luis	129,4
R.N.N°38-79	Malla 207/304 - La Rioja-Córdoba	334,0
R.N.N°146-147	Malla 301 - San Luis	253,8
R.N.N°20-141	Malla 302 - San Juan	286,1
R.N.N°143-144-146	Malla 312 - Mendoza	223,4
R.N.N°40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	105,1
R.N.N°9	Malla 402ª - Santiago del Estero	96,7
R.N.N°9	Malla 402B - Santiago del Estero	120,9
R.N.N°9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy-Salta	148,9
R.N.N°64	Malla 407- Sgo.del Estero-Catamarca-Tucumán	152,0
R.N.N°157	Malla 408D - Tucumán-Santiago del Estero	128,0
R.N.N°12-136	Malla 509 - Entre Ríos	151,8
R.N.N°18	Malla 513ª - Entre Ríos	90,3
R.N.N°12-131	Malla 513B - Entre Ríos	99,9
R.N.N°7	Malla 330 - Mendoza	182,5
R.N.N°34	Malla 431 - Santiago del Estero	251,9
R.N.N°146	Malla 305 - San Luis-Mendoza	211,2
R.N.N°38	Malla 437 - Tucumán	145,7
R.N.N°234	Malla 133 - Neuquén	140,0
R.N.N°250	Malla 123 A - Río Negro	112,8
R.N.N°40 - 259	Malla 632 - Chubut	159,6
Total		4.734,4

Cuadro N° 12. Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (Kilómetros en ejecución)

Ruta	Malla	Longitud
R.N.N°38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	300,7
R.P.N°6-39	Malla 513C - Entre Ríos	86,0
R.N.N°14-122-123	Malla 501 - Corrientes	144,5
R.N.N°143-40S	Malla 313B - Mendoza	238,5
R.N.N°38-75	Malla 303 - La Rioja	237,9
R.N.N°143	Malla 313A - Mendoza	113,0
R.N.N°9-60	Malla 204 - Córdoba	157,4
R.N.N°14	Malla 534 - Corrientes	101,6
R.N.N°12-18	Malla 533 - Entre Ríos	133,2
R.N.N°3 y 26	Malla 107 B - Chubut	135,5
R.N.N°34	Malla 434 - Salta	159,3
R.N.N°3	Malla 603 - Tierra del Fuego	183,8
R.N.N°3	Malla 234 - Buenos Aires	133,2
Total		2.119,0

Mantenimiento de Rutas

En términos físicos la Dirección Nacional de Vialidad efectuó, al 31/12/2007, el

Mantenimiento Directo de rutas en 5.835 kilómetros, utilizando equipos y mano de obra propios.

Mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (se fija por convenio la inversión prevista, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) se llevó a cabo la conservación de la calzada, banquetas, estructuras y el señalamiento vertical, alcanzando los 7.432,0 kilómetros mantenidos.

Cuadro N° 13. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	5.835,0
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	7.432,0
Total	13.277,0

Las obras del Sistema Modular, durante el cuarto trimestre, incluyeron la ejecución de trabajos en 2.732,0 kilómetros, comprendiendo los siguientes tramos:

Cuadro N° 14. Sistema Modular (Kilómetros en ejecución)			
Ruta	Tramo	Provincia	Longitud
R.N.N° 34/81	Empalme R.N.N° 50 – Límite Bolivia - Pluma de Pato	Salta	259,0
R.N.N° 25	Los Altares - Empalme Ruta N.N° 40 (S)	Chubut	277,7
R.N.N° 16	Límite con Chaco - Empalme Rutas Nacionales N° 9-34	Salta	204,4
R.N.N° 40S	Empalme R.N.N° 25 – Empalme R.P.N° 56	Chubut	289,1
R.N.N° 16	Empalme R.N.N° 95 - Límite Chaco/Salta	Chaco	326,6
R.N.N° 40S	Pareditas/Malargüe	Mendoza	229,7
A007	Av. B.Parera-A.Nivel R.N.N° 11 - A. Nivel R.N.N° 11- C.J.Garay	Santa Fe	14,5
R.N.N°60	Tinogasta Límite con Chile	Catamarca	254,2
R.N.N°142/40N/7	G.Andre - Empalme R.N.N°20	Mendoza	194,7
R.N.N°40/260	Empalme R.P.N°22 - Límite con Chubut - Santa Cruz - Empal.R.N.N°40 Límite con Chile	Chubut	147,1
R.N.N°51-40	Campo Quijano-Límite con Chile/San Antonio de los Cobres-Límite con Jujuy	Salta	329,6
R.N.N°25	Los Altares-Empalme R.N.N°40 (Tecka)	Chubut	214,9
Total			2.732,0

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Misiones Satelitales

La CONAE continuó, durante el cuarto trimestre, su programa de inversiones tendiente a cumplimentar el Plan Espacial 2007/2014, trabajando con la contratista INVAP S.E., encargada de la construcción de los satélites del Plan y de las pruebas de ensayo.

Asimismo se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, en la obra Misión SAC-D Aquarius (ex Misión Cesar, siendo socia la NASA) y comenzaron las compras de grandes componentes de vuelo para los satélites SAOCOM, como los Sistema de posicionamiento global (GPS) y los posicionadores estelares (STAR TRACKERS). Por otra parte se continuaron los contratos con INVAP, CNEA, IAR y Consulfem SA para la plataforma, la antena de radar de apertura sintética (SAR) y los transmisores de banda s y banda x.

También se adquirieron componentes electrónicos de vuelo y la carga útil del SAC-D. Continuaron los contratos con INVAP, el IAR y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata para la construcción de la Plataforma, la computadora de a bordo para la carga útil y los radiómetros. Por otra parte, se continuó el contrato con el Instituto Nacional de Óptica, de Québec, Canadá, que provee la cámara infrarroja del SAC-D. Al 31/12/2007 las misiones en curso resultaron:

Cuadro N° 15. Misiones Satelitales en Curso		
Satélites	Misión	Socios
SAC-C	Observación de la tierra	USA/Dinamarca/Brasil/Italia/Francia
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAOCOM 1ª/1B	Observación de la tierra	Italia (A.S.I.)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)/Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA/Italia/Bélgica/Brasil/Dinamarca/Francia

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento

Proyectos Cloacales y de Saneamiento

Entre los proyectos más relevantes ejecutados al 31/12/07 se destaca el desarrollo del Acueducto Centro Oeste (en la provincia de Santa Fe). Se prevé la construcción de una planta depuradora cloacal del primero y segundo tramo de las colectoras cloacales y estaciones elevadoras en los partidos de Hurlingham, Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, beneficiando a 135.000 personas. Ampliando la información del Cuadro N° 4, se expone la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Ejecución de los Proyectos con Mayores Costos Totales (en pesos)

Denominación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Costo Total en pesos	Avance Físico acum.	Ejecución al 31/12/2007
Construcción Acueducto Centro Oeste, Santa Fe	18/03/2006	07/11/2007	119.804.416	49,48	83.265.404
Optimización Sistema de Agua Potable, Formosa	17/02/2006	17/02/2008	79.008.509	52,9	72.136.486
Colector Cloacal y Planta Depuradora, Villa Carlos Paz	01/03/2006	31/12/2007	64.830.751	78,44	66.409.246
Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	09/01/2007	29/12/2008	62.982.711	6,04	6.296.966
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	07/09/2005	31/12/2007	58.913.095	87,52	62.570.114
Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo	07/09/2006	27/08/2008	57.667.660	28,47	37.751.248

Órgano de Control de las Concesiones Viales

Vinculación y Remodelación Ruta Provincial N° 36 - Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial N° 2 - Florencio Varela

Se continuó con la ejecución de tareas de mejoramiento y reordenamiento urbano (de forma de garantizar las condiciones de confortabilidad y seguridad adecuadas) con especial cuidado del impacto ambiental y dentro del marco económico y jurídico. La iniciativa prevé el mejoramiento de 6.450 metros e incluye la repavimentación desde el kilómetro 34,5 al kilómetro 40,9 con el objetivo de transformar en autovía el citado tramo.

Aumento de la Capacidad de los Corredores Viales Nacionales

El proyecto Provincia Buenos Aires V, corresponde a la Ruta Nacional N° 9, comprendiendo el tramo Campana (hasta el distribuidor de la Ruta Nacional N° 193 acceso al complejo Zárate–Brazo Largo) y atañe la incorporación de un nuevo carril al trazado.

Por otra parte se llevaron a cabo obras de doble vía en los departamentos de Santa Rosa y General San Martín (Ruta Nacional N° 7) y se prevé la duplicación de la calzada existente en una longitud de 34 kilómetros, formando parte del corredor bioceánico central que vinculará las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja con la República de Chile.

Obras Mejorativas en los Corredores Viales Nacionales

El OCCOVI tiene delegadas facultades y obligaciones para la contratación de trabajos que revistan el carácter de obra. Por Acta de Acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se determinó que esa Dirección Nacional continuará con las obras licitadas y en trámite de licitación, correspondientes al primer año y parcialmente a las del Año II, mientras que el OCCOVI licitará las obras del Año II en adelante, siendo la única dependencia habilitada para realizar esa clase de iniciativas.

Al 31/12/2007 sobresalieron los proyectos Obras Mejorativas en Corredor Vial N° 2 Año II-I Etapa y Obras Mejorativas en Corredor Vial N° 5 Año II-I Etapa.

Secretaría de Transporte

Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario por encima de la Laguna La Picasa

El proyecto restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad de Buenos Aires con la República de Chile, pasando por la Provincia de Mendoza. Al 31/12/2007 mostró un avance físico anual del 36,1%, mientras que el total físico acumulado ascendió al 76,7%.

Ampliación Puerto Caleta Paula

Se encuentra ubicado próximo a la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Se proyecta la ampliación del actual recinto portuario, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros en sentido este-oeste y la construcción de una obra de control de deriva litoral. El costo total asciende a \$140,0 millones y, al 31/12/2007, la ejecución física anual resultó del 37,1% mientras que el total acumulado ascendió al 75,7%.

Modernización Líneas A Subterráneo – Obras Civiles

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires registró, al 31/12/2007, una ejecución física anual del 33,16%, mientras que el total acumulado ascendió al 46,18%.

Secretaría de Obras Públicas

Hospital Interzonal El Cruce (Florencio Varela)

Se trata de un establecimiento general de agudos de alta complejidad, con cuatro subespecialidades clínicas y quirúrgicas al nivel de prácticas y consultorios externos. El programa médico asistencial ha sido diseñado para responder a la demanda actual y esperada de prestaciones correspondientes al Tercer Nivel de Atención de Salud de la Población (distritos de Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui y Quilmes). Al cierre del ejercicio el Hospital se encontraba inaugurado.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2007

1-Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 16: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento al 31/12/2007 (en pesos)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	6.481.694.676	8.690.362.918	8.583.437.000	98,8%
Organismos Descentralizados	233.178.243	798.624.119	791.014.963	99,0%
TOTAL	6.714.872.919	9.488.987.037	9.374.451.963	98,8%

Dentro de la Administración Central, sobresalieron las transferencias a acciones para Planes Federales de Vivienda (\$2.723,7 millones), para la formulación y ejecución de la política energética (\$1.879,9 millones) y para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$660,0 millones). En materia energética también fueron importantes los montos a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$170,5 millones), al Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$160,6 millones) y a Energía Argentina S.A. (\$82,6 millones).


Dentro del programa Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario y Automotor se destacaron las transferencias a Metrovías S.A. (\$246,2 millones), a Trenes de Buenos Aires S.A. (\$165,3 millones), a Ferrovías S.A. (\$110,5 millones) y a Benito Roggio e Hijos S.A. (\$69,3 millones).

También se destacaron los giros destinados a los traspasos a los gobiernos provinciales y municipales para infraestructura social y obras municipales (\$367,3 millones), para el Mejoramiento de Barrios (\$210,1 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (\$216,0 millones), a Emergencia Habitacional (\$147,6 millones), para la atención de emergencias por inundaciones (\$141,5 millones) y para acciones para desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$122,5 millones). Asimismo resultaron relevantes las transferencias para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y para infraestructura y equipamiento (\$169,4 millones y \$139,5 millones, respectivamente).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron canalizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad (construcción de rutas por convenio con las provincias de Santa Cruz, Córdoba, Buenos Aires y Salta por \$556,9 millones) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas con cooperativas de trabajo por \$181,4 millones).

las provincias de Santa Cruz, Córdoba, Buenos Aires y Salta por \$556,9 millones) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas con cooperativas de trabajo por \$181,4 millones).

Gráfico N° 8
Transferencias de Capital - Devengado al 31/12

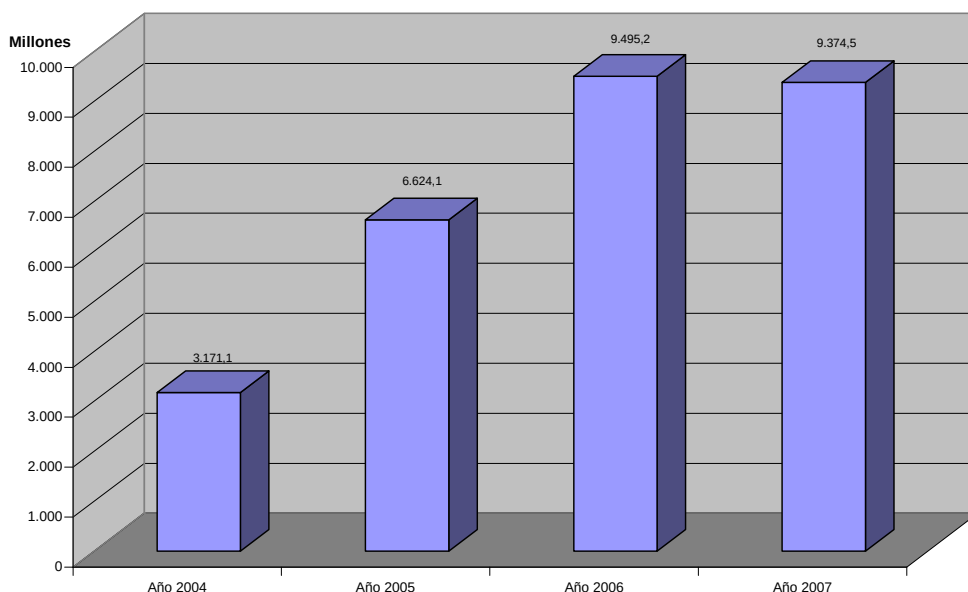

Se observa que las transferencias de capital mostraron una leve disminución, respecto al 2006, de \$120,8 millones (1,3%), por primera vez en los últimos años.

2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 17. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/12/2007 (en pesos)


Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.604.273.252	7.571.527.994	7.555.700.879	99,8%
Recursos con Afectación Específica	229.752.055	268.418.153	242.488.816	90,3%
Otros recursos internos	32.270.000	45.378.037	44.146.716	97,3%
Financiamiento Externo	848.577.612	1.603.662.853	1.532.115.552	95,5%
Total	6.714.872.919	9.488.987.037	9.374.451.963	98,8%

Desde el punto de vista de la fuente de financiamiento el Tesoro Nacional concentró el 80,6% de las transferencias, sobresaliendo los citados Planes Federales de Vivienda (\$2.709,7 millones), la formulación y ejecución de la política energética (\$1.250,6 millones), la construcción de rutas por convenio con provincias (\$554,9 millones), las asistencias para infraestructura social y obras municipales, en el marco del Programa de Formulación, Programación y Ejecución del Control de Obras Públicas (\$320,6 millones), las acciones para Emergencia Habitacional (\$147,6 millones) y para desarrollo de la infraestructura urbana en municipios (\$122,5 millones).

También se realizaron transferencias con destino a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de Políticas para Transporte Ferroviario (\$777,6 millones), las acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$170,1 millones), a Agua y

Saneamientos Argentinos S.A.(\$166,0 millones), para el financiamiento del Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$160,6 millones), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$155,5 millones), al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$151,6 millones) y para Mejoramiento de Barrios (\$89,5 millones). Asimismo fueron relevantes las transferencias realizadas, por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (\$169,4 millones) y para infraestructura y equipamiento (\$68,3 millones).

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 31/12/2007

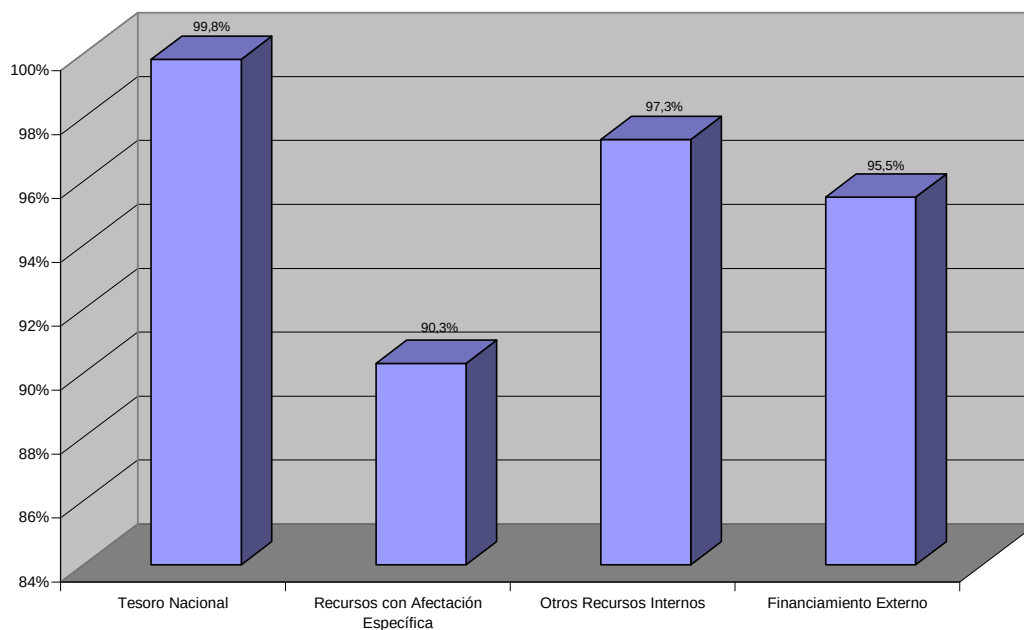

Los recursos afectados correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (F.E.D.E.I.) por \$221,0 millones. El crédito externo fue aplicado, principalmente, al plan “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$489,9 millones), al programa Mejoramiento de Barrios BID 940 OC-AR (\$120,6 millones), para Atención de Emergencias por Inundaciones Préstamo BID 1118 (\$118,4 millones), a las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires para obras municipales (\$46,7 millones), a Metrovías (\$30,0 millones), asistencia financiera a Jujuy y San Juan para Hospitales provenientes de préstamo del Reino de España (\$25,5 millones) y para el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$389,3 millones).

3-Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital (TC) se concentraron (alrededor del 53%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (25,5%) se transfirieron, entre otros, fondos para la política energética (\$1.069,8 millones) y para políticas de transporte automotor y ferroviario (\$807,6 millones).

Las asignaciones inherentes a la provincia de Buenos Aires (16,8%) comprendieron, mayormente, a los Planes Federales de Vivienda (\$1.046,7 millones) y a acciones para “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$129,3 millones).

En la provincia de Santa Cruz (10,4% del total) sobresalieron las obras viales realizadas por convenio (\$488,3 millones), las asignaciones para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$170,5 millones) y para infraestructura social (\$153,1 millones).

Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial (asociadas a dos o más jurisdicciones), se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$419,7 millones).

CUADRO A
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 31/12/2007
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	2.728.209	0	2.728.209	0	0	0
Judicial	45.586.849	0	45.586.849	548.806	0	548.806
Dirección Superior Ejecutiva	36.221.512	5.780.552	42.002.064	0	0	0
Relaciones Exteriores	13.827.735	700.000	14.527.735	0	0	0
Relaciones Interiores	3.278.371	175.394.000	178.672.371	4.185.360	0	4.185.360
Administración Fiscal	8.247.564	0	8.247.564	641.743	0	641.743
Control de la Gestión Pública	4.171.496	0	4.171.496	931.298	0	931.298
Información y Estadística Básicas	1.332.302	0	1.332.302	0	0	0
Subtotal	115.394.038	181.874.552	297.268.590	6.307.207	0	6.307.207
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	137.837.622	73.569	137.911.191	0	0	0
Seguridad Interior	170.021.417	2.174.907	172.196.324	0	0	0
Sistema Penal	18.567.413	0	18.567.413	0	0	0
Inteligencia	688.050	0	688.050	0	0	0
Subtotal	327.114.502	2.248.476	329.362.978	0	0	0
Servicios Sociales						
Salud	83.020.747	62.281.672	145.302.419	10.453.164	0	10.453.164
Promoción y Asistencia Social	5.282.377	431.557.290	436.839.667	499.557	10.252.655	10.752.212
Seguridad Social	437.823	0	437.823	42.437.716	0	42.437.716
Educación y Cultura	46.476.954	1.091.159.241	1.137.636.195	3.547.154	2.612.807	6.159.961
Ciencia y Técnica	37.248.418	315.864	37.564.282	230.606.859	38.812.513	269.419.372
Trabajo	10.834.690	28.829.435	39.664.125	225.390	0	225.390
Vivienda y Urbanismo	182.344	3.096.609.017	3.096.791.361	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	6.526.601	407.369.532	413.896.133	434.699.064	181.355.774	616.054.838
Subtotal	190.009.954	5.118.122.051	5.308.132.005	722.468.904	233.033.749	955.502.653
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	2.057.024	2.321.276.023	2.323.333.047	2.573.522	0	2.573.522
Comunicaciones	69.197	25.850.000	25.919.197	6.479.297	0	6.479.297
Transporte	350.921.844	900.932.786	1.251.854.630	4.837.926.676	557.751.214	5.395.677.890
Ecología y Medio Ambiente	10.879.686	10.276.004	21.155.690	20.005.088	0	20.005.088
Agricultura	754.246	0	754.246	10.950.236	230.000	11.180.236
Industria	167.018	7.750.575	7.917.593	19.419.455	0	19.419.455
Comercio, Turismo y Otros Servicios	37.344.933	15.106.533	52.451.466	1.099.522	0	1.099.522
Seguros y Finanzas	0	0	0	2.049.336	0	2.049.336
Subtotal	402.193.948	3.281.191.921	3.683.385.869	4.900.503.132	557.981.214	5.458.484.346
TOTAL	1.034.712.442	8.583.437.000	9.618.149.442	5.629.279.243	791.014.963	6.420.294.206

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	30.754.772	-11.666.895	-27,5%
Presidencia de la Nación	33.461.134	30.800.918	-2.660.216	-8,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	42.084.780	36.084.780	601,4%
Ministerio del Interior	11.236.020	825.735	-10.410.285	-92,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	123.748.137	3.379.590	2,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	53.523.000	-1.847.000	-3,3%
Ministerio de Defensa	64.237.643	58.258.099	-5.979.544	-9,3%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	48.033.204	12.497.077	35,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	6.147.096.044	2.315.668.566	60,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	315.000	115.000	57,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	1.084.000	-3.810.000	-77,9%
Ministerio de Salud	6.524.213	2.341.936	-4.182.277	-64,1%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	6.538.865.625	2.327.188.796	55,3%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	9.967.278	2.103.278	26,7%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	46.228.566	412.180	0,9%
Ministerio Público	6.075.133	8.806.133	2.731.000	45,0%
Presidencia de la Nación	24.394.427	60.631.260	36.236.833	148,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	40.296.211	6.480.288	19,2%
Ministerio del Interior	123.048.617	207.122.493	84.073.876	68,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	15.942.810	10.652.965	201,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	12.570.345	4.284.345	51,7%
Ministerio de Defensa	86.676.181	254.097.836	167.421.655	193,2%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	104.372.338	518.700	0,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	145.248.079	31.297.274	27,5%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	46.375.945	-9.868.055	-17,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	97.314.267	57.947.525	147,2%
Ministerio de Salud	41.980.323	42.855.842	875.519	2,1%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	9.908.850	4.213.850	74,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	3.795.000	-22.100.000	-85,3%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	1.105.533.253	377.281.233	51,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.644.398.878	2.704.470.029	54,7%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/12/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	42.421.667	30.754.772	15.765.303	15.765.303	51,3%
Presidencia de la Nación	33.461.134	30.800.918	21.975.204	21.865.138	71,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	6.000.000	42.084.780	4.410.952	4.410.952	10,5%
Ministerio del Interior	11.236.020	825.735	580.293	580.293	70,3%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	120.368.547	123.748.137	120.608.584	119.757.058	96,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	55.370.000	53.523.000	11.909.451	11.909.451	22,3%
Ministerio de Defensa	64.237.643	58.258.099	35.187.886	35.185.566	60,4%
Ministerio de Economía y Producción	35.536.127	48.033.204	38.831.896	38.747.011	80,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	3.831.427.478	6.147.096.044	5.624.492.639	5.617.777.494	91,4%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	200.000	315.000	0	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	4.894.000	1.084.000	0	0	0,0%
Ministerio de Salud	6.524.213	2.341.936	2.267.759	2.267.759	96,8%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	4.211.676.829	6.538.865.625	5.876.029.967	5.868.266.025	89,7%
Poder Legislativo Nacional	7.864.000	9.967.278	5.886.090	5.663.792	56,8%
Poder Judicial de la Nación	45.816.386	46.228.566	20.832.498	20.832.498	45,1%
Ministerio Público	6.075.133	8.806.133	8.308.953	7.141.254	81,1%
Presidencia de la Nación	24.394.427	60.631.260	36.329.227	36.271.705	59,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	33.815.923	40.296.211	10.143.760	10.143.760	25,2%
Ministerio del Interior	123.048.617	207.122.493	187.793.803	180.165.900	87,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	5.289.845	15.942.810	11.889.319	11.111.304	69,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	8.286.000	12.570.345	8.554.833	8.554.833	68,1%
Ministerio de Defensa	86.676.181	254.097.836	235.675.302	221.741.561	87,3%
Ministerio de Economía y Producción	103.853.638	104.372.338	62.056.019	61.769.677	59,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	113.950.805	145.248.079	112.753.977	112.753.255	77,6%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	56.244.000	46.375.945	40.226.096	40.197.254	86,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	39.366.742	97.314.267	54.143.213	53.162.200	54,6%
Ministerio de Salud	41.980.323	42.855.842	20.893.910	20.839.826	48,6%
Ministerio de Desarrollo Social	5.695.000	9.908.850	6.432.949	5.376.841	54,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	25.895.000	3.795.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	728.252.020	1.105.533.253	821.919.949	795.725.660	72,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.644.398.878	6.697.949.916	6.663.991.685	87,2%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado a	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al
								al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	3.280.497	0	0	0,00	24,00		s/i
					51	Adecuación para Instalación Subdirección de Notificaciones	3.280.497	0	0	0,00	24,00		
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	4.487.919	573.779	573.778	0,00	100,00		s/i
					61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	4.487.919	0	0	0,00			
					68	Construcción de Locales Subsuelo Av. de los Inmigrantes 1950 (1)	0	573.779	573.778	0,00			
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	1.546.745	2.277.270	956.419	0,00	80,00		s/i
					51	Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	1.506.745	2.085.713	956.419	0,00	100,00		
					52	Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal (1)	40.000	191.557	0	0,00	13,00		
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	516.872	912.371	912.370	0,00	100,00		s/i
					52	Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle 1171	516.872	912.371	912.370	0,00	100,00		
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	407.716	407.711	21,00	1,00		s/i
					52	Lavalle 1220 Cap.Fed., Reparación de Cubiertas, Fachadas y Contrafrente	0	407.716	407.711	21,00	1,00		
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	7.447.946	3.923.189	2.490.837	0,00	79,00		s/i
					51	Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de seis Juzgados	7.447.946	3.923.189	2.490.837	0,00	79,00		
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	452.000	526.617	526.616	20,00	5,00		s/i
					51	Adecuación Edificio Anexo M. T. de Alvear 1840 Capital Federal	452.000	526.617	526.616	20,00	5,00		
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	1.640.547	0	0	0,00	25,00		s/i
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento	1.000.248	0	0	0,00	100,00		
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	600.299	0	0	0,00	100,00		
					53	Secretaría Electoral de La Plata - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				10		Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	786.796	100.000	0	0,00	20,00		s/i
					51	Edificio La Rioja esq. Mitre, San Juan. Adecuación Sector Electoral	746.796	100.000	0	0,00	100,00		
					52	Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	40.000	0	0	0,00	1,00		
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	3.462.796	0	0	0,00	24,00		s/i
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edif.Calle Garibaldi	3.074.497	0	0	0,00	24,00		
					52	Edif. Primera. Junta 2687, Santa Fe - Adecuación	388.299	0	0	0,00	23,00		
				12		Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.039.796	100.000	0	0,00	20,00		s/i
					52	Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	999.796	100.000	0	0,00	100,00		
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				14		Área Cámara Posadas							
				1		Construcción de Sedes Judiciales (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		s/i
					51	Tribunales Federales de Posadas Construcción de Edificio (1)	40.000	0	0	0,00	1,00		
				15		Área Cámara Resistencia							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	435.146	384.486	5,00	1,00		s/i
					51	Adecuación y Obras del Juzgado Federal de Formosa	40.000	435.146	384.486	53,00	1,00		
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (1)	0	349.340	0	0,00	100,00		s/i
					51	Juzgado de Roque Saenz Peña, Remodelaciones y Reparaciones (1)	0	349.340	0	0,00	100,00		
				16		Área Cámara de Córdoba							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	683.548	100.000	0	0,00	100,00		s/i
					51	Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	683.548	100.000	0	0,00	100,00		
				17		Área Cámara San Martín							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	880.135	474.463	374.463	45,00	40,00		s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)					
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						51 Adecuacion Edificio de la Camara Federal y Tribunal Oral N° 4	0	374.463	374.463	91,00	9,00			
						52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	800.135	0	0	0,00	100,00			
						53 Edificio Calle Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio (1)	40.000	100.000	0	0,00	7,00			
						54 Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir (1)	40.000	0	0	0,00	4,00			
			18			Área Cámara Tucumán								
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	2.586.242	2.801.488	2.032.304	0,00	100,00		s/i	
					22	52 Juzg. Fed. Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio Fuero Penal Económico	2.586.242	2.801.488	2.032.304	0,00	100,00			
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	665.000	0	0	71,00	29,00		s/i	
						52 Adecuación Juzg. Penal Económ. Av. de los Inmigrantes 1950	665.000	0	0	71,00	29,00			
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)								
		21				Justicia de Máxima Instancia								
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	2.962.451	4.136.451	1.692.038	15,00	50,00		s/i	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	659.999	3.079.999	1.692.038	44,25	35,00			
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	367.520	520	0	0,00	37,00			
						57 Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	852.632	152.632	0	0,00	100,00			
						62 Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	973.353	593.353	0	0,00	100,00			
						63 Reforma de las Instalaciones Eléctricas Palacio de Justicia (2)	0	1.000	0	100,00	0,00			
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia	108.947	308.947	0	0,00	100,00			
				2		Refacciones en Sedes Periciales	1.894.737	4.250.486	2.516.770	0,00	83,00		s/i	
						56 Refac. y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú 92	1.894.737	4.148.986	2.433.870	0,00	83,00			
						69 Reparación y Mantenimiento de Ascensores B. Mitre 718 y Maipú 92	0	1.500	0	0,00	100,00			
						70 Adecuación de Locales para el Traslado del Cuerpo Médico Forense	0	100.000	82.900	0,00	100,00			
				3		Refacciones Varias	156.316	258.816	0	0,69	98,00		s/i	
						73 Reparación y Mantenimiento de Ascensores Edificio Lavalle (2)	0	2.500	0	100,00	0,00			
						76 Reformas - Edificio Lavalle 1250 (1)	156.316	256.316	0	0,00	100,00			
				4		Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	4.027.647	1.343.896	0,00	75,00		s/i	
						51 Reforma Instal. Eléct. Palacio de Justicia y Talcahuano 550	1.477.647	4.027.647	1.343.896	0,00	75,00			
				5		Readecuación y Refuncionalización Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.550.948	54,00	46,00		s/i	
						51 Readecuación Edificio Lavalle 1429	1.240.804	2.030.804	1.550.948	54,00	46,00			
				6		Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00		s/i	
						51 Reciclado de Fachadas calles Tucumán-Lavalle-Palacio de Justicia	608.663	858.663	0	0,00	17,00			
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	0	0	0,00	52,00		s/i	
						51 Mejoras en el Palacio de Justicia	2.273.684	0	0	0,00	52,00			
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	2.667	0,00	99,00		s/i	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia (1)	2.210.526	2.210.526	2.667	0,00	99,00			
20						Presidencia de la Nación								
						ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES								
				17		Conservación y Administración de Areas Naturales Protegidas								
					3	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	2.588.029	2.517.060	0,00	100,00	23,00	100,00	100,00
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques (1)	1.200.000	2.588.029	2.517.060	0,00	100,00	23,00	100,00	100,00
					20	Bosques Nativos y Areas Protegidas BIRF 4085/AR								
				36		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	380.000	1.005.112	915.014	96,00	4,00	0,00	0,80	20,00
						58 C.de Interpretación en San Martín de los Andes - 2da. Etapa	380.000	1.005.112	915.014	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00
				37		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.672.000	2.870.644	2.828.841	80,25	19,75	0,00	3,46	17,50
						53 Albergue para Voluntarios en Villa La Angostura	152.000	723.915	314.830	61,00	39,00	0,00	5,85	15,00
						54 Camino Tronador-Los Rápidos	1.140.000	1.225.000	1.307.964	66,00	34,00	0,00	6,80	20,00
						55 Reparación Senderos y Miradores en Cascada los Alerces (5)	0	0	314	0,00	s/i	0,00	0,00	0,00
						58 Senderos y Miradores en Isla Victoria	76.000	387.000	490.234	16,00	84,00	0,00	16,80	20,00
						59 Infraestructura Isla Victoria Area Central	304.000	534.729	715.499	79,00	21,00	0,00	3,15	15,00
				42		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	152.000	950.244	526.312	87,56	12,44	0,00	0,00	0,00
						54 Construcción Albergue para Voluntarios en Lago Verde (2)	152.000	950.244	526.312	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR								
						Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	3.137.007	1.537.007	413.045	35,00	45,00	0,00	16,00	35,56
						52 Obras en Junta de la Palca	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obras en Agua del Godo	1.537.007	337.007	104.774	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Terminación Viviendas en Rodeo	1.200.000	800.000	308.271	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				39		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Quebrada del Condorito	301.517	554.087	349.996	86,00	14,00	0,00	14,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
					40	56 Mejoramiento Camino de Acc.al Parque Nac. Quebrada del Condorito	301.517	554.087	349.996	86,00	14,00	0,00	14,00	100,00
						Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo (4)	1.161.476	1.511.476	1.105.647	7,00	1,00	18,00	40,00	4000,00
						53 Centro Operativo Area Pobladores	591.326	591.326	0	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00
						54 Centro Operativo Area Robles	570.150	920.150	1.105.647	0,00	100,00	46,00	93,00	93,00
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	1.800.000	2.400.000	2.095.722	15,00	85,00	30,00	79,11	93,07
						51 Obras 1° Etapa Infraestructura (4)	1.000.000	1.500.000	1.753.463	39,00	61,00	0,00	166,19	272,44
						52 Adecuación Galpón de Esquila como Centro de Interpretación	800.000	900.000	342.259	0,00	100,00	70,00	90,00	90,00
				43		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya (9)	0	400.000	400.000	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Obras Varias en el Parque Nacional Mburucuya (9)	0	400.000	400.000	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		22				Mejora de la Competitividad Préstamo BID AR-L-1004								
				1		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	1.649.487	36,00	64,00	17,00	65,23	101,92
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín	1.850.000	1.850.000	1.649.487	39,00	61,00	53,00	101,23	165,95
				2		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	1.340.000	533.440	8,00	92,00	17,00	32,15	34,95
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi	1.340.000	1.340.000	533.440	18,00	82,00	17,00	32,15	39,21
				3		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces	1.364.000	2.379.000	1.781.441	33,00	67,00	0,00	67,02	100,03
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (4)	1.364.000	2.379.000	1.781.441	45,00	55,00	0,00	67,02	121,85
				4		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	422.200	44.107	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo	1.437.200	422.200	44.107	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		116				BIBLIOTECA NACIONAL								
				25		Servicios de la Biblioteca Nacional								
				1		Construcción Edificio Las Heras- Museo del Libro (1)(6)	2.100.934	500.934	274.900	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro (1)(6)	2.100.934	500.934	274.900	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		301				SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION								
				1		Actividades Centrales								
				2		Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4) (12)	140.000	435.000	385.757	99,66	0,34	2,29	3,24	952,94
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (4) (12)	140.000	435.000	385.757	99,66	0,34	2,29	3,24	952,94
				3		Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	4.273.430	2.548.607	36,90	63,10	10,20	39,28	62,25
						51 Remodelación Casa de Gobierno 2º Etapa	8.900.000	4.273.430	2.548.607	36,90	63,10	10,20	39,28	62,25
				4		Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.301.570	615.560	0,00	100,00	0,18	42,95	42,95
						51 Remodelación y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (1)	1.100.000	1.301.570	615.560	0,00	100,00	0,18	42,95	42,95
		337				SECRETARIA DE CULTURA								
				36		Difusión de la Música y Danza								
				1		Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	166.805	163.805	0,00	100,00	70,00	72,17	72,17
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria (1)	115.000	166.805	163.805	0,00	100,00	70,00	72,17	72,17
				37		Preservación y Exhibición Artística-Cultural								
				1		Mejoras en Museos (1)	430.000	397.380	267.680	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00
						51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas (1)	110.000	110.000	267.680	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00
						52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo (1)	80.000	47.380	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Mejoras en el Museo Roca (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Museo Mitre (1)	120.000	120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos (1)	60.000	60.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				38		Desarrollo y Promoción Cultural								
				5		Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1 (1)	880.000	628.000	464.017	0,00	100,00	70,00	81,19	81,19
						51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear (1)	135.000	135.000	382.584	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00
						52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña (1)	15.000	15.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina (1)	230.000	139.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Edificio de la Calle México (1)	260.000	99.000	4.114	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Mejoras en el Palais de Glace (1)	80.000	80.000	77.319	0,00	100,00	50,00	146,65	146,65
						56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos (1)	160.000	160.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	3.290.000	1.984.700	0,00	100,00	36,00	102,57	102,57
						51 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario (1)	4.000.000	3.290.000	1.984.700	0,00	100,00	50,00	116,57	116,57
25						Jefatura de Gabinete de Ministros								
				305		DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE								
				23		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (**)								
				1		Construcción de Instalaciones Deportivas (1) (7)	6.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Salón Cubierto de Atletismo (1) (7)	3.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Gimnasio Ezeiza (1) (7)	3.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		317				SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
		31				Coordinación de Políticas Ambientales								
				1		Construcción Relleno Sanitario Jujuy (5)	0	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Jujuy (5)	0	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Relleno Sanitario Mendoza (5)	0	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario Mendoza (5)	0	500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Relleno Sanitario San Juan (5)	0	1.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario San Juan (5)	0	1.000.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcciones Accesorias al Relleno Sanitario San Juan (5)	0	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcciones Accesorias al Relleno Sanitario San Juan (5)	0	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				5		Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (5)	0	1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (5)	0	1.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				6		Recuperación y Reciclaje de Residuos Rosario (5)	0	4.670.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Reciclaje de Residuos Rosario (5)	0	4.670.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción y Puesta en Marcha de Planta de Compostaje Rosario (5)	0	2.481.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Puesta en Marcha de Planta de Compostaje Rosario (5)	0	2.481.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Construcción Puntos Verdes Rosario (5)	0	576.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puntos Verdes Rosario (5)	0	576.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				9		Refacción Planta de Transferencia Rosario (5)	0	773.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Planta de Transferencia Rosario (5)	0	773.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		34				Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059 OC/AR								
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo (5)	0	26.084.780	4.410.953	0,00	12,00	5,00	5,00	41,67
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza (5)	0	9.116.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza (5)	0	8.600.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					53	Colector Troncal-Ruta 21 en La Matanza (5)	0	8.368.780	4.410.953	0,00	20,00	16,00	16,00	80,00
					54	Rectificación Av. Carlos Pellegrini Villa Diamante-Lanús (5) (7)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55	Relleno Sanitario Cuenca Alta (5) (7)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Construcción Puente Roca-Patricios (5) (7)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior								
	326					POLICIA FEDERAL ARGENTINA								
		21				Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes								
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana	156.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				37		Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcciones en el Cuerpo de Sistema de Tránsito	600.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la División Laboratorio Químico	935.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Edificio Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Casino - Dirección Gral. Asuntos Internos	67.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				47		Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Planta Verificadora Falcón	1.000.000	0	0	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia								
				4		Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Consultorios Externos para Ginecología	310.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	375					GENDARMERIA NACIONAL								
		40				Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional								
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	0	0	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	250.000	0	0	15,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional	1.493.953	470.745	470.745	20,70	79,30	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmería Nacional	1.493.953	470.745	470.745	23,60	37,97	0,00	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional Etapa II	783.567	324.990	109.548	62,40	37,60	4,80	4,80	12,77
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	158.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 "Oberá" (1)	178.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón 4 "Concordia" (1)	125.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Refacción Escuadrón 19 "Ingeniero Juárez" (1)	124.567	114.990	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)														
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al 31/12/2007	% Ejec./Progr. anual										
								al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4º trim.												
35	380	31				59 Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (1)	38.000	38.000	37.998	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
						61 Ampliación Escuadrón 55 "Tucumán" (1)	60.000	72.000	71.550	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						62 Ampliación Grupo "Alfárez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahúe" (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						22 Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Edificio para Grupo Tte. Gral. Fraga Esc. 19 I.S. (1)	96.500	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						23 Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Cocina Comedor del Destacamento Móvil IV (1)	279.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						PREFECTURA NAVAL ARGENTINA																		
						Servicio de Seguridad de la Navegación de Policía de Seguridad y Judicial																		
						1 Construcción Destacamento Chana Mini (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Destacamento Chana Mini (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						2 Construcción Centro Control de Tráfico Rosario (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Centro Control de Tráfico Rosario (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						3 Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires (7)	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Edilicia Prefectura Lago Buenos Aires (7)	315.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						4 Construcción Prefectura Tigre (1) (7)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Prefectura Tigre (1) (7)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						5 Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1) (7)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Prefectura San Martín de los Andes (1) (7)	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						6 Construcción Prefectura Zona Mar Argentina Norte (1) (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Estructura Basamento Edificio (1) (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						7 Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1) (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción Centro de Control de Tráfico Mar del Plata (1) (7)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						Formación y Capacitación Profesional de la PNA																		
						2 Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						51 Construcción de Alojamiento para Cursantes (1)	1.000.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto																		
						COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES																		
						35	106	1				Actividades Centrales												
												3 Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00	0,00				
												51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	92,63	7,37	0,00	0,00	0,00				
												Generación de Ciclos de Información Espacial Completos												
												1 Infraestructura Terrestre	2.036.000	4.125.968	3.646.107	40,64	59,36	1,94	4,78	8,05				
												0 Infraestructura Terrestre	53.000	38.000	1.867									
												51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	5.000	3.131.918	2.710.071	76,30	14,45	4,47	13,29	91,97				
52 Construcción del Instituto Gulich	188.000	20.000	19.800	13,50	0,12							0,00	0,00	0,00										
55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	775.000	160.850	102.653	12,05	11,11							1,31	2,27	20,43										
56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11							0,00	0,00	0,00										
57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08							0,00	0,00	0,00										
58 Construcción de Antenas Educativas	700.000	340.200	553.717	2,65	1,99							0,64	1,93	96,98										
59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	300.000	20.000	0	0,08	0,07							0,00	0,00	0,00										
60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	5.000	405.000	258.000	0,00	8,91							0,56	2,30	25,81										
2 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	110.293.301	108.767.733	106.980.072	32,79	10,00							5,76	14,45	144,50										
0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.484.750	1.601.510																					
52 Misión SAOCOM	79.472.030	51.473.212	39.019.145	26,60	11,76							3,50	8,38	71,26										
53 Misión SABIA	5.000	2.970.000	80.614	14,19	0,69							0,17	0,84	121,74										
54 Misión CESAR	28.816.271	51.839.771	66.278.803	22,60	34,99							5,88	34,98	99,97										
4 Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	0	0	0,00	1,00							0,00	0,00	0,00										
51 Antena Multipropósito N° 5	10.000	0	0	0,00	0,22							0,00	0,00	0,00										
52 Antena Multipropósito N° 6	10.000	0	0	0,00	0,22							0,00	0,00	0,00										
5 Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	0	0	0,00	39,00							0,00	0,00	0,00										
51 Construcción de Subsistemas de Propulsión de Satélites	762.500	0	0	0,00	0,25							0,00	0,00	0,00										
6 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	13.200	13.200	0,00	44,00							0,00	0,29	0,66										
51 Construcción Satélite "SARE - 1"	2.000.000	13.200	13.200	0,00	22,22							0,00	0,29	1,31										
Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio																								
35	17	1										Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas (4)	367.000	2.967.200	2.940.855	1,18	1,00	0,23	1,27	127,00				
												0 Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	3.000	3.000	0									
												51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	360.000	707.200	893.001	14,32	5,12	0,20	5,11	99,80				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
		18				52 Configuración de Vehículo Espacial	4.000	2.257.000	2.047.854	0,00	1,01	0,58	1,00	99,01
						Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen								
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen (7)	10.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen (7)	6.000	0	0					
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen (7)	4.000	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
	307					MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO								
		1				Actividades Centrales								
				2		Remodelación Palacio San Martín	710.849	530.849	509.945	50,00	10,00	0,10	9,65	96,50
						51 Remodelación Palacio San Martín	710.849	530.849	509.945	50,00	10,00	0,10	9,65	96,50
				3		Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1)	0	2.403.532	1.649.995	0,00	100,00	25,00	105,00	105,00
						0 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1) (7)	0	0	0					
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería (1)	0	2.403.532	1.649.995	0,00	100,00	25,00	105,00	105,00
				16		Remodelación Archivo (1) (7)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Archivo (1) (7)	976.123	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16				Acciones Diplomáticas de Política Exterior								
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia	0	4.426.655	3.795.005	2,15	97,85	0,00	70,00	71,54
						0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	729.263	520.063					
						51 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	3.697.392	3.274.942	2,15	97,85	0,00	70,00	71,54
				8		Remodelación Embajada en Roma	508.195	100.000	85.890	0,00	30,00	3,50	28,50	95,00
						0 Remodelación Embajada en Roma	0	100.000	85.890					
						51 Remodelación Embajada en Roma (7)	508.195	0	0	0,00	30,00	3,50	28,50	95,00
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	0,00	40,00	100,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	370.472	250.000	0	35,00	40,00	0,00	40,00	100,00
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington (7)	1.093.200	0	0	45,00	25,00	0,00	25,00	100,00
						51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington (7)	1.093.200	0	0	45,00	25,00	0,00	25,00	100,00
				12		Remodelación de la Embajada en Francia (7)	1.016.394	150.000	135.987	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00
						0 Remodelación de la Embajada en Francia	0	150.000	135.987					
						51 Remodelación de la Embajada en Francia (7)	1.016.394	0	0	0,00	100,00	0,00	30,00	30,00
	20					Desarrollo del Plan Antártico								
				15		)Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1) (7)	191.513	0	0	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00
						51 Remodelación del Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (1) (7)	191.513	0	0	0,00	30,00	0,00	30,00	100,00
40						Ministerio de Justicia y Derechos Humanos								
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS								
		1				Actividades Centrales								
				3		Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	270.000	237.454	86,11	13,89	3,87	13,48	97,05
						51 Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias (2)	180.000	180.000	177.381	100,00	0,00	3,67	3,67	
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	19.117	90,00	10,00	0,20	0,80	8,00
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos (2)	45.000	45.000	40.957	100,00	0,00	0,00	0,00	
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria								
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	692.341	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	2.864.938	692.341	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	7.588.000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	15.673.600	15.753.600	7.588.000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	6.972.000	6.972.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				15		Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 31 - Ezeiza	5.127.200	5.127.200	0	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
				16		Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Unidad 3 - Ezeiza	9.075.200	9.075.200	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				17		Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.163.997	4.083.996	0,00	100,00	70,00	100,00	100,00
						51 Ampliación Unidad 11	3.918.400	4.163.997	4.083.996	0,00	100,00	70,00	100,00	100,00
				18		Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 33	896.000	896.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
				19		Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cárcel Federal de Salta - Unidad 34	2.420.000	2.420.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				20		Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cárcel Federal de Formosa - Unidad 35	2.048.000	2.048.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				21		Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
45					22	51 Cárcel Federal de Candelaria	660.000	660.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
						Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
						51 Centro de Drogadependientes	5.444.662	5.444.662	0	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
						Ministerio de Defensa								
		370				MINISTERIO DE DEFENSA								
			18			Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas								
				1		Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)(6)	7.502.000	13.048.286	8.096.597	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
						0 Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA) (1)	945.000	945.000	154.985					
						51 RSMA - Fabricación e Instalación de Radares (1) (6)	6.557.000	12.103.286	7.941.612	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		371				ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.								
			20			Sostén Logístico Antártico								
				2		Mantenimiento y Modernizacion Helicopteros Augusta Sea King (9)	0	3.853.760	3.853.711	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Mantenimiento y Modernizacion Helicopteros Augusta Sea King (9)	0	3.853.760	3.853.711	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		372				INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A								
			17			Desarrollo Tecnológico para la Defensa								
				2		Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	483.999	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
						51 Modernización de Instalaciones de CITEFA (3)	0	484.000	483.999	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
		374				ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO								
			16			Adiestramiento Operacional y Apoyo								
				48		Construcciones Etapa II (5) (7)	0	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción Hangar y Planta de Combustible-Curuzu Cuatia (5)	0	0	0	0,00	0,00	s/i	s/i	s/i
				49		Construcción y Ampliación redes de Agua, Gas y Electricidad Etapa II (5)	0	780.000	779.095	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
						51 Ampliación Red de Gas en Cuartel B y Barrio Militar Tartagal (5)	0	780.000	779.095	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
				52		Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdro. Rivadavia (3)	0	443.415	443.415	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
						51 Conexión Cloacal 77 Viviendas Barrio Gral. Mosconi - Cdro. Rivadavia (3)	0	443.415	443.415	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
				53		Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - Resia (3)	0	624.900	624.900	0,00	100,00		36,18	36,18
						51 Construcción Parque Automotor Cdo.de la III Brigada - Monte - Resia (3)	0	624.900	624.900	0,00	100,00		36,18	36,18
				59		Ampliación Red de Gas (9)	0	189.092	189.092	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51 Ampliación Red de Gas Natural de los Barrios Militares Bateria Ingenieros (9)	0	189.092	189.092	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
			61		Construcción Polvorin tipo M8 Cuartel Secc. Munición Mercedes (9)	0	1.619.040	1.619.040	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					51 Construcción Polvorin tipo M8 Cuartel Secc. Munición Mercedes (9)	0	1.619.040	1.619.040	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
	379				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA									
		16			Capacidad Operacional de la Armada									
			3		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	601.387	29,22	50,00	0,00	33,49	66,98	
					51 Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.250.000	1.250.000	601.387	29,22	50,00	0,00	33,49	66,98	
			5		Construcción Compuerta Corediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano (5)	0	5.000.000	4.847.500	0,00	58,00	33,00	33,00	56,90	
					51 Construcción Compuerta Corediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval Puerto Belgrano (5)	0	5.000.000	4.847.500	0,00	58,00	33,00	33,00	56,90	
	18				Formación y Capacitación									
			1		Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	4.421.387	69,67	15,00	1,00	1,13	7,53	
					51 Escuela de Suboficiales de la Armada	4.800.000	4.800.000	4.421.387	69,67	15,00	1,00	1,13	7,53	
			3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	5.124.603	5.116.956	12,70	59,00	10,53	17,40	29,49	
					0 Construcción de Alojamiento para Personal Militar (1)	0	0	114.430						
					51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	22.682.603	5.124.603	5.002.526	12,70	59,00	10,53	17,40	29,49	
			4		Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	2.496.040	2.496.019	55,00	45,00	7,26	9,41	20,91	
					51 Construcción de la Escuela de Guerra Naval	10.386.040	2.496.040	2.496.019	55,00	45,00	7,26	9,41	20,91	
			5		Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	243.000	171.607	47,80	52,20	0,00	12,13	23,24	
					51 Remodelación para la Reubicación de Servicios	503.000	243.000	171.607	47,80	52,20	0,00	12,13	23,24	
			7		Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
					51 Construcción del Liceo Naval	16.857.000	16.857.000	0	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
	381				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA									
		1			Actividades Centrales									
			1		Ampliación Estructura Anexo Edificio Cóndor (5)	0	714.419	710.985	0,00	100,00	79,30	79,30	79,30	
					51 Ampliación Estructura Anexo Edificio Cóndor (5)	0	714.419	710.985	0,00	100,00	79,30	79,30	79,30	
		19			Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea									
			2		Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Aeronáutico Central (5)	0	473.544	472.875	0,00	23,17	23,17	23,17	100,00	
					51 Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital Aeronáutico Central (5)	0	473.544	472.875	0,00	23,17	23,17	23,17	100,00	
450					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR									
	16				Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional									

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)					
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al		Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006			4° trim.	31/12/2007	
50					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	257.000	14,26	28,00		0,00	28,00	100,00
						51 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	257.000	257.000	257.000	14,26	28,00		0,00	28,00	100,00
		357				Ministerio de Economía y Producción									
			1			MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION									
						Actividades Centrales									
					6	Reciclaje Edificio Ex-Aerolineas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						51 Reciclaje Edificio Ex-Aerolineas Argentinas (2)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					13	Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	686.300	603.484	15,43	84,57	9,00	89,00	105,24	
						51 Refacción Núcleos Sanitarios, Sede M.Ec.y P.	400.000	686.300	603.484	15,43	84,57	9,00	89,00	105,24	
					14	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J. A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - J.A. Roca 651	900.000	900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Restauración Integral del Patio Principal- Edificio PAHAC	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
						51 Restauración Integral Piso 1 Edificio PAHAC Y.H.250	600.000	989.300	931.448	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
					16	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal	500.000	429.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Provisión e Instalación Cielorrasos Suspendidos	500.000	429.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					17	Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	930.000	1.151.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
					18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982 (1)	1.000.000	805.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					19	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac. (1)	400.000	400.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
					20	Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Recuperación y Fijación Revestim. Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651 (1)	500.000	250.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
					21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicación - MEcyP (1)	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicación - MEcyP (1)	500.000	11.095	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I (1)	700.000	700.000	0	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive (1)	400.000	400.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Instalación de Sistema Contra Incendios - Hidr. y Rociad. Automático (1)	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	26				Administración Financiera										
				1	Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	389.045	39,64	60,36	0,00	60,36	100,00		
					51 Remodelación para la Unidad Informática	980.010	980.010	389.045	39,64	60,36	0,00	60,36	100,00		
	602				COMISION NACIONAL DE VALORES										
		16			Control y Fiscalización de la Oferta Pública										
				1	Modernización de la Comisión Nacional de Valores	371.000	114.000	113.070	74,49	25,51	15,17	35,90	140,73		
					53 Modernización del Archivo	371.000	114.000	113.070	74,49	25,51	15,17	35,90	140,73		
	606				INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA										
		1			Actividades Centrales										
				1	Ampliación Edificio Ciudad de Buenos Aires (5)	0	30	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i		
					51 Ampliación Edificio Chile 460 - Capital Federal (5)	0	30	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i		
				16	Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T										
				3	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	744.355	485	0	62,81	2,00	0,00	0,00	0,00		
					0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	367.004	464	0							
					86 Ampliación Laboratorios de Alta Complejidad PITS	377.351	21	0	42,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
				5	Construcción y Ampliaciones Inst. de Investigación -Etapa II	329.387	194.237	193.633	71,63	28,37	6,00	11,42	40,25		
					58 Laboratorio de Sanidad Animal y Semillas Mercedes	329.387	194.237	193.633	71,63	28,37	6,00	11,42	40,25		
				8	Construcción y Ampliaciones Instit. de Invest. Etapa III (2)	492.029	79	0	100,00	0,00	s/i	s/i	s/i		
					51 Ampliación Sala de Proc. Satelitales en Instit. Clima y Agua (2)	185.370	40	0	98,32	1,68					
					53 Remodelación Laboratorio Seg. Viral Inst. de Virología (2)	22.884	0	0	54,72	17,28					
					54 Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología (2)	137.307	39	0	94,00	6,00					
					55 Remodelación Alojamiento Inst. Microbiología y Zool. Agríc. (2)	22.884	0	0	79,13	10,87					
					59 Sala de Equipos de Frío en el Inst. de Patobiología-Castelar (2)	123.584	0	0	94,75	4,00					
				12	Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	3.722.275	3.665.333	33,00	57,00	43,00	65,26	114,49		
					51 Construcción y Ampliaciones Instit. de Investigación - Etapas V	385.695	3.722.275	3.665.333	33,00	57,00	43,00	67,26	118,00		
				17	Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	7.223.903	6.141.831	8,00	92,00	45,00	106,49	115,75		
					51 Ampliación Laboratorio Biotecnología Cs. Veterinarias y Agronómicas	771.403	7.223.903	6.141.831	8,00	92,00	45,00	106,49	115,75		
				18	Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar (5)	0	565.560	435.804	0,00	s/i	12,00	12,00			
					51 Construcción Box Bioseguridad en el Centro Investigación en Cs.Vet.y Agron. Castelar (5)	0	414.620	290.804	0,00	s/i	14,00	14,00			
					52 Ampliación Edificio Central del Instituto Recursos Biologicos Castelar (9)	0	150.940	145.000	0,00	s/i	13,00	13,00			

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al 31/12/2007	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.		
		17				Investigación Aplicada, Innov. y Transf. de Tecnologías AITT								
				4		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - Etapal	109.787	410.487	410.453	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					56	Construcción Oficinas AER Río Grande	109.787	410.487	410.453	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			5			Construcción y Ampliaciones Centros del interior -EtapalI (2)	443.297	209.037	195.299	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					58	Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay (2)	443.297	209.037	195.299	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
				9		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (2)	819.281	118.251	118.185	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					52	Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales (2)	27.459	81.221	81.185	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					54	Construcción Ofic. Baños y Sala Reuniones Estación Exper. Anguil (2)	389.049	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce (2)	68.654	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Rioja (2)	228.846	37.030	37.000	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
					61	Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur (2)	22.884	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. Mendoza	82.389	0	0	50.52	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapav	1.619.937	977.907	920.510	73,00	27,00	2,00	23,11	85,59
					51	Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	192.848	18.168	101.719	42.03	57.97	3.80	9.94	17.15
					52	Obras Varias C.R. Salta - Jujuy (4)	771.403	207.252	206.744	91.57	8.43	5.30	81.65	968.56
					53	Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	38.572	32	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					54	Obras Varias C.R. Chaco - Formosa (4)	385.695	752.455	611.222	79,14	20,86	0,00	41,56	199,23
					55	Obras Varias C.R. Misiones	231.419	0	825	68,87	31,13	0,00	0,00	0,00
				14		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -EtapavI	925.703	1.819.023	1.787.063	60.57	39,43	0,00	22,21	56,33
					51	Obras Varias C.R. Corrientes	77.144	31.914	31.861	28,87	71,13	0,00	8,82	12,40
					52	Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan (4)	154.288	648.058	616.666	93,88	6,12	11,74	68,12	1113,07
					53	Obras Varias C.R. Santa Fe	385.695	234.645	234.602	71,95	28,05	11,74	17,74	63,24
					54	Obras Varias C.R. Córdoba	154.288	655.518	655.474	39,39	60,61	22,74	62,44	103,02
					55	Obras Varias C.R. Entre Ríos (4)	154.288	248.888	248.460	94,64	5,36	0,00	17,96	335,07
				15		Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación-Etapa VII	1.928.513	125.123	125.104	25,00	35,00	0,90	2,39	6,83
					51	Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	1.928.513	125.123	125.104	25,00	35,00	0,90	2,39	6,83
				16		Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -EtapavIII	925.690	1.354.840	1.224.218	73,00	27,00	11,00	20,98	77,70
					51	Obras Varias C.R. Buenos Aires Sur	385.695	601.215	477.601	79,79	19,81	12,45	22,48	113,48
					52	Obras Varias C.R. Patagonia Norte	154.288	18	0	58,40	42,00	0,00	0,00	0,00
					53	Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	154.288	645.418	637.799	72,53	29,55	20,00	35,50	120,14
					54	Obras Varias C.R. Patagonia Sur	231.419	108.189	108.818	80,71	19,44	1,00	15,00	77,16
				18		Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan	2.314.220	2.356.650	2.345.811	8,00	92,00	49,00	82,33	89,49
					51	Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan	2.314.220	2.356.650	2.345.811	8,00	92,00	49,00	82,33	89,49
				19		Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	2.614.943	1.746.211	2,00	34,00	24,45	31,10	91,47
					51	Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.928.513	2.614.943	1.746.211	2,00	34,00	24,45	31,10	91,47
				20		Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	4.028.168	3.989.824	1,00	3,00	50,00	71,00	2366,67
					51	Construcción Edificio Agr. Estación Agrop. Balcarce (4)	1.542.818	4.028.168	3.989.824	1,00	3,00	50,00	71,00	2366,67
				21		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	134.820	134.777	0,00	52,00	51,00	87,20	167,69
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agrop. Rafaela	2.314.220	134.820	134.777	0,00	52,00	51,00	87,50	168,27
				22		Construcción y Ampliaciones Centro regional Salta-Jujuy	1.542.818	38	0	38,00	62,00	0,00	0,00	0,00
					52	Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	1.542.818	38	0	38,00	62,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	1.928.513	829.093	829.060	50,00	50,00	22,00	41,63	83,26
					51	Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	1.928.513	829.093	829.060	50,00	50,00	22,00	41,63	83,26
				24		Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	80.768	80.726	82,00	18,00	18,00	33,44	185,78
					51	Construcción Edificio Agencia Extensión Rural Bandera	1.542.818	80.768	80.726	82,00	18,00	18,00	33,44	185,78
				25		Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales del País (5)	0	5.043.110	4.942.070	0,00	52,00	55,00	59,60	114,62
					51	Construcción Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria Sgo. del Estero (5)	0	32.200	32.175	0,00	17,00	3,50	4,50	26,47
					52	Construcción Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Salta (5)	0	42.030	41.989	0,00	100,00	42,00	42,00	42,00
					53	Ampliación Sanitarios, Salón de Actos y Oficina Centro Regional Chaco - Formosa (5)	0	419.840	420.213	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					54	Construcción Pabellón Fitomej. Algodón en Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña (5)	0	350.030	349.999	0,00	60,00	32,00	70,00	116,67
					55	Construcción Centro de Convenciones en el Centro Regional Misiones (5)	0	100.030	99.920	0,00	77,00	15,00	15,00	19,48
					56	Ampliación Edificio en la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo (5)	0	48.960	48.926	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					57	Construcción Laboratorio, Sala Cámara y Depósito Estación Experimental Agropecuaria Mendoza (5)	0	328.620	328.311	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					58	Ampliación Laboratorio y Depósito Agroquímicos en la Estación Experimental Agropecuaria Junin (5)	0	97.120	97.040	0,00	100,00	95,00	100,00	100,00
					59	Construcción Torre p/Soporte Radar Meteorológico Estación Experimental Agropecuaria Anguil (5)	0	776.810	769.292	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					60	Construcción Torre p/Soporte Radar Meteorológico Estación Experimental Agropecuaria Paraná (5)	0	857.840	764.801	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					61	Restauración Edificio Histórico Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (5)	0	517.820	517.778	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					63	Construcción Laboratorio,Ofcina,Dependencias,Talleres y Viviendas Lag.Naineck (9)	0	1.271.780	1.271.626	0,00	12,00	100,00	100,00	833,33

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						65 Contrucción Laboratorio Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista (5)	0	200.030	200.000	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
						69 Construcción Laboratorio Semillas Estación Experimental Agropecuaria Oliveros (5)	0	0	0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (5)	0	1.900.073	1.900.000	0,00	70,00	9,00	33,00	47,14
						51 Ampliación Edificio Agronomía Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (5)	0	1.900.073	1.900.000	0,00	70,00	9,00	33,00	47,14
				27		Construcción y Ampliaión Edificio p/Agencias de Ext.Rural y Campos (5)	0	2.121.700	1.997.599	0,00	45,00	36,50	63,50	141,11
						51 Ampliaión Edificio Agencia de Extensión Rural Perico (5)	0	28.060	27.694	0,00	42,00	8,00	8,00	19,05
						52 Casa Campo Anexo Estaión Experimental Agropecuaria Colonia Benitez (5)	0	224.440	224.415	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						55 Construcción Edificio Agencia Ext.Rural General Pinedo (5)	0	168.520	163.883	0,00	40,00	42,00	42,00	105,00
						56 Construcción Edificio p/Agencia Ext.Rural Güemes y Viviendas Personal (5)	0	100.990	4.582	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						57 Construcción Sanitarios, Depósito y SUM en Campo Anexo San Antonio (5)	0	328.640	309.829	0,00	42,00	100,00	100,00	238,10
						59 Ampliación Edificio Agencia Ext.Rural Lavalle (5)	0	30.030	29.969	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						60 Construcción Edificio p/Agencias Ext. Rural San Rafael (5)	0	555.410	555.389	0,00	94,00	47,00	100,00	106,38
						63 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural Ceres (5)	0	29.540	29.498	0,00	100,00	60,00	160,00	160,00
						65 Construción Edificio p/Agencia Ext. Rural Cruz del Eje (5)	0	30	0	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
						66 Construcción Cochera y Galpón Agencia Ext.Rural San Antonio de Areco (5)	0	33.230	33.100	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
						67 Ampliación Sanitarios Agencia Ext. Rural Carhue (5)	0	20	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						68 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural San Martin de los Andes (5)	0	460	400	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						69 Ampliación Edificio Agencia Ext. Rural Cipolletti (5)	0	98.840	98.800	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						70 Ampliación Unidad Ext. y Experimentación Adapataiva Gral.Pico (5)	0	9.010	8.986	0,00	50,00	0,00	5,00	10,00
						71 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Concaran (5)	0	116.820	115.756	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
						72 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural San Luis (5)	0	144.120	141.759	0,00	s/i	49,00	49,00	
						73 Remodelación Edificio Agencia Ext. Rural Trevelín (5)	0	79.600	79.544	0,00	s/i	100,00	100,00	
						74 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Puerto Rico (5)	0	44.700	44.670	0,00	s/i	10,00	10,00	
						75 Construcción Edificio p/Agencia Ext. Rural Guatrache (5)	0	129.240	129.325	0,00	s/i	25,00	25,00	
				28		Construcciones y Ampliaciones Centros Regionales Tucumán-Sgo. del Estero/Chaco-Formosa (9)	0	101.940	99.645	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción Laboratorio Agroindustrial Apicola, Dependencia y Oficina E.E.A. Famailla (9)	0	100.020	99.645	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						52 Edificio p/ Agencia de Extensión Rural Formosa (9)	0	1.920	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
609				16		INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA								
						Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola								
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	422.600	405.439	41,74	58,26	6,82	19,89	34,14
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	340.000	422.600	405.439	30,50	40,25	16,46	47,99	119,23
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	100.920	27,90	12,00	9,17	11,57	96,42
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	101.500	101.500	100.920	27,90	12,00	9,17	11,57	96,42
				3		Equipamiento Analítico	447.660	378.311	377.840	50,16	13,00	7,69	10,61	81,62
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	447.660	378.311	377.840	50,16	13,00	7,69	10,61	81,62
				4		Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.309	418.092	97,31	2,69	13,61	20,15	749,07
						51 Modernización de la Tecnología de la Información (4)	456.960	456.309	418.092	97,31	2,69	13,61	20,15	749,07
				623		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA								
				17		Servicios de Laboratorios								
				14		Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (7)	3.800.000	3.217.934	2.124.518	10,00	0,00	0,00	5,00	
						51 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (7)	3.800.000	3.217.934	2.124.518	10,00	0,00	0,00	5,00	
56				105		Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios								
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA								
				20		Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear								
				1		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.142.374	679.248	90,00	4,00	0,45	1,24	31,00
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	2.181.000	2.142.374	679.248	90,00	4,00	0,45	1,24	31,00
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	759.497	750.695	95,00	3,00	3,00	3,29	109,67
						51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	128.000	759.497	750.695	95,00	3,00	3,00	3,29	109,67
				3		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	1.878.116	1.477.243	39,00	7,00	4,50	7,84	112,00
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	450.000	1.878.116	1.477.243	39,00	7,00	4,50	7,84	112,00
				4		Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	539.685	499.112	28,00	4,00	0,40	4,00	100,00
						51 Laboratorio de Caracterización de Materiales	500.000	539.685	499.112	28,00	4,00	0,40	4,00	100,00
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	182.105	157.301	0,00	10,00	6,50	10,40	104,00
						51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4 (1)	130.000	182.105	157.301	0,00	10,00	6,50	10,40	104,00
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.620.999	2.137.644	0,00	50,00	6,30	50,00	100,00
						51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 (1)	370.000	2.620.999	2.137.644	0,00	50,00	6,30	50,00	100,00
				8		Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	1.460.078	596.687	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael (5)	0	1.460.078	596.687	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)					
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
					9	Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	195.816	178.618	0,00	10,00	7,10	7,65	76,50
						51 Construcción de Dispositivo p/ Irradiación de Barras Combustibles (1)	250.000	195.816	178.618	0,00	10,00	7,10	7,65	76,50
					10	Ampliación Laboratorios CAB	500.000	825.000	632.118	52,16	30,00	10,00	14,10	47,00
						51 Ampliación Laboratorios CAB	500.000	825.000	632.118	52,16	30,00	10,00	14,10	47,00
					11	Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	189.090	189.089	25,84	20,00	0,02	8,39	41,95
						51 Ampliación Capacidad Experimental CAB	191.000	189.090	189.089	25,84	20,00	0,02	8,39	41,95
					12	Instalación y Puesta en Funcionamiento Reactores de Baja Potencia (5)	0	3.194.987	2.295.779	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2 (5)	0	3.194.987	2.295.779	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear								
					1	Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	76.583	88,28	8,00	1,35	7,15	89,38
						51 Ampliación del Laboratorio Calibración en Dosimetría	85.000	85.000	76.583	88,28	8,00	1,35	7,15	89,38
					2	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	301.779	271.122	94,71	4,00	1,59	3,51	87,75
						51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	235.000	301.779	271.122	94,71	4,00	1,59	3,51	87,75
					3	Saneamiento del CAE	250.000	398.047	333.037	88,93	11,00	2,30	9,10	82,73
						51 Saneamiento del CAE	250.000	398.047	333.037	88,93	11,00	2,30	9,10	82,73
					4	Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	38.860	21.600	27,05	20,00	0,00	4,30	21,50
						51 Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	38.860	21.600	27,05	20,00	0,00	4,30	21,50
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	150.000	0,00	7,00	7,00	7,00	100,00
						51 Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos (1)	3.450.000	150.000	150.000	0,00	7,00	7,00	7,00	100,00
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	179.505	155.986	0,00	12,00	9,85	9,85	82,08
						51 Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos (1)	3.750.000	179.505	155.986	0,00	12,00	9,85	9,85	82,08
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	83.000	63.809	0,00	6,00	2,90	5,32	88,67
						51 Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) (1)	75.000	83.000	63.809	0,00	6,00	2,90	5,32	88,67
					8	Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	92.205	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Ciclotrón de Producción (1)	175.000	92.205	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
					9	Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Fuentes Selladas de Cesio-137 (1)	150.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	340.205	316.860	0,00	8,00	7,17	8,00	100,00
						51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET) (1)	470.000	340.205	316.860	0,00	8,00	7,17	8,00	100,00
					11	Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	140.543	92.260	0,00	3,00	1,70	2,25	75,00
						51 Construcción y Equipamiento Laborat. p/ Materiales y Combust.Nucleares (1)	130.000	140.543	92.260	0,00	3,00	1,70	2,25	75,00
					12	Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	323.266	305.866	0,00	10,00	7,70	8,53	85,30
						51 Construcción Planta para Combustibles de Muy Alta Densidad (1)	390.000	323.266	305.866	0,00	10,00	7,70	8,53	85,30
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	23.000	22.532	0,00	3,00	0,35	0,35	11,67
						51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1 (1)	50.000	23.000	22.532	0,00	3,00	0,35	0,35	11,67
					14	Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	5.296.138	3.312.236	0,00	12,00	2,85	5,02	41,83
						51 Puesta en Marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio (1)	1.897.600	5.296.138	3.312.236	0,00	12,00	2,85	5,02	41,83
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental								
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.453.000	1.237.416	1.208.291	79,49	13,60	7,64	11,42	83,97
						51 Área Gestión Ezeiza	1.350.000	1.131.416	1.112.651	62,89	15,00	7,96	12,00	80,00
						52 Laboratorio Control y Verificación	103.000	106.000	95.640	91,68	6,00	5,92	8,32	138,67
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.832.000	610.698	594.453	24,37	5,74	0,87	1,94	33,80
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	1.635.000	379.685	370.042	15,82	9,00	1,25	4,62	51,33
						52 Repositorio Fase 1	197.000	231.013	224.411	27,21	1,00	0,75	1,06	106,00
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	616.373	407.126	48,70	36,00	7,51	25,00	69,44
						51 Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	238.000	616.373	407.126	48,70	36,00	7,51	25,00	69,44
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad	10.400.000	3.301.167	3.167.193	24,47	13,07	2,08	3,66	28,00
						51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	7.199.700	2.868.723	2.747.031	30,08	14,00	2,90	4,70	33,57
						52 Tratamiento colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	1.761.000	255.100	243.173	18,46	12,00	1,06	2,00	16,67
						53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	1.289.300	167.258	168.066	8,25	11,00	0,12	2,52	22,91
						54 Remodelación Casa Guayra	150.000	10.086	8.923	72,68	0,50	0,50	1,00	200,00
					5	Laboratorio de Química Analítica	100.000	1.032.348	973.024	53,95	2,00	10,26	12,00	600,00
						51 Laboratorio de Química Analítica	100.000	1.032.348	973.024	53,95	2,00	10,26	12,00	600,00
					6	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	30.624	95,19	4,81	0,78	4,81	100,00
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 1	35.000	35.000	30.624	95,19	4,81	0,78	4,81	100,00
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	498.740	466.121	0,00	6,00	6,35	9,50	158,33
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3 (1)	255.000	498.740	466.121	0,00	6,00	6,35	9,50	158,33
23						Investigación, Formación de RRHH y Aplicaciones no Nucleares								

AI 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)				
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
								al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
108	16				1	Centro Aceleración de Iones	670.000	2.856.170	2.809.850	35,53	3,00	7,56	10,00	333,33
					51	Centro Aceleración de Iones	670.000	2.856.170	2.809.850	35,53	3,00	7,56	10,00	333,33
					2	Lab.Integrado p/Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	2.133.652	1.886.534	42,35	46,00	14,95	55,00	119,57
					51	Lab.Integrado p/Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos (4)	530.000	2.133.652	1.886.534	42,35	46,00	14,95	55,00	119,57
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	916.000	762.338	0,00	4,00	8,00	12,00	300,00
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología (1)	200.000	916.000	762.338	0,00	4,00	8,00	12,00	300,00
						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA								
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua								
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	98,00	1,00	0,00	1,00	100,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	98,00	1,00	0,00	1,00	100,00
354	17				2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	454.552	454.552	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	100.000	179.890	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	108.552	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	60.000	274.662	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejoras y Recuperación Bco. de Bombas del Laboratorio de Hidráulica (1)	200.000	186.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE PLANIFICACION FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS								
						Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo BID 1059-OC/AR(8)								
					2	Saneamiento Cloacal en La Matanza	10.654.800	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	3.854.800	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudeste en La Matanza	3.400.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
19					53	Colector Troncal - Ruta 21 - en La Matanza	3.400.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					3	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Rect. Av. C. Pellegrini Villa Diamante - Lanus	886.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					4	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Relleno Sanitario Cuenca Alta	687.200	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					5	Construcción Puente Roca-Patricios	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Puente Roca-Patricios	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						Recursos Hídricos								
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (2)	200.000	300.000	299.593	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56	Aliviador Cildanez - Etapa II (2)	0	300.000	299.593	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II (2)	200.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	437.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	330.000	437.041	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	3.741.100	3.741.100	0,00	90,00	11,84	37,56	41,73
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	8.000.000	3.741.100	3.741.100	0,00	90,00	11,84	37,56	41,73
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.434.290	2.433.284	0,00	1,00	s/i	s/i	s/i
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	2.034.700	2.434.290	2.433.284	0,00	1,00	s/i	s/i	s/i
					31	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	s/i	s/i	s/i
					51	Cildáñez Etapa III Villa Insuperable (1)	41.800.000	0	0	0,00	40,00	s/i	s/i	s/i
					32	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	s/i	s/i	s/i
51	Obra Const.Dique, Represa y Defensas en Cusi Cusi-Dto.Sta.Ca (1)	900.000	0	0	0,00	18,00	s/i	s/i	s/i					
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	0	2.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional (5)	0	2.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						Ejecución de Obras de Arquitectura								
					1	Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	25.406.004	21.281.782	40,35	11,00	1,26	4,97	45,18
					51	Restauración de Monumentos Históricos	12.500.000	25.406.004	21.281.782	40,35	11,00	1,26	4,97	45,18
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	3.550.000	3.885.000	3.655.329	58,31	8,00	0,36	1,57	19,63
					51	Edificios Fiscales	3.550.000	3.885.000	3.655.329	58,31	8,00	0,36	1,27	15,88
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	1.000.000	6.536.891	6.525.088	16,14	5,00	2,45	10,93	218,60
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II (4)	900.000	5.231.491	5.220.158	0,00	5,00	2,45	10,93	218,60
					52	Defensa Costera	100.000	1.305.400	1.304.930	49,70	42,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	258.000	28.493	49,52	50,48	0,00	0,19	0,38
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	10.000	258.000	28.493	49,52	50,48	0,00	0,19	0,38
					12	Protección Cueva de las Manos	338.972	258.972	258.127	99,34	0,66	0,00	0,65	98,48
					51	Protección Cueva de las Manos	338.972	258.972	258.127	99,34	0,66	0,00	0,65	98,48
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia	1.800.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					14	Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	360.000	358.366	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al 31/12/2007	% Ejec./Progr. anual
								al 31/12/2007	31/12/2007					
						51 Obra Civil - BID1201- OCAR Complejo Positrón (2)	100.000	360.000	358.366	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	68.576.136	68.551.849	32,51	25,00	9,62	65,48	261,92
						51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela (4)	24.386.178	68.576.136	68.551.849	32,51	25,00	9,62	65,48	261,92
				21		Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	8.043.000	7.944.072	10,16	52,00	10,51	35,92	69,08
						51 Restauración y Puesta en Valor. Basílica Ntra. Sra. de Luján	9.700.000	8.043.000	7.944.072	10,16	52,00	10,51	35,92	69,08
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	5.898.499	5.098.499	3.206.374	0,00	8,00	6,13	6,13	76,63
						0 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID Ar - L-1004	1.937.806	293.950	76.766					
						51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	3.960.693	4.804.549	3.129.608	0,00	8,00	6,13	6,13	76,63
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	5.900.000	3.951.996	0,00	45,00	8,74	12,52	27,82
						51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	6.000.000	5.900.000	3.951.996	0,00	45,00	8,74	12,52	27,82
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	200.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				26		Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puesto Fronterizo Paso Cardenal Samoré (1)	350.000	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				27		Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puesto Fronterizo Paso San Sebastián (1)	400.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				28		Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						51 Puesto Fronterizo Paso Posadas (1)	50.000	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
				29		CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
						51 CERIDER Pabellón 4 (1)	1.000.000	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas (1)	8.500.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	0	0	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
						51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once (1)	100.000	0	0	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
				33		Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Restauración de la Basílica Ntra. Sra. de Lujan Etapa III (3)	0	10.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				30		Prevención Sísmica								
				1		Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	522.000	479.744	57,80	4,70	0,80	4,60	97,87
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	522.000	479.744	57,80	4,70	0,80	4,60	97,87
				32		Formul.y Ejecu.de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)								
				3		Construcción Huellas Mineras Etapa II	3.245.000	1.838.411	1.784.790	57,00	32,00	7,00	20,00	62,50
						0 Construcción Huellas Mineras Etapa II	594.027	521.427	472.636					
						51 Huellas Varias Misiones	250.973	0	0	59,00	32,00	7,00	25,00	78,13
						52 Huellas Mineras NOA	750.000	393.416	393.416	59,00	32,00	4,00	17,00	53,13
						53 Huellas Mineras Cuyo	750.000	773.568	768.737	59,00	32,00	3,00	17,00	53,13
						54 Huellas Mineras Comahue	450.000	150.000	150.000	54,00	32,00	20,00	38,00	118,75
						55 Huellas Mineras Patagonia	450.000	0	0	54,00	32,00	0,00	6,00	18,75
				4		Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (9)	0	591.000.000	553.946.111	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (9)	0	591.000.000	553.946.111	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				50		Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas								
				2		Obras Viales. Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	100.000	265.000	261.723	0,00	5,00	s/i	s/i	s/i
						52 Puente Encarnación - Posadas	100.000	265.000	261.723	0,00	5,00	s/i	s/i	s/i
				13		Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	8.388.512	8.375.815	0,00	100,00	8,35	62,35	62,35
						51 Escuela Nacional de Náutica	7.217.012	8.388.512	8.375.815	0,00	100,00	8,35	62,35	62,35
				14		Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
						51 Escuela Nacional Fluvial	4.071.988	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
				55		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario								
				2		Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	99.288.912	80.010.912	77.494.664	99,75	0,25	s/i	s/i	s/i
						0 Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR - Etapa II	9.501.725	10.689.725	8.392.923					
						52 Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles	81.949.712	45.133.712	44.231.959	13,02	86,98	6,25	33,16	38,12
						54 Modernización Línea A - Señalamiento y Radiocomunicación	4.837.475	10.687.475	6.144.756	72,06	27,94	2,50	14,91	53,36
						66 Paso a Diferente Nivel, Municipio de San Fernando - Tigre	3.000.000	13.500.000	18.725.026	64,00	36,00	s/i	s/i	s/i
				4		Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	78.318.491	54.488.677	52.756.196	12,42	46,98	6,11	36,06	76,76
						0 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF 3192)	4.933.332	3.916.518	2.549.055					
						51 Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	73.385.159	50.572.159	50.207.141	12,42	46,98	6,11	36,06	76,76
				5		Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Moreno ex Línea Sarmiento (9)(11)	0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
						51 Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Liniers, Etapa I (9) (11)	0	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				89		Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"(BID 1345)								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)					
						Descripción	Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra			al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
					1	Escuela Nacional Fluvial (1)	0	3.472.567	3.472.444	0,00	60,00	18,21	27,35	45,58
					51	Escuela Nacional Fluvial (1)	0	3.472.567	3.472.444	0,00	60,00	18,21	27,35	45,58
	91					Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables								
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	51.336.468	51.336.467	7,52	49,00	20,35	37,07	75,65
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	9.500.000	51.336.468	51.336.467	7,52	49,00	20,35	37,07	75,65
					3	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción Uruguay	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					4	Puerto Diamante	800.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	800.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					5	Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	0	0	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
					51	Repar. Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Pto. Madryn	2.000.000	0	0	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
					6	Reparación Puente Uriburu	0	441.067	441.067	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00
					51	Reparación de Estructura de Tablero y Calzada	0	441.067	441.067	79,00	21,00	0,00	21,00	100,00
					7	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	0	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	0	0	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
					8	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	1.000.000	0	0	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
					9	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	1.000.000	0	0	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
					10	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	2.000.000	0	0	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
					11	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	1.000.000	0	0	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
					12	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					13	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	1.000.000	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
					14	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.500.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
					15	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.000.000	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
					16	Dragado Río Uruguay	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					17	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					19	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	0	0	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
					20	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	2.000.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					22	Reparación Parque España (1)	2.000.000	0	0	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Parque España (1)	2.000.000	0	0	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
					23	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera (1)	2.000.000	0	0	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					24	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II (1)	1.000.000	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					25	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN (1)	1.000.000	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
451						DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
					16	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios (10)								
					1	Remodelación Fábrica Río Tercero (5)	0	10.632.000	6.870.135	0,00	100,00	58,08	100,00	100,00
					51	Remodelación Planta Amoniaco (5)	0	1.506.430	303.185	0,00	100,00	90,72	100,00	100,00
					52	Remodelación Planta Acido Nítrico (5)	0	5.380.890	4.555.620	0,00	100,00	28,38	100,00	100,00
					53	Remodelación Planta Acido Sulfúrico (5)	0	1.159.280	681.322	0,00	100,00	74,18	100,00	100,00
					54	Remodelación Planta Mecánica (5)	0	1.090.750	759.182	0,00	100,00	74,83	100,00	100,00
					55	Remodelación Infraestructura Laboratorios (5)	0	265.750	2.292	0,00	100,00	97,79	100,00	100,00
					56	Obras Menores (5)	0	1.228.900	568.535	0,00	100,00	25,76	100,00	100,00
					2	Remodelación Fábrica Azul (5)	0	1.544.325	183.932	0,00	100,00	90,02	100,00	100,00
					51	Remodelación Fábrica Azul (5)	0	1.350.325	156.848	0,00	100,00	90,01	100,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
								al 31/12/2007	31/12/2007			31/12/2006	4° trim.	31/12/2007
						52 Obras Menores (5)	0	194.000	27.084	0,00	100,00	90,10	100,00	100,00
				3		Remodelación Fábrica Villa María (5)	0	3.968.360	2.941.729	0,00	100,00	35,03	100,00	100,00
						51 Remodelación Fábrica Villa María (5)	0	3.651.975	2.539.688	0,00	100,00	32,87	100,00	100,00
						52 Obras Menores (5)	0	316.385	402.041	0,00	100,00	50,95	100,00	100,00
				4		Remodelación Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	3.009.740	2.821.257	0,00	100,00	59,50	100,00	100,00
						51 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	2.435.540	2.704.095	0,00	100,00	59,87	100,00	100,00
						52 Obras Menores (5)	0	574.200	117.162	0,00	100,00	56,31	100,00	100,00
				5		Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes (5)	0	3.110.660	1.305.020	0,00	100,00	83,15	90,95	90,95
						51 Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes Fábrica Río Tercero (5)	0	1.160.000	1.101.642	0,00	100,00	90,85	100,00	100,00
						52 Infraestructura para el Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes Fábrica Azul (5)	0	1.564.660	201.742	0,00	100,00	95,82	100,00	100,00
						53 Obras Menores (5)	0	386.000	1.636	0,00	100,00	25,05	27,05	27,05
				6		Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas (5)	0	4.344.575	1.806.737	0,00	100,00	67,21	93,40	93,40
						51 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Río Tercero (5)	0	1.000.000	1.041.026	0,00	100,00	83,66	100,00	100,00
						52 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Fray Luis Beltrán (5)	0	1.550.000	85.897	0,00	100,00	25,54	100,00	100,00
						53 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas Fábrica Azul (5)	0	1.268.907	609.970	0,00	100,00	69,94	89,13	89,13
						54 Obras Menores	0	525.668	69.844	0,00	100,00	63,93	79,94	79,94
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO								
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento								
				20		2 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	19.920.237	22.697.576	22.697.109	66,59	30,00	0,00	19,80	66,00
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham-Morón-Ituzaingo	742.512	747.242	3.465.556	84,77	15,23	0,00	15,23	100,00
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (4)	14.136.489	14.549.060	9.942.446	75,47	17,80	0,00	12,05	67,70
						53 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón - 3 de Febrero	5.041.236	7.401.274	9.289.107	39,53	40,47	0,00	32,11	79,34
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación Paraná	29.103.558	35.010.405	35.008.469	46,90	43,00	0,00	29,06	67,58
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación y Optimización Sistema de Captación Paraná	21.173.555	21.973.493	21.026.977	56,92	43,00	0,00	29,31	68,16
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución Paraná	7.930.003	13.036.912	13.981.492	46,79	43,00	0,00	28,95	67,33
				4		Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.(4)	8.631.415	17.667.623	17.655.970	57,27	42,73	0,00	42,73	100,00
						51 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.(4)	8.631.415	17.667.623	17.655.970	57,27	42,73	0,00	42,73	100,00
				5		Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba (4)	27.309.750	41.923.865	41.918.849	20,43	70,55	0,00	58,01	82,23
						51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba (4)	27.309.750	41.923.865	41.918.849	20,43	70,55	0,00	58,01	82,23
				6		Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut)	14.745.213	20.754.637	20.753.760	74,08	20,00	0,00	22,25	111,25
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (PM - Chubut) (4)	14.745.213	20.754.637	20.753.760	74,08	20,00	0,00	22,25	111,25
				7		Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Constucción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As. (#) (1)	7.323	7.323	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.126.865	11.176.999	11.175.019	23,48	35,52	0,00	14,96	42,12
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	12.949.333	10.999.467	11.175.019	46,95	43,05	0,00	25,52	59,28
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	6.177.532	177.532	0	0,00	18,00	0,00	4,46	24,78
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	24.540.227	32.945.019	32.941.699	31,86	36,95	0,00	22,86	61,87
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	6.708.350	10.385.539	17.110.727	60,43	39,57	0,00	30,18	76,27
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	17.831.877	22.559.480	15.830.972	3,28	30,00	0,00	25,19	83,97
				10		Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(4)	172.600	7.773.435	7.768.189	0,00	9,78	0,00	3,64	37,22
						51 Construcción de Acueductos p/ 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.(#)	17.359	7.618.194	7.164.869	0,00	0,00	0,00	7,27	#1DIV0!
						52 Perforación 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	155.241	155.241	603.320	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja (4)	4.247.851	14.033.041	13.997.066	43,39	56,61	0,00	56,61	100,00
						51 Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja (4)	4.247.851	14.033.041	13.997.066	43,39	56,61	0,00	56,61	100,00
				12		Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	6.605.494	6.603.949	0,00	52,64	0,00	23,95	45,50
						51 Construcción Planta de Trat. de Líq. Cloacales Chascomús Bs. As.	2.584.891	6.605.494	6.603.949	0,00	52,64	0,00	23,95	45,50
				13		Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	25.000	25.000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cloacas y Depuradoras Lago San Roque - Cosquín - Sta. María	9.964.899	25.000	25.000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
				14		Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	571.158	528.535	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Constr. Acueducto La Laguna Laboulaye Córdoba	206.531	571.158	528.535	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital (#) (4)	57.359	6.301.976	6.296.966	0,00	11,60	0,00	6,04	52,07
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital (#) (4)	57.359	6.301.976	6.296.966	0,00	11,60	0,00	6,04	52,07
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa (4)	27.463.825	48.901.419	48.901.404	15,42	52,10	0,00	37,48	71,94
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	18.611.840	26.218.166	13.585.550	10,31	29,19	0,00	19,95	68,35
						52 Optimización de Sisema de Provisión de Agua Potable Formosa (4)	8.851.985	22.683.253	35.315.854	20,53	75,00	0,00	55,42	73,89
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.688.785	4.681.094	0,00	20,63	0,00	11,06	53,61
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.508.938	4.688.785	4.681.094	0,00	20,63	0,00	11,06	53,61
				18		Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	58.057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

						FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
						Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						51 Obra Distribución Agua Potable Desierto Lavallino Mendoza (#)	83.359	58.057	0	0,00	0,00	0,00	
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	40.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú Misiones	3.589.271	40.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
				20		Construcción Acueducto V. Regina Río Negro (4)	1.222.597	3.388.449	3.377.707	0,00	31,53	0,00	15,69
						51 Construcción Acueducto V. Regina Río Negro (4)	1.222.597	3.388.449	3.377.707	0,00	31,53	0,00	15,69
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	8.084.291	8.081.721	0,00	45,90	0,00	32,84
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	3.283.550	8.084.291	8.081.721	0,00	45,90	0,00	32,84
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	20.840.944	31.648.941	31.623.781	20,92	28,00	0,00	14,41
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	6.482.420	17.700.951	16.397.980	31,14	50,00	0,00	42,49
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	14.331.165	13.920.631	15.225.801	31,62	50,00	0,00	25,76
						53 Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan (#)	27.359	27.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	59.583.664	59.577.274	9,68	51,05	0,00	39,80
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	44.058.202	59.583.664	59.577.274	9,68	51,05	0,00	39,80
				24		Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	9.213.656	15.700.708	15.700.458	2,74	30,00	0,00	17,08
						51 Constr. de Planta Depuradora Norte - Tandil - Bs. As. (#)	7.359	37.359	23.210	2,00	0,00	0,00	0,00
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil - Bs. As.	9.206.297	15.663.349	15.677.248	3,48	60,00	0,00	34,06
				25		Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil - Bs. As.	3.006.352	7.181.264	7.114.184	83,88	16,12	0,00	16,12
						51 Construcción 9 Perforaciones Agua Potable Tandil - Bs. As.	3.006.352	7.181.264	7.114.184	83,88	16,12	0,00	16,12
				26		Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sistema de Desagües El Maitén - Chubut (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	7.359	7.359	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				28		Construcción de Acueducto L. del Tafi - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto L. del Tafi - Tucumán (#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				29		Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.(#)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Construcción Estación de Bombeo- San Isidro - Buenos Aires	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				30		Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	14.718	1.843.741	1.840.948	0,00	19,88	0,00	10,33
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	697.822	669.221	0,00	10,84	0,00	7,14
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	7.359	1.145.919	1.171.726	0,00	28,91	0,00	13,52
				31		C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 C. Acueducto L.Blanco - Pampa del Infierno - C.del Bermejo - Chaco	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				32		Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sist. Agua Potable San Salvador de Jujuy y Otras - Jujuy	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				33		Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Acueducto El Cadillal - Tucumán	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Desagües Cloacales Trelew - Chubut (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				36		Obras Integral Desagües y Tratamientos Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras Integral Desagües y Tratamientos (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Colectora Gral. y Planta Depuradora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				38		Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero - Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Sist.de Desagües Cloacales M.Clavero-Villa C.Brochero Cba. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				39		Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Regional Oeste Entrerriano (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				40		Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Potabilizadora de Agua y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				41		Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sist. de Desagües Cloacales Ciudad de Formosa (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Optimización de Sist. Provisión y Distrib. de Agua Potable (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				43		Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acueducto Río Colorado La Pampa Convenio Ley 25.565 art. 96 (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				44		Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema Integ. Desagües Cloac Colonia Segovia (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
					45	Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Optimización de Sistema de Desagües Cloacales Ing. Cipolletti (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					46	Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Plan Director de Desagües Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47	Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Obra Sistema Cloacal Ciudad de Malargüe - Mendoza (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					48	Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	35.632.521	35.632.521	0,00	68,36	0,00	35,00	51,20
					51	Construcción de Acueducto Sur - Salta (1)	7.359	35.632.521	35.632.521	0,00	68,36	0,00	35,00	51,20
					49	Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Acueducto del Este - San Luis (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50	Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Acueducto Norte - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción del Acueducto Sur - Santa Fe (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					52	Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Obras de Agua Potable en 9 de Julio y San Cristóbal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Cloaca y Colectores Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					54	Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Desagües Cloacales - Río Grande - Chacra (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Planta de Tratamiento de Agua en Tolhuin (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					56	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					57	Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Obra Embalse Acueducto Dique Potrero Las Tablas (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58	Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Obra Encauce Ríos Gestona Chirimayo - La Angostura (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					59	Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famailá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Desagües Cloacales - Loc. Famailá (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					61	Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Refuncionalización y Ampliación Sist. Agua Potable - Tupungato (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					62	Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Sistema Cloacal - Ciudad de San Martín (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63	Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable y Red Cloacal (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65	Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Colectora de Efluentes Cloacales (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					69	Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Acueducto en Lunhunt (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					72	Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Red de Desagües Cloacales en Loc. de Wini Fr (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					78	Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	701.308	701.308	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Acueducto - Loc. Alto (1)	900.000	701.308	701.308	0,00	0,00	0,00	0,00	
					81	Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Muro Conducción y Ampliac Planta Potabilizadora (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					87	Obras de Agua Potable (1)	233.714	43.714	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					55	Perf. de 12 Pozos y Centros de Mezcla - Corimayo AB Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60	Construcción de Redes de Distrib. Primarias - V. Independ Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					62	Construcción de Redes Secundarias B° San Martín - Lan. - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Ampliación de Redes y Construcción de Tanques Elevados para Refuerzo (1)	204.278	14.278	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65	Construcción de Redes de Expansión Primarias - Quilmes - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					88	Obras de Agua Potable - Establecimiento Ezeiza - Bs.As. (1)	14.718	14.718	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					53	Perf. de 27 Pozos - Batería Unión - Ezeiza - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60	Construcción de Redes Prim. de Expansión Mte. Grande Sur - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					91	Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					51	Optimización del Sist. de Agua Potable de Vedia - Bs. As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					92	Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs .As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						51 Ampliación del Sist. de Desagües Cloacales de Vedia - Bs.As. (1)	7.359	7.359	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
				98		Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora (1)	200.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta de Trat. Liq. Cloacales - Fiorito - L.Zamora (1)	200.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				99		Construcción de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Colectores Cloacales - Lomas de Zamora (1)	155.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO								
						Actividades Centrales								
				1		Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	730.760	96,23	3,77	0,60	3,48	92,31
						51 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.120.657	1.120.657	730.760	96,23	3,77	0,60	3,48	92,31
						3 Construcción Edif. Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	581.743	581.743	495.753	32,00	15,00	1,20	14,70	98,00
						51 Construcción Edificio 25	581.743	581.743	495.753	32,00	15,00	1,20	14,70	98,00
				19		Producción de Información Geológica de Base								
						1 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.257.000	1.104.436	31,11	3,00	0,69	2,82	94,00
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.347.000	1.257.000	1.104.436	31,11	3,00	0,69	2,82	94,00
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES								
						Infraestructura en Concesiones Viales								
				1		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires.	11.104.037	40.702.592	40.702.592	43,68	56,32	4,15	50,63	89,90
						51 Autovía Cañuelas - Monte Grande - R.N. 3 - Km. 87,82- Km. 97,561 Buenos Aires	11.104.037	40.702.592	40.702.592	43,68	56,32	4,15	50,63	89,90
				2		Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buenos Aires	1.402.765	60.605	60.605	93,45	6,55	0,00	0,17	2,60
						51 Obra de Alteo R.N.3 - Km. 607,5 - Km. 608,5 Coronel Dorrego - Buenos Aires.	1.402.765	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Interseccion R.N. 3 con R.N. 249 Acceso a Punta Alta	0	60.605	60.605	99,83	0,17	0,00	0,17	100,00
				3		Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia de Buenos Aires II	5.747.342	10.047.342	10.047.342	99,46	0,54	0,46	0,54	100,00
						51 Autovía Mar del Plata - Balcarce I Tramo R.226 - Km. 20,5 -	5.747.342	10.047.342	10.047.342	99,46	0,54	0,46	0,54	100,00
				4		Aumento de Capacidad en Corredores Viales Provincia Buenos Aires III	28.055.304	500	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata - Balcarce II Tramo - R.226- Km. 31,7 -	28.055.304	500	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				5		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Buenos Aires. II	1.402.766	4.092.576	4.069.144	17,97	44,15	0,00	33,16	75,11
						51 Mejora en Travesía Urbana R.N. 205 Km. C66 - Cañuelas Buenos Aires.	701.383	4.092.576	4.069.144	35,93	64,07	0,00	61,60	96,14
						52 Mejora Intersección e Iluminación R.N. 5 -Km. 260 9 de Julio Buenos Aires	701.383	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				6		Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	2.104.148	464.908	464.729	0,00	88,88	12,23	13,00	14,63
						51 Mejora Intersección R.N. 7 Km. 202,16 Chacabuco - Buenos Aires.	701.383	0	0	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora en Travesía Urbana R.N. 188 Km. 156,80 - Junín Buenos Aires.	1.402.765	464.908	464.729	0,00	88,88	26,16	26,93	30,30
				7		Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección R.N. 8 Km. 224,9 Pergamino Buenos Aires.	701.383	0	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				8		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires. IV	48.920.782	26.190.669	26.190.668	5,57	53,22	3,62	24,00	45,10
						51 Autopista Luján - Mercedes Sección I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 Buenos Aires.	24.448.391	529.047	2.187.631	0,00	66,67	2,16	2,49	3,73
						52 Autopista Luján - Mercedes Sección III RN 5 Km. 85,78 - Km. 95,6 Buenos Aires.	24.472.391	25.661.622	24.003.038	10,55	39,80	17,10	44,70	112,31
				9		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires. V	35.069.138	39.543.496	39.534.718	15,80	58,97	8,89	50,48	85,60
						51 Tramo Campana - Zárate R.N. 9 Entre Km. 72,62- Km. 85,20	35.069.138	39.543.496	39.534.718	15,80	58,97	8,89	50,48	85,60
				10		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe I	1.402.765	2.745.157	2.723.873	0,00	90,00	45,09	75,55	83,94
						52 Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista Santa Fe	1.402.765	2.745.157	2.723.873	0,00	90,00	45,09	75,55	83,94
				11		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Buenos Aires. VI	3.506.913	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Vinculación ex RN 193 Tramo Empalme RN 8 - Empalme RP 39 Exaltación de La Cruz	3.506.913	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				12		Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Córdoba I	3.506.913	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
						51 Obra en RN A005-Tramo Empalme RN 8 - Empalme RP 36 - Sección Km 0 - 12 Río Cuarto	3.506.913	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
				13		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia de Santa Fe II	2.104.148	0	0	0,00	90,00	3,00	3,00	3,33
						51 Mejoras en Intersección R.N. 33 Km.699,95 Venado Tuerto - Santa Fe	701.383	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Accesos R.N. 34 Km 387 - Ceres - Santa Fe	1.402.765	0	0	0,00	80,00	6,76	6,76	8,45
				14		Seguridad en Corredores Viales I (4)	1.364.954	7.644.094	7.618.801	70,15	10,00	s/i	s/i	s/i
						52 Construcción Pasarelas Peatonales RN 3 Km 76,75 Cañuelas Buenos Aires RN 33 Km751 (2)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Rotonda Acceso a Wheelwright Santa Fe RN 8 Km 294,60 (2)	1.000	842.433	842.432	100,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Travesía Urbana Río Cuarto Córdoba R.N.8 Km. 598,8A-5 Km 0-11,4; R.N. 36 (2)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Construcción Pasarelas Peatonales R.N.9 Km.1349,0 B.Paz Tucumán ;RN.9 Km 1459,80 M (2)	1.000	20.100	20.094	100,00	0,00	0,00	0,00	
						59 Mejora Intersección y Construcción Colectoras R.N.3 Km.109 110 San Miguel del Monte (2)	1.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						61 Construcción Canal Desagües Pluviales - Aparicio R.N.3 Km.555,9 Coronel Dorrego	35.069	421.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						63 Travesía Urbana R.N.188 Km.8,0 - 112,0 C.Salles , Erezcano, Acevedo, Guerrero	20.000	1.178.000	556.670	57,82	42,18	35,00	35,00	82,98
						66 Mejora Acceso a Vedia Buenos Aires. R.N.7 Km 312,26 Buenos Aires.	17.535	1.864.639	3.542.627	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
						67 Mejora Acceso a Alberti e Iluminación R.N. 5 Km. 189,39 Buenos Aires. (2)	44.000	246.902	246.901	100,00	0,00	0,00	0,00	
						68 Mejora Acceso Canalizado a la Laguna de Lobos R.N. 205 Km111,45 (2)	30.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción	FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado a	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al 31/12/2007	% Ejec./Progr. anual
								al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.		
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 Km 207,00 Buenos Aires.	280.553	980.553	919.020	0,00	100,00	1,93	98,88	98,88
						76 Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km 369,88	701.383	300.000	35.658	0,00	100,00	11,36	11,36	11,36
						78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	70.138	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						79 Mejora Intersección Acceso a San Esteban - Los Cocos Córdoba R.N.38 Km75,3	10.000	0	0	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
						80 Mejora de Acceso a Pinto Santiago del Estero RN 34 Km 496,08 (2)	10.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						81 Adecuación Urbana R.N. 34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	35.069	35.069	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						82 Construcción Intersección Canalizada R.N.12 Km. 1383,25 Santa Ana - Misiones	105.207	1.455.398	1.455.398	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
16						Iluminación y Travesías Urbanas Córdoba	140.277	763.984	659.999	51,39	48,61	10,65	57,51	118,31
						51 Iluminación Intersección R.N. 19 R.P.10 - Río Primero Córdoba.	140.277	763.984	659.999	51,39	48,61	10,65	57,51	118,31
17						Construcción de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (2)	10.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Construcción pasarela peatonal R.N. 5 Km. 74,18 Jauregui	10.000	0	0	96,40	3,60	0,00	0,00	0,00
21						Obras de Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Buenos Aires.	54.028	28	0	33,32	30,00	22,00	22,00	73,33
						51 Construcción Pasarela Peatonal R.N.8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz Buenos Aires.	30.000	0	0	31,42	50,00	68,58	68,58	137,16
						52 Construcción Colectora R.N. 3 Km. 109/110 - San Miguel del Monte Buenos Aires.	10.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Rotonda R.N. 3 Km. 192,34 - Intersección R.P. 30- Las Flores Buenos Aires.	14.028	28	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Córdoba II	7.013.826	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.8 Sección.Km. 606 - 619 Tramo Río IV - Holmberg	7.013.826	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta I	7.013.826	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.9 Km.1547 - 1555 Cabeza de Buey - Salta	7.013.826	0	0	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
25						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Salta II	3.506.913	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha R.N.34 Km.1129-1135,5 - Cabeza de Buey - Zorzalit	3.506.913	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26						Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán I	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 San Cayetano-Tucumán	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27						Seguridad en Corredores Viales en Provincia de Tucumán II	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28						Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	701.383	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29						Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	0	0	0,00	30,00	19,92	19,92	66,40
						51 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.402.765	0	0	0,00	30,00	19,92	19,92	66,40
30						Obras Menores en Concesiones Viales	4.942.343	7.936.981	7.914.363	30,88	47,62	8,24	20,28	42,59
						51 Rotonda en Intersección R.N.3 Km.448,7 - R.P. 75 González Chavez - Buenos Aires.	701.383	3.251.307	3.251.307	0,00	100,00	30,77	82,62	82,62
						52 Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Buenos Aires. (1)	701.383	1.710.009	1.888.417	0,00	100,00	63,20	63,20	63,20
						53 Adecuación de Acceso RN7 Km 139 Carmen de Areco - Buenos Aires. (1)	350.691	2.297.346	2.297.346	0,00	100,00	22,49	70,33	70,33
						54 Mejora Intersección R.N. 11 - Calle Santiago Cabral - San Lorenzo -Santa Fe	701.383	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Adecuación Acceso R.N.34 Km.252,60 - Sunchales - Santa Fe	172.941	476.941	476.537	93,01	6,99	0,01	6,99	100,00
						56 Mejora de Acceso R.N.12 Km.1056 Paso de la Patria Corrientes (1)	350.691	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora en Intersección R.N.12 Km. 1361 Candelaria Misiones (1)	350.691	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						58 Readecuación de Acceso RN12 Km.1398 San Ignacio Misiones (1)	350.691	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						59 Readecuación de Acceso RN12 Km.1416 Santo Pipa Misiones (1)	280.553	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						60 Readecuación de Acceso RN12 Km. 1445 Puerto Leoni Misiones (1)	280.553	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
						61 Rotonda e Iluminación en RN 3 Intersección con Av. Piazza Azul Buenos Aires. (1)	701.383	201.378	756	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
31						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones I	5.895.816	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
						51 Construcción de Terceras Trochas R.N.12 Km.1370 -1399 Arroyo San Juan	5.895.816	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
32						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones II	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
						51 Construcción 3ª Trocha R.N.12 Km.1399 - 1436 San Ignacio - Jardín Americano - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
33						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones III	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
						51 Construcción 3ª Trocha R.N.12 Km. 1442 - 1470 Jardín Americano - Puerto Rico - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
34						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Misiones IV	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
						51 Construcción 3ª Trocha R.N.12 Km. 1472,06 - Km 1540,33 - Puerto Rico - Misiones	6.807.613	0	0	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
35						Construcción 3ª Trocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provincia de Misiones	6.807.613	32.289.472	32.281.800	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
						51 Construcción 3ª Trocha R.N.12 Km.1370,038 - 1594,400 Provincia de Misiones	6.807.613	32.289.472	32.281.800	5,19	34,73	27,28	48,52	139,71
36						Construcción Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	1.664.354	1.664.181	99,87	0,13	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción Distribuidor de Bernal - Calle Espora - Quilmes	0	1.664.354	1.664.181	99,87	0,13	s/i	s/i	s/i
37						Seguridad en Corredores Viales en Provincia de La Pampa I	701.383	2.590.739	2.590.738	49,61	50,39	1,00	49,19	97,62
						51 Readecuación Acceso Planta Urbana R.N. 5 Km. 605 - 606 - Santa Rosa La Pampa	701.383	2.590.739	2.590.738	49,61	50,39	1,00	49,19	97,62
38						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Provincia de Mendoza I (4)	30.558.390	55.972.481	55.972.480	61,20	38,80	s/i	s/i	s/i
						51 Doble Vía Santa Rosa - General San Martín R.N.7 Km. 965,51-998,80 Mendoza (4)	30.558.390	55.972.481	55.972.480	61,20	38,80	s/i	s/i	s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Peaje Jaúregui	2.920.751	356.082	356.082	96,77	3,23	3,03	3,23	100,00
						51 Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II R.N.5 Km. 72,42	2.920.751	356.082	356.082	96,77	3,23	3,03	3,23	100,00
					40	Aumento de Capacidad en Corredores Viales - Provincia de Santiago del Estero I	701.383	112.206	112.206	99,72	0,28	0,28	0,28	100,00
						51 Ensanche Puente sobre Río Dulce R.N.9 Km.1205 - Termas Río Hondo Santiago del Estero.	701.383	112.206	112.206	99,72	0,28	0,28	0,28	100,00
					48	Construcción Pasarelas Peatonales en Provincia de Santa Fe	0	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN9 Km376 Cañada de Gomez (2)	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
					63	Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San Nicolás (2)	50.000	163.320	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Iluminación Intersección R.N.9 Km. 227,03 con R.N. 188 - San Nicolás (2)	50.000	163.320	163.319	100,00	0,00	0,00	0,00	
					64	Iluminación RN 11 en Chaco	50.000	374.993	374.992	75,94	24,06	1,22	24,06	100,00
						51 Iluminación RN 11 Km1000 - 1002 Resistencia Chaco	50.000	374.993	374.992	75,94	24,06	1,22	24,06	100,00
					65	Construcción de Destacamentos Policiales Provincia de Buenos Aires	2.496.922	702.874	702.873	0,00	30,71	s/i	s/i	s/i
						51 R.N.9 Km.54 Loma Verde - Escobar, RN9 - RP6 - Campana,RN8 - RP51 Arrecifes (4)	2.496.922	702.874	702.873	0,00	30,71	s/i	s/i	s/i
						52 R.N.205 y R.P.51 Saladillo, R.N.205 y 226 Bolivar, R.N.3 y RP86 Benito Juárez (1)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 R.N.22 Km. 714 Medanos, R.N.222 Km.769 Algarrobo - Punta Alta (1)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 R.N.188 Km.398 Banderale, R.N.33 entre R.P.65 Guamini, R.N.33 y Lima Provincia de Buenos Aires (1)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Edificio Cuerpo de Apoyo a los Servicios Viales - Km.31 Autopista Buenos Aires - La Plata (1)	0	0	0	0,00	50,00	s/i	s/i	s/i
					67	Seguridad en Corredores Viales - Tucumán III	701.383	1.250.280	1.250.280	79,16	20,84	0,01	20,84	100,00
						51 Pavimentación Colectora, Construcción e Iluminación Pasarelas R.N. 9 Tucumán (4)	701.383	1.250.280	1.250.280	79,16	20,84	0,01	20,84	100,00
					68	Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe	140.277	734.351	727.138	0,00	100,00	21,44	100,00	100,00
						51 Iluminación Distribuidor Funes - Autopista Rosario - Armstrong Intersección R.P. 34 - Funes Santa Fe	140.277	734.351	727.138	0,00	100,00	21,44	100,00	100,00
					69	Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	1.403.467	7.203.631	7.192.719	0,00	100,00	12,43	66,27	66,27
						51 Intersección Canalizada R.N.188 - Construcción Bicisenda Ameghino - Provincia de Buenos Aires.	701.383	1.827.172	1.820.537	0,00	100,00	27,96	37,24	37,24
						52 Intersección Canalizada para Giro Camiones R.N. 33 Km. 711 - Chabas Santa Fe	701.383	3.612.655	3.612.654	0,00	100,00	4,18	98,83	98,83
						53 Mejora Travesía Urbana R.N. 8 Venado Tuerto Santa Fe (1) (4)	701	1.763.804	1.759.528	0,00	100,00	25,51	100,00	100,00
					70	Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco	140.277	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal R.N.11 Barrio Toba - Resistencia - Chaco	140.277	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	370.277	666.366	666.365	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
						51 Rama de Salida Km.21 Autopista Richieri Buenos Aires	140.277	666.366	666.365	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas (1)	230.000	0	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
					72	Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	0	0	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora en Corredor Vial 29 (1)	150.000	0	0	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00
					73	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires II (1)	701	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en San Miguel del Monte y Punta Alta R.N.3 (1)	701	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					74	Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Buenos Aires (1)	100.000	0	0	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía R.N.226 - R.P. 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Buenos Aires (1)	100.000	0	0	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
					75	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba (1)	2.103	3.038.269	3.038.268	0,00	48,19	8,19	27,51	57,09
						51 Puente Sobre el Arroyo El Ajó R.N. 7 Km. 600 - Córdoba (1)	701	3.038.269	3.038.268	0,00	66,67	24,55	51,91	77,86
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9 - Córdoba (1)	701	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149 - 203 Córdoba (1)	701	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					76	Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales (1)	80.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta (1)	80.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					77	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Santiago del Estero (1)	701	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puente sobre el Río Dulce R.N. 34 Santiago del Estero (1)	701	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
					78	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos (1)	112.000	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso a Gualaguaychú R.N. 14 Entre Ríos (1)	112.000	0	0	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00
					80	Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provincia de Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección R.N.188 y R.N.33 General Villegas - Provincia de Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00
					81	Obras de Seguridad Vial en Provincia de Buenos Aires III (1)	141.917	1.163.378	1.013.992	0,00	17,06	1,17	1,17	6,86
						51 Mejora Intersección y Colectora R.N.3 Km. 186.72 - 187.29 Las Flores Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora Intersección y Colectora R.N. 5 km 208 - 211 Bragado - Buenos Aires. (1)	701	1.163.378	1.013.992	0,00	0,00	11,04	11,04	
						53 Construcción Tercer Puente La Niña R.N. 252 Buenos Aires. (1)	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Rotonda en Intersección R.N. 3 - R.N. 252 El Triángulo Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg R.N. 3 Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	
						56 Acceso Canalizado Dorrego (1)	701	0	0	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av Caseros y San Martín -Tres Arroyos (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Ilumación Rotondas R.N. 205 - R.P. 65 y R.P. 30 y R.N. 226 Buenos Aires (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 Obras de Alcantarillado en Bolivar - Buenos Aires (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam R.N.5 Km.305 - 307 Carlos Casares (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191 - Chacabuco (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av Elguera - Chacabuco (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución - Córdoba (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias - Buenos Aires. (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						68 Iluminación Acceso a Zárate R.N. 3 - Buenos Aires (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
82						Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II (1)	4.907	1.078.037	1.078.035	0,00	33,36	s/i	s/i	s/i
						51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Iluminación de Empalme de Acceso a R.P. 26 - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco R.N. 9 - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
						55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						57 Travesía Urbana en Murphy RN 33 - Santa Fe (1)	701	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 Travesías Urbanas en RN 11 (1)	0	1.078.037	1.078.035	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
83						Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puerto Tirol RN16 - Provincia de Chaco (1)	701	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
84						Travesía Urbana en Capiovi RN 12 - Misiones (1)	701	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						51 Travesía Urbana en Capiovi RN 12 - Misiones (1)	701	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
85						Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (1)(4)	200.000	18.128.037	18.128.037	0,00	1,00	2,90	8,88	888,00
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas - Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (1)(4)	200.000	18.128.037	18.128.037	0,00	1,00	2,90	8,88	888,00
86						Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy - Provincia de Buenos Aires. (1)	250.000	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
88						Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (1)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en Aeropuerto de Sauce Viejo - Provincia de Santa Fe (1)	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89						Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV (9)	0	1.552	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora RN Nº 36 Sección Variante Perilago Almafuerte (9)	0	1.552	0	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas								
1						Infraestructura en Áreas Urbanas (7)	455.197	0	0	0,00	1,00	s/i	s/i	s/i
						53 Rotonda en Intersección RN15 y Av. Monseñor Rosch - Concordia - Entre Ríos	350.691	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
						54 Iluminación en Intersección R.N.14 y R.N. 15 - Concordia - Entre Ríos	104.506	0	0	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2						Seguridad en Áreas Concesionadas II (7)	29.000	0	0	86,71	13,29	0,00	0,00	0,00
						51 Repavimentación RP 42 Sección RP 51 Acceso a Rawson Bs.As.	29.000	0	0	86,71	13,29	0,00	0,00	0,00
3						Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 La Plata - Buenos Aires (7)	7.714.507	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Vinculación y Remodelación RP11 Entre Diagonal 74 Calle 60 La Plata - Buenos Aires	7.714.507	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4						Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires (7)	5.000	0	0	68,71	31,29	6,00	6,00	19,18
						51 Pavimentación 30 cuadras Magdalena - Buenos Aires	5.000	0	0	87,39	12,61	12,61	12,61	100,00
5						Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 - Florencio Varela - Buenos Aires	36.220.978	81.527.394	81.527.393	40,18	59,82	0,73	59,82	100,00
						51 Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 - Florencio Varela - Buenos Aires	36.220.978	81.527.394	81.527.393	40,18	59,82	0,73	59,82	100,00
6						Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 - La Plata - Buenos Aires (7)	1.402.765	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Escuela 67 - La Plata - Buenos Aires	1.402.765	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7						Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido - Pilar - Buenos Aires (4)	701.383	4.971.125	4.971.124	29,77	70,23	s/i	s/i	s/i
						51 Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido - Pilar - Buenos Aires (4)	701.383	4.971.125	4.971.124	29,77	70,23	s/i	s/i	s/i
9						Mejoras en Provincia de Entre Ríos I (7)	7.328.747	0	0	0,00	80,00	18,33	18,33	22,91
						51 Mejoras en Accesos Sur - R.N. 14 Km.252,60 Concordia - Entre Ríos	7.328.747	0	0	0,00	80,00	18,33	18,33	22,91
11						Obras Menores en Áreas Urbanas	701.383	2.754.746	2.737.187	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
						51 Pavimentación Tramos Urbanos RN 9 Km 100,49 Lima Buenos Aires	701.383	2.754.746	2.737.187	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
12						Seguridad en Áreas no Concesionadas	210.415	4.714.454	4.714.453	0,00	100,00	18,33	18,33	18,33
						51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	210.415	4.714.454	4.714.453	0,00	100,00	18,33	18,33	18,33
13						Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	701.383	3.012.401	3.012.400	0,00	100,00	0,92	70,83	70,83
						51 Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	701.383	3.012.401	3.012.400	0,00	100,00	0,92	70,83	70,83
14						R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aires (1) (7)	0	0	0	0,00	46,67	s/i	s/i	s/i
						51 R.P. 25 - Tramo Pilar - Acceso Oeste - Provincia de Buenos Aires (1)	0	0	0	0,00	46,67	s/i	s/i	s/i
15						Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	1.869.439	1.868.504	0,00	100,00	36,29	41,24	41,24
						51 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe (1)	0	1.869.439	1.868.504	0,00	100,00	36,29	41,24	41,24
16						Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia de Entre Ríos (1)(7)	0	0	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)				FISICO (en %)			
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						51 Vinculación Acceso Puerto Yerua RN.14 Km.242,36 Provincia de Entre Rios (1)	0	0	0	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	19					Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales								
					1	Obras Mejorativas en Corredor Vial 2 - Año II - I Etapa	5.000.000	47.058.645	47.049.313	25,40	74,60	17,24	72,00	96,51
						51 Obra Mejorativa N°212 Corredor Vial 2 - RN5 Km.98 -107 Km.143 - 150 Km. 208 - 221	1.000.000	12.711.717	12.713.951	48,11	51,90	3,49	51,66	99,54
						52 Obra Mejorativa N°221 Carredor Vial 2-RN7 Km. 259 - 276	1.000.000	13.775.601	13.775.239	14,32	85,68	0,00	85,68	100,00
						53 Obra Mejorativa N°208 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Km. 457 - 492	1.000.000	5.070.263	5.070.262	91,20	8,80	0,00	8,80	100,00
						55 Obra Mejorativa N°211 R.N.7 Km. 399 - 406 Km.424 - 457	2.000.000	15.501.064	15.489.861	16,18	83,82	s/i	s/i	s/i
					2	Corredor Vial 3	5.000.000	11.741.553	11.741.552	0,91	68,83	14,10	40,00	95,29
						51 Obra Mejorativa N°214 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.157-206	2.000.000	4.282.675	4.487.273	1,82	58,75	s/i	s/i	s/i
						52 Obra Mejorativa N°201 Corredor Vial 3 - R.N.9 Km.96-106	3.000.000	7.458.878	7.254.279	0,00	100,00	25,39	81,65	81,65
					3	Obras Mejorativas en Corredor Vial 4 - Año II - I Etapa	7.000.000	44.631.140	44.479.227	6,64	80,86	s/i	s/i	s/i
						51 Obra Mejorativa N°205 Corredor Vial 4 R.N.8 Km.661 - 695	3.500.000	24.047.985	22.524.689	19,93	80,07	0,36	80,07	100,00
						52 Obra Mejorativa N°206 Corredor Vial 4 R.N.33 Km.586 - 616, Km. 673 - 675	3.500.000	20.583.155	21.954.538	0,00	100,00	s/i	s/i	s/i
					5	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa	29.138.939	44.862.964	44.843.203	15,54	66,65	10,83	59,00	88,52
						0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5 - Año II - I Etapa (1)	3.000.000	1.690.000	1.849.244					
						51 Obra Mejorativa N°217 Corredor Vial 5 - R.N.9 Km. 1215 - 1225, Km.1315 - 1325	9.273.024	5.854.503	6.080.165	75,92	24,08	4,19	24,08	100,00
						52 Obra Mejorativa N°203 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 584 - 612, Km. 646 - 651, Km. 684 - 696	5.000.000	24.284.369	24.284.368	8,87	91,13	0,00	90,51	99,32
						53 Obra Mejorativa N°227 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Km. 1164 - 1177	4.359.002	10.089.516	10.089.515	8,56	91,44	2,53	90,82	99,32
						54 Obra Mejorativa N°218 Corredor Vial 5 - R.N.34 Km. 66,00 - 86,00	7.506.913	2.944.576	2.539.910	0,00	90,00	21,13	29,47	32,74
					6	Obras de Mejoras en Corredor Vial 1 - Año II - Etapa II (1) (7)	99.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra 236 Corredor Vial 1 - R.N. 3 y RN 252 - Km. 669-677 R.N. 252 Km. 0 - 6.80 (1)	98.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra 241 Corredor Vial 1 - R.N. 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos Buenos Aires (1)	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7	Obras de Mejoras en Corredor Vial 2 - Año II - Etapa II (1) (7)	546.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra 209 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 10 Acceso a Washington (1)	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra 222 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Limite San Luis / Mendoza - Acceso La Dormida (1)	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Obra 224 Corredor Vial 2 - R.N. 7 Empalme R.P. 6 - R.P. 41 Km. 63 - 103 (1)	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54 Obra 234 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Acceso Carlos Casares - Acceso San Bernardo (1)	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55 Obra 240 Corredor Vial 2 - R.N. 5 Limite Buenos Aires / La Pampa - Acceso Uriburu (1)	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa (1) (7)	729.000	0	0	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
						51 Obra 202 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Acceso a San Pedro (1)	133.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
						52 Obra 215 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Areco - Río Tala (1)	120.000	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						53 Obra 216 Corredor Vial 3 - R.N. 9 Río Tala - RP 51 (1)	138.000	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a Corredor Vial 3 - R.N. 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe (1)	100.000	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						55 Obra 223b Corredor Vial 3 - R.N. 11 Santo Tobrae - Santa Fe (1)	138.000	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
						56 Obra 232 Corredor Vial 3 - R.N. 188 Empalme R.P. 1 Empalme R.P. 35 - La Pampa (1)	100.000	0	0	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
					9	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa (1) (7)	327.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra 235 Corredor Vial 4 - R.N. 8 Arrecifes - Pergamino Km. 173 - 197 Buenos Aires (1)	197.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra 239 Corredor Vial 4 - R.N. 36 Almafuerte Acceso Los Molinos - Córdoba (1)	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 - Año II - II Etapa (1) (7)	369.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra 210 Corredor Vial 5 - R.N. 9 Río Juramento Empalme - R.N. 34 - Salta (1)	97.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						52 Obra 219 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme - R.N. 62 Santa Fe (1)	125.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						53 Obra 220 Corredor Vial 5 - R.N. 34 Limite Santa Fe / Santiago del Estero Km. 39 (1)	147.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11	Obra de Mejora en Corredor Vial 1 III Etapa (1) (7)	210.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 1 III Etapa (1)	210.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12	Obra de Mejora en Corredor Vial 2 III Etapa (1) (7)	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 2 III Etapa (1)	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 III Etapa (1) (7)	210.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 3 III Etapa (1)	210.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					14	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 III Etapa (1) (7)	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 4 III Etapa (1)	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 III Etapa (1) (7)	211.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 5 III Etapa (1)	211.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16	Obra de Mejora en Corredor Vial 6 III Etapa (1) (7)	236.608	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Obra en Corredor Vial 6 III Etapa (1)	236.608	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS								
	16					Control del Sistema Nacional de Aeropuertos								
					10	Reacond. de Plataformas, Pistas y Calles Aerop. Villa Gesel (1)	2.950.000	2.950.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Nivelación y Puesta en Norma Franja de Seguridad Aeropuerto Villa Gesel (1)	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
						52 Cerco Operativo del Aeropuerto de Villa Gesell (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Reacondicionamiento de Plataformas, Pistas y Calles Rodaje Aeropuerto Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación Estruct. Sup. de Pista, Calle Rodaje y Balizamiento Aeropuerto Tandil (1)	4.500.000	4.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				12		Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje Aeropuerto de Junín (1)	1.840.313	1.840.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Cerco Operativo del Aeropuerto de Junín (1)	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				13		Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Reacondicionamiento Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres (1)	690.313	690.313	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70						Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología								
					336	SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA								
				43		Formul.e Implementación de la Polit.de Ciencia y Tecnología								
					2	Acondicionamiento del Edificio Central (1)	200.000	315.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Implementación de Sistemas de Seguridad (1)	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Tendido de Red (1)	100.000	215.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social								
					350	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL								
				1		Actividades Centrales								
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2) (***)	300.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114 (2)	300.000	10.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
				3		Construcción de Pasajes de Estructura Metálica (7)	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				5		Reparación Edificio Callao Nº 114 (1) (***)	1.260.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						52 Reparación Primer Subsuelo Edificio Callao Nº 114 (1)	630.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
				22		Regularización del Trabajo								
					6	Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	1.074.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Agencias Territoriales (1)	2.334.000	1.074.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud								
					310	MINISTERIO DE SALUD								
				1		Actividades Centrales								
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas (7)	1.750.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
						52 Refuncionalización y Refacción Sede Administrativa Central (7)	1.750.000	0	0	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
				903		HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
				53		Atención a Enfermos								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	750.000	0	0	32,05	67,95	0,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones Nº 3 ,5 y 8	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				7		Reparación y Mantenimiento en Hospital	0	346.288	346.288	0,00	100,00	67,00	67,33	67,33
					52	Reparación de Usina	0	346.288	346.288	0,00	100,00	67,00	67,33	67,33
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón Nº 6	750.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	129.707	87,00	13,00	50,00	99,00	761,54
					51	Construcción y Equipamiento de Sala de Esterilización (4)	0	130.000	129.707	87,00	13,00	50,00	99,00	761,54
				13		Construcción de Quirofano	0	849.754	849.753	0,00	100,00	81,00	81,19	81,19
					51	Construcción de Quirofano	0	849.754	849.753	0,00	100,00	81,00	81,19	81,19
				906		ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
				56		Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud								
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Dist. Areas del Ed. Cent. de ANLIS (1)	1.605.413	466.007	429.407	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00
						51 Reconst. de Veredas y Arm. de la Red Pluv. del Pabe. Ppal. de ANLIS (1)	164.658	164.658	429.407	0,00	100,00	0,00	70,00	70,00
						52 Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque (1)	393.349	153.943	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Puesta en Valor y Consolida. de las Fachadas, Vestibulo de Acceso (1)	914.765	14.765	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de los Serv. de Higiene, Seguridad y Arquitectura (1)	50.312	50.312	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						55 Remodelación y Refuncionalización de la Amp. de las Of. del Dpto. de RRHH (1)	82.329	82.329	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				1		Desarrollo y Producción de Biológicos								
					3	Remodelación del Instituto Nacional de Producción de Biologicos-Etapa III (3)(7)	0	0	0	0,00	s/i	45,00	45,00	
						51 Remodelación de los Laboratorios para Envases de Inyectables	0	0	0	0,00	s/i	90,00	90,00	
						52 Remodelación del Sector Liofilizador	0	0	0	0,00	s/i	0,00	0,00	
				5		Control de Calidad de Biológicos								
					3	Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad (3)	0	10.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00	s/i

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/12/2007

							FINANCIERO (en pesos)			FISICO (en %)				
							Crédito Original	Crédito Vigente	Crédito Devengado al	% Acumulado al	Programación anual vigente	Ejecutado en el	Ejecutado al	% Ejec./Progr. anual
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Obra	Descripción		al 31/12/2007	31/12/2007	31/12/2006		4° trim.	31/12/2007	
				4		51 Adecuación de Laboratorios del Primer Piso	0	10.000	0	0,00	s/í	0,00	0,00	s/í
						Investigación, Desarrollo y Servicios en Virus Humanas. Producción de Vacunas c/ FHA								
					5	Red de Gas Natural del Instituto Nacional de Enfermedades Virales (5)	0	125.000	119.350	0,00	s/í	100,00	100,00	
						51 Red de Gas Natural del Instituto Nacional de Enfermedades Virales (5)	0	125.000	119.350	0,00	s/í	100,00	100,00	
				8		Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias								
					3	Mejoramiento Edificio Instituto Nacional de Epidemiología "DR. Juan H. Jara" Fase III (3)	0	280.000	258.549	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 Mejoramiento Edificio Interno	0	280.000	258.549	0,00	0,00	0,00	0,00	
	909					COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA								
		59				Atención de Pacientes								
					2	Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Instalaciones Colonia Dr. Manuel Montes de Oca (1)	862.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	910					INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR								
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos								
					1	Construcción Natatorio	250.000	63.275	63.093	44,76	31,73	0,00	25,23	79,51
						51 Construcción Natatorio	250.000	63.275	63.093	44,76	31,73	0,00	25,23	79,51
					7	Remodelación del Inst. Nac. de Rehabilitación Psicofísica del Sur	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Restauración Capa Asfáltica y Fachada de la Entrada	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	206.800	71.612	71.612	0,00	100,00	34,63	34,63	34,63
						51 Ampliación Archivo General 2° Etapa (1)	64.800	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						52 Ampliación Departamento Residentes (1)	44.000	23.612	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						53 Ampliación Farmacia (1)	48.000	48.000	71.612	0,00	100,00	34,63	34,63	34,63
						54 Ampliación Laboratorio (1)	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					9	Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Cocina del Instituto Nacional de Rehabilitación (1)	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) Proyecto y obras que se ejecutarán a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

(***) Los créditos del proyecto 5 fueron reasignados por Resolución M.T.E. y S.S. Nº 236 al proyecto 2. El proyecto 5 fue dado de baja en el ejercicio 2007 por problemas licitatorios.

s/í Sin información

(#) Proyectos y obras del ENOHA que no pudieron cumplimentar la primera programación física debido a que el crédito vigente no es suficiente para el inicio de los mismos. (incluye los proyectos del 31 al 92)

(1) Proyectos y obras nuevos iniciados en el ejercicio 2007.

(2) Obra terminada físicamente, los devengados corresponden a certificaciones atrasadas.

(3) Proyectos y Obras iniciados en el 2° trimestre del ejercicio.

(4) Proyectos y obras con ejecución mayor a la programada.

(5) Proyectos y Obras iniciados en el 3° trimestre del ejercicio.

(6) El devengado corresponde al pago de la dirección de obra, estudios previos, estudios de Impacto Ambiental y gastos de demoliciones.

(7) Esta obra no se va a realizar en el ejercicio.La licitación quedo nula.El crédito fue dado de baja.

(8) Los Proyectos del Servicio 354, Programa 17, pasaron al Servicio 317, Programa 34.

(9) Proyectos y Obras iniciados en el 4° trimestre del ejercicio.

(10) Durante el 4° trimestre se realizaron reasignaciones de crédito entre proyectos

(11) Se le dió a este proyecto un crédito de \$ 10.000.000 el 13/12/2007 . El 28/12/2007 fue dado de baja.

(12) Proyectos y obras mal informados y que finalizan en el ejercicio

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra										Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs		
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim	Avance Total		
1	0	0	97	0	PAIS	VS	Fuente 11 Equipos Varios	Nacional		01/01/07	31/12/07	18.024				25,00%	91,67%	6	B
							MANTENIMIENTO												
							Mantenimiento por Administración												
10	1	1	97	51	PAIS	VS		Nacional		01/01/07	31/12/07	80.666	5.765.000	92.744.792	92.742.263	25,00%	91,67%	6	B
10	1	2	97	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	DNU		01/01/07	31/12/07	9.332	3.088.000	9.331.914	9.331.913	24,98%	91,59%	6	B
							Total Mantenimiento por Administración					89.998	8.853.000	102.076.706	102.074.176				
							Mantenimiento por Contrato												
10	2	7	50	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	194,7	22/08/95	28/02/07	15.251	68.000	429.311	429.304	0,00%	77,50%	7	
10	2	10	22	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN° 86 / Emp. R11 - Villa Gral Guemes	Mes)	403,4	29/04/97	31/07/04	3.615	100.000	1	0	0,00%	100,00%	8	
							Total Mantenimiento por Contrato					18.867	168.000	429.312	429.304				
							Mantenimiento por Convenio												
10	3	24	42	51	LA PAMPA	143.151.152	TFO LA PAMPA Convenio N 10		633,3	01/01/06	31/12/07	8.571	3.007.000	4.388.072	4.387.799	26,28%	85,91%	6	A
10	3	25	58	51	NEUQUEN	22.49(5).234	TFO NEUQUEN Convenio 10		528,4	01/01/06	31/12/07	7.489	2.163.000	3.525.821	3.525.184	15,17%	65,00%	6	
10	3	26	62	51	RIO NEGRO	23.1540-3.251.250	TFO Rio Negro - Convenio N 10	Yacheta - Jacobacci	1.136,1	01/01/06	31/12/07	8.482	2.808.000	2.836.500	2.836.500	11,05%	91,36%	6	
10	3	27	78	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 10	I - II - Prog. 2.13 - Prog 126,5	2.207,3	01/01/07	31/12/07	32.500	18.950.000	25.495.265	25.494.396	25,72%	98,45%	6	A
10	3	28	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3com a.b.m.j	TFO TIERRA DEL FUEGO Convenio N 9		520,5	01/01/06	31/12/07	10.191	2.186.000	5.485.962	5.484.972	3,73%	89,74%	6	A
10	3	30	38	51	JUJUY	52 - 40	TFO JUJUY Convenio N10	Varias	392,8	01/01/06	31/12/07	3.495	455.000	1.087.532	1.087.526	9,21%	81,95%	6	A
10	3	31	66	51	SALTA	40-1V40-51	TFO Salta - Convenio 11	Payogasta - Viaducto La Polvorilla	480,6	01/01/07	31/12/07	3.570	11.000	747.719	747.718	24,99%	91,65%	6	A
10	3	31	66	51	SALTA	51-40-86	TFO Salta - Convenio 10		482,4	01/01/06	31/12/06	2.614				0,00%	100,00%	7	
10	3	32	34	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 8		236,0	01/01/06	31/12/07	5.625	1.925.000	1.669.941	1.669.759	16,48%	80,82%	6	A
10	3	33	34	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fin Pilcomayo - Media Luna - Rio Muerto	144,6	04/05/07	31/05/09	2.048	398.000	425.536	425.535	10,69%	28,42%	6	A
10	3	34	50	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6		266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	2.669.000	496.140	496.138	0,00%	100,00%	7	
10	3	38	26	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8		537,2	01/01/04	31/12/07	5.873	2.994.000	1	0	21,35%	91,84%	6	A
10	3	37	46	51	LA RIOJA	40-76-78-150	TFO La Rioja - Convenio 7		434,5	01/12/06	30/11/07	4.286	2.000.000	2.037.683	2.037.680	32,97%	91,81%	7	A
10	3	38	22	51	CHACO	89	TFO CHACO - Convenio 2		163,4	01/01/06	31/12/07	1.864	1.000.000	1.098.582	1.098.494	16,63%	97,59%	6	A
10	3	39	90	51	TUCUMAN	9.38	TFO TUCUMAN Convenio N 6	Emp. R.N. N° 11 - Cote Lai	67,4	01/01/06	31/12/07	2.558	1.000.000	449.366	449.363	3,28%	34,05%	6	A
10	3	40	10	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8-Belen- Lte c/Tucuman	Km. 798,82- km 986,82	188,0	31/07/08	30/06/09	2.632	20.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	3	41	54	51	MISIONES	14	TFO - Convenio2- Emp. RP Nº20 - Emp. RP Nº17	Km1056,32 - Km1116,96	60,6	31/07/08	30/06/09	850	6.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	3		78	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288-193	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)		1.714,9	01/01/06	31/12/06	23.944				0,00%	100,00%	7	
							Total Mantenimiento por Convenio					131.487	41.592.000	50.744.128	50.741.069				
							Señalamiento												
10	4	1	97	51	PAIS	Varías	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais		01/01/07	31/12/07	77.936	5.714.000	91.976.555	91.976.546	25,00%	91,67%	6	B
							Obras de Emergencia												
10	5	1	97	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia Menores	Nacional	100,0	01/01/07	31/12/07	47.508	3.571.000	61.257.864	61.145.801	25,00%	91,67%	6	B
10	5	2	97	51	PAIS	Varías	Obras en Puentes	Nacional		01/01/07	31/12/07	7.264	3.571.000	10.115.970	10.115.968	24,99%	91,62%	6	B
10	5	3	97	51	PAIS	Varías	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	1.000	01/01/07	31/12/07	1.000	143.000	86.565	86.476	1,50%	5,50%	6	B
10	5	4	97	51	PAIS	Varías	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional		01/01/07	31/12/07	2.623	4.286.000	2.632.678	2.624.278	24,94%	91,43%	6	B
							Total Obras de Emergencia					58.394	11.571.000	74.093.077	73.950.773				
							Mantenimiento por Sistema Modular												
10	6	1	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Limite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	254,2	19/07/04	19/07/08	6.076	29.000	1.405.569	1.355.538	19,87%	87,16%	6	
10	6	3	22	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Limite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	326,6	03/12/04	30/03/08	7.985	510.000	982.214	879.077	1,69%	82,75%	6	
10	6	4	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	277,6	08/05/04	30/04/08	10.314	1.387.000	2.110.531	2.110.528	3,98%	67,31%	6	A-C
10	6	5	26	51	CHUBUT	40S	Emp. Ruta Nacional N° 25 - Emp. Ruta Provincial N° 56 (Rio Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	289,1	07/09/04	30/11/07	9.742	205.000	2.421.839	2.421.837	8,69%	97,98%	7	
10	6	6	26	51	CHUBUT	40-280	Emp.RPN°22-Lte c/Chubut/Sla Cruz / Emp.RNN°40-Lte c/Chile	- km 105	147,1	22/01/07	20/01/09	6.033	63.000	1.929.789	1.929.787	15,30%	47,27%	6	
10	6	8	50	51	MENDOZA	142 - 40N - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mtdza - Lte S.Juan / S.Martin - Mtdza	Sistema Modular	194,7	01/01/07	30/12/08	9.909	386.000	3.910.412	3.906.601	16,97%	50,20%	6	
10	6	9	50	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	229,6	17/03/05	31/03/09	15.119	1.109.000	4.173.561	4.173.557	4,30%	66,45%	6	
10	6	10	82	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RNN° 11 - A Nivel RN N° 11- Calle J/Garay	Modular	14,4	21/07/05	20/03/08	7.017	831.000	3.603.575	3.603.573	0,00%	97,98%	6	
10	6	11	66	51	SALTA	16	Limite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	204,4	14/07/04	30/07/08	9.048	54.000	2.436.339	2.434.166	6,59%	84,21%	6	
10	6	12	66	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN° 34	Sistema Modular	249,3	15/04/04	14/04/08	8.699	990.000	2.694.271	2.690.942	5,76%	95,07%	6	
10	6	19	6	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	43,0	31/05/08	30/06/10	7.037	27.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	20	6	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		7,3	30/06/08	30/10/09	6.000	46.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	21	54	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aero. Gral. San Martin - Emp. RN Nº105	Km1336 - Km1349 DNU	13,2	01/11/08	31/10/09	1.500	2.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	22	66	51	SALTA	40	Seclantías - Emp. R.n. N° 51	Km 4433,87 - Km 4594,22	160,4	01/12/08	30/11/10	5.950	23.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	23	66	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Lte con Chile / S.A. De los Cobres - Lte con Jujuy	Km 26,39 - 296,44 / Km 4607,03 - 4666,62	329,6	01/11/07	30/10/09	9.044	30.000	1	0	13,07%	13,07%	6	
10	6	24	26	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp R.N. N° 40 (Tecka)	Km 313,74 - Km 528,67	214,9	20/11/07	18/11/09	12.221	30.000	1	0	8,35%	8,35%	6	
10	6	25	26	51	CHUBUT	40	Emp RN N°25 - Emp RP N° 56	km1556,60-km 1815,71 - km 1865,6	269,1	30/06/08	25/06/10	9.300	35.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	26	26	51	CHUBUT	26	Emp (Ex) RN N° 26 Emp RN N° 40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1815,71 - km 1865,6	157,6	01/10/08	30/09/10	5.700	22.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	27	6	51	BUENOS AIRES	SIN	Mant. Vigilancia y Seg. Integral - Ptes Acc. a Cdad Aut de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyredon y Pte Avenalleda		06/06/07	30/06/09	36.995	24.000	4.919.500	4.919.507	12,81%	26,10%	6	
10	6	28	38	51	JUJUY		Pte. Sobre el Rio Grande - Bajo la Viña			01/06/08	31/05/10	15.000	1.500.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
10	6	30	66	51	SALTA	34-50	Lte. Con Jujuy - Lte. Inter. Con Bolivia/Emp RNN ° 34-Lte.con Bolivia	km 1287 - km 1484 / 0,00 - km 71.1	17,0	01/07/08	30/06/10	17.300				0,00%	0,00%	0	
							Total Sistema Modular					215.992	7.303.000	30.497.607	30.435.112				
							Obras de Seguridad Vial						250000	208000					
10	7	2	42	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)	200 Km	200,0	01/11/08	02/05/09	11.000	407.500	382.000	0	0,00%	0,00%	0	
10	7	3	82	51	SANTA FE	34	Corredor 3 (200 km)	200 Km	200,0	01/11/08	01/05/09	11.000	557.500	532.000	0	0,00%	0,00%	0	
10	7	4	18	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)	30 Km	30,0	31/05/08	31/03/09	8.292	414.000	372.000	0	0,00%	0,00%	0	
10	7	5	6	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		1,0	28/02/08	30/06/08	2.300	144.000	144.000	0	0,00%	0,00%	0	
10	7	5	6	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		1,0	01/11/08	01/03/09	2.000	84.000	84.000	0	0,00%	0,00%	0	
10	7	6	30	53	ENTRE RIOS	127	Readecu												

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra										Avance Financiero										Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim.	Avance Total						
16	7	9	18	55	CORRIENTES	95	Intersección con Ruta N° 95 y Ruta Prov.N°2		1,0	31/03/08	29/09/08	1.800	28.000	28.000	0	0,00%	0,00%	0					
16	7	9	34	58	FORMOSA	11	Intersección c/RNN° 81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	1,0	30/04/08	31/12/08	3.000	63.000	63.000	0	0,00%	0,00%	0					
16	7	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.RPN° 116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN° 116		1,0	01/08/08	30/01/09	450	112.000	4.174.584	0	0,00%	0,00%	0					
16	7	10	74	52	SAN LUIS	20 - 79	Int. RNN° 20 y RNN° 79		1,0	01/09/08	01/03/09	2.937	31.000	31.000	0	0,00%	0,00%	0					
16	7	10	14	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN 60 (Alto Nivel Emp. RNN 9)	1,0	07/11/04	07/05/08	11.303	134.000	1.777.749	5.947.332	25,46%	74,34%	6					
16	7	11	50	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo	Sección I - Int. R.P.N°7 - Int. R.P.N°60	12,2	01/09/08	30/09/09	10.000	27.000	27.000	0	0,00%	0,00%	0					
16	7	12	50	51	MENDOZA	40	Intersección R.N.N°7 (El Cóndor) - Lujan de cuyo	Sección II - Int. R.P.N°60 - Int. R.P.N°2	4,0	01/09/08	30/09/09	3.500	18.000	18.000	0	0,00%	0,00%	0					
							Total Obras de Seguridad Vial					98.127	4.200.000	13.147.545	9.455.750								
							Total Mantenimiento					690.801	79.401.000	362.964.930	359.062.729								
							CONSTRUCCIONES																
							Corredores Viales I																
22	0	0	97	0	PAIS	VS	Estudios y Proyectos	Nacional		01/01/07	31/12/07	129			6	0	0,75%	2,75%	6	B			
22	1	3	58	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile		6,4	21/02/01	30/08/05	12.589	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7					
22	1	4	38	51	JUJUY	9	Uchihara - La Quilaca		33,0	03/02/97	30/04/04	9.362	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7					
22	1	5	38	51	JUJUY	9	A° Uchihara - La Quilaca		48,3	03/02/97	30/04/04	13.596	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7					
22	1	6	66	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)		35,0	28/01/97	31/07/05	18.814	1.065.000	1	0	0,00%	94,34%	7					
22	1	7	50	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIP- Río Caucheta - Emp. R.N.N° 7	9,8	21/02/01	31/01/05	28.314	576.000	1	0	0,00%	94,43%	7					
22	1	8	66	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)		29,7	28/01/97	31/08/05	24.210	1.967.000	1	0	0,00%	91,88%	8					
												106.885	3.908.000		6	0							
							Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																
22	2	2	10	51	CATAMARCA	40	Rio Agua Clara - Rio Las Cuevas		38,0	17/04/06	15/04/08	92.072	10.031.000	41.983.092	41.983.090	15,87%	88,23%	6					
22	2	3	26	51	CHUBUT	40S	Rio Mayo - Lte. c/santa Cruz		46,0	31/03/08	30/03/11	60.000	153.000	1	0	0,00%	0,00%	2					
22	2	6	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I - Lte. C/Chaco - Los Pirintos	38,6	18/12/06	17/06/08	46.094	29.000.000	11.331.206	10.579.931	6,14%	21,36%	6					
22	2	13	50	51	MENDOZA	40S	Emp. R.N. 144 - El Sosneado		18,7	31/07/08	30/06/09	6.938	116.000	1	0	0,00%	0,00%	2					
22	2	14	50	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	18,0	04/01/05	28/02/07	15.139	304.000	2.937.386	133.384	0,00%	100,00%	8					
22	2	18	94	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. I	Emp. R.N.N° 3 - Lte con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	11,0	01/11/08	31/10/08	13.000	99.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	21	66	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy		60,0	01/11/08	30/11/10	60.000	115.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	23	86	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirintos - El Cabure	29,2	17/10/06	16/04/08	45.290	25.466.000	13.093.917	13.093.910	15,06%	31,61%	6					
22	2	32	38	51	JUJUY	40N	Lte con Salta - Emp. RNN° 52	Prog. 1412 - Prog. 1447	35,0	01/11/08	30/11/09	26.400	67.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	34	14	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	62,9	04/04/07	31/03/09	127.778	367.000	13.440.464	13.440.462	7,69%	14,76%	6					
22	2	35	14	51	CORDOBA	158	Villa María - Rio Cuarto	Chucul - Rio Cuarto	19,0	30/06/08	29/06/09	28.000	107.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	41	66	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		6,0	01/11/08	30/11/09	18.000	69.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	46	50	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte con Chile		70,0	01/11/08	30/11/09	46.000	176.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	47	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	18,0	04/01/05	03/06/06	12.835	28.000	2.654.244	126.244	0,00%	100,00%	8					
22	2	48	70	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km. 370 - Lte con Chile		19,0	01/08/08	31/01/11	68.244	348.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	50	66	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		22,6	31/05/08	29/11/10	40.000	153.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	29,0	16/12/02	12/05/05	32.003	746.000	746.000	0	0,00%	97,75%	7					
22	2	51	78	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	26,0	12/05/03	30/12/05	33.502	218.000	218.000	0	0,00%	97,54%	7					
22	2	52	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	63,0	01/11/08	30/11/09	57.152	157.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	2	53	30	51	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	18,2	16/11/05	31/05/08	70.878	26.318.000	37.360.177	17.569.053	17,01%	60,08%	6					
22	2	53	30	52	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J (Colonia Elia)	27,7	28/11/04	28/12/08	110.392	20.000.000	133.441.719	21.106.456	4,01%	13,91%	6					
22	2	53	30	53	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J (Colonia Elia) - A°Colman	34,8	21/09/07	31/05/09	171.447	32.222.000	21.662.000	21.582.546	5,18%	5,18%	6					
22	2	53	30	54	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	33,3	28/06/07	31/05/10	228.409	32.222.000	4.112.000	9.845.803	2,25%	6,08%	6					
22	2	53	30	55	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubañay	35,0	30/07/07	31/12/11	254.935	32.222.000	16.112.000	37.677.274	2,76%	6,33%	6					
22	2	53	30	56	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Ubañay - Emp. RNN°19	35,0	01/06/07	30/05/10	180.399	32.224.000	31.584.170	29.501.210	6,88%	10,86%	6					
22	2	53	30	57	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Yal Grande	32,1	01/06/07	30/05/10	225.310	10.208.000	10.208.000	57.375.000	2,55%	6,80%	6					
22	2	53	30	58	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A° Yal Grande - A° Mandisovi Grande	34,8	29/06/07	30/05/10	186.989	32.222.000	16.112.000	28.058.309	6,53%	10,78%	6					
22	2	53	30	59	ENTRE RIOS	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisovi Grande - Rio Mocoretá	35,0	01/06/07	30/05/10	206.079	32.222.000	16.112.000	31.054.083	3,25%	7,28%	6					
22	2	53	30	60	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Rio Mocoretá - A°Curupay	33,0	21/09/07	30/09/10	165.270	36.250.000	13.697.000	20.927.117	3,68%	3,68%	6					
22	2	53	30	61	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	A°Curupay - Emp RNN°127	29,3	21/09/07	30/09/10	139.932	36.250.000	0	18.205.169	3,82%	3,82%	6					
22	2	53	30	62	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Estab. San Agustín	32,4	01/10/07	30/10/10	169.127	36.250.000	13.556.307	16.912.749	3,31%	3,31%	6					
22	2	53	30	63	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	30,4	21/09/07	31/05/10	165.845	36.250.000	36.250.000	22.229.264	4,29%	4,29%	6					
22	2	53	30	64	CORRIENTES	14	Guaileguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	27,8	21/09/07	30/09/10	128.200	36.250.000	36.250.000	14.897.467	3,47%	3,47%	6					
22	2	53	30	65	CORRIENTES	117	Guaileguayile																

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra																			Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim	Avance Total									
22	3	28	54	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32.05 -	32,1	24/09/01	24/05/07	77.218	2.546.000	14.546.000	11.016.733	0,00%	99,62%	7								
22	3	75	82	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77.00 - km 123.43	46,4	04/10/04	28/02/06	18.036	217.000		1	0	0,00%	100,00%	8							
22	3	76	54	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32.05 - km 62.05	30,0	19/08/03	28/02/07	83.843	26.239.000	26.239.000	15.679.736	0,00%	100,00%	8								
22	3	86	62	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Valcheta - Musters - Km 77 - Km 105 (Sección I)	28,2	01/12/04	31/12/07	27.575	3.145.000	58.868.203	4.623.451	0,00%	92,41%	6								
22	3	86	62	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	29,0	23/03/04	31/03/08	38.982	8.125.000	10.931.315	13.877.157	20,94%	82,68%	6								
22	3	86	62	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu - Los Menucos	(Sección III)	44,0	21/03/04	19/03/08	42.240	3.934.000	3.934.000	14.795.962	11,52%	65,40%	6								
22	3	86	62	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu - Los Menucos	(IV)	19,6	23/03/04	31/12/07	29.484	3.285.000	3.285.000	9.139.058	22,86%	81,06%	6								
22	3	86	62	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu - Los Menucos	(Sección V)	23,9	23/03/04	31/12/07	28.390	3.468.000	3.468.000	10.415.876	15,28%	73,78%	6								
22	3	86	62	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	43,8	01/02/07	28/01/08	60.967	589.000	589.000	27.678.512	22,65%	60,57%	6								
22	3	86	62	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	72,0	23/03/04	31/03/08	90.999	4.403.000	24.078.152	25.272.653	7,17%	47,74%	6								
22	3	86	62	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 340 - km 410	70,0	01/11/08	31/10/08	60.000	229.000		0	0,00%	0,00%	0								
22	3	86	62	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pícaniyeu	Jacobacci - Pícaniyeu Km 410 - Km 537	126,7	31/05/08	29/11/10	110.000	420.000	420.000	0	0,00%	0,00%	0								
22	3	87	58	51	NEUQUEN	242	Aduana - Límite con Chile		7,0	31/07/08	29/09/08	5.500	42.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
22	3	88	78	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián		55,6	06/01/07	04/01/08	107.720	331.000	56.653.939	56.653.937	0,00%	12,32%	6	A							
22	3	89	78	51	SANTA CRUZ	P15	RPN° 11(Er Cañafates) - Paso Zamora	km 1970.40 - km 2026	58,0	01/11/08	31/10/09	116.000	295.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
Total Obras por Convenio con Provincias												2.222.928	159.606.000	419.107.202	399.696.125											
Mejoramiento y Reposición de Rutas																										
22	4	1	97	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores	Nacional	200,0	01/01/07	31/12/07	37.759	1.129.000	50.410.523	50.332.953	25,00%	91,68%	6	B							
22	4	2	46	51	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Safoagasta	Secciones I - Ila y Iib (km 485 - km 522)	51,1	08/01/07	31/12/08	42.668	444.000	2.617.885	2.570.986	2,90%	19,16%	6								
22	4	3	62	51	RIO NEGRO	258	Variante desde R.N. N°237	Variante Paso por Bariloche	14,7	14/10/99	11/04/08	17.633	3.397.000	3.397.000	2.329.564	0,00%	97,05%	6								
22	4	5	70	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41.530	41,5	01/11/08	30/11/09	40.000	313.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
22	4	8	66	51	SALTA	34	Emp. R.N. N° 81 - General Mosconi	Km. 1398 - Km. 1431	33,0	14/11/99	01/07/97	1.281	0	1	0	0,00%	100,00%	8								
22	4	11	58	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río salado	6,7	22/10/99	03/12/04	3.045	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7								
22	4	17	90	51	TUCUMAN	157	Monteagudo - Simoca	Km 1174 - Km 1205	31,0	29/06/94	31/12/99	6.494	0	270.257	270.256	0,00%	100,00%	8								
22	4	22	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	Km 2988,48 - Km 3000,00 (P Garibaldi)	11,5	01/02/99	31/01/05	16.289	368.000	10.568.892	10.100.025	0,00%	98,97%	7								
22	4	25	6	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19.8 - km 29.2	9,4	16/05/05	15/03/08	55.690	133.000	108.720.620	19.605.044	0,00%	97,04%	6								
22	4	25	6	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	Km. 29.2 - Km. 37,86	8,7	30/09/05	30/04/08	199.884	21.038.000	22.000.000	70.203.028	6,25%	83,55%	6	C							
22	4	25	6	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37.86 - Km 46.3	8,4	09/09/05	09/03/08	116.028	11.422.000	8.396.222	49.308.769	4,87%	93,71%	6								
22	4	29	26	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	6,8	12/04/05	31/01/08	35.097	4.275.000	9.004.230	9.004.229	14,53%	73,64%	6								
22	4	30	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	22,3	01/11/08	30/11/09	56.000	214.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
22	4	31	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1909	41,6	01/11/08	30/11/10	106.000	382.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
22	4	32	50	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	0,5	01/10/03	31/07/05	23.681	897.000	181.228	181.226	0,00%	96,29%	8								
22	4	34	78	51	SANTA CRUZ	RP23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	23,2	17/12/03	28/02/05	1.676	100.000	18.673.798	14.573.793	0,00%	100,00%	10								
22	4	34	78	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	20,5	27/09/06	31/01/08	31.253				0,00%	42,19%	6	S/D							
22	4	35	78	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	90,0	10/11/03	31/01/06	39.924	832.000	1	0	0,00%	0,00%	7								
22	4	36	78	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - Km 78	78,0	24/09/03	24/04/06	34.798	725.000	1	0	0,00%	100,00%	7								
22	4	37	78	51	SANTA CRUZ	RP5	La Esperanza - El Cerrito		67,2	31/12/08	31/07/11	53.585	1.116.000	1	0	0,00%	0,00%	12								
22	4	39	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Concepción	26,6	01/06/08	30/11/10	152.700	77.000	17.300.001	17.299.897	0,00%	0,00%	3								
22	4	40	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	20,0	15/10/04	30/08/07	86.183	3.820.000	28.820.000	8.899.016	0,00%	97,55%	8								
22	4	41	14	51	CORDOBA	158	Variante piso por Villa María		5,0	30/11/08	31/05/10	19.000	94.000	1	0	0,00%	0,00%	0								
22	4	42	78	51	SANTA CRUZ	405	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	67,5	17/11/04	30/11/09	111.058	681.000	8.295.984	8.295.983	0,14%	7,94%	6	A							
22	4	43	46	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	2.343.000	8.035.315	8.035.312	0,00%	94,57%	7								
22	4	44	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambalá	El Puerto - Río La Troya	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	589.000	1	0	0,00%	91,93%	7								
22	4	45	50	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	3,2	14/05/04	31/01/08	13.654	856.000	1.311.726	1.311.724	0,00%	100,00%	8								
22	4	46	14	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Orchivalco-Orchivalco-Pilar	107,5	01/02/01	31/09/08	387.125	22.980.000	24.036.640	14.599.481	0,18%	67,24%	6	A							
22	4	47	14	51	BUENOS AIRES	P-8	Compañía - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	187,0	18/05/03	30/04/08	504.339	6.734.000	64.699.941	44.189.836	1,00%	99,36%	8	A-C							
22	4	48	38	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	Km. 489.25 - Km. 500,59	11,3	09/09/03	31/10/04	7.653	100.000	1	0	0,00%	100,00%	8								
22	4	49	82	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	11,0	18/03/04	30/08/08	10.479	276.000	65.963	65.962	0,00%	99,98%	7								
22	4	50	58	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN° 231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Trufil	25,0	08/10/04	08/04/08	56.333	8.073.000	1.531.948	1.531.947	0,07%	10,95%	6								
22	4	51	78	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Int Norte R.N. N° 3 - Int Sur R.N. N° 3	7,0	28/09/09	30/09/09	152.163	244.000	19.712.796	19.712.796	3,53%	19,17%	6	A							
22	4	52	70	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldescos	Sección I (Río del Valle - Los Baldescos)	54,6	20/01/04	27/08/08	13.954	48.000	1	0	0,00%	100,00%	8								
22	4	53	42	51																						

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra										Seccion			Long	Inicio	Fin	Avance Financiero				Avance Fisico			Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo									Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim.	Avance Total			
22	4	71	78	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles		Sección I. Perito Moreno - km 49	48,9	16/02/04	31/01/07	76.871	7.047.000		14.603.390	14.101.245	0,00%	88,05%	7				
22	4	72	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11		Sección I. Tres Lagos - km 50	50,1	27/05/04	30/04/08	67.171	6.807.000		14.307.000	1.392.842	0,00%	93,91%	6	S/D			
22	4	73	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11		127,6)	42,3	27/05/04	28/02/08	59.913	4.285.000		17.785.000	12.611.038	0,00%	97,47%	6	S/D			
22	4	74	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito		Sección I: El Cerrito - km 34	34,0	22/11/03	30/04/08	32.190	686.000		686.000	0	0,00%	88,42%	6	S/D			
22	4	75	78	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito		Sección II: km 34 - Emp. RPN° 11	28,4	07/02/03	30/06/05	37.081	100.000		1.043.610	0	0,00%	100,00%	7				
22	4	76	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera			40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	100.000		100.000	0	0,00%	80,37%	7				
22	4	78	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Rio Turbio		Km 2839,55 - Km 2872,18	32,6	02/05/00	31/10/04	28.335	1.098.000		1.098.000	0	0,00%	96,12%	7				
22	4	79	78	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Rio Turbio		km 21.252 - km 28.740	7,5	22/08/01	30/12/05	19.050	100.000		1	0	0,00%	100,00%	7				
22	4	81	82	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Pizasa		Km. 380 - Km. 390,5	10,5	01/02/04	31/05/07	67.980	19.288.000		30.151.627	26.293.626	0,00%	98,58%	8	C			
22	4	82	14	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Onclativo (O.F.)	91,0	17/04/04	15/08/08	363.170	226.963.000		336.860.798	333.150.337	10,30%	63,28%	6				
22	4	82	14	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Secc Ito: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	63,0	16/05/04	14/04/08	361.818	307.858.000		1	0	5,33%	29,14%	6				
22	4	82	14	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba		Secc Ito: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RNN°9 Actual	45,0	01/06/04	31/05/10	323.703	82.206.000		1	0	0,00%	0,00%	2				
22	4	82	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba		(Armstrong)	36,0	15/11/06	13/11/08	275.993	4.008.000		0	1.080.000	12,03%	30,68%	6				
22	4	82	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba		Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcareña	39,6	02/10/04	30/09/08	303.405	4.974.000		1.499.004	1.080.000	10,33%	38,38%	6				
22	4	83	34	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano - Gral. Güemes		km 1432,18 - km 1487,81	55,6	01/11/03	30/11/12	45.600	174.000		16.499.922	16.458.160	0,00%	0,00%	0				
22	4	84	34	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/Chaco- Sec. I		Lte. C/Chaco- Prog 29.800	29,8	14/05/01	15/05/09	89.897	89.000		29.711.664	41.939.258	9,57%	22,79%	6				
22	4	84	34	52	FORMOSA	95	Emp. RN. 81 - Lte. C/Chaco - Sec. II		Prog 29.800 - Emp. R.N. N° 81	29,8	09/05/04	07/05/08	83.905	76.000		30.890.622	18.622.396	18,16%	73,55%	6				
22	4	85	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN° 34			31,0	01/11/09	30/11/10	30.000	76.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	86	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lm. Sta. Fe - Bandera		Km.180,79 - Km.226,67	46,1	21/02/04	30/05/08	67.861	4.269.000		33.391.869	33.391.860	17,44%	72,61%	6				
22	4	87	50	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)		Sección II - Km 393 - Km 445	52,0	31/05/09	30/05/10	70.000	267.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	88	50	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquen (S III)		Sección III Km 445 - Km 502	57,0	31/05/09	30/05/10	70.000	267.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	89	78	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos			221,0	01/04/08	31/03/13	193.000	232.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	90	78	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia			6,0	31/07/08	30/06/09	4.400	34.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	91	50	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)		Sección I	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	100.000		1	0	0,00%	79,94%	7				
22	4	92	82	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela		Km 217 - Km 225	8,0	03/08/02	30/06/08	56.337	13.987.000		16.987.000	14.490.007	9,97%	65,40%	6				
22	4	93	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles		Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	42,0	01/06/08	30/05/11	70.400	153.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	94	78	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Gran Bajo San Julián - Crmdte Luis Piedrabuena	111,7	15/09/05	15/12/07	86.633	8.259.000		98.502.285	100.316.770	1,15%	94,56%	6	A			
22	4	94	78	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		Crmdte Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	118,0	15/09/05	15/03/08	147.082	22.210.000		560.570	0	0,29%	75,41%	6	A			
22	4	94	78	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos		El Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	112,0	03/12/05	01/12/08	117.357	20.384.000		1.253.916	0	6,34%	54,32%	6	A			
22	4	95	78	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles		Sección II: km 49 - km 89	40,0	26/11/04	30/11/08	96.967	250.000		6.069.817	6.069.816	0,00%	7,83%	6	S/D			
22	4	96	78	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos		Km. 2215,91	28,3	01/03/07	30/08/08	55.200	90.000		28.017.235	8.051.592	0,00%	18,23%	6	S/D			
22	4	96	78	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos		Km. 2289,64	72,9	07/11/04	13/04/09	110.626	154.000		154.000	3.655.502	0,00%	5,03%	6	S/D			
22	4	96	78	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos		Km. 2344,99	55,4	15/09/04	15/03/09	80.201	75.000		675.000	17.320.956	3,19%	28,62%	6	A			
22	4	96	78	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos		Sobre RPN° 25	66,5	01/06/08	30/05/10	65.000	229.000		229.000	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	96	78	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos		29	57,0	01/06/08	31/05/10	55.000	178.000		178.000	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	96	78	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos		Lagos por RNN°288 -Km 2411,37 - Km. 2526	116,8	01/06/08	31/05/11	115.000	438.000		438.000	0	0,00%	0,00%	0				
22	4	97	78	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		Km. 245,00 - Pico Truncado	105,0	06/01/07	30/01/09	123.783	264.000		149.568.754	147.519.648	0,49%	23,64%	6	A			
22	4	97	78	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado		Emp RP N° 25 - Km 245,00	204,0	30/12/04	31/08/08	102.677					0,06%	93,05%	6				
22	4	98	78	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek		Noviembre	11,0	19/01/04	18/05/08	37.742	3.069.000		3.855.594	3.830.097	1,89%	59,51%	6	A			
22	4	99	78	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11		Sección II. km 50 - km 86	36,0	30/05/04	27/11/08	69.532	419.000		16.206.337	15.047.813	0,77%	29,78%	6	A			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas																7.488.828	944.867.000	1.532.460.460	1.394.631.315					
Obras por Concesión sin Peaje COT																								
22	5	1	34	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28		Resistencia - Lte. C/Paraguay	297,3	01/06/98	28/05/11	170.700	33.719.000		42.719.000	15.563.960	2,28%	64,29%	6				
22	5	2	6	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31		Bahía Blanca - Emp. R.N.N° 5	329,2	02/02/98	29/01/11	162.439	15.517.000		43.742.659	15.787.234	2,40%	69,87%	6				
Total Obras por Concesión sin Peaje COT																333.139	49.236.000	86.461.659	31.351.194					
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																								
22	6	3	18	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/R° Alivador R. Corrientes) metros		Prog. 713,33	30,0	01/11/08	31/10/08	3.300	36.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	6	4	18	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Rio Batellón) metros		Prog. 735,68	30,0	31/07/09	29/12/08	1.500	23.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	6	5	18	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Rio Mirifay)		Prog. 182	150,0	01/11/09	30/11/08	6.700	34.000		1	0	0,00%	0,00%	0				
22	6	6	70	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)		Prog. 564,70	200,0	23/08/02	31/10/04	6.344	130.000		1	0	0,00%	99,53%	7				
22	6	7	70	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Rio San Juan)		Prog. 174,92	200,0	29/01/03	31/10/04	8.112	100.000		1	0	0,00%	100,00%	8				
22	6	8	70	51	SAN JUAN	PS10	Pte. s/Rio del Valle			80,0	01/11/09	30/11/08	1.175	9.000		1	0	0						

Datos de Obra										Avance Financiero										Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim	Avance Total						
22	6	43	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103.30	80,0	01/08/08	31/01/10	2.000	15.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	44	30	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A/Las Tunas)	Prog. 447.34	30,0	30/06/08	29/06/09	1.500	11.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	45	82	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343.44	70,0	31/07/08	30/06/09	1.200	8.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	46	34	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbiguá)	Prog. 1120.72	20,0	31/05/08	30/04/09	1.350	11.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	47	66	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñalpampa)	Prog. 124.70	30,0	01/11/08	31/10/08	1.500	11.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	48	18	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelló	Puente nuevo y accesos	70,0	27/06/06	31/12/07	15.611	229.000	6.808.453	6.808.452	17.92%	96,08%	6					
22	6	49	66	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	km 1480.80	60,0	01/11/08	31/10/08	3.800	58.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	50	14	51	CORDOBA		Nuevo Puente sobre Río Cuarto	INCISO 5	50,0	16/02/07	30/06/08	20.689	345.000	1	0	7,48%	42,96%	6		A			
22	6	51	10	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Pacín	100,0	01/11/08	31/10/09	2.500	19.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	52	38	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua	Pte. S° FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	400,0	01/11/08	31/10/09	50.000	153.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	53	38	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		200,0	01/11/08	31/10/09	30.000	416.000	333.001	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	54	66	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Rio Seco (1300 km.)	50,0	01/08/08	30/01/10	9.600	73.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	55	66	51	SALTA	68	La Viña Moldes - Pte. S/Viñaco	km. 97.77	30,0	01/08/08	31/01/10	13.600	104.000	1	0	0,00%	0,00%	0					
22	6	56	66	51	SALTA	68	La Viña Moldes - Pte. S/Viñaco	4.000	30,0	01/11/08	31/10/08	8.000		1	0	0,00%	0,00%	0					
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												423.487	17.262.000	26.906.167	26.464.755								
Obras en Corredores Viales Concesionados																							
22	7	1	6	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp. RPN° 3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319.4	57,4	15/07/04	28/02/05	8.829	211.000	12.211.000	0	0,00%	97,61%	7					
22	7	1	6	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acc.Viedela Doma	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	236.000	236.000	0	0,00%	96,56%	7					
22	7	1	6	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Viedela Doma - Emp. RPN° 61	km 118 - km 156	38,0	27/01/06	31/12/06	15.332	834.000	834.000	6.684.34								

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra											Avance Financiero										Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim.	Avance Total							
22	9	8	66	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		35,0	01/10/08	30/09/10	10.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	9	66	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		160,0	01/10/08	30/09/12	73.000	1.111.000	889.001	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	10	66	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SI	La Dársena - Angastaco	43,0	01/11/08	30/10/10	120.000	43.000	0	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	10	66	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	39,0	01/11/08	31/10/09	120.000	38.000	0	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	10	66	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantías	16,0	01/11/08	31/10/08	48.000	23.000	0	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	10	66	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantías - Cachi	28,0	01/11/08	30/10/10	90.000	37.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	12	50	51	MENDOZA	149	Uspallata - Calingasta (Ex Ruta 412)		100,0	01/11/08	31/10/10	100.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	13	96	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319			31/05/08	30/05/10	40.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	15	54	51	MISIONES	14	Construcción Acceso a Campo Grande y San José - Misiones		4,0	01/11/08	30/09/09	5.500	28.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	16	54	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN° 4		0,5	01/11/08	31/05/08	3.000	25.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	17	22	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp RPN° 63 - Emp RN N° 11 (PROG 0 - PROG 7,6)	7,3	18/10/08	16/10/08	47.499	111.000	27.757.374	27.757.373	7,43%	40,95%	6						
22	9	17	22	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	13)	5,4	18/10/08	18/10/08	35.025				6,25%	38,50%	6						
22	9	18	22	51	CHACO	16	Paseo por Saenz Peña		5,0	01/08/07	30/11/08	46.083	38.000	4.897.067	4.897.065	5,49%	7,12%	6						
22	9	19	22	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		77,0	01/11/08	30/09/10	40.000	157.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	21	22	51	CHACO	89	Villa Ángela - General Pinedo		50,0	01/11/08	31/10/11	150.000	95.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	22	90	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Acceso a Aguilares - Concepción	9,5	08/03/07	08/03/09	105.140	118.000	1	0	15,47%	39,81%	6						
22	9	23	90	51	TUCUMAN	40	Ruta Pque Nac.Calchaquí entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle		80,0	01/11/08	30/10/10	50.000	38.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	24	10	51	CATAMARCA	40	El Ejé - Las Cuevas		25,0	30/06/09	30/05/10	80.000	306.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	25	10	51	CATAMARCA	40	Pte s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		0,2	31/07/09	30/06/09	8.000	82.000	0	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	26	22	51	CHACO	11	Autovía Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (S I)	Emp. RNN° 89 - Cem. Parque Jazmin	16,9	30/06/09	30/10/09	80.000	625.000	0	0	0,00%	0,00%	2						
22	9	26	22	52	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (SII)	Cementerio - Autódromo y accesos	10,8	01/11/08	31/10/10	50.000	306.000	0	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	26	22	53	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN° 89 - Acc. Margarita Belén (SIII)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belén	14,7	01/11/08	31/10/10	70.000	229.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	27	22	51	CHACO	P12	Obras Empalme Ruta Provincial 12			01/11/08	31/10/11	17.000	233.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	28	22	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		12,0	01/11/08	31/10/13	200.000	1.184.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	22	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai		513,0	01/11/08	31/10/12	5.000	155.000	125.001	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	22	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S II)	Sección II	58,9	01/11/08	31/10/13	150.000	693.000	554.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	22	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S III)	Sección III	79,3	01/11/08	31/10/13	210.000	852.000	682.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	86	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S IV)	Sección IV	55,0	01/11/08	31/10/12	150.000	648.000	518.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	86	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S V)	Sección V	61,0	01/11/08	31/10/12	180.000	649.000	519.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	86	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S VI)	Sección VI	74,8	01/11/08	31/10/12	210.000	791.000	633.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	86	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S VII)	Sección II	64,0	01/11/08	31/10/12	180.000	692.000	554.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	29	86	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S VIII)	Sección VIII	64,8	01/11/08	31/10/12	180.000	670.000	536.000	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	30	22	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina		0,1	01/11/08	31/10/09	50.000	38.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	31	22	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		0,2	01/11/08	31/10/09	6.000	46.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	32	96	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		0,2	01/11/08	31/10/08	7.000	38.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	33	26	51	CHUBUT	P71	Emp RN N° 258 (Emp.RNN 40) - Chollila	Km 0 - Km 30	30,0	15/12/05	31/12/07	24.395	7.230.000	4.580.704	4.549.785	3,76%	47,19%	6						
22	9	34	26	51	CHUBUT	1540-P70-S/N°	El Maten - Emp. RN N° 40 (ex258-Epuyen)-Acc A Bs As Chico	(P70)- DNU	44,8	22/11/05	30/04/08	32.101	8.813.000	11.563.109	11.563.105	6,41%	79,30%	6						
22	9	35	26	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N. N° 40	1ra. Sección Km 0 - Km 30	30,0	01/02/06	30/06/08	44.170	3.963.000	13.433.846	13.433.844	12,05%	52,97%	6						
22	9	36	26	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	KM. 9,14 - KM. 15,45 (Pte. s/A° Seco)	6,3	01/04/07	28/03/08	15.905	28.000	2.634.495	2.634.492	32,21%	43,78%	6						
22	9	37	14	51	CORDOBA	60	Empalme RNN° 9 - Límite c/Catamarca km 154		154,0	01/11/08	31/10/10	70.000	126.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	38	14	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		185,0	01/11/08	31/10/11	300.000	1.782.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	39	14	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		16,0	30/06/08	25/06/10	50.000	244.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	40	14	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.R.N.N° 8	Km. 702 - Km. 704 - A° Corralito	2,0	27/01/04	31/12/06	2.649	262.000	1	0	0,00%	100,00%	8						
22	9	42	30	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena			01/11/08	31/10/09	10.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	43	30	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay			30/11/08	31/05/10	5.000	84.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	44	30	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		79,0	30/11/08	31/05/10	40.000	95.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	45	14	51	CORDOBA	38	RNN° 36 - Prolongación			30/06/09	25/06/10	10.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	46	30	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		0,6	01/11/08	31/10/11	26.000	99.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	47	30	51	ENTRE RIOS	14	Autopista Mesopotámica Ceibas - Gualeguaychú - Derivador Rutas 14 y 16		1,0	01/11/08	31/10/11	33.000	126.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	48	96	51	INTERPROVINCIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fé, Damas Patricias en General Roca		0,2	01/11/08	31/10/10	7.000	107.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	50	83	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el cruce de la RPN° 69 y RNN° 151 - Campo Grande		0,5	01/11/08	31/01/10	5.000	38.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	51	82	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en 30 km RNN° 151 Banda del Medio		0,5	01/08/09	31/03/09	3.500	45.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
22	9	52	78	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cde Luis Piedrabuena - Ea La Julia	73,9	07/03/07	31/03/10	225.760	1.146.000	63.339.652	63.339.651	4,87%	10,11%	6	A					
22	9	53	78	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	pesado	21,0	07/03/07	31/05/10	142.468	153.000											

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIABILIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra										Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs	
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007			Avance 4° Trim
22	9	87	34	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa	DNV	20,4	01/09/08	30/11/10	32,762	150,417	1	0	0,00%	0,00%	0
22	9	88	34	51	FORMOSA	86	Mision Tacaagle - RN N°95	Güemes DNU	29,6	28/11/06	28/11/08	57,225	117,583	1	0	16,37%	50,94%	6
22	9	89	34	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Güemes - Fortin Leyes	25,1	07/05/07	30/08/11	88,366	153,000	23,002,896	8,682,530	9,39%	19,76%	6
22	9	89	34	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortin Leyes - San Martin 2	25,1	01/07/07	31/07/09	90,988	160,000	0	0	7,84%	13,01%	6
22	9	89	34	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martin 2 - Cabo 1° Lugones	24,8	20/11/07	18/11/09	60,329	122,000	0	14,320,365	1,90%	1,90%	6
22	9	89	34	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	37,5	31/05/08	30/05/10	85,815	138,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	9	90	34	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	58,0	27/06/05	26/04/08	20,521	0	9,178,351	9,177,408	8,64%	87,01%	6
22	9	91	34	51	FORMOSA	P2	Emp. RN N°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	70,0	20/05/05	18/04/08	51,556	3,855,000	2,793,032	2,793,031	23,24%	65,85%	6
22	9	92	38	51	JUJUY	P1	Acceso sur a San Salvador de Jujuy	Pte J.M. Gorri - Emp. R.N. N°9	8,0	07/08/04	05/02/08	77,974	102,000	30,595,552	30,595,082	22,80%	59,25%	6
22	9	93	46	51	LA RIOJA	79	Esperanza de los Cerillos y Casa de Piedra		44,0	01/11/08	02/05/11	40,000	102,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	9	94	50	51	MENDOZA	7	Lujan - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	5,0	05/02/07	30/09/07	6,117	8,000	608,001	607,705	0,00%	98,38%	7
22	9	95	50	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Seccion II	Emp. RN N°7 - Ugarteche	13,6	25/01/05	31/01/08	54,192	1,893,000	10,249,921	10,249,910	2,77%	88,66%	6
22	9	96	82	51	SANTA FE	A.008	Av. Circunvalación de Rosario		2,8	31/07/08	30/06/09	5,000	76,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	9	97	80	51	MENDOZA	145	Paso Pehuénche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande	20,5	01/11/08	30/05/09	25,427	16,445,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	9	98	50	51	MENDOZA	145	Baridas Blancas - Hito Pehuénche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuénche	16,5	02/01/07	30/12/08	67,458	18,976,000	5,247,157	5,247,155	3,34%	11,12%	6
22	9	99	50	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuénche Sección III - a	DNV	13,6	15/01/07	31/01/09	99,429	12,820,000	9,907,045	9,907,043	18,23%	34,33%	6
													6.517.722	109.192.000	442.952.342	436.879.843		
22	10	1	50	51	MENDOZA	----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino			01/11/08	31/10/08	25,000	95,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	2	54	51	MISSIONES	---	Puente Internacional Encarnacion - Posadas	DNV	1,0	01/11/08	30/10/10	10,000	76,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	4	58	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta rangui y Barrancas	DNV	2,5	31/07/08	30/06/09	1,500	23,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	5	58	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Choc Malal - Pte s/A° Pilmatue	Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquen y R° Neuquen	1,0	15/03/07	14/08/07	2,309	8,000	1	0	0,00%	100,00%	8
22	10	6	58	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura	DNV	5,0	01/11/08	31/10/10	20,000	92,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	7	58	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN N°231	Sección IV- Acc. Villa Tratul - Emp. RN N°231	20,6	21/02/06	21/08/08	75,759	18,520,000	14,976,690	14,976,686	8,50%	38,11%	6
22	10	8	62	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen	DNV	21,0	31/05/08	30/05/10	116,277	76,000	1	0	0,00%	0,00%	2
22	10	9	62	51	RIO NEGRO	23	Picaniyeu Viejo - Emp. RN N°237	I y II DNU	64,0	01/10/08	30/09/11	86,400	176,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	10	62	51	RIO NEGRO	40	Emp. RN N°23 - Norquenco	Pte. S/A° Las Bayas - Km1272,39	0,1	01/02/06	30/11/06	797	27,000	1	0	0,00%	100,00%	7
22	10	11	62	51	RIO NEGRO	258	Mejora Red Vial de Bariloche	DNV	01/10/08	30/09/09	1,000	15,000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	12	66	52	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-1.Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM 1448 - KM 1462	14,0	18/12/06	11/06/08	20,548	621,000	50,669,832	62,245,007	33,73%	89,65%	6
22	10	12	66	52	SALTA	34	CVN°5: Obra 24-B-2- Emp. RPN°3- Emp RNN°34	KM. 1462 - KM. 1478	16,0	07/04/06	11/06/08	32,734	16,614,000	1	0	13,90%	94,32%	6
22	10	12	66	53	SALTA	9	CVN°5: Obra 24-B-3.Emp. RPN°3- Emp RNN°34	Km 1478 - Km 1500 - DNU	22,0	12/04/04	11/06/08	39,658	19,602,000	11,575,178	14,75%	96,36%	6	
22	10	13	66	51	SALTA	16	Lte. C/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal- J.V. Gonzalez- DNU	1,4	01/08/08	31/01/10	20,000	38,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	14	66	51	SALTA	40	Puyogasta - Emp. RNN° 51	Prog. 1220,3 - Prog. 1339,19	118,9	01/11/08	30/10/10	68,000	173,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	15	70	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN° 40	Caballo Anca - Emp. R.N. N° 40	48,4	01/10/08	30/09/10	90,000	102,000	4,159,964	4,159,964	0,00%	0,00%	0
22	10	15	70	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN° 40	(Sección II - a 2)	10,0	01/10/08	30/09/10	40,000	100,000	0	0	0,00%	0,00%	0
22	10	15	70	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN° 40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb)	12,2	30/06/08	31/05/11	82,250	72,000	0	0	0,00%	0,00%	2
22	10	15	70	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - RNN° 40	R. Bermejo - Emp. RNN° 40 (Sección III)	34,4	01/06/07	30/05/09	77,930	87,000	1	0	12,15%	13,73%	6
22	10	16	70	51	SAN JUAN	Ex RPN°12	Pachaco- Calingasta	0,1	26/10/05	25/04/08	17,933	3,640,000	1	0	1,67%	30,98%	6	
22	10	20	78	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Rio Santa Cruz	0,2	31/07/08	30/06/09	5,000	23,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	22	82	51	SANTA FE	168	Rio Colastiné- Tunel Subfluvial Hemandarias		9,0	01/06/08	30/11/11	117,781	178,000	15,535,603	15,535,601	0,00%	0,00%	2
22	10	23	82	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hemandarias	Intercam La Guardia- Pte. S/Rio Colastiné	3,5	01/03/08	08/02/11	140,269	127,000	1	0	0,00%	0,00%	4
22	10	24	82	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Elisoa	km 115,76 - km 146	31,0	01/09/08	30/08/10	90,000	229,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	25	82	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	30,0	31/07/08	30/06/09	20,000	153,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	26	50	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km650 - km655,55	5,5	31/01/07	30/04/07	400	8,000	1	0	0,00%	100,00%	7
22	10	27	82	51	SANTA FE	A008	Rio Paraná - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	10,1	13/02/08	31/05/08	99,495	9,910,000	34,122,647	34,122,600	7,58%	90,22%	6	
22	10	28	82	51	SANTA FE	1403	Municipalidad de Arroyo Seco	Acc. alternativo tránsito pesado RNN°9	4,0	01/11/08	31/10/09	2,000	29,761	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	29	82	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres		3,4	01/11/08	30/10/10	1,940	29,761	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	30	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional - Bahía Lapataia		16,0	31/07/08	30/06/09	20,000	23,239	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	31	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista		19,9	01/10/08	30/09/10	130,000	626,000	1	0	0,00%	0,00%	2
22	10	32	90	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)-Principio Autopista	Emp. Traza actual - Principio Autopista	13,9	08/03/07	09/03/09	105,140	190,000	44,670,132	44,670,131	13,82%	38,16%	6
22	10	33	6	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro		1,0	01/11/09	31/10/10	50,000	61,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	34	30	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones rutas: 127/P6 - 127/P2-12/131/P32-18/P32		1,0	31/05/09	30/05/10	6,500	99,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	35	30	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°A015 y calle Bösch		1,0	31/03/09	29/09/09	653	20,000	1	0	0,00%	0,00%	0
22	10	36	42	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca	DNV	46,0	01/11/08	31/10/11	30,000	125,000	1	0	0,00%	0,00%	0

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra												Avance Financiero				Avance Físico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim	Avance Total		
22	10	67	78	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras (en sigo 464878/2007)	41,0	09/04/07	30/10/09	120.273	191.000	191.000	25.289.012	3,57%	9,39%	6	A
22	10	67	78	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras - Guer Aike	42,0	09/04/07	01/01/09	118.995				4,85%	11,46%	6	A
22	10	68	78	51	SANTA CRUZ	40	Chimen Aike - Cabo Virgenes		130,0	01/07/08	30/06/11	300.000	229.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	69	50	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	9,5	29/06/04	31/01/08	5.888	184.000	3.689.310	3.689.306	0,00%	72,28%	6	S/D
22	10	69	50	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III)	Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota	9,8	31/07/08	30/06/09	6.000	94.000	0	0	0,00%	0,00%	3	
22	10	69	50	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V)	Fin pavimento - Acc. Hotel Villavicencio	8,2	01/11/08	30/10/09	6.000	75.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	72	78	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran bajo San Julian - (Dos Secciones)	Km 2184,79 - 2284,79	100,0	20/12/05	20/12/07	146.562	17.753.000	54.995.899	53.100.847	0,00%	15,67%	6	
22	10	72	78	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km. 2026,00 - km 2088,55	62,6	20/05/04	20/05/08	115.925	8.256.000	10	0	2,83%	45,84%	6	A
22	10	72	78	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2284,79 - 2303	18,6	22/08/07	31/10/09	41.183				35,89%	48,08%	6	A
22	10	73	90	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. RNN° 38 - Lte c/Catamarca		30,0	01/10/08	30/09/10	100.000	46.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	74	90	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Itico		30,0	27/07/04	31/10/07	1.333	151.000	737.030	737.029	9,80%	97,45%	7	
22	10	75	14	51	CORDOBA	9	Autopista Pilar - Villa María - Acc a dif localidades desde la autop		30,0	01/11/08	31/05/10	7.000	107.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	76	66	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacubá		9,7	01/06/04	30/05/10	35.550	115.000	1	0	0,00%	0,00%	2	
22	10	77	38	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		15,0	01/09/04	28/02/10	20.000	57.507	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	78	14	51	BUENOS AIRES	SN	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomus	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	15,0	01/09/04	31/07/09	5.017	730.403	1	0	0,00%	0,00%	15	
22	10	78	14	51	CORDOBA	SN	Reordenamiento accesos a Cosquin - 2 Puentes		1,0	05/05/07	02/11/08	31.609	110.535	12.034.957	12.034.955	10,15%	24,78%	6	
22	10	80	14	51	CORDOBA	8	Obra de intersección RNN° 18 - Acceso Este Ciudad de la Carlota		0,5	31/07/08	29/01/09	1.600	24.465	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	81	22	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8,0	31/08/04	01/03/10	40.000	82.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	82	34	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Km 113	80,0	31/05/08	30/05/10	150.000	886.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	84	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	15,0	01/07/08	30/06/10	60.000	134.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	85	86	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	Km. 857,52 - Km. 883,38	25,0	28/06/04	28/02/07	1.281	18.000	1	0	0,00%	100,00%	8	
22	10	86	78	51	SANTA CRUZ		Velódromo y Autódromo - Caleta Oliva - convenio		4,0	01/11/08	30/10/10	16.000	81.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	88	50	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	66,0	29/11/07	01/05/10	208.911	437.000	1	0	1,57%	1,57%	6	
22	10	90	74	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	km 198,65 - km 266,41	67,8	01/09/08	31/03/09	20.625	39.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	92	6	51	BUENOS AIRES		Acceso a Campo Universitario Tandil		1,0	01/11/08	31/10/09	3.000	41.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	93	6	51	BUENOS AIRES		Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez		0,5	01/11/08	31/10/10	12.000	88.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	96	6	51	BUENOS AIRES	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel RNN° 9 - Pergamino		7,8	01/11/08	31/10/09	6.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	97	6	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Limite con Santa Fe		50,0	01/11/08	31/10/09	8.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	98	82	51	SANTA FE	178	Limite con Buenos Aires - Emp. RNN° 33 - Acceso a Villa Elvira		110,0	01/11/08	30/10/10	42.285	108.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	99	18	51	CORRIENTES		Isla Apípe San Antonio - Puerto Tonta			30/06/09	29/06/09	2.000	14.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
							Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III					6.169.061	115.636.000	385.871.630	381.308.884				
							Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												
22	11	4	14	51	CORDOBA	P21	RPN° 20- RPN° 19 - Puente sobre A El Gato y San Antonio	RPN° 20- RPN° 19 - Puente sobre A El Gato y San Antonio	0,2	01/11/08	31/10/08	5.000	48.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	5	30	51	ENTRE RIOS	P42	Puente Mendez - Casariego (s/Rio Gualaguaychí) hasta RNN° 136		15,0	01/11/08	31/10/09	6.000	73.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	6	70	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	Pque Nac El Leoncio	35,3	20/09/08	31/08/10	42.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	9	66	51	SALTA	SN	Ruta Nacional Tramo Tolombon - Hualinchay		40,0	01/11/08	30/10/10	15.000	76.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	11	18	51	CORRIENTES	123	Empalme RNN° 12 - Mercedes		73,0	01/11/08	30/10/09	20.000	102.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	12	70	51	SAN JUAN	40	Puente s/Rio Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		41,0	01/11/08	31/10/09	6.000	61.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	14	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	46,1	01/10/08	30/09/11	230.600	4.572.000	2	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	14	78	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección RNN° 228 Y RPN° 73		0,5	01/11/08	31/10/08	3.000	46.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	19	66	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		40,0	01/11/08	31/10/12	200.000	1.041.000	2	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	20	14	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. C/San Luis		18,0	01/11/08	31/10/09	12.000	299.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	21	14	51	CORDOBA	PU203	RNN° 9 - Capilla Los Remedios		8,1	31/05/08	30/05/10	15.000	924.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	28	50	51	MENDOZA	7	Acceso a Mercado Cooperativo	km 1034,9 (Acceso a P.ercado Cooperativo)	1,0	01/06/04	30/11/08	2.366	17.000	1	0	0,00%	0,00%	2	
22	11	29	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. RNN° 9 (N) - Emp. RNN° 9 (S)	7,5	01/06/04	31/05/10	43.799	121.000	1	0	0,00%	0,00%	2	
22	11	30	30	51	ENTRE RIOS	40	Tramo urbana Ciudad de Nogoyá		3,6	13/06/07	31/03/08	7.861	46.000	2.789.937	2.789.936	30,08%	65,17%	6	
22	11	31	54	51	MISIONES	12	Las. C/Corrientes - A° Itaipu - Acc. A Garupá	Variante RNN° 12	21,5	01/04/04	31/03/10	40.000	417.000	1	0	0,00%	0,00%	4	
22	11	32	70	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Rio Nikes - Pampa del Yalguaraz	39,8	01/11/08	31/10/10	54.000	165.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	33	62	51	RIO NEGRO	151	Emp. Acceso a Dique Ballester			01/11/08	31/10/08	4.000	61.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	34	62	51	RIO NEGRO	151	Emp. RPN 69			01/11/08	31/10/08	3.000	61.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	35	38	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. RN 66 - Emp. RN 34	13,0	01/11/08	31/10/10	60.000	469.000	375.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	36	38	51	JUJUY	66	Perico - El Cuareadero	Emp.I RN IV 66 - Emp. RN 34	40,0	01/11/08	31/10/09	50.000	375.000	300.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	38	51	JUJUY	34	Lte con Salta - Acc a San Pedro de Jujuy		60,0	01/11/08	31/10/12	150.000	750.000	600.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	38	86	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Olumpa (S IV)	S IV 114.000 - 137.416	23,4	08/05/07	31/10/09	35.235	127.000	2.138.605	2.138.603	12,90%	18,97%	6	
22	11	40	10	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte con Chile			25/06/04	25/12/08	42.846</							

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra										Avance Financiero				Avance Físico					
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim	Avance Total	Est	Obs
22	11	72	38	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Limite con Salta - Abra Pampa	Seccion: I	40,0	01/11/08	31/10/10	50.000	509.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	73	90	51	TUCUMAN	RP N° 307	Tafi del Valle - Limite con Catamarca		60,0	01/11/08	31/10/10	50.000	519.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	74	10	51	CATAMARCA	RP N° 46	Belen - Andalgalá		32,0	01/11/08	31/10/10	50.000	464.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	75	10	51	CATAMARCA	RP N° 219	Acc. Ruinas el Shincal		6,0	01/11/08	31/10/09	6.000	92.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	76	74	51	SAN LUIS	RP N° 29	Ruta de los Dinosaurios		63,0	01/11/08	31/10/10	45.000	326.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	77	46	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Saipogasta		6,0	01/11/08	31/10/09	10.000	263.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	78	42	51	LA PAMPA	154	Emp. RN N° 35 - Emp. RN N° 22		25,5	01/11/08	31/10/09	15.000	330.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	79	82	51	SANTA FE	177	Emp. RP N° 21 - Alto nivel RN N° 9		7,8	25/07/07	31/12/07	10.034	101.000	575.730	575.728	7,05%	12,79%	6	
22	11	80	6	51	BUENOS AIRES	RP N° 72	San Francisco de Bellocq - Copetonas - Acc. Bañealro Reta		67,0	01/11/08	31/10/12	90.000	181.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	81	70	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Cauceite - Emp. RN N° 141 - Cauceite y Dif.Co.		29,8	01/11/08	31/10/08	7.000	114.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	82	82	51	SANTA FE		Sistema Margen Izquierdo Río Grande			15/11/08	14/11/10	15.000	1.000.000	1	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	86	78	51	SANTA CRUZ	SN	Acceso desde RNN° 281 a Pto. Deseado			01/11/07	31/12/08	79.292	0	21.105.484	21.105.488	3,52%	8,71%	6	A
22	11	82	38	51	JUJUY	P 83	Emp. R.N. N°34 - Valle Grande (Colorado)		30,1	24/07/07	31/01/08	6.792				16,99%	34,45%	6	
22	11	82	38	51	JUJUY	P 83	Emp. R.N. N°34 - Valle Grande (Colorado)		12,3	25/07/07	23/01/08	8.335				20,44%	31,45%	6	
22	11	98	26	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)			01/11/08	30/10/11	116.000	0	61.660.593	61.660.592	0,00%	0,00%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												2.391.363	21.300.000	100.045.080	98.769.974				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																			
22	12	14	6	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. C/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martin	27,4	17/09/07	30/09/08	61.279				9,23%	9,23%	6	
22	12	22	78	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	14,0	02/08/07	31/07/09	92.908				1,61%	7,62%	6	A
22	12	27	78	51	SANTA CRUZ	281	Emp. RNN 3 - Pto Deseado		67,6	01/04/07	01/04/09	108.048				14,87%	26,00%	6	A
22	12	54	78	51	SANTA CRUZ	P 39	Emp. R.P. N°43 - Bajo Caracoles		184,0	13/04/07	11/04/10	223.277				0,67%	15,00%	6	A
22	12	55	78	51	SANTA CRUZ	P 49	EMP. RP N 39 - EMP. RNN 3		200,0	01/11/08	31/10/09	107.000				0,00%	0,00%	0	
22	12	56	78	51	SANTA CRUZ	P 2	Condor Cliff - La Esperanza		85,0	01/11/07	30/10/09	94.428				5,83%	19,45%	6	A
22	12	84	34	51	FORMOSA	SN°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez	Emp. R.N. N° 81 - Fin Tramo	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762				95,99%	95,99%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												697.698							
Total Construcciones												30.656.119	2.107.376.513	3.763.173.652	3.447.433.611				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	1	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Prog.1971.77	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	100.000	142.342	142.341	0,00%	100,00%	7	
26	1	2	78	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	R.N.N° 3	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	100.000	1	0	0,00%	99,75%	7	
26	1	3	42	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. R.N.N° 35 - Chacharramendi	127,8	03/07/97	31/10/04	9.733	100.000	1	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	4	46	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Chemical	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	256.000	1	0	0,00%	97,71%	8	
26	1	6	66	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Conchas (Pte)	142,3	04/06/97	31/10/08	21.467	43.000	3.773.234	3.773.170	1,59%	99,90%	6	
26	1	7	66	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Rio Las Conchas (Pte) - Rio Ancho (Pte)	114,8	30/04/97	30/09/08	26.336	217.000	4.034.054	4.034.051	1,36%	80,66%	6	
26	1	8	46	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Tingasta/Aminga - Emp.RNN°60	226,3	04/07/97	30/09/04	17.762	583.000	1	0	0,00%	96,72%	7	
26	1	9	38	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Rio Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	148,9	05/04/97	14/10/04	12.938	100.000	232.900	232.898	0,00%	100,00%	8	
26	1	10	22	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	c/Chaco - Yuchán	178,6	22/05/97	31/07/06	23.197	832.000	925.809	925.807	0,00%	100,00%	7	
26	1	11	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. R.N.N° 34	79,7	10/04/97	31/08/06	19.845	461.000	513.777	513.776	0,00%	100,00%	7	
26	1	12	18	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu	144,7	07/07/97	05/10/06	27.283	581.000	1	0	0,00%	85,76%	7	
26	1	13	30	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.P. N° 32-Emp. R.N. N° 12-Hansenkamp	271,4	27/08/97	31/12/07	28.762	226.000	1.850.266	1.850.264	2,74%	93,62%	6	
26	1	14	18	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507 - Corrientes	Km. 139,00	217,8	03/11/97	05/04/04	20.456	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	15	22	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Islotas	222,3	10/02/98	31/12/07	21.754	943.000	3.925.108	3.925.106	3,45%	91,02%	6	
26	1	16	18	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Guay Grande - Lte. C/Misiones	122,3	07/07/97	12/09/04	15.340	100.000	1	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	17	54	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte cl Corrientes - Emp.R.P.N° 20	272,4	14/09/97	15/10/04	20.028	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	18	66	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	Bolivia	204,1	18/07/97	30/11/04	16.672	100.000	1	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	21	78	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	R.N.N° 20	286,4	15/08/97	15/08/03	16.095	100.000	2.057.815	2.057.815	0,00%	100,00%	7	
26	1	22	46	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Aminga	231,0	02/08/97	31/12/02	6.378	100.000	263.325	263.322	0,00%	100,00%	7	
26	1	23	46	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. R.N.N° 150 - Vinchina / Patquia - Ischigulestee	292,0	13/01/98	26/01/04	10.862	100.000	1.600.781	1.600.769	0,00%	100,00%	7	
26	1	24	46	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	RNN° 60 / Patquia - Emp. RNN° 40N	327,8	30/09/97	30/06/04	17.878	100.000	1	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	25	26	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	124,5	11/11/97	31/10/07	20.117	193.000	1.645.064	1.645.062	1,74%	99,59%	7	
26	1	26	78	51	SANTA CRUZ	3	Malla 108 - Santa Cruz	Emp. Rn N° 281- Gran Bajo de San Julian	308,0	25/11/97	25/04/05	20.207	2.105.000	1	0	0,00%	89,58%	7	
26	1	28	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. R.N.N° 12 Sur - Pje. Iguaçu. Porá	84,3	13/01/98	11/03/08	21.453	262.000	421.981	421.980	0,59%	97,67%	6	
26	1	29	6	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	229/Emp.RNN°3-Pte S/R Colorado	167,1	17/07/97	13/04/08	21.947	228.000	1.504.363	1.504.361	2,00%	96,32%	6	
26	1	31	82	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N° 11 - Km 123,43	123,4	09/12/97	30/12/05	26.066	121.000	1	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	32	26	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	201,2	01/12/97	31/03/08	30.618	194.000	4.503.114	4.503.112	2,79%	98,01%	6	
26	1	33	26	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Pte S/R Chubut	250,4	14/11/97	25/11/04	21.472	100.000	1	0	0,00%	99,78%	7	
26	1	34	34	51	FORMOSA	81	Malla 50												

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 31/12/2007

Datos de Obra															Seccion			Long	Inicio	Fin	Avance Financiero				Avance Fisico		Est	Obs
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo						Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007	Avance 4° Trim.				Avance Total							
26	1	65	18	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes					Pje. Iguaté Porá - Emp. R.N.N° 12 (Norte)	113,5	17/11/97	31/03/08	19.278	43.000	486.214	486.212	0,76%	97,27%	6	A-C					
26	1	66	62	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires					Emp. R.N.N° Ex 3 - Emp. R.N.N° 251	220,5	23/02/98	21/12/08	27.120	98.000	4.859.302	4.859.301	1,04%	81,83%	6						
							Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I							1.042.647	12.702.000	53.986.911	53.888.819											
							Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II																					
26	2	24	58	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén					Catán Lli - Collón Curá	104,5	01/12/04	29/11/09	46.074	2.099.400	8.233.566	3.421.303	0,57%	84,98%	6						
26	2	37	34	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa					General Güemes	171,0	01/01/05	30/12/09	49.896	2.462.100	7.794.001	1.779.857	0,97%	94,38%	6						
26	2	50	62	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro					km 112,78 - km 258,01	145,2	01/12/04	29/11/09	45.667	2.238.200	8.405.032	2.021.441	0,85%	89,37%	6						
26	2	66	70	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan					Arrequintín (O.faltantes)	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	3.940.100	5.629.083	5.629.081	0,00%	96,57%	7						
26	2	68	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires					Emp. R.P.N° 1 (D)	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	4.384.100	7.414.001	1.072.825	0,54%	70,30%	6						
26	2	69	42	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa					Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	114,0	01/11/05	30/10/10	49.375	7.986.300	21.076.001	15.989.214	0,70%	92,94%	6						
26	2	70	42	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa					Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	111,3	01/05/05	29/04/10	42.652	6.639.500	8.646.292	5.543.075	0,92%	75,63%	6						
26	2	71	82	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe					F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	99.200	9.385.590	2.924.663	0,00%	99,24%	7						
26	2	72	82	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe					Tornos Varios	95,7	10/01/04	08/01/08	32.892	86.800	7.086.800	82.870	0,54%	78,10%	6						
26	2	78	90	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán					Acceso a Frias	114,8	01/02/05	31/01/10	36.957	2.250.600	7.726.001	1.184.011	0,79%	93,17%	6						
26	2	79	46	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca					Almogata	166,7	03/12/04	01/12/09	56.317	8.186.400	15.576.906	11.325.286	0,67%	98,33%	6						
26	2	80	10	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca					Emp. R.P.N° 157 - Emp. R.N.N° 38	171,9	02/05/05	30/04/10	52.948	7.653.900	7.675.482	1.321.963	0,70%	92,51%	6						
26	2	81	90	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán					Emp. R.P.N° 329 - Tucumán	75,3	19/05/01	16/11/08	24.284	913.800	8.234.589	1.560.207	0,58%	98,27%	6						
26	2	93	50	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis					Emp. R.P.N° 3 - Acceso a Colonia Alvear	161,5	05/06/01	30/05/08	30.708	1.848.300	7.634.222	401.044	0,64%	86,65%	6	A					
26	2	94	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires					Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo	69,2	01/02/09	02/03/10	42.472	2.638.100	9.959.871	959.872	0,62%	94,45%	6						
26	2	95	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires					Estancia El Recreo - Estancia El Mate	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	7.392.800	14.686.408	7.797.921	0,45%	95,80%	6						
26	2	97	42	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa					Quetquén	158,3	01/04/05	30/04/10	39.548	4.374.100	6.536.566	1.565.441	1,23%	94,59%	6						
26	2	98	6	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires					Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	71,9	01/03/05	27/02/10	40.405	1.972.300	7.701.782	799.735	0,50%	95,38%	6						
							Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II							752.201	67.166.000	167.293.320	65.359.809											
							Contratos de Recuperación y Mantenimiento III C.Re.Ma. III																					
26	3	1	82	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé					Emp. R.P. Secundaria N° 286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	79,0	01/11/08	30/11/13	43.116	703.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
26	3	2	30	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Rios					C/Rep. Uruguay	151,8	01/01/05	30/12/09	45.290	3.121.000	3.447.198	2.440.197	1,36%	93,90%	6						
26	3	3	30	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios					Emp. R.P.N° 32 - Emp. R.P.N° 20	90,3	01/01/05	30/12/09	41.571	1.181.100	1.615.883	1.234.882	0,87%	92,70%	6						
26	3	4	26	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut					Pto. Mineralero	159,7	01/10/05	30/09/10	26.392	9.539.400	7.252.039	4.175.038	0,00%	100,00%	10						
26	3	5	62	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro					Pampa	163,8	15/01/05	13/01/10	54.523	2.135.900	4.497.463	3.808.462	0,71%	83,07%	6						
26	3	6	26	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - CHUBUT					Lte. c/Rio Negro - Emp. RNNº 259	149,1	01/08/08	31/08/12	97.343	2.274.700	2.274.700	0	0,00%	0,00%	0						
26	3	7	74	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis					RNNº 20	253,8	01/02/05	31/01/10	43.938	2.061.500	3.689.913	3.024.911	0,93%	92,66%	6						
26	3	8	74	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis					Acc. a Quetquén - Emp. RPNº 3	129,4	01/09/05	30/08/10	40.518	8.841.200	16.167.909	13.315.909	0,86%	95,30%	6						
26	3	9	82	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires					Nivel RNNº 9	179,7	31/05/07	31/05/12	54.970	5.966.800	1.925.000	0	0,00%	0,00%	16						
26	3	10	50	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza					Emp. R.N.º 40S - Lte. c/Chile	182,5	02/01/07	30/04/12	100.185	29.890.900	22.014.549	22.013.545	3,66%	25,43%	6						
26	3	11	70	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan					Circ. San Juan	105,0	02/05/05	02/10/10	73.467	9.829.400	17.281.315	14.110.314	0,46%	82,71%	6						
26	3	12	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero					Rio Saladillo (Pte) - Stgo. Del Estero (Ent)	120,8	01/01/06	30/12/10	56.142	16.275.700	31.954.503	31.953.501	0,83%	90,30%	6						
26	3	13	38	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta					Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	148,9	01/10/05	31/10/10	45.910	9.908.300	20.905.143	17.709.140	4,06%	93,41%	6						
26	3	14	86	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán					Santiago del Estero - Emp. RNNº 38	151,9	01/08/05	30/08/10	52.920	13.030.000	14.669.652	14.667.229	0,99%	80,25%	6						
26	3	15	90	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero					Acceso a Frias - Emp. RPNº 329	128,0	01/04/05	30/03/10	43.830	5.471.500	6.510.541	4.745.539	0,89%	89,94%	6						
26	3	16	30	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Rios					R.N.º 12	99,9	01/03/05	31/03/10	45.812	5.221.100	3.347.771	1.663.716	1,00%	93,61%	6						
26	3	17	78	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz					RNNº 3	180,1	01/11/08	31/10/12	81.023	678.000	1	0	0,00%	0,00%	0						
26	3	18	26	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut					u/Rio Chubut	250,4	01/12/04	29/11/09	47.004	7.837.500	4.116.917	1.588.916	1,79%	61,59%	6						
26	3	19	26	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut					Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	230,4	01/12/04	31/01/10	58.838	5.576.200	16.904.024	15.105.023	3,86%	58,62%	6						
26	3	20	42	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa					Carancho	128,8	02/01/05	30/12/10	37.385	9.939.300	19.101.306	15.895.304	2,12%	86,33%	6						
26	3	21	62	51	RIO NEGRO	22	Malla 106 A - Río Negro					Chimpay - Allen	52.114	01/05/05	29/04/10	52.114	4.610.710	8.002.843	8.002.843	0,36%	85,75%	6						
26	3	22	58	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén					Emp. RNNº 40S / Emp. RNNº 237-Lte. c/R. Negro	291,2	01/02/05	31/01/10	47.996	5.467.700	9.766.841	8									

Datos de Obra										Avance Financiero				Avance Físico		Obr		
PR	SP	PY	UB	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Seccion	Long	Inicio	Fin	Inversión Total (en miles de \$)	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/12/2007	Devengado al 31/12/2007		Avance 4° Trim	Avance Total
26	4	8	18	51	CORRIENTES	14	Malta 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	103,7	01/07/07	30/06/12	70.907	1.355.000	6.989.844	6.989.843	11,83%	21,68%	6
26	4	9	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malta 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	183,8	01/01/07	31/10/12	88.892	1.507.000	1	0	6,10%	6,10%	6
26	4	10	86	51	SGO DEL ESTERO	89	Malta 405 B - Sgo. Del Estero	Emp R.P. N° 116 - Emp R.N. N° 34	140,7	01/01/06	31/10/13	39.758	1.767.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	11	18	51	CORRIENTES	14-122-123	Malta 501 - Corrientes - Yapeyu	R.N.N°14-Emp.R.N.N°14-Yapeyu	144,7	01/08/06	30/07/12	47.315	16.858.000	3.260.794	3.260.792	8,72%	19,14%	6
26	4	12	30	51	ENTRE RIOS	127	Malta 506 - Entre Rios	Emp. R.N. N° 12 - Emp. R.N. N° 14 y 19	259,2	01/01/06	31/10/13	116.618	2.073.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	13	46	51	LA RIOJA	40N	Malta 337 - La Rioja	Lte c/San Juan - Las Tucumanesas	72,6	01/01/06	31/01/13	32.670	968.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	14	38	51	JUJUY	9	Malta 432 - Jujuy	Emp. R.N. N° 52 - La Quieca	220,3	01/11/06	31/10/12	101.300	1.933.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	15	10	51	CATAMARCA	40N	Malta 435 - Catamarca - Tucumán	Rio Las Cuevas - Limite con Salta	139,2	31/08/06	31/08/13	62.618	1.855.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	16	46	51	LA RIOJA	77	Malta 333 - La Rioja	Emp.RNN° 79 - Emp.RNN° 38	102,5	01/01/06	31/10/13	45.000	1.367.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	17	10	51	CATAMARCA	60	Malta 440 - Catamarca	Tingostata - Lte c/Chile	236,1	01/06/06	31/10/13	106.245	3.148.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	18	34	51	FORMOSA	86	Malta 531 - Formosa	Fin Pavimento	171,0	01/01/06	30/11/13	30.889	1.364.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	19	18	51	CORRIENTES	12	Malta 535 - Corrientes	Lte c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	254,3	31/08/06	29/08/12	114.700	3.399.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	20	78	51	SANTA CRUZ	3	Malta 101 A - Santa Cruz	29/01/07	115,3	01/01/06	29/01/13	50.117	1.451.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	21	26	51	CHUBUT	3-26	Malta 107 B - Chubut	Emp.RPN° 20	135,5	01/01/07	30/10/13	101.525	2.905.000	1	0	1,84%	1,84%	6
26	4	22	58	51	NEUQUEN	22	Malta 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	134,7	01/01/06	31/10/13	60.633	2.905.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	23	6	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malta 120 - Buenos Aires - Rio Negro	N° 3 - Puerto San Antonio Oeste	222,0	30/06/06	27/06/13	85.048	2.196.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	24	14	51	CORDOBA	9-60	Malta 204 - Cordoba	Jesus Maria - Lte con Santiago del Estero	157,2	01/02/07	31/01/13	64.844	29.297.000	4.270.263	4.270.260	1,14%	6,99%	6
26	4	25	0	51	BUENOS AIRES	3	Malta 208 - Buenos Aires	Basilio	153,2	01/09/06	30/08/10	70.000	1.164.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	26	82	51	SANTA FE	98	Malta 209 A - Santa Fe	Emp. RNN° 11 - Prog. 123	123,2	01/11/06	31/10/13	55.544	1.846.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	27	58	51	NEUQUEN	40S	Malta 135 - Neuquen	Lte c/Mendoza - Las Lajas	278,0	01/11/06	31/10/13	125.100	3.707.000	1	0	0,00%	0,00%	0
26	4	28	58	51	NEUQUEN	40S-242	Malta 136 - Neuquen		11									

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.

Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad

Total General

9 348 067 593 129 58

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

40 694 987 2 779 907 10

40,713,139

664 013 394 498 059

Table 1

4.790 151 976 4.304 556

Datos de Obra	
Ruta	Tramo
N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Prejudiciada
16	Suspendida
N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/12/2007
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	785.687.610	1.067.885.661	774.409.183	747.647.977	11,2%
Provincia de Buenos Aires	719.247.118	974.524.044	780.706.262	779.884.182	11,7%
Provincia de Catamarca	25.811.811	65.287.117	60.006.350	60.006.350	0,9%
Provincia de Córdoba	199.441.329	209.226.016	227.080.241	223.025.556	3,3%
Provincia de Corrientes	251.519.994	156.886.600	111.055.075	111.055.075	1,7%
Provincia del Chaco	30.955.245	99.009.534	91.839.020	91.839.020	1,4%
Provincia del Chubut	103.483.733	207.733.506	182.855.613	182.761.006	2,7%
Provincia de Entre Ríos	338.613.877	243.155.562	203.284.929	203.284.929	3,1%
Provincia de Formosa	131.479.216	355.920.124	296.907.053	296.907.053	4,5%
Provincia de Jujuy	29.816.394	62.936.161	61.276.198	61.276.198	0,9%
Provincia de La Pampa	54.660.537	79.411.343	60.434.384	60.434.384	0,9%
Provincia de La Rioja	157.326.893	169.708.594	131.847.239	131.847.239	2,0%
Provincia de Mendoza	180.518.328	151.010.605	127.356.773	127.356.773	1,9%
Provincia de Misiones	82.230.654	115.683.458	117.883.772	117.883.772	1,8%
Provincia del Neuquén	54.427.201	41.451.172	49.509.678	49.343.542	0,7%
Provincia de Río Negro	167.164.072	208.325.768	204.052.953	204.052.636	3,1%
Provincia de Salta	139.769.162	230.044.593	239.477.265	239.476.507	3,6%
Provincia de San Juan	56.720.462	80.935.422	81.502.313	81.482.080	1,2%
Provincia de San Luis	16.832.283	39.211.948	61.078.653	61.078.653	0,9%
Provincia de Santa Cruz	172.252.832	366.883.228	384.290.091	384.290.091	5,8%
Provincia de Santa Fe	246.745.172	412.747.400	387.169.800	385.299.591	5,8%
Provincia de Santiago del Estero	124.016.244	205.443.861	183.025.292	183.025.292	2,7%
Provincia de Tucumán	58.864.174	155.265.956	141.578.661	141.578.661	2,1%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	11.199.467	8.348.195	18.713.688	18.713.688	0,3%
Interprovincial	671.586.609	550.440.692	560.671.407	560.671.407	8,4%
Nacional	64.680.500	1.069.821.433	840.413.008	840.413.008	12,6%
Binacional	110.000	30.509.001	62.203.389	62.203.389	0,9%
No Clasificado	64.767.932	286.591.884	257.321.626	257.153.626	3,9%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	4.939.928.849	7.644.398.878	6.697.949.916	6.663.991.685	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2007
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	25.636.000	9.540.564	59,3%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	360.000	19,0%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	29.517.441	12.981.441	78,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	8.208.900.462	2.393.450.408	41,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	412.187.846	18.384.846	4,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.950.000	400.000	0,8%
Ministerio de Salud	28.451.745	40.613.535	12.161.790	42,7%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	11.460.073	1.707.389	17,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	694.998.111	315.554.111	83,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	9.488.987.037	2.458.560.007	36,6%

CUADRO B
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	16.095.436	25.636.000	24.376.457	24.352.648	95,0%
Ministerio del Interior	1.890.000	2.250.000	2.174.907	2.174.907	96,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0%
Ministerio de Economía y Producción	16.536.000	29.517.441	29.249.387	29.249.387	99,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	5.815.450.054	8.208.900.462	8.137.534.434	8.135.433.557	99,1%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	393.803.000	412.187.846	409.966.054	409.964.054	99,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	51.550.000	51.950.000	28.990.573	28.829.435	55,5%
Ministerio de Salud	28.451.745	40.613.535	32.906.845	28.700.189	70,7%
Ministerio de Desarrollo Social	9.752.684	11.460.073	11.024.102	11.024.102	96,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	379.444.000	694.998.111	693.674.111	693.674.111	99,8%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	9.488.987.037	9.380.946.443	9.374.451.963	98,8%

CUADRO C
PRINCIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2007

(en pesos)

Denominación	Crédito Inicial (a)	Crédito Vigente (b)	Devengado (c)	% (d)=(c)/(b)
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios				
<i>Recursos Hídricos</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	176.370.000	204.314.711	204.312.919	100,0%
<i>Desarrollo Urbano y Vivienda</i>				
Acciones para Planes Federales de Vivienda	2.528.237.314	2.638.231.414	2.723.743.056	103,2%
Acciones para Emergencia Habitacional	154.501.046	154.501.046	147.575.763	95,5%
<i>Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas</i>				
Asistencia Financiera para Infraestructura Social	208.561.221	278.566.419	278.238.266	99,9%
<i>Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios</i>				
Transferencias a Gobiernos Municipales	80.000.000	123.871.230	122.548.807	98,9%
<i>Mejoramiento de Barrios</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales	155.352.698	210.055.490	210.054.917	100,0%
<i>Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario</i>				
Metrovías S.A.	32.695.274	268.037.309	246.187.175	91,8%
Trenes de Buenos Aires S.A.	58.166.691	161.063.268	165.276.632	102,6%
Trenes Metropolitanos General Roca S.A.	67.903.261	67.903.261	32.191.527	47,4%
Ferrocenral S.A.	0	12.540.532	29.732.560	237,1%
Herso S.A.	0	0	28.638.725	
Siemens S.A.	0		54.075.758	
Ferrovías S.A.	72.271.220	98.028.878	110.456.590	112,7%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	24.505.608	33.782.701	19.950.986	59,1%
Benito Roggio S. A.	0	0	69.342.529	
Sin discriminar	47.866.735	114.846.732	34.930.727	30,4%
<i>Formulación y Ejecución de la Política Energética</i>				
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal	424.466.000	1.150.439.431	1.150.439.276	100,0%
Cooperativas de Servicios Públicos	0	29.755.381	29.755.081	100,0%
Sin discriminar (a empresas privadas)	394.228.702	473.431.104	455.060.502	96,1%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	216.489.000	245.527.598	220.990.724	90,0%
<i>Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación"</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	289.409.000	660.170.447	660.047.858	100,0%
<i>Atención de Emergencia para Inundaciones</i>				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	85.845.285	142.272.974	141.538.031	99,5%
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD				
<i>Obras por Convenio con Provincias</i>				
Asistencia Financiera para Obras en Provincias	90.780.000	556.877.422	556.869.888	100,0%
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO				
<i>Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento</i>				
Obras de Saneamiento en Areas de Riesgo Sanitario				
Transferencias a Gobiernos Provinciales	81.850.452	149.323.452	145.090.752	97,2%
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología				
<i>Mejoramiento de la Calidad Educativa BIRF 7353</i>				
Transferencias a instituciones provinciales	14.100.000	23.708.407	17.708.819	74,7%
<i>Infraestructura y Equipamiento</i>				
Transferencias a Provincias e Institutos de Enseñanza Provinciales	141.713.606	139.475.652	139.473.508	100,0%
<i>Innovacion y Desarrollo de la Formación Tecnológica</i>				
Transferencias a Institutos de Enseñanza Provinciales	201.664.500	171.298.403	171.298.403	100,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro				
<i>Asist. Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales</i>				
Agua y Saneamiento Básico AySA S.A.	166.000.000	216.000.000	216.000.000	100,0%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	155.549.000	170.549.000	170.549.000	100,0%
TOTAL	5.868.526.613	8.494.572.262	8.552.078.779	100,7%

CUADRO D
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	996.360.232	1.641.281.576	2.395.002.827	2.394.877.972	25,5%
Provincia de Buenos Aires	1.092.820.956	1.748.703.073	1.578.966.874	1.578.038.205	16,8%
Provincia de Catamarca	131.163.296	129.495.704	105.401.114	105.234.465	1,1%
Provincia de Córdoba	219.752.332	388.907.456	278.087.916	278.108.916	3,0%
Provincia de Corrientes	112.421.961	117.767.422	136.335.933	135.989.949	1,5%
Provincia del Chaco	180.537.323	235.982.193	253.708.742	251.895.222	2,7%
Provincia del Chubut	191.493.889	200.712.717	190.733.605	190.733.605	2,0%
Provincia de Entre Ríos	128.860.362	184.843.603	179.858.947	179.858.947	1,9%
Provincia de Formosa	126.025.266	169.975.034	154.261.469	153.920.114	1,6%
Provincia de Jujuy	167.899.530	208.687.638	193.410.073	193.292.756	2,1%
Provincia de La Pampa	77.905.708	101.707.170	123.400.388	123.400.388	1,3%
Provincia de La Rioja	150.353.907	162.438.369	152.489.055	151.413.723	1,6%
Provincia de Mendoza	152.197.384	177.497.277	180.692.144	180.608.231	1,9%
Provincia de Misiones	114.771.640	162.052.964	185.318.692	184.929.544	2,0%
Provincia del Neuquén	124.606.199	96.823.462	61.222.330	61.152.730	0,7%
Provincia de Río Negro	117.747.362	89.316.903	92.580.631	92.573.006	1,0%
Provincia de Salta	144.784.580	205.800.784	198.168.955	197.717.894	2,1%
Provincia de San Juan	192.761.108	301.938.865	324.922.996	324.903.244	3,5%
Provincia de San Luis	137.401.115	47.522.033	30.565.010	30.565.010	0,3%
Provincia de Santa Cruz	351.509.795	498.895.745	971.242.377	971.242.377	10,4%
Provincia de Santa Fe	336.895.360	316.347.986	239.332.756	239.332.756	2,6%
Provincia de Santiago del Estero	149.932.257	142.148.301	110.774.701	110.402.433	1,2%
Provincia de Tucumán	246.766.974	472.752.605	413.813.620	413.605.188	4,4%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	61.023.014	116.141.801	112.937.467	112.937.467	1,2%
Interprovincial	869.460.000	1.470.077.334	711.142.117	711.142.117	7,6%
Nacional	132.672.369	94.155.022	0	0	0,0%
Binacional	0	105.000	100.797	100.797	0,0%
No Clasificado	6.749.000	6.909.000	6.474.907	6.474.907	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.714.872.919	9.488.987.037	9.380.946.443	9.374.451.963	100,0%
