

INVERSION PUBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Semestre Año 2008


INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.


La Inversión Real Directa (IRD) abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$8.135,2 millones y el Crédito Vigente (CV) al 30/06/08 resultó de \$7.654,2 millones (baja de \$481,0 millones, 5,9%), con un devengado de \$3.116,4 millones (ver Gráfico N° 1):

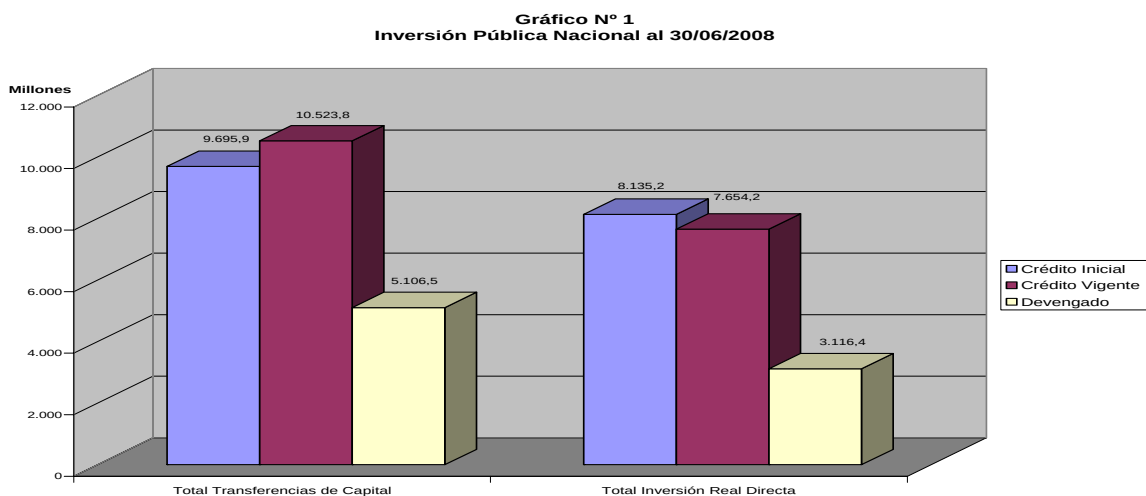

Los proyectos de inversión, principal componente de la IRD, incluyen gastos vinculados a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos y su CV al 30/06/08 ascendió a \$6.049,9 millones, correspondiendo \$5.695,0 millones a construcciones (ejecución de \$2.792,2 millones), \$162,7 millones a maquinarias y equipos (\$51,5 millones) y \$192,2 millones a otros gastos (\$83,9 millones). Asimismo la IRD incluye la adquisición de bienes de capital, con \$1.373,4 millones para maquinarias y equipos (ejecución de \$174,0 millones), \$74,3 millones de activos intangibles (\$5,5 millones), \$143,8 millones de edificios e instalaciones (\$4,2 millones) y \$12,8 millones de otros conceptos (\$5,1 millones) (ver Gráfico N° 2):

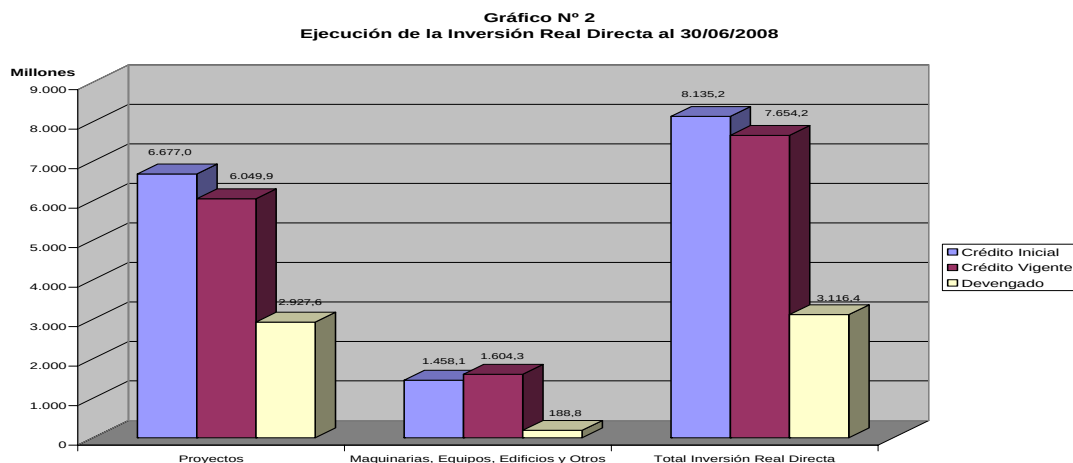

Por otra parte la Administración Nacional transfiere recursos a agentes económicos públicos o privados, para gastos de capital que impliquen un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al 30/06/08, sobre un CV de \$10.523,8 millones, las transferencias de capital ascendieron a \$5.106,5 millones (ver Gráfico N° 3):

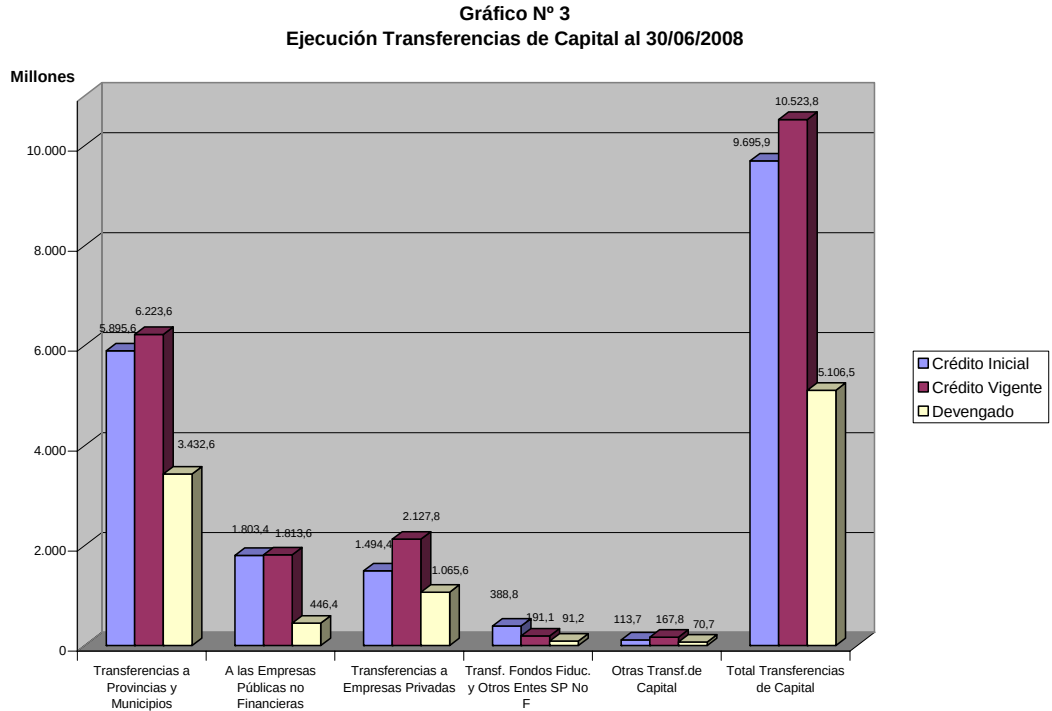

Al 30/06/08, de la ejecución de las transferencias de capital, \$3.432,6 millones (67,2%) correspondieron a provincias y municipios, \$1.065,6 millones (20,9%) a empresas privadas, \$446,4 millones (8,7%) a empresas públicas no financieras, \$91,2 millones (1,8%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$70,7 millones (1,4%) a otros tipos. El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la Ejecución de la Inversión Total durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/08 (en pesos)				
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejec.
Inversión Real Directa	8.135.156.226	7.654.222.792	3.116.351.001	40,7%
Proyectos	6.677.014.128	6.049.939.126	2.927.569.245	48,4%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.458.142.098	1.604.283.666	188.781.756	11,8%
Transferencias de Capital	9.695.897.095	10.523.802.748	5.106.497.753	48,5%
Inversión Total	17.831.053.321	18.178.025.540	8.222.848.754	45,2%


Se observa que las transferencias de capital registraron una mayor ejecución que la inversión real directa al cierre del primer semestre. Las transferencias de capital arrojaron un incremento en el crédito inicial de \$827,9 millones (8,5%). Asimismo, el CI asignado a los proyectos de inversión disminuyó en \$627,1 millones (9,4%) mientras que para la adquisición de bienes de uso aumentó \$146,1 millones (10,0%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2008

La ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) alcanzó a \$3.116,4 millones durante el primer semestre, lo que implica incrementos del 13,7% respecto a igual período de 2007, del 90,9% respecto a 2006, del 205,7% en relación a 2005 y del 524,9% respecto a 2004.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/06

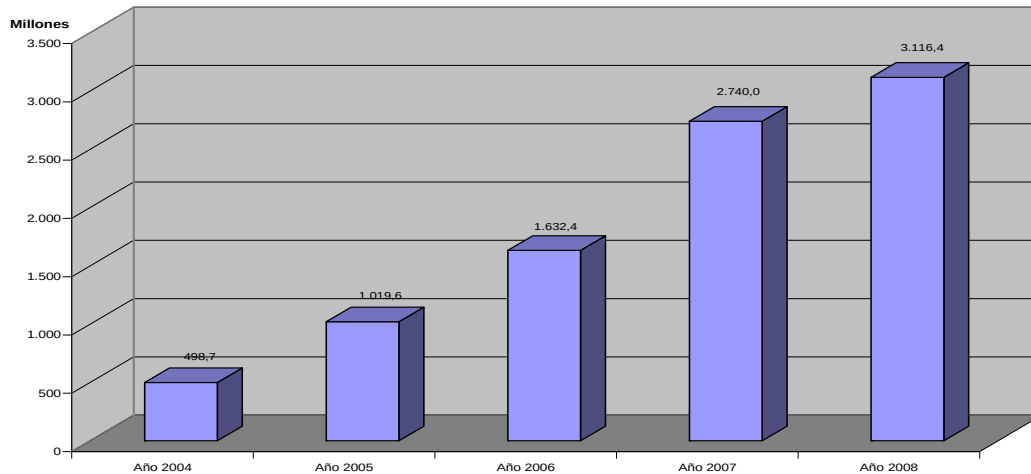

1- Según Nivel Institucional

Al 30/06/08 el CI destinado al financiamiento de la IRD disminuyó en \$480,9 millones (5,9%), de acuerdo al detalle por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/06/08 (en pesos)

Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	2.103.586.233	2.216.959.235	328.163.019	14,8%
Organismos Descentralizados	5.951.719.993	5.352.963.557	2.779.125.592	51,9%
Instituciones de Seguridad Social	79.850.000	84.300.000	9.062.390	10,8%
Total	8.135.156.226	7.654.222.792	3.116.351.001	40,7%

La ejecución en la Administración Central se concentró en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (\$151,3 millones) y en el Ministerio de Justicia (\$73,9 millones). En los Organismos Descentralizados prevaleció en la Dirección Nacional de Vialidad (\$2.217,6 millones), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$237,8 millones), el Órgano de Control de Concesiones Viales (\$206,5 millones) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (\$64,0 millones):


Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Interanual Comparada.
Principales Organismos Ejecutores. Primer Semestre 2007/2008 (en miles de pesos)

Organismo	Ejecución al 30/06/07	Ejecución al 30/06/08	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	1.949,5	2.217,6	13,8%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	154,2	237,8	54,2%
Órgano de Control de Concesiones Viales	184,4	206,5	12,0%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	150,5	151,3	0,5%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	40,0	64,0	60,0%
Total	2.478,6	2.877,2	16,1%

2- Según Fuente de Financiamiento

Alrededor del 82% de la inversión realizada al 30/06/08 se financió con Tesoro Nacional. A continuación se expone un gráfico relativo a las fuentes de financiamiento del gasto, comparando las ejecuciones en el primer semestre de 2007 y de 2008:

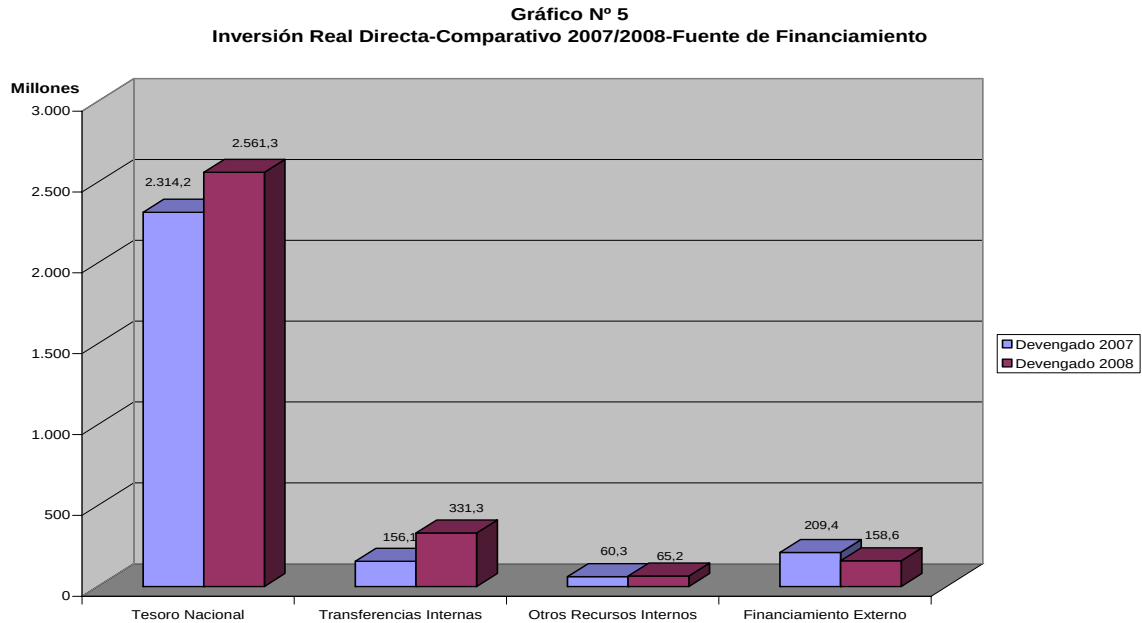


Al 30/06/08 la ejecución se incrementó en Tesoro Nacional (\$247,1 millones, un 10,7%), en Transferencias Internas (\$175,1 millones, un 112,2%) y en otros recursos internos (\$4,9 millones, un 8,1%), Por su parte, el financiamiento externo disminuyó (\$50,8 millones, un 24,3%), de acuerdo al gráfico anterior. A continuación se expone un cuadro con los niveles de gasto por fuente de financiamiento:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/06/08 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.632.487.583	5.201.833.954	2.561.318.993	49,2%
Transferencias Internas	772.005.000	777.635.000	331.278.387	42,6%
Otros Recursos Internos	441.125.526	568.802.470	65.163.611	11,5%
Financiamiento Externo	1.289.538.117	1.105.951.368	158.590.010	14,3%
Total	8.135.156.226	7.654.222.792	3.116.351.001	40,7%

La ejecución con Tesoro Nacional incluyó \$1.801,3 millones destinados a obras de construcción de rutas y al mantenimiento del sistema vial nacional, \$237,8 millones a saneamiento y cloacas y \$171,3 millones a cargo del Órgano de Control de las Concesiones Viales.

Con Transferencias Internas se financiaron proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad por \$296,1 millones y del Órgano de Control de Concesiones Viales por \$35,1 millones (mediante el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte). Con Financiamiento Externo sobresalió la ejecución de \$108,7 millones destinados a proyectos de construcciones de rutas de

la Dirección Nacional de Vialidad.

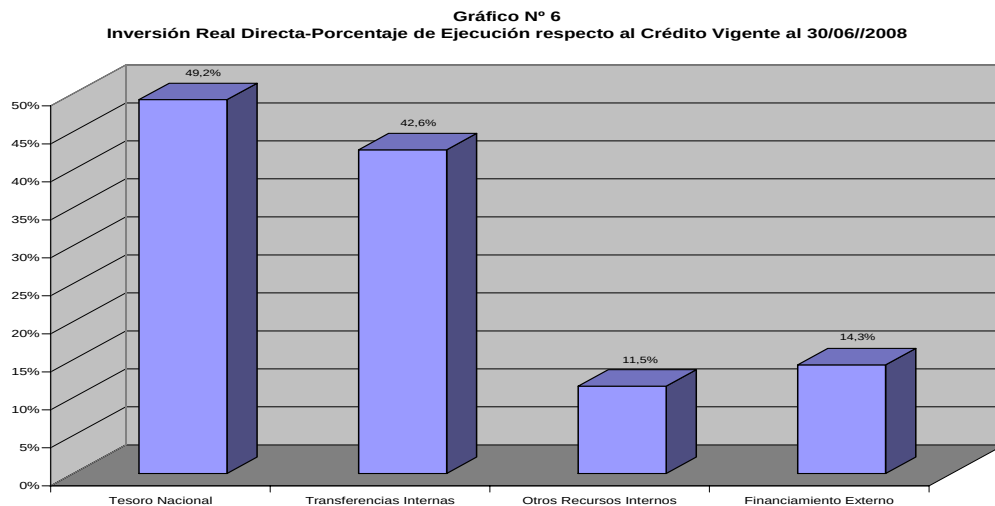

3- Según Ubicación Geográfica

La Inversión Real Directa se concentró (31%) en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias que presentaron menor inversión fueron Tierra del Fuego, San Luis, La Pampa, Chaco y Misiones (3,8% en conjunto).

En la provincia de Buenos Aires la ejecución alcanzó los \$293,9 millones incluyendo, principalmente, los proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$100,2 millones), de la Dirección Nacional de Vialidad (\$105,1 millones) y del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$51,2 millones).

En la provincia de Santa Fe la ejecución alcanzó los \$233,9 millones y correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$97,8 millones) sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286-Límite con Chaco (\$37,6 millones) y el mejoramiento en la Ruta Nacional N° 168 Río Colastiné - Túnel Fluvial Hernandarias (\$23,6 millones). Asimismo mostró importantes avances la construcción del Acueducto Centro Oeste Santa Fe (\$43,9 millones) a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento y la construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (\$56,9 millones) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En la provincia de Formosa la ejecución alcanzó los \$189,4 millones, comprendiendo, entre otras, las obras en la Ruta Nacional N° 86 General Güemes Posta Cambio a Salazar (\$44,6 millones), Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 Límite con Chaco (\$30,2 millones), Ruta Provincial N° 2 Empalme Ruta Nacional N° 11 Riacho He (\$26,1 millones) y Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable (\$36,4 millones).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destacó la administración integral de las fuerzas de seguridad (\$55,5 millones) y los proyectos Transporte Urbano de Buenos Aires y Construcción Escuela Nacional Fluvial (\$15,6 millones y \$8,2 millones, respectivamente).

II- EJECUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 30/06/08, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 71,6% del costo total de los proyectos en cartera y el 89,1% de la ejecución acumulada al primer semestre:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total*	Devengado Acumulado al 31/12/07	Devengado 01/01 al 30/06/08	% Dev. Acumulado al 30/06/08/ Costo Total
DNV	Construcción de Rutas	37.903.238.373	8.223.615.170	1.652.070.479	26,06
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	10.401.054.126	2.814.902.000	374.978.113	30,67
Sec. de Transporte	Soterramiento Corredor Ferroviario Caballito-Moreno	2.798.956.410	0	0	0,00
DNV	Mantenimiento de Rutas	1.902.648.199	155.440.900	180.465.216	17,65
CONAE	Misiones Satelitales	786.260.882	276.871.672	58.900.141	42,70
Sec. Rec. Hídricos	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	156.926.500	0	5.784.064	3,69
OCCOVI	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guaquaychú	155.023.867	18.128.037	20.603.449	24,98
ENOHSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	143.408.920	83.265.404	44.379.173	89,01
Sec. de Transporte	Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa	140.398.980	80.620.813	56.932.062	97,97
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula	139.827.069	67.385.870	24.180.548	65,49
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	131.539.952	72.136.786	36.390.913	82,51
OCCOVI	Vinculación y Remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP II Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	126.625.949	104.494.172	18.004.821	96,74
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	123.863.414	102.588.415	14.510.905	94,54
OCCOVI	Autopista Luján-Mercedes Secciones I y III, Provincia de Buenos Aires	108.564.115	31.303.978	19.638.771	46,92
ENOHSA	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson, Provincia de San Juan	105.672.929	53.485.348	18.878.157	68,48
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo	104.723.411	54.861.975	13.276.147	65,06
ENOHSA	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación, Paraná, Provincia de Entre Ríos	103.487.098	80.594.912	21.192.319	98,36
ENOHSA	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba	81.714.278	66.409.246	14.094.316	98,52
OCCOVI	Aumento de Capacidad Construcciones Viales, Provincia de Buenos Aires V-Tramo Campana-Zárate RN N°9	80.266.598	46.069.730	18.960.108	81,02
Sec. de Transporte	Modernización Línea A Subterráneo-Obras Civiles, CABA	78.826.513	48.447.097	15.604.986	81,26
Subtotal		55.573.027.583	12.380.621.525	2.608.844.688	26,97
Total I.R.D.		77.517.118.382	13.725.408.061	3.116.351.001	21,73

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2008

A continuación se describen los principales proyectos de inversión, por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)


La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional y, durante el primer semestre de 2008, ha realizado intervenciones en 5.371 kilómetros de rutas provinciales.

Construcción de Rutas

La ejecución financiera, al 30/06/08, acumuló el 26,1% del costo total de los proyectos vigentes. Al 30/06/08 en el subprograma Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración se encontraban en ejecución 637 kilómetros de ruta (en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). Asimismo se finalizó el tramo en la Ruta Nacional N° 40 Río Agua Clara-Río Las Cuevas con 38 kilómetros en la provincia de Catamarca. En el subprograma Obras por Convenio con Provincias se encontraban en ejecución trayectos que atañen 1.472 kilómetros, finalizándose el tramo en la Ruta Nacional N° 23 Valcheta-Pilcaniyeu Sección I (Musters kilómetro 77-kilómetro 105) con 28,2 kilómetros, en la provincia de Río Negro,

la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286 - Límite con Chaco con 29,2 kilómetros en la provincia de Santa Fe, Ruta Nacional N° 76 Vinchina-Pircas Negras con 30 kilómetros con la provincia de La Rioja y tramos varios por convenios con provincias y municipios en 388 kilómetros. En Obras en Corredores Viales Concesionados se encontraban en ejecución 291 kilómetros de rutas. Los tramos finalizados ascendieron a 140 kilómetros en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Por el sistema Construir, Operar y Transferir se mantuvieron 626 kilómetros (Corredor 28 Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31 Bahía Blanca-Empalme Ruta Nacional N° 5). Por último, en el subprograma Mejoramiento y Reposición de Rutas se encontraban en ejecución 4.724 kilómetros, concluyéndose 376 kilómetros (provincias de Formosa, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, Formosa, Salta, Entre Ríos y La Rioja). Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en los primeros semestres de los últimos 8 ejercicios:

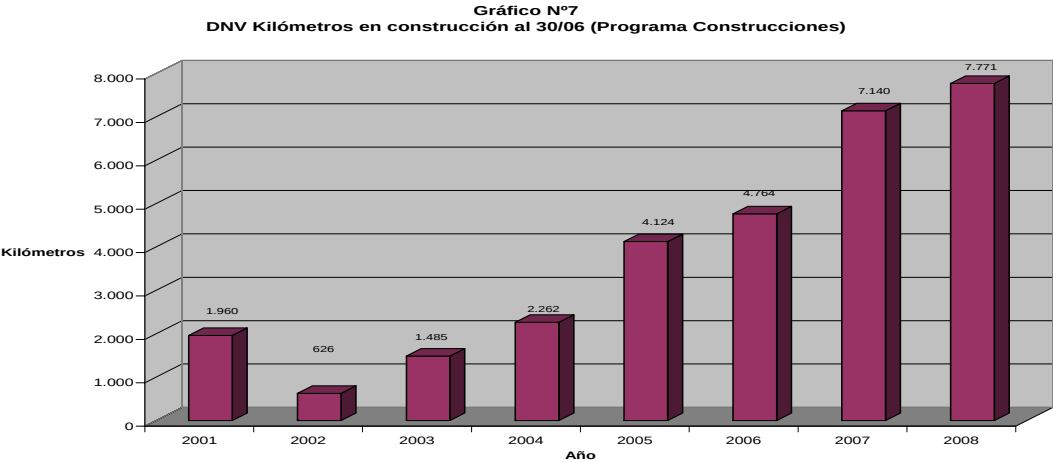

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

Al 30/06/08 el gasto acumulado representó el 30,7% del costo total de la cartera vigente. Las mallas en ejecución ascendían a 2.874 kilómetros para C.Re.Ma I, 1.780 kilómetros en C.Re.Ma, 5.529 kilómetros en C.Re.Ma III y 2.763 kilómetros en C.Re.Ma IV. Durante el segundo trimestre comenzaron las Mallas 507 (Provincia de Corrientes), 505 (Provincia de Misiones), 539 (Provincia de Formosa), 502 (Provincia de Entre Ríos) y 202 (Provincia de Santa Fe).

Mantenimiento de Rutas

La ejecución acumulada en mantenimiento de rutas ascendió al 17,6% del costo total de las obras vigentes al 30/06/08 y la DNV efectuó el mantenimiento directo de caminos en 5.123 kilómetros (equipos y mano de obra propios) e indirecto mediante el Sistema de Transferencias de Funciones Operativas (se fija por convenio, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.276 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	5.123,0
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.276,0
Total	11.399,0

Al 30/06/08 las obras del Sistema Modular incluyeron trabajos en 2.427 kilómetros, en las provincias de Salta, Chaco, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires y Chubut. Asimismo se finalizaron tramos en la Ruta Nacional Nº 25 Los Altares - Empalme Ruta Nacional Nº 40 (277,7 kilómetros) y Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 (289,1 kilómetros), provincia de Chubut y el tramo Ruta Nacional Nº 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Límite con Bolivia / Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional Nº 34 (249,3 kilómetros), provincia de Salta. Asimismo comenzaron otras obras en la citada Ruta Nacional Nº 40 Empalme Ruta Nacional Nº 25 - Empalme Ruta Provincial Nº 56 (272 kilómetros).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Misiones Satelitales

Al 30/06/08 se ejecutó el 42,7% del costo total de las iniciativas y, dentro del Plan Espacial 2007/2014, se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 6. Misiones Satelitales en Curso		
Satélites	Misión	Socios
SAOCOM 1 ^a /1B	Observación de la tierra	Italia (A.S.I.)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)/Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA/Italia/Bélgica/Brasil/Dinamarca/Francia

En la obra Misión SAOCOM se preparó el pliego para la licitación de los servicios de lanzamiento (incluye la provisión de un lanzador y los servicios de apoyo de tierra y colocación en órbita de los dos satélites SAOCOM 1). En la obra Misión SARE-SABIA se completó la provisión de la computadora de abordo y en la Misión SAC-D Aquarius se realizó la Revisión Crítica de diseño del Segmento Terreno y la Revisión Crítica de diseño de la Misión en su conjunto. Asimismo comenzó la construcción de los componentes de vuelo de la carga útil y de la plataforma. Participaron la firma INVAP, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)

Proyectos Cloacales y de Saneamiento

Al 30/06/08 continuó la ejecución de proyecto Construcción de Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora del Lago San Roque - Carlos Paz (Provincia de Córdoba, avance físico acumulado del 94,6%), beneficiando a 100.000 personas y la Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson (Provincia de San Juan) con un 57,6% acumulado físico y un 98,5% acumulado financiero. Asimismo se prevé la finalización de los proyectos Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa (avance del 82,5% y financiero del 82,5%), Planta Depuradora Cloacal Merlo (Provincia de Buenos Aires, avance del 67,2% físico y 65,6% financiero), Plata Potabilizadora, Redes y Centros de Distribución de Agua

Potable Paraná (Provincia de Entre Ríos, avance físico del 91,9% y 98,4% financiero) y Acueducto Centro Oeste (Provincia de Santa Fe, avance físico del 91,7% y financiero del 89,1%).

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI)

A continuación se expone un cuadro que refleja los proyectos que constituyen la cartera del OCCOVI:

Cuadro Nº 7. Proyectos del OCCOVI por Programa Presupuestario. En Pesos y Cantidad						
Programas	CV Proyectos	Devengado Proyectos	Q de Proyectos Presupuesto 2008	Q de Proyectos con Devengado al 30/06/08	Q de Proyectos con Ejecución Física 30/06/08	Q de Proyectos a finalizar 2008
17- Infraestructura en Concesiones Viales	291.335.043	129.901.021	61	25	23	14
18- Infraestructura en Áreas Urbanas	84.073.043	45.582.631	23	8	5	7
19- Obras de Mejora en Corredores Viales Nacionales	67.544.170	30.942.135	15	4	4	3
Totales	466.584.300	217.651.273	99	37	32	24

Sobresalen la Autopista Mesopotámica (Provincia de Entre Ríos), con una ejecución acumulada de casi el 9% (física) y 24,9% financiera, el proyecto Doble Vía Santa Rosa-General San Martín Ruta Nacional Nº 7 (Provincia de Mendoza), con un acumulado físico del 90,9% y financiero del 94,5%, el proyecto Autopista Luján-Mercedes (Provincia de Buenos Aires), con 42,1% de avance físico acumulado y 43,9% financiero, el proyecto Vinculación y Remodelación Ruta Provincial Nº 36-Rotonda Gutiérrez y Ruta Provincial II Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires), quedando sólo remanentes de certificaciones impagas, y el proyecto de Aumento de Capacidad Construcciones Viales Tramo Campana-Zárate Ruta Nacional Nº 9 (Provincia de Buenos Aires), con un acumulado físico del 76,7% y financiero del 81,1%.

Secretaría de Transporte

Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito – Moreno Línea Sarmiento

El proyecto integra el plan de modernización de la Línea de Ferrocarril Sarmiento y se ejecutará en tres etapas: Caballito-Liniers, Liniers-Castelar y Castelar-Moreno. La iniciativa postula eliminar las interferencias entre el servicio ferroviario y el entorno urbano y la posibilidad de accidentes, como así también incrementar la capacidad de transporte del servicio.

Se prevé la construcción de un túnel ferroviario entre Caballito y Ciudadela, en la primera etapa, de 11 metros de diámetro y ubicado a una profundidad promedio de 22 metros. A principios de 2008 fue adjudicado al consorcio que conforman las empresas locales Lecsa y Comsa, la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella. Al 30/06/08, sobre un CV de \$2,0 millones, la ejecución financiera en la actividad específica del proyecto ascendió a \$181 miles.

Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario por encima de la Laguna La Picasa

El proyecto restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la República de Chile, pasando por la provincia de Mendoza. Al 30/06/08 arrojó

una ejecución física semestral del 30,3%, mientras el total acumulado ascendió al 78,7%. Desde el punto de vista financiero la ejecución acumuló un 97,9% del costo total.

Ampliación Puerto Caleta Paula

Se encuentra ubicado próximo a la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros en sentido este-oeste y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 30/06/08, la ejecución física resultó del 17,3%, con un total acumulado físico del 58,3% y financiero del 65,5%.

Modernización Líneas A Subterráneo – Obras Civiles

El proyecto Transporte Urbano de Buenos Aires registró, al 30/06/08, una ejecución física total acumulada del 68,2% y 81,2% financiera sobre el costo total.

Recursos Hídricos

Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional

El proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional abarca la construcción e instalación del instrumental de nuevas estaciones de medición, la contratación del servicio de ingeniería para la operación y mantenimiento y la sistematización de la base de datos hidrometeorológicos y de calidad de agua. El 28/02/08 se firmó el contrato del proyecto y la ejecución física al 30/06/08 ascendió al 1,8% y financiera al 3,7%.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2008

1-Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8 Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/06/2008 (en pesos)


NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	9.111.855.942	9.546.387.595	4.329.525.085	45,4 %
Organismos Descentralizados	584.041.153	977.415.153	776.972.668	79,5 %
TOTAL	9.695.897.095	10.523.802.748	5.106.497.753	48,5 %

En la Administración Central, sobresalieron las transferencias para el Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" (\$1.067,5 millones), para la Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$1.126,6 millones), para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$260,9 millones), para el Transporte Ferroviario (\$188,4 millones), para la Formulación y Ejecución de la Política de Obras Públicas (\$233,3 millones), Acciones para Mejoramiento Habitacional "Mejor Vivir" (\$157,3 millones), Fortalecimiento Comunitario del Habitat (\$168,6 millones) y para el Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$96,5 millones).

Resultaron importantes las transferencias a empresas públicas del sector energía y minería, entre ellas, a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$205,0 millones), Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (\$147,8 millones) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$60,0 millones).

En cuanto a los organismos descentralizados las transferencias fueron canalizadas, principalmente, por la Dirección Nacional de Vialidad (construcción de rutas por convenio con las provincias de Santa Cruz, Córdoba, Formosa y La Pampa por \$656,2 millones) y por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (obras de saneamiento y expansión de agua potable y cloacas por \$102,2 millones).

Gráfico N° 8
Transferencias de Capital - Devengado al 30/06

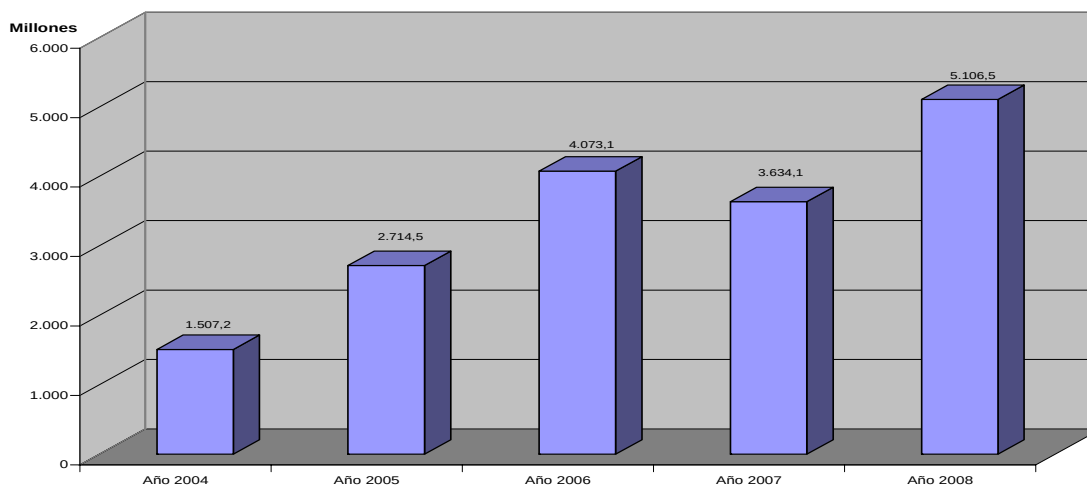

Se observa que las transferencias de capital mostraron un aumento de \$1.472,4 millones respecto al mismo período de 2007 (40,5%) y de \$1.033,4 millones (25,4%) respecto a 2006.


2-Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/06/2008 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	8.018.976.656	8.601.407.309	4.438.148.085	51,6%
Recursos con Afectación Específica	248.902.224	255.772.224	130.307.765	50,9%
Otros recursos internos	26.038.050	33.448.050	12.037.377	36,0%
Financiamiento Externo	1.401.980.165	1.633.175.165	526.004.526	32,2%
Total	9.695.897.095	10.523.802.748	5.106.497.753	48,5%

El Tesoro Nacional concentró el 86,9% de las transferencias, sobresaliendo las destinadas a la construcción de rutas por convenio con provincias (\$656,2 millones), al Desarrollo de la Infraestructura Habitacional “Techo Digno” (\$1.067,5 millones), la Formulación y Ejecución de la Política Energética (\$766,2 millones), las Asistencias para Infraestructura Social y Obras Municipales (\$227,4 millones), las Acciones de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (\$157,3 millones), Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (\$113,9 millones) y el Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$168,6 millones).

También se realizaron transferencias con destino a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de Políticas para Transporte Ferroviario (\$188,4 millones), las Acciones “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$130,0 millones), a Nucleoeléctrica (\$205,0 millones), a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.(\$147,8 millones), para el financiamiento del Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$96,5 millones), a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$60,0 millones) y al Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (\$95,0 millones):

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/06/2008

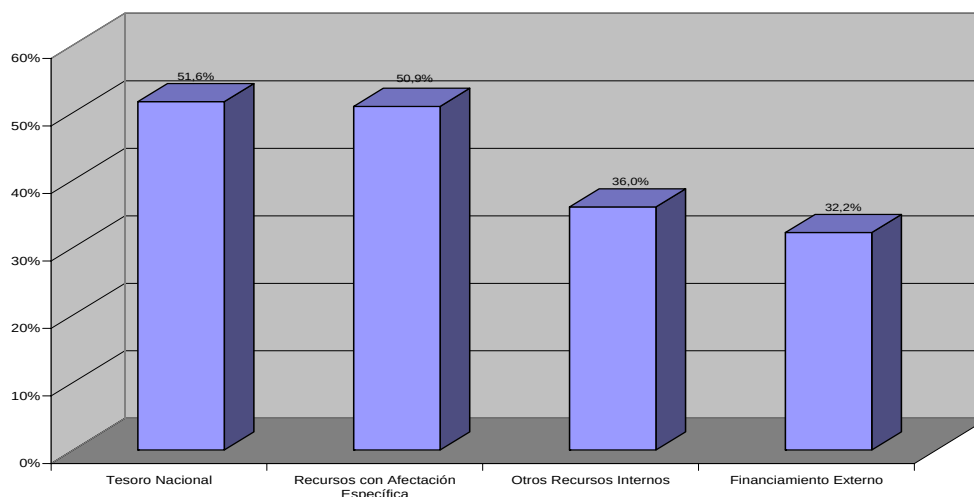

Los Recursos Afectados correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (FEDEI) por \$119,4 millones. El Crédito Externo fue aplicado, principalmente, a la Interconexión 3º tramo Yacyretá (\$231,8 millones), al plan “Más Escuelas, Mejor Educación”

(\$130,9 millones), para Atención de Emergencias por Inundaciones Préstamo BID 1118 (\$41,0 millones) y Mejoramiento de Barrios (\$79,3 millones)

3-Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron (alrededor del 65%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Tucumán y San Juan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27,5%) se destacaron, entre otros, los fondos para Nucleoelectrónica Argentina (\$205,0 millones), a Aguas Argentinas S.A. (\$147,8 millones), a Trenes de Buenos Aires S.A. (\$65,7 millones), a Herso S.A. (\$41,5 millones) y a Ferrocarril S.A. (\$32,1 millones). Debe aclararse que el área de cobertura de los servicios de estas empresas es más amplia que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las asignaciones inherentes a la provincia de Buenos Aires (12,8%) comprendieron, mayormente, al programa de Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$247,0 millones), acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$77,8 millones), Desarrollo de la Infraestructura Básica y Obras Complementarias (\$40,3 millones), apoyo para infraestructura urbana en municipios (\$40,6 millones) y Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (\$67,9 millones).

En la provincia de Santa Cruz (16,3% del total) sobresalieron las obras viales por convenio (\$555,4 millones), obras de agua potable y desagües (\$59,1 millones), para infraestructura social y obras municipales (\$92,4 millones) y las asignaciones para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$60,0 millones).

En la provincia de Tucumán se incluyeron transferencias a los programas Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "Techo Digno" (\$66,7 millones), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$50,3 millones) y Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$39,7 millones).

Las transferencias a la provincia de San Juan abarcaron, fundamentalmente, el financiamiento del dique y central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$96,5 millones) y para infraestructura habitacional del programa "Techo Digno" (\$63,3 millones).

Por su parte las transferencias con ubicación geográfica interprovincial (asociadas a dos o más jurisdicciones), se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$91,2 millones) y otras transferencias a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$100,0 millones).

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	38.790.352	43.473.703	4.683.351	12,1%
Presidencia de la Nación	50.839.980	39.599.591	-11.240.389	-22,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	37.910.304	51.059.810	13.149.506	34,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	203.909.252	203.909.252	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	80.002.930	79.702.930	-300.000	-0,4%
Ministerio de Defensa	74.002.411	76.644.535	2.642.124	3,6%
Ministerio de Economía y Producción	45.664.629	73.236.631	27.572.002	60,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	6.104.776.270	5.446.338.774	-658.437.496	-10,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	760.000	510.000	-250.000	-32,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.990.000	5.990.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	18.435.000	13.540.900	-4.894.100	-26,5%
Ministerio de Desarrollo Social	15.933.000	15.933.000	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	6.677.014.128	6.049.939.126	-627.075.002	-9,4%
Poder Legislativo Nacional	16.424.720	17.328.040	903.320	5,5%
Poder Judicial de la Nación	60.545.965	159.364.221	98.818.256	163,2%
Ministerio Público	14.855.425	19.869.175	5.013.750	33,8%
Presidencia de la Nación	36.175.020	114.913.396	78.738.376	217,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	106.127.197	85.956.518	-20.170.679	-19,0%
Ministerio del Interior	12.050.643	16.941.343	4.890.700	40,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.737.549	16.771.549	34.000	0,2%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	344.910.908	372.901.168	27.990.260	8,1%
Ministerio de Defensa	185.366.071	144.952.464	-40.413.607	-21,8%
Ministerio de Economía y Producción	138.115.168	121.550.643	-16.564.525	-12,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	240.795.504	216.869.898	-23.925.606	-9,9%
Ministerio de Educación	4.350.515	6.322.377	1.971.862	45,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	31.677.000	41.427.000	9.750.000	30,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131.184.600	132.594.600	1.410.000	1,1%
Ministerio de Salud	87.576.813	100.755.678	13.178.865	15,0%
Ministerio de Desarrollo Social	9.323.000	16.155.100	6.832.100	73,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	21.926.000	19.610.496	-2.315.504	-10,6%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.458.142.098	1.604.283.666	146.141.568	10,0%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	7.654.222.792	-480.933.434	-5,9%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/06/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	38.790.352	43.473.703	31.625.908	12.955.683	29,8%
Presidencia de la Nación	50.839.980	39.599.591	8.626.897	6.177.645	15,6%
Jefatura de Gabinete de Ministros	37.910.304	51.059.810	15.026.473	6.989.689	13,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	203.909.252	203.909.252	86.173.308	65.847.270	32,3%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	80.002.930	79.702.930	38.039.537	2.239.495	2,8%
Ministerio de Defensa	74.002.411	76.644.535	24.959.321	12.305.377	16,1%
Ministerio de Economía y Producción	45.664.629	73.236.631	22.264.454	13.217.317	18,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	6.104.776.270	5.446.338.774	2.860.176.908	2.806.392.114	51,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	760.000	510.000	185.587	25.085	4,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.990.000	5.990.000	1.669.016	407.655	6,8%
Ministerio de Salud	18.435.000	13.540.900	1.216.481	1.011.915	7,5%
Ministerio de Desarrollo Social	15.933.000	15.933.000	0	0	
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	6.677.014.128	6.049.939.126	3.089.963.890	2.927.569.245	48,4%
Poder Legislativo Nacional	16.424.720	17.328.040	4.736.631	2.953.803	17,0%
Poder Judicial de la Nación	60.545.965	159.364.221	8.912.307	5.154.329	3,2%
Ministerio Público	14.855.425	19.869.175	2.210.358	1.987.983	10,0%
Presidencia de la Nación	36.175.020	114.913.396	14.789.961	11.778.838	10,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	106.127.197	85.956.518	3.759.024	2.639.310	3,1%
Ministerio del Interior	12.050.643	16.941.343	2.068.827	1.083.454	6,4%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.737.549	16.771.549	4.683.660	3.426.949	20,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	344.910.908	372.901.168	87.817.762	71.928.960	19,3%
Ministerio de Defensa	185.366.071	144.952.464	16.958.314	9.818.263	6,8%
Ministerio de Economía y Producción	138.115.168	121.550.643	18.246.447	12.130.333	10,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	240.795.504	216.869.898	32.204.247	23.465.980	10,8%
Ministerio de Educación	4.350.515	6.322.377	952.144	292.348	4,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	31.677.000	41.427.000	18.599.213	17.972.265	43,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131.184.600	132.594.600	17.151.947	14.925.302	11,3%
Ministerio de Salud	87.576.813	100.755.678	10.365.401	7.484.743	7,4%
Ministerio de Desarrollo Social	9.323.000	16.155.100	2.942.729	1.738.896	10,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	21.926.000	19.610.496	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.458.142.098	1.604.283.666	246.398.972	188.781.756	11,8%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	7.654.222.792	3.336.362.862	3.116.351.001	40,7%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.810.000	2.308.909	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Adecuación para instalación Subdirección de Notificaciones	2.810.000	2.308.909	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	3.190.000	3.066.430	0	50,00	50,00	0,00	0,00
				61		Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	3.150.000	3.066.430	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				68		Construcción de locales subsuelo Avenida de los Inmigrantes	40.000	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00
	22					Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	3.090.000	3.613.018	2.447.307	35,00	65,00	s/i	
				51		Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	3.050.000	3.325.682	2.223.963	70,00	30,00	s/i	
				52		Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal	40.000	287.336	223.345	0,00	100,00	s/i	
	23					Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
		1				Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	0	0	57,00	43,00	0,00	0,00
				52		Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle	40.000	0	0	57,00	43,00	0,00	0,00
		2				Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	2.440.000	0	0	61,00	39,00	0,00	0,00
				53		Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal	2.440.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	24					Justicia Federal							
		3				Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	3.248.100	10.982.240	3.403.838	63,00	37,00	s/i	
				51		Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	3.248.100	10.982.240	3.403.838	63,00	37,00	s/i	
		4				Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (****)	0	237.116	237.114	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Adecuacion Edificio Anexo M.T.de Alvear 1840-Capital Federal	0	237.116	237.114	100,00	0,00	0,00	100,00
		7				Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	845.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	550.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	295.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	10					Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.890.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.860.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	11					Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	1.354.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio	925.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	429.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	12					Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	2.085.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				53		Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio	985.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	15					Área Cámara Resistencia							
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	650.000	1.397.361	834.407	0,00	100,00	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	650.000	1.397.361	834.407	0,00	100,00	s/i	
				16		Área Cámara de Córdoba							
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	662.900	721.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal Nº 2	662.900	721.152	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Área Cámara San Martín							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.245.000	600.000	0	70,00	30,00	0,00	0,00
						52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	40.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio	1.185.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Área Cámara Tucumán							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	1.665.225	1.014.622	73,00	27,00	s/i	
						52 Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	40.000	1.665.225	1.014.622	73,00	27,00	s/i	
335				21		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)							
						Justicia de Máxima Instancia							
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.199.733	2.469.733	451.609	15,03	50,00	s/i	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	200.000	1.370.000	451.609	69,25	30,00	s/i	
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.137.950	537.950	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	100.000	100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						62 Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	361.783	361.783	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad Buen	400.000	100.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
				2		Refacciones en Sedes Periciales	3.030.050	3.040.050	2.246.075	37,20	52,80	s/i	
						56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718	3.030.050	3.030.050	2.236.869	41,00	49,00	s/i	
						70 Adecuación Locales P.H. Hem. y Locales Anexos Tras.Cuerpo Médico Forence	0	10.000	9.206	85,00	15,00	s/i	
				3		Refacciones Varias	590.412	675.412	10.085	0,69	99,31	s/i	
						76 Reformas - Edificio Lavalle 1250	590.412	675.412	10.085	0,00	100,00	s/i	
				4		Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano	671.510	3.360.010	2.159.942	40,00	57,00	s/i	
						51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano	671.510	3.360.010	2.159.942	40,00	57,00	s/i	
				5		Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	0	50.400	33.619	78,00	22,00	s/i	
						51 Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	0	50.400	33.619	78,00	22,00	s/i	
				6		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	2.426.483	2.526.483	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	2.426.483	2.526.483	0	0,00	65,00	0,00	0,00
				7		Mejoras en el Palacio de Justicia	2.012.174	160.174	0	0,00	56,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Palacio de Justicia	2.012.174	160.174	0	0,00	56,00	0,00	0,00
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia	1.740.484	705.484	117.064	20,00	75,00	s/i	
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia	58.800	239.800	117.064	20,00	75,00	s/i	
						52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia Nº1 al Nº12 -	1.681.684	465.684	0	0,00	55,00	0,00	0,00
				9		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires	520.828	520.828	0	0,00	55,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires	520.828	520.828	0	0,00	55,00	0,00	0,00
				10		Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.008.678	423.678	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						51 Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.008.678	423.678	0	0,00	35,00	0,00	0,00
20						Presidencia de la Nación							
				107		ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
					17	Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							
					4	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales	1.300.000	6.278.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr. anual
						51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales	1.300.000	6.278.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
21					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.000.000	1.409.000	1.511.459	51,25	48,75	18,00	0,37
						52 Obras en Junta de la Palca	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Mejoras en Agua del Godo	0	1.409.000	1.511.459	0,00	s/i	s/i	
					40	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	400.000	590.000	660.857	53,82	46,18	34,00	0,74
						53 Centro Operativo Área Pobladores	200.000	390.000	0	15,00	85,00	0,00	0,00
						54 Centro Operativo Área Robles	200.000	200.000	660.857	92,62	7,38	7,00	0,95
					41	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	873.000	753.711	581.381	94,86	5,14	5,00	0,97
						51 Obras Etapa I - Infraestructura	123.000	96.511	96.511	98,00	2,00	0,00	0,00
						52 Adecuación Galpón de Esquila Como Centro de Interpretación	750.000	657.200	484.871	0,00	100,00	10,00	0,10
					43	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya	0	830.000	415.000	0,00	s/i	s/i	
						51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya	0	830.000	415.000	0,00	s/i	s/i	
22						Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-AR							
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR	7.111.350	5.111.350	52.210	59,00	41,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR	7.111.350	5.111.350	52.210	59,00	41,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AR	6.915.600	4.915.600	630.039	50,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AR	6.915.600	4.915.600	630.039	50,00	50,00	0,00	0,00
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR	2.790.560	1.897.560	478.592	65,00	35,00	0,00	0,00
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR	2.790.560	1.897.560	478.592	65,00	35,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR	6.065.490	3.430.390	29.409	0,00	100,00	1,00	0,01
						51 Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR	6.065.490	3.430.390	29.409	0,00	100,00	1,00	0,01
116						BIBLIOTECA NACIONAL							
					25	Servicios de la Biblioteca Nacional							
					1	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires (2)	1.621.000	1.621.000	590.988	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	1.621.000	1.621.000	590.988	0,00	0,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION							
					1	Actividades Centrales							
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (****)	1.360.000	1.360.000	120.689	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	1.360.000	1.360.000	120.689	100,00	0,00	0,00	100,00
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa II	16.665.980	6.397.980	271.490	76,18	23,82	1,26	0,05
						51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa II	16.665.980	6.397.980	271.490	76,18	23,82	1,26	0,05
					4	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (****)	0	268.000	16.738	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	0	268.000	16.738	100,00	0,00	0,00	100,00
337						SECRETARIA DE CULTURA							
					36	Difusión de la Música y Danza							
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	10.000	10.000	9.731	94,34	5,66	89,37	15,79
						51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	10.000	10.000	9.731	94,34	5,66	89,37	15,79
					37	Preservación y Exhibición Artística - Cultural							
					1	Mejoras en Museos	477.000	477.000	7.956	25,94	46,22	6,87	0,15
						51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	100.000	7.956	72,80	27,20	13,40	0,49
						52 Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	17,42	0,00	0,00
						53 Mejoras en el Museo Roca	50.000	50.000	0	0,00	45,45	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Museo Mitre	42.000	42.000	0	0,00	25,93	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
25	317	31	34	1		55 Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos	35.000	35.000	0	0,00	36,84	0,00	0,00
						56 Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad de Bs. As.	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						59 Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						61 Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Desarrollo y Promoción Cultural							
						5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	250.000	250.000	38.983	41,42	22,21	0,28	0,01
						51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	50.000	0	88,44	11,56	0,00	0,00
						52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	71,73	0,00	0,00
						53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina	75.000	75.000	0	0,00	35,05	0,00	0,00
						54 Mejoras en el Edificio de la Calle México	50.000	50.000	0	2,76	33,56	0,00	0,00
						55 Mejoras en el Palais de Glace	10.000	10.000	38.983	85,91	11,11	2,22	0,20
						56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	25.000	0	0,00	13,51	0,00	0,00
						6 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario	4.000.000	4.000.000	762.121	27,22	54,87	18,56	0,34
						51 Remodelación Edificio Festejo Bicentenario	4.000.000	4.000.000	762.121	27,22	54,87	18,56	0,34
						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE							
						Coordinación de Políticas Ambientales							
						1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	1.300.000	1.300.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	1.300.000	1.300.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	2.000.000	2.000.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						4 Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.700.000	1.700.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.700.000	1.700.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
35	106	1				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC-AR							
						1 Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo BID 1059 /OC-AR	26.910.304	40.059.810	6.989.689	5,00	42,00	2,00	0,05
						52 Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza BID 1059/OC-AR	1.887.604	4.687.604	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						53 Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza BID 1059/OC-AR	15.190.500	25.540.006	6.989.689	16,00	74,00	14,00	0,19
						54 Rectificación Avenida Carlos Pellegrini Villa Diamante - Lanús	6.712.200	6.712.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Relleno Sanitario Cuenca Alta BID 1059/OC-AR	3.120.000	3.120.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional							
						COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
						Actividades Centrales							
						3 Remodelación de la Sede Central de la CONAE	40.799	40.799	0	92,63	5,59	0,00	0,00
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	40.799	40.799	0	92,63	5,59	0,00	0,00
						4 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I	464.201	1.144.201	505.262	0,00	8,44	6,28	0,74

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr.
													anual
						51 Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I	464.201	1.144.201	505.262	0,00	8,44	6,28	0,74
					5	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.000.000	1.000.000	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						51 Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.000.000	1.000.000	0	0,00	11,11	0,00	0,00
16						Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
					1	Infraestructura Terrestre	2.680.000	3.070.000	1.348.281	44,80	3,03	0,98	0,32
						0 Infraestructura Terrestre	150.000	150.000	0				
						51 Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.000.000	1.340.000	1.145.458	87,96	4,25	2,51	0,59
						52 Construcción del Instituto Gulich	5.000	5.000	0	13,98	0,12	0,00	0,00
						55 Construcción Antena Multipropósito N° 3	5.000	5.000	0	14,33	0,11	0,00	0,00
						56 Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00
						57 Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00
						58 Construcción de Antenas Educativas	5.000	55.000	34.823	6,32	0,03	0,00	0,00
						59 Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,07	0,00	0,00
						60 Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	1.500.000	168.000	2,30	13,36	1,50	0,11
					2	Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	151.049.801	147.089.801	58.900.141	47,24	16,71	5,64	0,34
						0 Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.000.000	1.019.319				
						52 Misión SAOCOM	97.197.645	88.865.645	25.872.778	37,89	15,21	4,22	0,28
						53 Misión SABIA	16.604.761	16.604.761	3.177.470	15,19	68,61	13,13	0,19
						54 Misión CESAR	35.247.395	39.619.395	28.830.573	57,57	27,53	18,59	0,68
					4	Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	20.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
						51 Antena Multipropósito N° 5	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
						52 Antena Multipropósito N° 6	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00
					5	Subsistemas de Propulsión de Satélites	5.000	5.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	5.000	5.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00
					6	Construcción Satélite "SARE - 1"	1.500.000	1.500.000	0	0,29	33,33	0,00	0,00
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	1.500.000	1.500.000	0	0,29	33,33	0,00	0,00
17						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							
					1	Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	10.903.000	13.793.000	1.705.249	2,43	13,33	2,04	0,15
						0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	103.000	103.000	0				
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	1.040.000	205.035	19,42	14,64	3,30	0,23
						52 Configuración de Vehículo Espacial	10.000.000	12.650.000	1.500.213	1,01	13,95	2,05	0,15
18						Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen							
					1	Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
					1	Actividades Centrales							
					2	Remodelación Palacio San Martín	700.000	510.000	0	60,00	22,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Palacio San Martín	700.000	510.000	0	60,00	22,00	0,00	0,00
					3	Culminación Auditorio Edificio Cancillería	460.000	650.000	633.994	70,00	30,00	10,00	0,33
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería	460.000	650.000	633.994	70,00	30,00	10,00	0,33
16						Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	945.000	945.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	945.000	945.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
17						Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	1.200.000	1.200.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	1.200.000	1.200.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
16					6	Construcción de la Embajada en Brasilia	18.972.414	18.972.414	2.754.343	0,00	65,00	10,00	0,15
					0	Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.148.000	144.413				
					51	Construcción de la Embajada en Brasilia	18.972.414	17.824.414	2.609.930	0,00	65,00	10,00	0,15
					9	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	190.200	190.200	0	43,00	22,00	10,00	0,45
					51	Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	190.200	190.200	0	43,00	22,00	10,00	0,45
					10	Remodelación Consulado en Nueva York	500.000	500.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Consulado en Nueva York	500.000	500.000	0	0,00	9,00	0,00	0,00
					11	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.530.538	6.530.538	0	40,00	30,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.530.538	6.530.538	0	40,00	30,00	0,00	0,00
					12	Remodelación de la Embajada de Francia	3.829.442	3.829.442	0	0,00	84,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de la Embajada de Francia	3.829.442	3.829.442	0	0,00	84,00	0,00	0,00
					15	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	2.200.000	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	2.200.000	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					16	Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	120.000	120.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	120.000	120.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					17	Remodelación Residencia en Canberra, Australia	388.857	388.857	0	0,00	43,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Residencia en Canberra, Australia	388.857	388.857	0	0,00	43,00	0,00	0,00
					18	Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
40						Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos							
						POLICIA FEDERAL ARGENTINA							
					21	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes							
					22	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00
					33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Interior	775.000	775.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Interior	775.000	775.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	850.000	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	850.000	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					37	Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños	780.000	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños	780.000	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					43	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas	560.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas	560.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					22	Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
					9	Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca	310.000	310.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
					51	Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca	310.000	310.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00
332						MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS							
					1	Actividades Centrales							
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	280.000	0	99,59	0,41	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%	
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr	
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente	30/06/2008	ogr. anual	
18						51 Reparaciones Varias	180.000	190.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
						52 Equipamientos Varios	45.000	45.000	0	90,08	9,92	0,00	0,00	
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	45.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
						Política e Infraestructura Penitenciaria								
		10				Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	880.260	880.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	
		0				Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	100.000	100.000	0					
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	780.260	780.260	0	0,00	10,00	0,00	0,00	
		11				Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	22.179.402	22.179.402	2.120.105	0,00	18,00	4,18	0,23	
		0				Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	100.000	100.000	0					
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	22.079.402	22.079.402	2.120.105	0,00	18,00	4,18	0,23	
		12				Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	17.118.500	17.118.500	4.400	0,00	14,00	0,00	0,00	
		0				Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	100.000	100.000	4.400					
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	17.018.500	17.018.500	0	0,00	14,00	0,00	0,00	
		15				Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	6.715.146	6.715.146	0	0,00	26,00	0,00	0,00	
		0				Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	100.000	100.000	0					
						51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	6.615.146	6.615.146	0	0,00	26,00	0,00	0,00	
		16				Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	11.967.310	11.967.310	0	0,00	6,00	0,00	0,00	
		0				Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	100.000	100.000	0					
						51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	11.867.310	11.867.310	0	0,00	6,00	0,00	0,00	
		17				Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5)	0	350.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
						51 Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5)	0	350.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00	
		18				Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	2.955.382	2.955.382	0	0,00	40,00	0,00	0,00	
		0				Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	200.000	200.000	0					
						51 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	2.755.382	2.755.382	0	0,00	40,00	0,00	0,00	
		19				Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	7.750.000	7.400.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
		0				Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	100.000	100.000	0					
						51 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	7.650.000	7.300.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
	375						GENDARMERIA NACIONAL							
		40					Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
		2					Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	96.830	400.450	0	15,00	19,00	0,00	0,00
							51 Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	96.830	400.450	0	15,00	19,00	0,00	0,00
		20					Mejoramiento Infraestructura Gendarmeria Nacional-Etapa I	0	906.416	0	20,70	23,04	0,00	0,00
							51 Reparación Estructura General Escuela Gendarmeria Nacional Martín Miguel Güemes	0	906.416	0	23,60	23,04	0,00	0,00
		21					Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional	665.100	757.567	114.990	67,20	32,80	0,00	0,00
							53 Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 - Oberá	81.900	253.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
							54 Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 - Oberá	57.200	255.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Grupo Federación-Escuadrón 4-Concordia	0	125.000	0	0,00	s/i	s/i		
						56 Refacción Escuadrón 19 - Ingeniero Juarez	0	124.567	114.990	0,00	s/i	s/i		
						59 Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca"	26.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						62 Ampliación Grupo "Alfárez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahüe	500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
	22					Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu	130.000	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu	130.000	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
	23					Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV	0	279.000	0	0,00	s/i	s/i		
						51 Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV	0	279.000	0	0,00	s/i	s/i		

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					24	Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5	705.250	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5	705.250	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					25	Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					26	Construcción Sección San Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe	680.000	680.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección San Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe	680.000	680.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					27	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualeguaychú	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualeguaychú	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					28	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					29	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada	2.491.750	1.398.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada	2.491.750	1.398.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					30	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	0	250.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	0	250.000	0	0,00	s/i	s/i	
45						Ministerio de Defensa							
	370					MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)							
		18				Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas							
				1		Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	8.704.884	8.704.884	4.200.065	14,00	14,00	50,00	3,57
				0		Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	100.000	673.200	0				
				51		Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	8.604.884	8.031.684	4.200.065	14,00	14,00	50,00	3,57
	371					ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.							
		20				Sostén Logístico Antártico							
				2		Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	20.853.760	3.853.760	0	46,00	47,00	0,00	0,00
				51		Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	20.853.760	3.853.760	0	46,00	47,00	0,00	0,00
	372					INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A							
		17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
				2		Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	364.650	364.650	9.900	40,00	30,00	0,00	0,00
				51		Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	364.650	364.650	9.900	40,00	30,00	0,00	0,00
				3		Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración	129.000	129.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración	129.000	129.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.357.300	1.357.300	61.053	0,00	45,00	0,00	0,00
				51		Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.357.300	1.357.300	61.053	0,00	45,00	0,00	0,00
	374					ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
		16				Capacidad Operacional y Apoyo							
				58		Reemplazo y Provisión de Caldera	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Reemplazo Provisorio Caldera 2º Etapa Hospital Militar Central	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		19				Remonta y Veterinaria							
				62		Construcciones Agropecuarias	46.849	46.849	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Construcción Galpón Tinglado	20.500	20.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				52		Tanque Australiano Placas Hormigón	26.349	26.349	0	0,00	100,00	0,00	0,00
	379					ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
		16				Capacidad Operacional de la Armada							
				3		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.500.000	1.500.000	0	62,71	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrano	1.500.000	1.500.000	0	62,71	30,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
		18				Formación y Capacitación							
				1		Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	10.563.000	9.455.000	1.332.401	93,62	6,00	2,07	0,35
				51		Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	10.563.000	9.455.000	1.332.401	93,62	6,00	2,07	0,35
				2		Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4)	0	761.000	549.314	74,00	26,00	17,00	0,65
				51		Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4)	0	761.000	549.314	74,00	26,00	17,00	0,65
				3		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	11.650.473	11.650.473	3.572.921	32,25	25,00	12,44	0,50
				51		Construcción de Alojamiento para Personal Militar	11.650.473	11.650.473	3.572.921	32,25	25,00	12,44	0,50
				4		Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	1.102.495	1.102.495	1.024.923	9,41	25,00	18,14	0,73
				51		Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	1.102.495	1.102.495	1.024.923	9,41	25,00	18,14	0,73
				5		Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4)	0	347.000	64.920	88,03	11,97	2,07	0,17
				51		Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4)	0	347.000	64.920	88,03	11,97	2,07	0,17
				7		Construcción del Liceo Naval	8.512.000	8.512.000	0	0,00	33,55	5,00	0,15
				51		Construcción del Liceo Naval	8.512.000	8.512.000	0	0,00	33,55	5,00	0,15
381						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA							
				1		Actividades Centrales							
				1		Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4)	0	185.582	111.088	79,30	20,70	20,70	1,00
				51		Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4)	0	185.582	111.088	79,30	20,70	20,70	1,00
				16		Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea							
				3		Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1)	0	7.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1)	0	7.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	8.218.763	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	8.218.763	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	3.245.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	3.245.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea							
				3		Construcción Consultorios Externos para Centro Asistencial Retiro (1)	0	2.852.542	999.921	0,00	100,00	1,71	0,02
				51		Construcción Consultorios Externos para Centro Asistencial Retiro (1)	0	2.852.542	999.921	0,00	100,00	1,71	0,02
450						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
				16		Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
				3		Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	651.500	651.500	333.518	42,26	25,00	15,40	0,62
				51		Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	651.500	651.500	333.518	42,26	25,00	15,40	0,62
				4		Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	6.560.500	1.910.000	45.353	0,00	35,60	1,13	0,03
				51		Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	6.560.500	1.910.000	45.353	0,00	35,60	1,13	0,03
				5		Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185	6.000	2.496.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185	6.000	2.496.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
50						Ministerio de Economía y Producción							
						MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
				1		Actividades Centrales							
				6		Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentina (****)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				13		Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción	0	82.817	35.738	90,65	9,35	9,35	1,00
				51		Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción	0	82.817	35.738	90,65	9,35	9,35	1,00
				14		Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	3.483.000	3.483.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				51		Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	3.483.000	3.483.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr.
													anual
					15	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC-	0	24.419	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC -	0	24.419	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					17	Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	345.000	1.151.472	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	345.000	1.151.472	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.610.000	2.198.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.610.000	2.198.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					19	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secretaría de Haciend	3.050.000	3.050.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Refacción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secretaría de Haciend	3.050.000	3.050.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					20	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..Roca 651	785.000	785.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..Roca 651	785.000	785.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones - M.E.C.y P.	1.376.000	1.376.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones. - M.E.C.y P.	1.376.000	1.376.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	518.000	1.010.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive	518.000	1.010.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					23	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	743.000	743.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	743.000	743.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					24	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	692.000	692.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	692.000	692.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					25	Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651	1.522.454	502.375	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651	1.522.454	502.375	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					26	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica	1.174.000	1.174.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica	1.174.000	1.174.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					27	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	612.000	612.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	612.000	612.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					28	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	395.000	480.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	395.000	480.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					29	Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina	167.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina	167.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P.	1.500.000	500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P.	1.500.000	500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					31	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.100.000	1.100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.100.000	1.100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera							
					1	Remodelación para la Unidad Informática	0	160.683	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación para la Unidad Informática	0	160.683	0	0,00	s/i	s/i	
606						INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
				16		Investigación Fundamental e Innovación Tecnológica I.F.I.T							
					3	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	259.998	162.998	0	62,81	5,00	0,00	0,00
					0	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	159.998	159.998	0				
					86	Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	100.000	3.000	0	62,81	5,00	0,00	0,00
					8	Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación Etapa III	2.500.000	130.900	110.819	94,00	6,00	s/i	
					54	Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología	1.500.000	128.900	110.819	94,00	6,00		
					55	Remodelación Alojamiento Institutos Microbiología y Zoología Agrícola	1.000.000	2.000	0				
					12	Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V	1.500.000	480.000	313.595	91,00	9,00	14,00	1,56

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V	1.500.000	480.000	313.595	91,00	9,00	14,00	1,56
					17	Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas	200.000	5.000	0		s/i	0,00	
						51 Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómicas	200.000	5.000	0			0,00	
					18	Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar	800.000	2.597.600	235.674	12,00	43,00	18,00	0,42
						51 Construcción Box Bioseguridad en el Centro de Investigaciones	500.000	2.594.600	235.674	13,91	35,97	15,00	0,42
						52 Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos	300.000	3.000	0	10,18	52,63	20,00	0,38
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías AITT							
					4	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	50.000	402.000	393.755		s/i	0,00	
						56 Construcción Oficinas AER Río Grande	50.000	402.000	393.755			7,00	
					5	Construcción y Ampliaciones Centros del interior -Etapall	1.500.000	157.000	156.217		s/i	0,00	
						58 Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay	1.500.000	157.000	156.217			15,00	
					9	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III	1.930.000	1.325.800	171.416		s/i	s/i	
						52 Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales	50.000	181.500	124.216				
						54 Construcción Oficinas, Baños y Sala Reuniones Estación Experimental Anguil	70.000	1.000	0				
						56 Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce	1.500.000	966.900	0				
						57 Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Ríoja	70.000	5.000	0				
						61 Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur	150.000	134.400	47.200				
						62 Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. Mendoza	90.000	37.000	0				
13						Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa V	400.000	688.000	391.759	72,66	27,34	15,00	0,55
						51 Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	70.000	684.000	391.759	51,71	48,29	15,00	0,31
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy	90.000	1.000	0	91,09	8,91	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. La Ríoja - Catamarca	90.000	1.000	0		s/i	s/i	
						54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa	80.000	1.000	0	90,82	9,18	1,00	0,11
						55 Obras Varias C.R. Misiones	70.000	1.000	0	45,05	54,95	0,00	0,00
14						Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VI	400.000	420.600	62.088	75,00	25,00	10,00	
						51 Obras Varias C.R. Corrientes	80.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	80.000	32.000	31.131	90,00	10,00	10,00	
						53 Obras Varias C.R. Santa Fé	80.000	180.000	0	85,88	14,12	7,00	0,50
						54 Obras Varias C.R. Córdoba	80.000	159.600	959	71,46	28,54	11,00	0,39
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	80.000	48.000	29.998	95,01	4,99	10,00	2,00
15						Construcciones y Ampliaciones Institutos de Investiación.-Etapa VII	150.000	4.704.000	935.994	25,39	50,00	13,00	0,26
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	150.000	4.704.000	935.994	25,39	50,00	13,00	0,26
16						Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa VIII	420.000	211.000	201.277	47,55	52,45	20,00	0,38
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	150.000	150.000	181.554	30,05	69,95	20,00	0,29
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte	90.000	1.000	0		s/i	0,00	
						53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	90.000	5.500	5.500	70,78	29,22	10,00	0,34
						54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur	90.000	54.500	14.223	94,59	5,41	15,00	2,77
18						Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	1.500.000	88.100	0		s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	1.500.000	88.100	0				
19						Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.500.000	3.705.000	1.309.958	34,00	27,00	13,00	0,48
						51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.500.000	3.705.000	1.309.958	34,00	27,00	13,00	0,48
20						Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce	1.500.000	1.601.822	1.040.553	36,00	64,00	20,00	0,31
						51 Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce	1.500.000	1.601.822	1.040.553	36,00	64,00	20,00	0,31
21						Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela	2.000.000	220.000	87.120		s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela	2.000.000	220.000	87.120				
22						Construcción y Ampliaciones Centro Regional Salta -Jujuy	80.000	1.000	0	38,00	12,00	0,00	0,00
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	80.000	1.000	0	38,00	12,00	0,00	0,00
23						Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria. Manfredi	1.500.000	715.000	22.997		s/i	s/i	
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria. Manfredi	1.500.000	715.000	22.997				
25						Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales	3.780.000	2.106.800	780.133	52,00	48,00	10,00	0,21
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental	90.000	90.000	0	3,70	96,30	0,00	0,00
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	80.000	207.800	61.430	17,70	82,30	25,00	0,30
						54 Construcción Pabellón Fitomejoramiento Algodón en la Estación	90.000	90.000	0	62,50	37,50	0,00	0,00
						55 Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones	90.000	90.000	519.164	18,00	82,00	35,00	0,43
						58 Ampliación Laboratorio y Dependencias Agropecuarias E.E.A. Junin	0	9.000	25.184	90,00	10,00	10,00	1,00
						59 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación	200.000	200.000	64.724		s/i	3,00	
						60 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación	80.000	80.000	64.724	92,60	7,40	0,00	0,00
						61 Restauración Edificio Histórico en la Estación Experimental	50.000	92.000	42.000		s/i	0,00	
						62 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Esquel	30.000	30.000	0	0,00	100,00	3,00	0,03
						63 Construcción Laboratorios, Oficinas, Depósitos, Talleres y Vestuarios	80.000	80.000	0		s/i	0,00	
						64 Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Estación	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						65 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	50.000	228.000	2.907	40,00	60,00	30,00	0,50
						66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						67 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						68 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	80.000	80.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						69 Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experimental	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						70 Ampliación Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental	1.500.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						71 Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimental	1.000.000	440.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
26						Construcciones en la E.E.A. Balcarce	2.340.000	9.100.000	6.270.359	33,00	40,00	24,00	0,60
						51 Ampliación Edificio Agronomía en la Estación Experimental Agropecuaria	2.340.000	9.100.000	6.270.359	33,00	40,00	24,00	0,60
27						Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural	850.000	1.829.000	130.132	37,94	60,06	23,00	0,38
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	50.000	5.000	0	8,00	92,00	0,00	0,00
						52 Casa en el Campo Anexo de la Estación Experimental Agropecuaria	50.000	1.000	0		s/i	0,00	
						53 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarra	50.000	5.000	0		s/i	0,00	
						54 Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín	40.000	5.000	0		s/i	0,00	
						55 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güemes	50.000	500.000	92.246	42,00	58,00	35,00	0,60
						56 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güemes	50.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Construcción Sanitarios, Depósito y Salón Usos Múltiples	50.000	50.000	0		s/i	35,00	
						58 Remodelación Edificio Agencia de Extensión Goya	0	30.000	0		s/i	0,00	
						59 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Lavalle	50.000	1.000	0		s/i	0,00	
						60 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión San Rafael	0	100.000	0	90,00	10,00	3,00	
						61 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Juan	40.000	1.000	0		s/i	0,00	
						62 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gálvan	40.000	1.000	0		s/i	0,00	
						63 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres	40.000	1.000	0		s/i	0,00	
						64 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	40.000	1.000	0		s/i	0,00	
						65 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje	60.000	60.000	20.638	0,00	100,00	70,00	0,70
						66 Construcción Cochera y Galpón en la Agencia de Extensión Rural	40.000	40.000	0	40,00	60,00	0,00	0,00
						69 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Cipolle	40.000	5.000	0		s/i	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						70 Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa	40.000	510.000	0	5,00	95,00	0,00	0,00
						71 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Concarán	40.000	262.000	8.046	48,00	52,00	5,00	0,10
						72 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis	40.000	210.000	9.203	47,00	53,00	0,00	0,00
						75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché	40.000	40.000	0	75,00	25,00	0,00	0,00
					28	Construcción Ampliación Centros Regionales Tuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy	0	724.000	259.404		s/i		
						51 Construcción Lab. Agro. Apic., Dep.y Ofic.Estac.Ex.Agro.Famailla	0	592.000	189.999		s/i		
						52 Edificio para la Agencia de Extención Rural Formosa	0	102.000	69.405		s/i		
						53 Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa	0	30.000	0		s/i		
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
				16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
					1	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	55.049	55.049	0	51,53	2,26	0,00	0,00
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	55.049	55.049	0	63,08	4,42	0,00	0,00
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	200.000	200.000	37.136	26,73	18,65	3,46	0,19
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	200.000	200.000	37.136	26,73	18,65	3,46	0,19
					3	Equipamiento Analítico	624.840	624.840	34.074	52,49	16,14	0,88	0,05
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	624.840	624.840	34.074	52,49	16,14	0,88	0,05
					4	Modernización de la Tecnología de la Información	552.288	552.288	237.118	50,38	18,13	7,78	0,43
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	552.288	552.288	237.118	50,38	18,13	7,78	0,43
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
				17		Servicios de Laboratorios							
					14	Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (1)(4)	0	21.195.697	0	15,00	85,00	0,00	0,00
						51 Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (1)(4)	0	21.195.697	0	15,00	85,00	0,00	0,00
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
						COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)							
				1		Actividades Centrales							
					1	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	600.000	6.080	0,00	15,00	0,03	0,00
						51 Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	600.000	6.080	0,00	15,00	0,03	0,00
					2	Modernización Red de Datos CNEA	341.000	341.000	639	0,00	4,30	0,01	0,00
						51 Modernización Red de Datos CNEA	341.000	341.000	639	0,00	4,30	0,01	0,00
					3	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central	459.000	359.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central	459.000	359.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
				20		Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
					1	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	9.549.000	9.549.000	737.897	91,47	4,00	0,28	0,07
						51 Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	9.549.000	9.549.000	737.897	91,47	4,00	0,28	0,07
					2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	400.000	62.750	98,33	1,67	0,26	0,16
						51 Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	400.000	62.750	98,33	1,67	0,26	0,16
					3	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	3.500.000	2.080.000	499.221	46,87	16,00	3,01	0,19
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	3.500.000	2.080.000	499.221	46,87	16,00	3,01	0,19
					4	Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.100.000	1.100.000	70.138	32,25	9,00	0,55	0,06
						51 Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.100.000	1.100.000	70.138	32,25	9,00	0,55	0,06
					5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	1.360.000	1.360.000	3.476	10,40	40,00	0,10	0,00
						51 Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	1.360.000	1.360.000	3.476	10,40	40,00	0,10	0,00
					6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	700.000	700.000	36.175	50,00	14,00	0,70	0,05
						51 Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	700.000	700.000	36.175	50,00	14,00	0,70	0,05

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr.
													anual
					7	Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas	700.000	450.000	1.858	0,00	8,00	0,03	0,00
					51	Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas	700.000	450.000	1.858	0,00	8,00	0,03	0,00
					8	Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael	1.124.200	4.124.200	3.323.868	3,20	10,00	19,90	1,99
					51	Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael	1.124.200	4.124.200	3.323.868	3,20	10,00	19,90	1,99
					9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	700.000	560.000	0	7,65	30,00	2,50	0,08
					51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	700.000	560.000	0	7,65	30,00	2,50	0,08
					10	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	2.800.000	2.550.000	480.798	66,26	33,74	3,00	0,09
					51	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	2.800.000	2.550.000	480.798	66,26	33,74	5,50	0,16
					11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	570.000	570.000	233	45,63	18,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	570.000	570.000	233	45,63	18,00	0,00	0,00
					12	Instalación y Puesta en Funcionamiento Reactores de Baja Potencia	23.400.000	23.400.000	1.095.468	0,67	3,00	0,12	0,04
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2	23.400.000	23.400.000	1.095.468	0,67	3,00	0,12	0,04
					13	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.130.000	1.130.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.130.000	1.130.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					15	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	450.000	450.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	450.000	450.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					16	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	4.500.000	2.860.000	228	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	4.500.000	2.860.000	228	0,00	40,00	0,00	0,00
					17	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven	2.000.000	896.363	4.420	0,00	18,00	0,04	0,00
					51	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirven	2.000.000	896.363	4.420	0,00	18,00	0,04	0,00
21						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
					2	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	220.000	220.000	44.926	98,22	1,78	0,20	0,11
					51	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	220.000	220.000	44.926	98,22	1,78	0,20	0,11
					3	Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza	845.000	510.000	0	98,03	1,97	0,00	0,00
					51	Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza	845.000	510.000	0	98,03	1,97	0,00	0,00
					4	Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza	910.000	910.000	0	31,35	22,00	0,00	0,00
					51	Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza	910.000	910.000	0	31,35	22,00	0,00	0,00
					5	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	100.000	100.000	0	7,00	6,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	100.000	100.000	0	7,00	6,00	0,00	0,00
					6	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	660.000	660.000	7.925	12,00	31,00	0,36	0,01
					51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	660.000	660.000	7.925	12,00	31,00	0,36	0,01
					7	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	100.000	100.000	8.579	5,32	8,00	1,11	0,14
					51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	100.000	100.000	8.579	5,32	8,00	1,11	0,14
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	110.000	680.000	5.628	8,00	8,00	0,45	0,06
					51	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	110.000	680.000	5.628	8,00	8,00	0,45	0,06
					11	Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	215.000	215.000	392	2,25	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares	215.000	215.000	392	2,25	5,00	0,00	0,00
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	500.000	265.000	0	1,35	22,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	500.000	265.000	0	1,35	22,00	0,00	0,00
					14	Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	5.780.000	5.780.000	1.669.857	5,00	15,00	3,80	0,25
					51	Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	5.780.000	5.780.000	1.669.857	5,00	15,00	3,80	0,25
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.661.000	3.580.000	335.882	74,89	5,00	0,42	0,08
					51	Área Gestión Ezeiza	1.661.000	3.580.000	335.882	74,89	5,00	0,42	0,08

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr. anual
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	5.500.000	1.569.000	163.549	24,34	15,52	2,41	0,16
					51	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	4.950.000	858.000	145.926	20,44	20,00	0,69	0,03
					52	Repositorio Fase 1	550.000	711.000	17.623	28,27	3,00	0,13	0,04
				3		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	206.000	1.535.000	263.753	73,70	26,30	5,00	0,19
					51	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	206.000	1.535.000	263.753	73,70	26,30	5,00	0,19
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	4.315.520	6.395.520	145.016	29,45	4,36	0,10	0,02
					51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	3.373.320	5.478.820	111.021	34,78	5,00	0,10	0,02
					52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	464.000	479.000	14.880	20,46	3,00	0,06	0,02
					53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	321.200	321.200	0	9,85	2,00	0,00	0,00
					54	Remodelación Casa Guayra	157.000	116.500	19.115	73,68	17,00	2,55	0,15
				5		Laboratorio de Química Analítica	307.700	307.700	256.639	65,95	6,00	5,00	0,83
					51	Laboratorio de Química Analítica	307.700	307.700	256.639	65,95	6,00	5,00	0,83
				7		Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	950.500	1.441.300	53.994	9,50	26,00	1,10	0,04
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	950.500	1.441.300	53.994	9,50	26,00	1,10	0,04
				23		Investigación, Formación de Recursos Humanos y Aplicaciones							
					1	Centro Aceleración de Iones	450.000	450.000	96.560	45,53	2,00	0,42	0,21
					51	Centro Aceleración de Iones	450.000	450.000	96.560	45,53	2,00	0,42	0,21
				2		Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	50.000	50.000	13.039	97,35	2,65	0,60	0,23
					51	Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	50.000	50.000	13.039	97,35	2,65	0,60	0,23
				3		Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.100.000	1.100.000	237.163	12,00	20,00	2,24	0,11
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.100.000	1.100.000	237.163	12,00	20,00	2,24	0,11
				4		Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos	300.000	300.000	115.238	0,00	4,00	1,50	0,38
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros Atómicos	300.000	300.000	115.238	0,00	4,00	1,50	0,38
				5		Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	500.000	300.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	500.000	300.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	500.000	500.000	91.217	0,00	10,00	1,70	0,17
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	500.000	500.000	91.217	0,00	10,00	1,70	0,17
				7		Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	350.000	350.000	217.377	0,00	5,00	3,10	0,62
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	350.000	350.000	217.377	0,00	5,00	3,10	0,62
				8		Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	170.000	170.000	72.254	0,00	3,00	1,30	0,43
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	170.000	170.000	72.254	0,00	3,00	1,30	0,43
108						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
				16		Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00
				2		Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	420.000	0	10,00	25,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	0	0	10,00	25,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	0	0,00	25,00	3,00	0,12
					54	Mejoras y Recuperación Banco de Bombas del Laboratorio de Hidráulica	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
354						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
				19		Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (****)	12.400.000	12.161.000	4.590.748	100,00	0,00	0,00	100,00
					56	Aliviador Cildañez - Etapa II	6.600.000	6.361.000	4.590.748	100,00	0,00	0,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
							30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente	30/06/2008	ogr. anual	
25					9	57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	5.800.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						Canal Cintura Sur Tafí	400.000	270.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Canal Cintura Sur Tafí	400.000	270.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				17		Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	220.000	689.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	220.000	689.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	4.300.000	6.746.000	0	37,56	62,44	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	4.300.000	6.746.000	0	37,56	62,44	0,00	0,00
				19		Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.000.000	50.000		s/i	s/i	
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.000.000	50.000				
				44		Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	7.545.867	10.705.867	5.784.064	0,00	5,55	1,80	0,32
					51	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	7.545.867	10.705.867	5.784.064	0,00	5,55	1,80	0,32
						Ejecución de Obras de Arquitectura							
					1	Restauración de Monumentos Históricos	7.620.000	7.420.000	2.175.257	45,32	5,00	1,20	0,24
						51 Restauración de Monumentos Históricos	7.620.000	7.420.000	2.175.257	45,32	5,00	1,20	0,24
					2	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	5.000.000	6.100.000	0	59,88	12,00	0,00	0,00
						51 Edificios Fiscales	5.000.000	6.100.000	0	59,88	12,00	0,00	0,00
					7	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	10.100.000	10.100.000	4.036.548	10,93	38,72	17,99	0,46
						51 CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	10.000.000	10.100.000	4.036.548	10,93	38,72	17,99	0,46
						52 Defensa Costera	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					8	Basílica Nuestra Señora de Luján (****)	100.000	475.000	214.318	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Basílica Nuestra Señora de Luján	100.000	475.000	214.318	100,00	0,00	0,00	100,00
					12	Protección Cueva de las Manos	530.000	155.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Protección Cueva de las Manos	530.000	155.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					13	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					14	Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					20	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	8.332.952	16.332.952	7.086.223	97,99	2,01	1,70	0,85
						51 Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	8.332.952	16.332.952	7.086.223	97,99	2,01	1,70	0,85
					21	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	8.000.000	9.017.221	3.174.438	46,08	38,00	14,96	0,39
						51 Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	8.000.000	9.017.221	3.174.438	46,08	38,00	14,96	0,39
					23	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	10.500.000	10.500.000	2.606.637	6,13	8,68	4,13	0,48
						0 Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.925.000	1.925.000	30.308				
					51 Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	8.575.000	8.575.000	2.576.329	6,13	8,68	4,13	0,48	
				24	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	2.000.000	4.000.000	3.128.587	12,52	10,00	19,14	1,91	
					51 Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	2.000.000	4.000.000	3.128.587	12,52	10,00	19,14	1,91	
				25	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
					51 Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
				30	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	52.600.000	27.600.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	
					51 Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	52.600.000	27.600.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00	
				31	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00	
					51 Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00	
				33	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	4.000.000	6.247.952	0	0,00	8,47	0,00	0,00	
					51 Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	4.000.000	6.247.952	0	0,00	8,47	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					34	Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	570.000	570.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad Buenos Aires	570.000	570.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					35	Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	100.000	100.000	0	0,00	0,78	0,00	0,00
					51	Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	100.000	100.000	0	0,00	0,78	0,00	0,00
					36	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	2.000.000	2.000.000	0	0,00	9,21	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	2.000.000	2.000.000	0	0,00	9,21	0,00	0,00
					37	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio (***)	59.278.048	59.278.048	5.083.754	0,00	6,00	0,00	0,00
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	0	11.617.221	5.083.754				
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	59.278.048	47.660.827	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					38	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					39	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					40	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
30						Prevención Sísmica							
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	54.169	63,80	4,70	1,90	0,40
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	54.169	63,80	4,70	1,90	0,40
32						Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)							
					3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.000.000	249.500	0	72,00	28,00	4,00	0,14
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	75.000	24.500	0			0,00	
					51	Huellas Varias Misiones	70.000	0	0	79,00	21,00	0,00	0,00
					52	Huellas Mineras NOA	210.000	0	0	71,00	29,00	7,00	0,24
					53	Huellas Mineras Cuyo	420.000	0	0	71,00	29,00	3,00	0,10
					54	Huellas Mineras Comahue	150.000	150.000	0	87,00	13,00	3,00	0,23
					55	Huellas Mineras Patagonia	75.000	75.000	0	56,00	44,00	5,00	0,11
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	567.000.000	567.000.000	0		s/i	s/i	
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	567.000.000	567.000.000	0				
50						Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
					2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes (****)	0	231.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					52	Puente Encarnación - Posadas	0	231.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					13	Escuela Nacional de Náutica	7.217.000	7.217.000	991.458	83,35	16,65	1,43	0,09
					51	Escuela Nacional de Náutica	7.217.000	7.217.000	991.458	83,35	16,65	1,43	0,09
55						Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (**)							
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744	129.199.000	0	0				
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744	10.840.000	0	0				
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles (BIRF 4163)	118.359.000	0	0				
					4	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	97.825.000	0	0				
					0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	3.525.000	0	0				
					51	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	94.300.000	0	0				
					5	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento	50.000.000	0	0				
					0	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento	2.000.000	0	0				
					51	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Liniers Etapa I	48.000.000	0	0				
					6	Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	60.000.000	0	0				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						0 Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	2.000.000	0	0				
						51 Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	58.000.000	0	0				
62						Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario (**)							
				2		Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744	0	129.199.000	15.604.986	46,18	53,82	22,00	0,41
						0 Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744	0	12.672.000	3.246.636				
						52 Modernización Linea A del Subterráneo-Obras Civiles.BIRF4163	0	116.527.000	12.358.350	46,18	53,82	22,00	0,41
				4		Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	0	97.825.000	56.932.062	48,48	51,52	30,25	0,59
						0 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	0	2.465.000	1.100.520				
						51 Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	0	95.360.000	55.831.542	48,48	51,52	30,25	0,59
				5		Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento	0	2.000.000	180.778	0,00	s/i	s/i	
						0 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmiento	0	2.000.000	180.778	0,00			
						51 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Liniers Etapa I	0	0	0	0,00			
				6		Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	2.000.000	97.000	0,00	s/i	s/i	
						0 Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	2.000.000	97.000	0,00			
						51 Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	0	0	0,00			
89						Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID 1345 y S/N)							
				1		Escuela Nacional Fluvial	4.070.000	15.600.000	8.189.463	27,00	73,00	46,51	0,64
						51 Escuela Nacional Fluvial	4.070.000	15.600.000	8.189.463	27,00	73,00	46,51	0,64
91						Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	10.500.000	31.572.750	24.180.548	41,00	47,00	17,29	0,37
						51 Ampliación Puerto Caleta Paula	10.500.000	31.572.750	24.180.548	41,00	47,00	17,29	0,37
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	887.200	6.700.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	887.200	6.700.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante	1.000.000	4.747.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Puerto Diamante	1.000.000	4.747.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	17.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	10.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	10.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	3.000.000	10.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdoba	3.000.000	10.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	3.000.000	10.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	3.000.000	10.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%	
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr	
							30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente	30/06/2008	ogr. anual		
451	16					51 Puente Pueyrredón	1.100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		16				Dragado Río Uruguay	500.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Dragado Río Uruguay	500.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						17								
						Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						19								
						Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	10.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	10.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
						20								
						Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	3.000.000	10.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	3.000.000	10.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00	
						22								
						Reparación Parque España	2.000.000	40.780.245	0	0,00	75,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Parque España	2.000.000	40.780.245	0	0,00	75,00	0,00	0,00	
						23								
						Reparación Puerto Rosario Costanera	2.000.000	9.755	0	0,00	1,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Puerto Rosario Costanera	2.000.000	9.755	0	0,00	1,00	0,00	0,00	
						24								
						Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						25								
						Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	1.000.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						26								
						Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						27								
						Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						28								
						Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
						51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	
				29										
				Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	17.200	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	17.200	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				30										
				Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				31										
				Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				32										
				Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00			
				33										
				Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico (3)	900.000	0	0	0,00	s/i	s/i				
				51 Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico	900.000	0	0	0,00						
						DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES								
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios								
					1	Remodelación Fábrica Río Tercero (1) (4)	0	35.000	0	99,35	0,65	0,65	1,00	
					56 Obras Menores	0	35.000	0	94,61	5,39	5,39	1,00		
					2	Remodelación Fábrica Azul (1) (4)	0	748.000	0	25,42	74,58	67,87	0,91	
					51 Remodelación Fábrica Azul	0	748.000	0	27,52	72,48	65,96	0,91		
					3	Remodelación Fábrica Villa María (1) (4)	0	834.030	0	70,41	29,59	26,93	0,91	
					51 Remodelación Fábrica Villa María	0	834.030	0	72,29	27,71	25,22	0,91		
					4	Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran (1) (4)	0	808.215	0	36,79	63,21	57,52	0,91	
					51 Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran	0	808.215	0	35,40	64,60	58,79	0,91		
					5	Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes (1) (4)	0	1.587.285	0	32,42	67,58	61,50	0,91	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluentes, RIII	0	1.587.285	0	21,55	78,45	71,39	0,91
					6	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas (1) (4)	0	1.862.641	0	40,65	59,36	54,00	0,91
						51 Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica Militar Rio II	0	1.862.641	0	34,82	65,18	59,31	0,91
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO							
						Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
	20				2	Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingo	4.988.443	6.988.443	4.066.498	92,46	7,54	6,94	0,92
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (****)	48.000	48.000	36.850	100,00	0,00	0,00	100,00
						53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	4.940.443	6.940.443	4.029.648	77,39	22,61	20,82	0,92
					3	Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	14.113.513	29.113.513	21.192.319	82,73	17,27	9,16	0,53
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	10.766.080	20.766.080	14.943.781	92,97	7,03	7,03	1,00
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	3.347.433	8.347.433	6.248.538	82,53	7,27	11,28	1,55
					4	Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As. (****)	73.862	73.862	68.530	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. As.	73.862	73.862	68.530	100,00	0,00	0,00	100,00
					5	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	10.274.731	15.274.731	14.094.316	90,98	9,02	3,62	0,40
						51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	10.274.731	15.274.731	14.094.316	90,98	9,02	3,62	0,40
					6	Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut) (****)	136.611	136.611	29.975	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut)	136.611	136.611	29.975	100,00	0,00	0,00	100,00
					7	Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	7.030.000	7.030.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	7.030.000	7.030.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					8	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.730.471	20.730.471	5.667.765	38,43	13,50	6,56	0,49
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	5.690.471	5.690.471	5.302.653	82,75	16,00	9,67	0,60
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	15.040.000	15.040.000	365.112	4,46	11,00	3,45	0,31
					9	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	30.111.000	30.111.000	13.276.147	59,29	27,00	7,96	0,29
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	1.066.000	5.066.000	2.426.735	90,61	9,39	0,00	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	29.045.000	25.045.000	10.849.412	37,61	46,00	15,92	0,35
					10	Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	18.326.341	18.326.341	14.266.548	9,78	72,50	31,64	0,44
						51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	18.266.341	18.266.341	12.723.803	0,00	65,00	0,00	0,00
						52 Perforaciones 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	60.000	60.000	1.542.745	19,56	80,00	31,64	0,40
					11	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja (****)	113.000	1.613.000	1.258.747	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Rioja	113.000	1.613.000	1.258.747	100,00	0,00	0,00	100,00
					12	Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	7.929.252	7.929.252	2.289.086	22,41	48,00	10,62	0,22
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Bs. As.	7.929.252	7.929.252	2.289.086	22,41	48,00	10,62	0,22
					13	Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	50.000	50.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					14	Construcción Acueducto Laguna Laboulaye - Córdoba	19.560.246	19.560.246	4.931.554	0,00	7,00	8,02	1,15
						51 Construcción Acueducto Laguna Laboulaye - Córdoba	19.560.246	19.560.246	4.931.554	0,00	7,00	8,02	1,15
					15	Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües	36.632.359	27.632.359	7.324.617	11,60	49,00	9,52	0,19
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües	36.632.359	27.632.359	7.324.617	11,60	49,00	9,52	0,19
					16	Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	53.875.560	56.875.560	36.390.913	59,51	40,49	23,00	0,57
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	17.580.000	20.580.000	12.343.292	39,50	60,50	25,65	0,42
						52 Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa	36.295.560	36.295.560	24.047.621	79,52	20,48	20,48	1,00
					17	Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	18.348.000	18.348.000	7.166.901	20,63	56,00	23,79	0,42
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	18.348.000	18.348.000	7.166.901	20,63	56,00	23,79	0,42
					18	Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	76.000	76.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					51	Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	76.000	76.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
19						Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	18.030.000	7.030.000	0	0,00	10,00	2,38	0,24
					51	Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	18.030.000	7.030.000	0	0,00	10,00	2,38	0,24
20						Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	15.030.000	15.030.000	7.327.595	31,53	24,00	37,63	1,57
					51	Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	15.030.000	15.030.000	7.327.595	31,53	24,00	37,63	1,57
21						Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta	5.800.170	5.800.170	836.122	59,97	43,03	15,75	0,37
					51	Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta	5.800.170	5.800.170	836.122	59,97	43,03	15,75	0,37
22						Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	17.946.412	26.946.412	18.878.157	51,25	48,75	6,42	0,13
					51	Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	5.555.990	10.555.990	7.733.879	84,47	15,53	15,53	1,00
					52	Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	12.370.422	16.370.422	11.086.858	70,09	29,91	23,54	0,79
					53	Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan	20.000	20.000	57.420	s/i	s/i	s/i	
23						Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	37.182.812	54.182.812	44.379.173	60,73	16,00	30,64	1,92
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	37.182.812	54.182.812	44.379.173	60,73	16,00	30,64	1,92
24						Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	19.412.164	19.412.164	11.508.602	25,67	74,33	13,27	0,18
					52	Remodelación Planta Depuradora y Colectores Aguirre Tandil Bs. As.	19.412.164	19.412.164	11.508.602	25,67	74,33	20,21	0,27
25						Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil (****)	100.000	180.000	15.240	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil	100.000	180.000	15.240	100,00	0,00	0,00	100,00
27						Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	17.670.000	9.170.000	0	0,00	87,00	3,95	0,05
					51	Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	17.670.000	9.170.000	0	0,00	87,00	3,95	0,05
29						Construcción Colectora Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.040.000	10.540.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
					51	Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As	20.040.000	10.540.000	0	0,00	17,00	0,00	0,00
30						Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	13.476.053	13.476.053	3.030.207	19,88	57,00	22,90	0,40
					51	Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.326.053	4.326.053	601.565	10,84	47,00	8,40	0,18
					52	Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	9.150.000	9.150.000	2.428.641	28,81	67,00	14,85	0,22
31						Obra Cloacas Susques - Jujuy	100.000	100.000	0	s/i	s/i	s/i	
					51	Obra Cloacas Susques - Jujuy	100.000	100.000	0				
32						Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca	300.000	300.000	0	s/i	s/i	s/i	
					51	Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca	300.000	300.000	0				
33						Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	
					51	Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag	500.000	500.000	0				
34						Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	5.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	5.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35						Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	
					51	Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy	500.000	500.000	0				
43						Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones	15.000.000	2.420.000	0	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones	15.000.000	2.420.000	0				
48						Construcción de Acueducto Sur Salta	5.000.000	31.000.000	15.583.363	68,36	9,00	20,83	2,31
					51	Construcción de Acueducto Sur Salta	5.000.000	31.000.000	15.583.363	68,36	9,00	20,83	2,31
64						Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	5.430.000	5.430.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	5.430.000	5.430.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
70						Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires	10.014.896	5.014.896	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires	10.014.896	5.014.896	0	0,00	3,00	0,00	0,00
86						Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	5.500.000	2.500.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	5.500.000	2.500.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					87	Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar.Bs.As.	9.000.000	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar.Bs.As.	9.000.000	2.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					93	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	17.670.000	17.670.000	4.207.293	0,00	89,00	24,26	0,27
					51	Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	17.670.000	17.670.000	4.207.293	0,00	89,00	24,26	0,27
					98	Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	4.000.000	3.000.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
					53	Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Miguel de Tucumán	2.000.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					58	Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Bs. As.	2.000.000	1.500.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
					99	Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias (BID S/N)	27.531.000	19.031.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					52	Cosntrucción de Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales Necochea	2.000.000	1.500.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	10.850.000	8.850.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
					57	Optimización de sistema de Desagües Cloacales - Santa Fe	50.001	50.001	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					66	Construcción de Sistema Cloacal - Ringuet - Villa Elisa -	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					67	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas	7.360.999	4.360.999	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz	6.270.000	3.270.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
		1				Actividades Centrales							
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.800.000	1.800.000	0	46,70	37,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio 25	1.800.000	1.800.000	0	46,70	37,00	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base							
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.569.131	1.569.131	444.953	33,93	3,56	1,54	0,43
					51	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.569.131	1.569.131	444.953	33,93	3,56	1,54	0,43
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
		17				Infraestructura en Concesiones Viales							
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Bs.As.	5.000.000	9.145.238	7.398.737	94,31	5,69	1,01	0,18
					51	Autovía Cañuelas-M.G.de-RN 3 - Km 87,82- Km 97,561Bs.As.	5.000.000	9.145.238	7.398.737	94,31	5,69	1,01	0,18
					4	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	21.779.388	1.158	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo-R.226- Km 31,7 -	21.779.388	1.158	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					5	Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II	2.046.922	3.313.539	1.176.534	51,13	48,87	21,12	0,43
					51	Mejora en Travesía Urbana RN 205 km 67.800-67.300 Cañuelas Bs. As.	0	815.617	764.501	97,53	2,47	8,23	3,33
					52	Mejora Intersección e Iluminación RN 5 -Km260 9 de Julio Bs.As.	2.046.922	2.497.922	412.034	0,00	100,00	35,99	0,36
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	3.050.067	3.556.405	909.232	13,84	36,15	14,05	0,39
					51	Mejora Intersección RN 7 Km 202,16 Chacabuco- Bs.As.	3.050.067	1.067	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Mejora Urbana RN 188 km 155,866-160,146 Junin Bs. As.	0	3.555.338	909.232	27,70	72,30	28,09	0,39
					7	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	1.700.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	1.700.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	47.031.397	43.198.918	19.638.771	29,57	61,37	12,94	0,21
					51	Autopista Luján-Mercedes Sec.I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 BA.	13.396.188	12.333.533	1.790.919	2,49	78,00	7,52	0,10
					52	Autopista Luján-Mercedes Sec.III RN 5 Km 85,78 - Km 95,6	33.635.209	30.865.385	17.847.852	55,25	44,75	18,35	0,41
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	20.262.153	36.632.328	18.960.108	66,28	33,72	10,40	0,31
					51	Tamo Campana - Zárate RN 9 E/ Km 72,62- Km 85,20	20.262.153	36.632.328	18.960.108	66,28	33,72	10,40	0,31
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	679.556	6.571.209	4.407.490	77,55	24,45	27,46	1,12
					52	Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista SantaFe	679.556	6.571.209	4.407.490	77,55	24,45	27,46	1,12
					11	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Obra Vincul.Ex RN 193Tramo Emp.RN 8-Emp.RP39 Exalt.de la Cruz	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	7.654.540	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Obra en RN A005-Tramo Emp.RN8-Emp.RP36-Sec.Km0-12 R.Cuarto	7.654.540	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	4.112.585	7.024.558	512.854	3,00	46,64	0,00	0,00
					51	Mejoras en Intersección RN 33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					52	Adecuación de Accesos RN.34 Km387 - Ceres - Santa Fe	2.112.585	7.023.558	512.854	6,76	93,24	0,00	0,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	6.851.340	3.909.611	2.511.072	89,27	2,00	4,28	2,14
					61	Construcción Canal Desagües Pluviales-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorrego	120.000	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					63	Travesia Urbana RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerrica	230.490	673.820	0	91,72	8,28	0,00	0,00
					68	Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RN 205 km 111,45 Bs.As. (****)	0	36.580	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	28.817	28.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					74	Acceso a Villa Ramallo RN 9 km 207 - Provincia de Bs. As.	0	198.634	186.246	98,88	1,12	0,00	0,00
					76	Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km369,88	1.552.733	2.860.076	2.324.826	11,36	88,64	87,07	0,98
					78	Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	2.524.500	500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					79	Mejora Intersección Acceso a San Esteban-Los Cocos- Cba RN38 Km75,3	1.300.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
					80	Mejora Acceso a Pinto RN 34 km 496,08 - Pcia. Sgo. del Estero (****)	0	73.184	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					81	Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.094.800	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					16	Iluminación y Travesias Urbanas-Provincia de Córdoba	0	65.147	50.808	98,50	1,50	0,00	0,00
					51	Obras de Iluminacion RN 19 km 278,00-km279,95-Río I Córdoba	0	65.147	50.808	98,50	1,50	0,00	0,00
					17	Construccin de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (****)	10.000	60.004	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					55	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	10.000	60.004	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	800.000	117.115	0	56,18	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN8 Km 78 - Exalt. de la Cruz Bs. As. (****)	70.000	115.115	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					52	Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	680.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Iluminación Rotonda RN 3 Km 192,34 - Int. RP 30- Las Flores Bs.As.	50.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					23	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					24	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	8.121.500	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	8.121.500	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					25	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Salta II	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Multitrocha RN34 Km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					26	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán I	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 S.Cayetano-Tucumán	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	1.600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	1.600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	1.600.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	1.600.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	4.110.898	7.255.259	5.254.258	19,92	80,08	77,38	0,97
					51	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	4.110.898	7.255.259	5.254.258	19,92	80,08	77,38	0,97
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	15.159.243	11.121.138	5.132.689	47,00	13,26	16,16	1,22
					51	Rotonda en IntersecciónRN3 km448,7-RP75 González Chavez-Bs.As.	2.290.487	1.093.024	1.065.176	82,62	17,38	9,40	0,54
					52	Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Bs. As.	2.295.154	2.611.994	2.557.087	63,20	36,80	40,81	1,11
					53	Mejoras Acceso e Iluminación RN 7 C. de Areco km139,24-S. A. Giles km101,81	0	2.186.443	1.510.427	70,33	29,67	36,44	1,23
					54	Mejora Intersección. RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fe	2.185.727	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					56	Mejora de Acceso RN12 km1056 Paso de la Patria Corrientes	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Program	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr. anual
						57 Mejora en Intersección RN12 Km 1361 Candelaria Misiones	400.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Readecuación de Acceso RN12 Km1398 San Ignacio Misiones	1.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Readecuación de Acceso RN12 Km 1416 Santo Pipa Misiones	1.400.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Readecuación de Acceso RN12 Km 1445 Puerto Leoni Misiones	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Rotonda e Iluminación en RN3 Inters. con Av. Piazza Azul Bs. As.	4.286.875	5.223.677	0	0,00	100,00	5,72	0,06
31						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones I	6.192.000	2.626.000	2.625.213	53,71	30,00	12,28	0,41
51						Construcción de Terceras Trochas RN12 Km1370-1399 Arroyo San Juan	6.192.000	2.626.000	2.625.213	53,71	30,00	12,28	0,41
32						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones II	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
51						Construcción 3ºTrocha RN12 Km1399-1436 S.Ignacio-Jardín América Misiones	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
33						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones III	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
51						Construcción 3ºTrocha RN12 Km 1442-1470 Jardín América-Pto. Rico Misiones	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
34						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones IV	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
51						Construcción 3ºTrocha RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto. Rico-Misiones	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	12,28	0,41
35						Construcción 3ºTrocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	6.192.000	21.606.382	10.926.946	53,71	30,00	12,28	0,41
51						Construcción 3ºTrocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	6.192.000	21.606.382	10.926.946	53,71	30,00	12,28	0,41
37						Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	0	1.549.672	1.281.645	97,80	2,20	0,00	0,00
51						Readecuación Acceso Planta Urbana RN 5 km 605,03-km 606,65 Santa Rosa	0	1.549.672	1.281.645	97,80	2,20	0,00	0,00
38						Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	0	21.275.000	14.510.905	82,55	17,45	8,36	0,48
51						Doble Via Sta Rosa-Gral. San Martin RN 7 km 965,51-998,80 Mza	0	21.275.000	14.510.905	82,55	17,45	8,36	0,48
39						Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Jaúregui	2.000.000	2.088.583	0	97,44	2,56	2,56	1,00
51						Autopista Luján-Mercedes Etapal, Seccion II RN5 Km 72,42	2.000.000	2.088.583	0	97,44	2,56	2,56	1,00
40						Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I (****)	0	549.538	549.537	100,00	0,00	0,00	100,00
51						Ensanche Puente s/Río Dulce RN 9, Termas de Río Hondo	0	549.538	549.537	100,00	0,00	0,00	100,00
63						Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As. (****)	0	163.321	0	100,00	0,00	0,00	100,00
51						Iluminación Intersección RN 9 km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs. As.	0	163.321	0	100,00	0,00	0,00	100,00
65						Construcciónde Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	2.881.389	130.900	128.214	19,53	5,47	0,10	0,02
51						RN9 Km54 L.Verde Escobar,RN9-RP6-Campana,RN8-RP51 Arrecifes	695.000	0	46.899	0,00	0,00	0,00	0,00
52						RN205 y RP51 Saladillo,RN205 y 226 Bolivar,RN3 y RP86 B.Juarez	865.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53						RN22 Km714 Medanos,RN222 Km769 Algarrobo-Punta Alta	705.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54						RN188,Km398 Banderale,RN33 entre RP65 Guamini,RN33 y Lim.Pro	520.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55						Edificio Cpo.de Apoyo a los Serv. Viales-Km31 Autop.BsAs-La Plata	96.389	130.900	81.315	91,29	8,71	0,38	0,04
67						Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	0	580.173	0	99,99	0,01	0,00	0,00
51						Pavimento Calle Colectora, Iluminación y Construcción Pasarela Peatonal RN9 Talita	0	580.173	0	99,99	0,01	0,00	0,00
68						Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe (****)	200.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
51						Iluminación Distrib.Funes-Autop.Roario.-Armstrong Inters.RP34-Funes	200.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
69						Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	2.451.635	4.008.664	3.093.850	78,69	21,31	9,91	0,47
51						Intersección Canalizada RN188-ConstrucciónBicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	1.558.529	3.625.558	3.093.850	37,24	62,76	29,72	0,47
53						Mejora Travesía Urbana RN 8 Venado Tuerto Santa Fe (****)	893.106	383.106	0	100,00	0,00	0,00	100,00
70						Construcción Pasarela Peatonal. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51						Construcción Pasarela Peatonal RN11Km.1005,70 Bo.Toba Resistencia Chaco	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
71						Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	301.000	38.589	0	47,33	2,67	0,00	0,00
51						Rama Salida Descendente km 21 Autopista Ricchieri-Pcia. Bs.As.	0	37.589	0	94,66	5,34	0,00	0,00
52						Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72						Mejora en Corredor Vial 29	8.000.000	2.700	1.840	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Mejora en Corredor Vial 29	8.000.000	2.700	1.840	0,00	50,00	0,00	0,00
73						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. II	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en S. Miguel del Monte y P. Alta RN3	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74						Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	8.000.000	10.166.386	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	8.000.000	10.166.386	0	0,00	50,00	0,00	0,00
75						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba	3.616.165	4.662.226	1.440.499	27,51	16,03	10,67	0,67
						51 Puente Sobre el A° El Ajó RN 7 Km 600 - Córdoba	2.566.165	4.660.226	1.440.499	51,91	48,09	32,01	0,67
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9- Córdoba	600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149-203 Córdoba	450.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
76						Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.090.000	3.438.520	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta	1.090.000	3.438.520	0	0,00	50,00	0,00	0,00
78						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos	9.916.667	18.405.147	5.672.428	7,15	92,85	37,55	0,40
						51 Acceso a Gualeguaychú RN14 Entre Ríos	9.916.667	18.405.147	5.672.428	7,15	92,85	37,55	0,40
80						Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	575.082	1.082	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	575.082	1.082	0	0,00	50,00	0,00	0,00
81						Obras de Seguridad Vial en Provincia. de Bs. As. III	7.756.371	9.356.061	564.518	0,61	7,72	0,33	0,04
						52 Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.118.696	5.387.775	563.465	11,04	88,96	5,85	0,07
						53 Construcción Tercer Puente La Niña RN 252 Bs. As.	726.675	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Rotonda en Intersección RN 3- RN 252 El Triángulo Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg RN 3 Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Acceso Canalizado Dorrego	500.000	3.953.286	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av. Caseros y San Martín -Tres Arroyos	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Iluminación Rotondas RN 205-RP 65 y RP 30 y RN 226 Bs. As.	100.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil	2.000.000	1.000	1.053	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Obras de Alcantarillado en Bolívar- Bs. As.	300.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam RN5 Km 305-307 Carlos Casares	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fe	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución- Córdoba	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias- Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Iluminación Acceso a Zárate RN 3- Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
82						Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	7.260.000	1.619.395	1.092.936	9,54	2,96	2,89	0,98
						51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo-Santa Fe	280.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación de Empalme de Acceso a RP 26- Santa Fe	300.000	44.190	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco RN 9 - Santa Fe	300.000	79.244	0	0,00	s/i	0,00	
						54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes-Santa Fe	5.400.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo-Santa Fe	350.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel-Santa Fe	460.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Travesías Urbanas en RN 11	170.000	1.092.961	1.092.936	76,31	23,69	23,13	0,98
83						Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco	300.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco	300.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
84						Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones	298.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr
							30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente	30/06/2008	ogr. anual	
						51 Travesía Urbana en Capiovi RN 12- Misiones	298.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guaaleguaychú-Provincia Entre Ríos	64.190.611	45.610.520	20.603.749	8,88	80,00	0,00	0,00
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guaaleguaychú-Provincia Entre Ríos	64.190.611	45.610.520	20.603.749	8,88	80,00	0,00	0,00
					86	Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos. Aires	2.500.000	2.759.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos. Aires	2.500.000	2.759.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					87	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.710.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.710.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					88	Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	0	4.710.417	1.456.186	3,24	96,76	79,42	0,82
						51 Mejoras Acceso a Aeropuerto RN 11 km 464,61 Sauce Viejo	0	4.710.417	1.456.186	3,24	96,76	79,42	0,82
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV	12.001.000	2.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejora RN N36 Sección Variante Perilago Almafuerte	11.000.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						52 Mejora RP N36 Sección Variable Despeñaderos	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					91	Variante San Miguel del Monte RN N 3 San Miguel del Monte	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Variante San Miguel del Monte RN N 3 San Miguel del Monte	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					92	Tercer Carril RN N°9 Tramo A012-RN N° 188-Villa Constitución	748.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Tercer Carril RN N°9 Tramo A012-RN N° 188-Villa Constitución	748.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					93	Tercer carril RN N°9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Tercer carril RN N°9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					94	Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas	775.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas	775.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					95	Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					96	Pavimentación Urbana y Repavimentación RNN° 22 Río Negro	501.000	3.951.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Pavimentación Urbana RNN°22 KM 1212.40 Cipolletti-Río Negro	501.000	3.951.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas							
					1	Infraestructura en Áreas Urbanas	320.000	1.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						53 Rotonda en Intersección R.N. N° 15 y Av. Monseñor Rosch	320.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II (****)	0	26.712	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Repavimentación RP 42,Secc RP51, Acceso a Rawson-Provincia Chubut	0	26.712	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					3	Vinculación y Remodelación R.P. N° 11 entre Diagonal 74	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Vinculación y Remodelación R.P. N° 11 entre Diagonal 74	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires (****)	0	849.649	849.648	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Pavimentación Urbana en Magdalena y Atalaya-Provincia de Buenos Aires	0	849.649	849.648	100,00	0,00	0,00	100,00
					5	Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florencio Varela Bs.A:	12.797.914	22.131.767	18.004.821	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florencio Varela Bs.A:	12.797.914	22.131.767	18.004.821	100,00	0,00	0,00	100,00
					6	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata Bs. As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata Bs. As.	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					7	Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs. As.(****)	600.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs. As.	600.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.254.313	17.871.563	11.320.355	18,33	81,67	63,58	0,78
						51 Mejoras en Accesos Sur - RN 14 Km.252,60 Concordia - Entre Ríos	3.254.313	17.871.563	11.320.355	18,33	81,67	63,58	0,78
					11	Obras Menores en Areas Urbanas	0	1.415.621	462.921	90,96	9,04	1,78	0,20
						51 Pavimentación Urbana Localidad de Lima-Zarate (Provincia Bs. As.)	0	1.415.621	462.921	90,96	9,04	1,78	0,20
					12	Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.966.205	252.751	165.573	96,59	3,41	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Pr ogr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.966.205	252.751	165.573	96,59	3,41	0,00	0,00
					13	Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	0	1.763.012	1.727.986	70,83	29,17	29,71	1,02
						51 Repav e Ilumin Camino al Ctro Atomico Ezeiza-Pcia Bs As	0	1.763.012	1.727.986	70,83	29,17	29,71	1,02
					14	Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As.	16.934.432	23.375.823	9.831.069	2,98	97,02	30,82	0,32
						51 Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As.	16.934.432	23.375.823	9.831.069	2,98	97,02	30,82	0,32
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.511.603	4.193.649	3.220.257	41,24	58,76	51,10	0,87
						51 Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.511.603	4.193.649	3.220.257	41,24	58,76	51,10	0,87
					16	Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Rios	9.600.000	5.333.334	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Rios	9.600.000	5.333.334	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					17	Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					18	Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					19	Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					20	Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					21	Mejoras en Areas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires	6.003.002	3.002	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Repavimentación y Ensanche RP Nº 21 Nº Tramo: RP Nº 7	2.001.002	1.002	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Pavimentación Calle Salguero Tramo Hipólito Yrigoyen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					22	Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Variante Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					23	Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri)	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri)	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					24	Mejoras en Áreas no Concecionadas Provincia de Buenos Aires	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Rehabilitación y Ensanche ex RN Nº 8 Tramo General Paz-RP 4-3	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					25	Mejoras en Áreas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires	6.003.000	6.845.160	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	2.001.000	6.843.160	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales							
					1	Obras Mejorativas en C.V.2-Año II-I Etapa	1.500.000	8.194.637	5.433.208	98,11	1,89	4,36	2,31
						52 Obra Mejorativa N221 C.V.2-RN7 Km259-276	1.500.000	1.000	0	99,77	0,23	0,23	1,00
						53 Obra Mejorativa 208 RN 7 km 457-492-Provincia de Córdoba (****)	0	2.833.757	2.435.071	100,00	0,00	0,00	100,00
						55 Obra Mejorativa 221 RN 7 km 399-406,424-457	0	5.359.880	2.998.137	92,58	7,42	17,45	2,35
					2	Corredor Vial 3	8.080.367	37.247.511	12.000.309	47,10	52,90	13,86	0,26
						51 Obra Mejorativa N214 C.V.3-RN9 Km 157-206	7.080.367	28.701.253	7.457.577	81,65	18,35	37,86	2,06
						52 Obra Mejorativa N 201 C.V.3-RN9 Km 96-106	1.000.000	8.546.258	4.542.732	12,54	87,46	12,34	0,14
					3	Obras Mejorativas en C.V.4-Año II-I Etapa	1.601.598	2.348.465	2.253.296	98,16	1,84	0,00	0,00
						51 Obra Mejorativa N205 C.V.4 RN8 Km 661-695- Provincia de Córdoba (****)	1.601.598	2.348.465	2.253.296	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Obra Mejorativa RN33 Km 586-616/Km 673-676-Provincia de Santa Fe				96,31	3,69	0,00	0,00
					5	Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa	4.422.499	19.730.557	11.255.322	82,06	17,94	14,59	0,81
						0 Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa	1.524.256	893.256	94.092				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	anual	30/06/2008	Ejec./Pr
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		ogr.
													anual
						51 Obra Mejorativa N217 C.V.5 RN9 Km1215-1225 Km1315-1325 (****)	1.000.000	2.840.141	2.140.419	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Obra Mejorativa 203 RN 34 km 584-612,km 646-651-Provincia Santiago del Estero	0	311.155	0	99,38	0,62	0,00	0,00
						54 Obra Mejorativa N218 C.V.5 RN34 Km 66,00-86,00	1.898.243	15.686.005	9.020.811	29,47	70,53	58,35	0,83
					6	Obras de Mejoras en Corredores Viales 1 Año II - II Etapa	3.459.333	2.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 236 C.V. 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6.80	2.423.333	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 241 C.V. 1 RN 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos Buenos Aires	1.036.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					7	Obras de Mejoras en Corredores Viales 2 Año II - II Etapa	10.903.030	5.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 209 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 10 Acceso a Washington	2.465.384	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 222 C.V. 2 RN 7 Límite San Luis/Mendoza -Acceso La Dormida	2.500.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 224 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 6-RP 41 Km 63-103	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra 234 C.V. 2 RN 5 Acc. Carlos Casares - Acceso San Bernardo	1.632.814	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra 240 C.V. 2 RN 5 Límite Buenos Aires / La Pampa- Acceso Uriburu	2.304.832	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	30.124.466	6.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 202 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Acceso a San Pedro	2.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 215 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Río Tala	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 216 C.V. 3 RN 9 Río Tala - RP 51	2.718.486	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V. 3 RN 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe	19.169.421	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra 223b C.V. 3 RN 11 Santo Tobrae - Santa Fe	1.966.479	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra 232 C.V. 3 RN 188 Empalme RP 1 Empalme RP 35 - La Pampa	1.970.080	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					9	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa	1.077.985	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 239 C.V. 4 RN 36 Almafuerte Acceso Los Molinos - Córdoba	1.077.985	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					10	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 Año II - II Etapa	5.103.000	3.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 210 C.V. 5 RN 9 Río Juramento Empalme RN 34- Salta	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 219 C.V. 5 RN 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme RN 62 Santa Fe	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 220 C.V. 5 RN 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km 39	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					11	Obra de Mejora en Corredor Vial 1 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 1 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					12	Obra de Mejora en Corredor Vial 2 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 2 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					13	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 3 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					14	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 4 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					15	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 5 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					16	Obra de Mejora en Corredor Vial 6 III Etapa	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 6 III Etapa	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
664						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS							
					16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos							
					12	Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje Aeropuerto de Junín	4.725.000	4.725.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín	4.725.000	4.725.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					14	Reacondicionamiento de Pavimento y Balizamiento - Aeropuerto de Sauce Viejo	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista, Calle de Rodaje	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					15	Reacondicionamiento de Pavimento - Aeropuerto de Bahía Blanca	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
71	336	43			51	Bacheo y Reparación de Estado Superficial de Pista en Aeropuerto	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					16	Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Villa Gesell	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					17	Reparación de Pista - Aeropuerto de Rosario	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ensanche y Reparación de Estado Superficial de Pista en el Aeropuerto	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					18	Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Tartagal	2.900.000	2.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje	2.900.000	2.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					19	Reacondic. Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres	1.120.000	1.120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Bacheo y Reparación de Estado Superficial Pista Aeropuerto de Paso de los Libres	1.120.000	1.120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
75	350	1				MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA							
						Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica							
					2	Acondicionamiento del Edificio Central	760.000	510.000	25.085	0,00	100,00	24,50	0,25
					51	Implementación de Sistemas de Seguridad	690.000	440.000	25.085	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Tendido de Red	70.000	70.000	0	0,00	100,00	100,00	1,00
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
						MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
						Actividades Centrales							
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	760.000	2.060.000	407.655	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao Nº 114	760.000	2.060.000	407.655	0,00	100,00	0,00	0,00
80	310	21			3	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.150.000	1.150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	Reparación Edificio Callao Nº 114	1.490.000	190.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	1.490.000	190.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					22	Regularización del Trabajo							
					6	Construcción de Agencias Territoriales	2.590.000	2.590.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Agencias Territoriales	2.590.000	2.590.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Ministerio de Salud							
						MINISTERIO DE SALUD							
						Actividades Centrales							
902	52	26			1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.450.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.450.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00
						Planificación Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud							
					1	Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salud	400.000	400.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salud	400.000	400.000	0	0,00	36,00	0,00	0,00
						Cobertura de Emergencias Sanitarias							
					1	Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización	520.000	520.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL							
						Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción							
903	53				2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
						Atención a Enfermos							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	575.000	425.000	0	32,05	67,95	0,00	0,00
					53	Remodelación del Pabellón N° 4	150.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refacción Integral de Pabellones N° 3, 5 y 8 Hospital Nacion	425.000	25.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital (****)	350.000	430.000	76.553	100,00	0,00	0,00	100,00
					52	Reparación de Usina	350.000	430.000	76.553	100,00	0,00	0,00	100,00
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.500.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	1.500.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					13	Construcción de Quirófanos (****)	0	270.000	268.046	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Construcción de Quirófanos	0	270.000	268.046	100,00	0,00	0,00	100,00
					15	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	500.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					16	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1)	0	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1)	0	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
906						ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN							
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
					3	Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Áreas del Edificio Central de ANLIS	3.957.735	2.957.735	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	107.735	107.735	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas del Departamento de RRHH	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				1		Desarrollo y Producción de Biológicos							
				4		Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos	850.000	350.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos	850.000	350.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				2		Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virales							
				2		Remodelación de Laboratorios del Departamento Virologia	0	155.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	0	155.000	0	0,00	s/i	s/i	
				3		Investigación, Desarrollo y Servicios en Enfermedades Parasitarias							
				1		Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Líquidos	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Líquidos	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas c/ FHA							
				6		Remodelación Planta de Producción del INEVH	400.000	400.000	150.436	0,00	100,00	38,00	0,38
					51	Remodelación Planta de Producción del INEVH	400.000	400.000	150.436	0,00	100,00	38,00	0,38
				5		Control de Calidad de Biológicos							
				3		Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad	0	20.900	20.900	0,00	s/i	s/i	
					51	Adecuación de Laboratorios del Primer Piso	0	20.900	20.900	0,00	s/i	s/i	
				8		Capacidad y Servicio Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias							
				3		Mejoramiento Edificio INE "DR. Juan H. Jara" Fase III	100.000	100.000	0	15,00	85,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Interno	100.000	100.000	0	15,00	85,00	0,00	0,00
				4		Mejoramiento Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.572.265	1.372.265	495.980	0,00	100,00	24,00	0,24
					51	Mejoramiento Edificio Externo	1.572.265	1.372.265	495.980	0,00	100,00	24,00	0,24
				5		Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes	370.000	370.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes	370.000	370.000	0	0,00	76,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
				59		Atención de Pacientes							
				4		Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	2.800.000	2.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/06/2008

J	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programa	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado	ción anual	30/06/2008	Ejec./Progr. anual
								30/06/2008	al 30/06/2008	al 31/12/2007	vigente		
						51 Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	2.800.000	2.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					5	Refacción Integral Pabellón 8	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Pabellón 8	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					6	Refacción Lavadero Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Lavadero Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					7	Refacción Integral de Cocina Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Cocina Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE							
		60				Atención a Discapacitados Psico físicos							
					1	Contrucción Natatorio	540.000	540.000	0	72,65	27,35	0,00	0,00
					51	Construcción Natatorio	540.000	540.000	0	72,65	27,35	0,00	0,00
912						SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION							
		62				Prevención y Control de las Discapacidades							
					6	Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización	210.000	210.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización	210.000	210.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social							
	311					MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
		17				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
					7	Construcción Instalaciones	11.033.000	11.033.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reposcición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	3.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					57	Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D.	4.510.000	4.510.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					58	Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	1.545.000	1.545.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					9	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					52	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
					Total		2.831.352.128	2.792.026.329	720.934.028				

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) En el Servicio Administrativo 354, el Programa 55 pasó al Programa 62.

(***) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra que no superen el 20%

(1) Proyectos y Obras que iniciaron en el segundo trimestre del ejercicio 2008.

(2) En el proyecto Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires, el devengado corresponde a trabajos previos a la realización de la obra, alquiler de andamios, honorarios profesionales, seguros de obra, pago al Ejército Argentino, encargado de la demolición de los de los edificios en donde se realizará la obra.

(3) La obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico, no pertenece al programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables , según lo informado por la Jurisdicción.

(4) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(5) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007, se pidió la reapertura en el 2º trimestre de 2008, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

Proyectos y obras sin crédito igualmente informadas por el Organismo porque iniciaron la ejecución física. Tendrán crédito en el próximo trimestre.

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
						MANTENIMIENTO													
						Mantenimiento por Administración													
16	1	1	51	PAIS	VS	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01-01-08	31-12-08	59.514	35.542	70.353	63.766	25,00%	41,67%	6	B
16	1	2	51	PAIS	Vs	Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01-01-08	31-12-08	5.000	5.000	7.500	2.474	25,02%	41,70%	6	B
						Total Mantenimiento por Administración						64.514	40.542	77.853	66.241				
						Mantenimiento por Contrato													
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/André-Emp20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22-08-95	17-02-07	15.251	2.600	200	134	0,00%	77,50%	7	
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Emp. R11 - Villa Gral. Güemes	Km. 1167,24-Km 1373,73/Km 1290,62-Km 1488 (Km-Mes)	11	403,4	29-04-97	27-03-04	3.616	2.600	0	0	0,00%	100,00%	8	
						Total Mantenimiento por Contrato						18.867	5.200	200	134				
						Mantenimiento por Convenio													
16	3	24	51	LA PAMPA	43,151,152	TFO La Pampa Convenio 11	TFO LA PAMPA Convenio N 11	11	633,3	01-01-08	31-12-09	5.032	4.100	4.100	3.935	12,58%	18,98%	6	A
16	3	24	51	LA PAMPA	143,151,152	TFO La Pampa Convenio 10		11	633,3	01-01-06	31-12-07	10.346	0	0	0	0,00%	89,78%	7	
16	3	25	51	NEUQUEN	22,40,234	TFO Neuquén Convenio 11	Catan Lil - Lte con Mdza / Las Lajas - Lte con Chile	11	528,4	01-01-08	31-12-09	9.982	3.600	3.600	2.697	5,80%	8,09%	6	K
16	3	25	51	NEUQUEN	22,40(S),234	TFO Neuquén Convenio 10	Catan Lil - Lte/Mdza / Las Lajas - Lte/Chile	11	528,4	01-01-06	31-12-07	7.998	0	0	0	0,00%	99,14%	7	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23 - 250	TFO Río Negro - Convenio 11		11	1.136,5	01-01-08	30-12-08	10.000	4.100	1.100	758	12,60%	21,00%	6	A-D
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-1S40-3-251-250	TFO Río Negro - Convenio 10	Valcheta - Jacobacci	11	1.136,5	01-01-06	31-12-07	8.482	0	0	0	0,00%	94,13%	7	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 10	I - II : Prog. 2,13 - Prog 126,5	11	2.207,3	01-01-07	31-12-08	50.000	15.000	13.964	13.964	12,95%	93,54%	6	A-H
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3 - Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01-01-08	25-12-09	12.000	4.800	1.300	732	12,50%	20,83%	6	A-D
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3com a,b,m,i	TFO Tierra del Fuego Convenio 9		11	520,5	01-01-06	31-12-07	12.320	0	0	0	0,00%	77,09%	7	
16	3	30	51	JUJUY	52-40 (Ex Rp 16)	TFO Jujuy Convenio 11		11	392,8	01-01-08	31-12-09	4.000	2.700	2.700	1.124	12,75%	21,25%	6	A-D
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio 10		11	392,8	01-01-06	31-12-07	3.675	0	0	0	0,00%	91,05%	7	
16	3	31	51	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6	01-01-08	25-12-09	4.000	3.690	3.690	2.614	0,00%	0,00%	12	
16	3	31	51	SALTA	40-1V40-51	TFO Salta - Convenio 11	Payogasta - Viaducto La Polvorilla	11	480,6	01-01-07	31-12-07	3.570	0	0	0	0,00%	95,83%	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	V.Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martín	11	236,0	01-01-08	30-12-09	6.000	2.200	2.200	2.056	12,50%	20,83%	6	A-D
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 8	V.Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión S. Martín	11	236,0	01-01-06	31-12-07	5.625	0	0	0	0,00%	100,00%	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso	Fin Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	144,6	04-05-07	31-05-09	2.048	1.300	300	296	13,13%	52,88%	6	H
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6		11	266,7	01-04-04	31-03-06	4.895	2.600	0	0	0,00%	100,00%	7	
16	3	36	51	CHUBUT	26 - S1 - 40	TFO Chubut - Convenio 9		11	537,2	01-01-08	30-12-09	6.000	1.900	0	0	0,00%	0,00%	12	
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8		11	537,2	01-01-04	30-12-07	5.873	0	0	0	0,00%	93,89%	7	
16	3	37	51	LA RIOJA	40 - 76 - 78 - 79	TFO La Rioja - Convenio 8		11	434,5	01-01-08	30-12-08	5.000	2.000	3.257	2.112	12,60%	21,00%	6	A-D
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01-01-08	29-12-09	2.386	2.200	700	206	11,36%	18,57%	6	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 2	Emp. RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01-01-06	31-12-07	1.864	0	0	0	0,00%	99,95%	7	
16	3	39	51	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucumán Convenio 7		11	67,4	01-01-08	25-12-09	3.000	1.450	1.450	260	12,50%	20,83%	6	A-D
16	3	39	51	TUCUMAN	9,38	TFO Tucumán Convenio 6	Emp. RNN°38- Villa Mariano Moreno	11	67,4	01-01-06	31-12-07	2.558	0	0	0	0,00%	35,42%	7	
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO-Convenio 8:Belen- Lte. c/Tucuman	Km. 798,82- km 986,82	11	188,0	31-07-08	31-08-08	2.632	2.719	0	0	0,00%	0,00%	12	
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO - Convenio2: Empalme RPN°20 - Empalme RPN°17	Km1056,32 - Km1116,96	11	60,6	31-07-08	30-08-08	850	2.571	0	0	0,00%	0,00%	12	
						Total Mantenimiento por Convenio						190.136	56.930	38.362	30.753				
						Señalamiento													
16	4	1	51	PAIS	Vs	Señalamiento Horizontal - Nacional	Pais	12		01-01-08	31-12-08	31.500	31.500	31.500	28.994	25,00%	41,67%	6	B
						Obras de Emergencia													
16	5	1	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	100,0	01-01-08	31-12-08	22.050	22.050	22.050	17.370	24,99%	41,66%	6	B
16	5	2	51	PAIS	Vs	Obras en Puentes	Nacional	14		01-01-08	31-12-08	5.338	5.000	5.449	5.449	25,01%	41,68%	6	B
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01-01-08	31-12-08	850	850	0	0	25,06%	41,76%	6	B
16	5	4	51	PAIS	Vs	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01-01-08	31-12-08	5.000	5.000	1.500	1.085	25,02%	41,70%	6	B
						Total Obras de Emergencia						33.238	32.900	28.999	23.904				
						Mantenimiento por Sistema Modular													
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19-07-04	18-07-08	6.076	2.300	2.300	1.211	0,84%	89,76%	6	
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. RNN°95 - Límite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	03-12-04	01-12-08	8.647	2.400	0	0	0,20%	76,71%	6	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. RNN°40 (S)	km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03-05-04	01-11-07	10.314	6.000	1.000	274	0,00%	67,31%	7	
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp.RNN°25 - Emp.RPN°56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07-09-04	06-11-07	9.742	2.600	2.600	1.518	0,00%	97,98%	7	
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp.RPN°22-Lte.c/Chubut/Santa Cruz / Emp.RNN°40-Lte. c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22-01-07	20-01-09	7.855	3.030	3.030	1.397	7,94%	63,04%	6	
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín Mendoza	km35-km112,5 / km3,27-km80,83 / km997,4-km1041,8 - Sistema Modular	11	199,5	01-01-07	31-12-08	11.888	5.000	3.000	2.485	5,77%	66,07%	6	
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17-03-05	31-03-09	15.118	4.000	1.500	944	6,67%	79,14%	6	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RNN° 11 - A Nivel RNN° 11- Calle J/Garay	km0-km7,23 / km0-km4,59 / km0-km2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21-07-05	19-07-08	9.899	2.500	454	0	14,01%	88,82%	6	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. RNN°9-34	km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14-07-04	30-07-08	13.123	3.200	1.200	983	17,95%	80,44%	6	
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RNN°50 - Lte. con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RNN°34	km1329,12-km1488,40 / km1763,6-km1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15-04-04	30-11-07	8.394	4.100	600	162	0,00%	92,83%	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01-11-08	31-10-10	7.037	2.793	293	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01-11-08	31-10-10	6.000	2.200	0	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
16	6	21	51	MISIONES	12	Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Emp. RNN°105	km1336 - km1349	11	13,2	01-11-08	31-10-09	1.500	3.204	204	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. RNN°51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21-02-08	28-02-10	6.995	3.397	397	0	18,14%	22,36%	6	
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01-11-07	30-10-09	10.852	2.678	2.678	2.670	16,38%	47,51%	6	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. RNN°40 (Tecka)	km 313,74 -km 528,67	11	214,9	20-11-07	18-11-09	12.221	2.755	3.433	3.009	8,88%	33,50%	6	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. RNN°25 - Emp. RPN°56 (Tamarisco)	km.1556,60- km 1815,71	11	272,1	01-05-08	30-04-10	22.435	2.693	193	0	5,45%	5,45%	6	
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) RNN°26 - Emp RNN°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21-01-08	19-01-10	17.524	2.831	2.177	2.177	10,57%	22,99%	6	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant. , Vigilancia y Seguridad Integral - Ptes. Acc. a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda	11		06-06-07	30-06-09	36.995	3.271	6.256	6.256	11,90%	50,04%	6	
16	6	28	51	JUJUY		Puente sobre el Rio Grande - Bajo la Viña		8		01-06-08	31-05-10	15.000	2.813	313	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	29	51	MENDOZA	40 - 145	Lte. Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acceso C. Grande		11	257,4	01-10-08	30-09-10	20.672	2.931	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		8	68,0	01-11-08	31-10-10	10.000	2.708	208	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	32	51	FORMOSA	81	Ls Lomitas - Lte. c/Salta		8	215,0	01-11-08	31-10-10	11.000	2.860	360	0	0,00%	0,00%	0	
16	6	33	51	ENTRE RIOS	S/N	Camino Botte a RNN°12 Bovril Entre Rios		8		01-11-08	31-10-10	1.400	1.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
						Total Sistema Modular						280.687	73.264	32.194	23.085				
						Obras de Seguridad Vial													
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01-07-08	30-06-10	15.000	3.863	863	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01-11-08	02-05-09	11.000	4.014	1.014	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01-11-08	01-09-09	8.292	3.871	871	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01-11-08	02-03-09	2.300	2.644	144	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01-11-08	02-03-09	2.000	2.688	188	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. c/RPN°6, RPN°2 y Acceso a Bovril	Inter. RNN°127 - RPN°2 - Acc. Bovril	17	5,5	16-04-07	31-10-08	11.857	6.917	1.917	2.301	19,79%	77,19%	6	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01-06-08	01-05-09	2.000	4.125	1.125	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	01-08-08	31-12-08	11.488	4.718	574	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna		17	1,0	01-10-08	02-03-09	300	4.538	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01-08-08	31-12-08	600	3.575	60	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	541,0	01-11-08	02-05-09	1.200	4.416	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01-11-08	02-05-09	600	3.825	100	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	01-11-08	02-05-09	500	3.825	100	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	22-05-08	19-02-09	5.899	4.225	300	0	0,02%	0,02%	6	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con RNN°95 y RPN°2		17	1,0	01-11-08	02-05-09	1.800	4.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/ RNN°81	(Prog.Inic. 1184) Intersección e iluminación	17	1,0	01-11-08	02-07-09	3.000	4.188	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.RPN°116-Intersección en T Sucesiva en Emp.c/RNN°116		17	1,0	01-08-08	30-01-09	450	3.938	3.938	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Intersección RNN°20 y RNN°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	01-09-08	02-03-09	3.476	4.889	1.089	0	0,00%	0,00%	3	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN°60 (Alto Nivel Emp. RNN°9)	17	1,0	07-11-06	30-06-08	11.303	2.600	2.600	5.054	2,49%	99,82%	6 A	
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. RPN°7 - Int. RPN°60	8	12,2	01-09-08	01-10-09	10.000	4.975	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. RPN°60 - Int. RPN°2	8	4,0	01-09-08	01-04-09	3.500	3.800	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	13	51	CORRIENTES	14	RPN°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01-07-08	29-01-09	7.000	3.938	350	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	4.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigue	Acc. a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	6.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San German - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.909	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RPN°7	Intersección con RNN°127	17	1,0	01-07-08	30-10-08	2.500	4.013	250	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	18	51	RIO NEGRO	151	Intersección RNN°151 - RPN°69		17	1,0	01-11-08	02-05-09	5.000	3.952	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	19	51	RIO NEGRO	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Intersección con RPN°7 (Accesos)	17	1,0	01-11-08	02-05-09	2.500	4.409	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Emp. RPN°406 - Choele Choel	km 994,2 - km 995,7	17	1,5	01-11-08	02-05-09	3.000	3.750	200	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de los Andes	17	1,6	01-07-08	30-12-08	10.000	4.125	500	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	22	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN°90	Acc. a Colonia Benítez	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN°90	Acc. A Margarita Belén	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN°90	Emp. RPN°90	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	25	51	CHACO	11	Emp. RPN°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acc. a la Leonesa	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.709	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Lugones		17	1,8	01-11-08	02-03-09	2.500	3.638	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01-11-08	02-04-09	3.000	3.875	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01-11-08	02-03-09	3.000	4.575	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RPN°5 - Pozo Hondo	Emp. RPN°5	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	4.059	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte. con Chaco - Quimilí	Emp. RPN°92	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	4.209	167	0	0,00%	0,00%	0</	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.759	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamental	Acceso a Olta	17	1,0	01-07-08	30-12-08	2.500	3.859	167	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía urbana por Funes		8	2,0	01-07-08	30-06-09	10.000	4.402	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda		8	1,5	11-11-08	10-11-10	4.500	4.688	0	0	0,00%	0,00%	0	
16	7	50	51	JUJUY	9	RNN°9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	01-11-08	31-10-10	2.000	500	500	0	0,00%	0,00%	0	
						Total Obras de Seguridad Vial						350.765	236.321	19.735	7.355				
						Total Mantenimiento						969.708	476.657	228.843	180.465				
						CONSTRUCCIONES													
						Corredores Viales I													
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21-02-01	23-03-03	12.589	3.700	18.365	12.579	0,00%	100,00%	8	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marques	8	33,0	03-02-97	03-03-04	9.362	3.700	200	0	0,00%	100,00%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03-02-97	03-05-04	13.596	3.700	200	0	0,00%	100,00%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - R. de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28-01-97	27-10-03	17.646	3.700	200	0	0,00%	100,00%	7	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª: Río Caucheta - Emp. RNN°7	8	9,8	21-02-01	19-01-10	32.970	3.700	200	0	7,05%	88,14%	6	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28-01-97	26-08-05	22.243	3.700	200	0	0,00%	100,00%	8	
						Total Corredores Viales I						108.406	22.200	19.365	12.579				
						Pasos Fronterizos y Corredores de Integración													
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río agua clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17-04-06	15-04-08	93.906	17.276	26.965	25.858	1,28%	99,76%	7	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01-11-08	31-10-11	60.000	8.500	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18-12-06	17-06-08	46.094	26.693	19.059	5.183	11,98%	45,90%	6	
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. RN° 144 - El Sosneado	km 260 - km 278,69	8			30-11-07		3.804	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04-01-05	03-01-07	15.139	3.898	398	0	0,00%	100,00%	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. RNN°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01-11-08	31-10-09	13.000	4.875	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01-11-08	31-10-11	60.000	6.060	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Seccion II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17-10-06	15-12-08	49.394	11.796	19.323	8.507	15,78%	59,74%	6	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Emp. RNN°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01-11-08	31-10-10	26.400	4.297	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04-04-07	31-03-09	127.778	38.254	26.308	20.920	16,43%	43,32%	6	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05-05-08	05-05-09	28.000	5.850	0	0	3,20%	3,20%	6	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01-11-08	31-10-10	18.000	4.125	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. con Chile		5	70,0	01-11-08	31-10-10	46.000	6.278	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog.520 - prog.538)	8	18,0	04-01-05	03-02-07	12.835	4.600	20	0	0,00%	100,00%	8	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01-08-08	30-01-10	68.244	6.172	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01-11-08	02-05-11	40.000	4.750	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - Km 29	8	29,0	16-12-02	14-12-04	32.003	100	810	0	0,00%	97,75%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12-05-03	09-11-04	33.502	100	100	0	0,00%	97,54%	7	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01-11-08	31-10-10	57.152	5.833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersecc. Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16-11-05	25-10-08	70.878	16.433	107.133	19.411	11,79%	87,80%	6	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J° (Colonia Elia)	8	27,7	26-11-06	31-05-09	110.392	34.853	34.853	10.616	7,57%	28,69%	6	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J° (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21-09-07	19-09-10	171.447	57.149	47.149	13.275	4,93%	14,35%	6	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28-06-07	26-06-10	228.409	76.136	61.136	19.089	8,33%	19,65%	6	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30-07-07	31-12-10	279.001	84.979	14.979	22.097	6,09%	19,07%	6	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01-06-07	30-05-10	190.399	63.466	63.466	28.251	7,94%	29,68%	6	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01-06-07	30-05-10	225.310	75.104	75.104	17.036	8,09%	19,38%	6	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29-06-07	30-05-10	186.989	62.330	62.330	33.739	9,47%	30,71%	6	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	35,9	01-06-07	30-05-10	206.079	68.693	68.693	15.962	7,11%	18,15%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	21-09-07	30-09-10	165.270	55.090	44.090	4.681	4,95%	11,62%	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21-09-07	30-09-10	139.932	46.644	40.644	7.353	8,32%	16,46%	6	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp RNN°127 - Establecimiento San Agustín	8	32,4	01-10-07	30-10-10	169.127	56.376	53.163	15.838	7,28%	14,92%	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	21-09-07	31-05-10	165.845	55.281	55.281	15.098	7,16%	17,79%	6	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21-09-07	30-09-10	128.200	42.734	28.734	15.412	9,24%	17,95%	6	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13-12-07	11-12-10	62.722	28.040	28.040	5.667	8,34%	14,52%	6	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	31-07-08	30-07-09	10.000	51.614	50.614	0	0,00%	0,00%	2	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01-11-08	31-								

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA													AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin		Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283,700 - Prog. 324,017	8	40,0	19-02-01	20-07-04		28.524	100	100	0	0,00%	99,24%	7	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20-09-93	18-03-07		47.155	2.600	2.228	1.160	0,00%	99,23%	7	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp 9-Lte. c/Chile	8	267,0	08-09-00	08-03-04		208.395	100	100	0	0,00%	97,08%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	km.25 - Campañas (Acceso a Sto.Domingo)	5	24,0	07-07-99	02-02-07		4.309	3.433	433	0	0,00%	87,56%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av San Martín (R.N. N°3) - 1º Etapa	8	6,4	26-09-05	31-08-08		98.654	3.350	350	0	0,76%	95,13%	6	A-C
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13-10-04	13-04-06		12.688	4.350	350	0	0,00%	91,14%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acc. a Cajón Grande	8	22,9	20-11-00	19-10-04		11.890	3.350	1.350	814	0,00%	99,53%	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.RNN°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25-02-97	25-04-00		15.305	0	166	161	0,00%	94,77%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km. 862,31 - 912,02	5	49,7	01-09-05	05-09-08		106.412	25.300	32.937	24.525	13,60%	98,35%	6	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km. 912,02 - 941,20	5	29,2	25-08-06	28-02-08		58.650	3.660	13.104	13.104	0,42%	100,00%	8	
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Río Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	01-11-08	31-10-10		37.564	4.185	185	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01-09-08	31-08-10		30.000	4.185	185	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	24-09-01	24-05-07		76.922	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04-10-04	03-01-06		18.036	3.660	160	0	0,00%	100,00%	8	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19-08-03	17-01-07		83.843	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters - Km 77 - Km 105 (Sección I)	8	28,2	01-12-04	31-12-07		27.575	4.350	4.384	2.190	0,00%	99,97%	7	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - Km 137 (Sección II)	8	29,0	23-03-06	30-07-08		38.982	2.560	2.560	16.442	0,46%	99,69%	6	A-C
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - Km 137 - Km 181 (Sección III)	8	44,0	21-03-06	19-08-08		42.324	6.928	6.928	8.644	11,10%	84,97%	6	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - Km 201 (Sección IV)	8	19,6	23-03-06	30-09-08		29.484	2.666	2.666	11.636	1,53%	93,04%	6	A-C
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23-03-06	31-07-08		28.390	4.600	4.600	1.618	8,25%	98,25%	6	A-C
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - Km 269	8	43,8	01-02-07	28-01-09		68.931	30.579	20.579	13.288	15,28%	79,89%	6	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - Km 340	8	72,0	23-03-06	31-03-09		90.999	28.513	28.513	16.586	16,43%	80,72%	6	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - km 414,57	5	73,5	01-11-08	02-05-11		120.000	7.727	7.727	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - Km 537	8	126,7	01-11-08	02-05-11		110.000	10.750	10.750	0	0,00%	0,00%	0	
22	3	87	51	NEUQUEN	231	Aduana - Límite con Chile	km 1398 - km 1431	8	7,0	17-04-07	30-12-08		7.640	6.038	0	0	13,10%	91,88%	6	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06-01-07	04-01-09		107.720	30.569	19.569	17.999	1,15%	16,04%	6	A
22	3	89	51	SANTA CRUZ	P15	RPN°11(El Calafate) - Paso Zamora		8	58,0	01-11-08	31-10-10		116.000	4.493	493	0	0,00%	0,00%	0	
						Total Obras por Convenio con Provincias							2.395.862	353.814	221.190	180.511				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas														
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores		14	200,0	01-01-08	31-12-08		18.252	13.252	22.294	19.323	25,00%	41,67%	6	B
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - y IIa y IIb (km 485 - km 522)	8	51,1	08-01-07	31-12-08		52.755	24.680	180	176	11,07%	28,09%	6	
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde RNN°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14-10-99	11-04-08		17.633	4.560	0	0	0,85%	99,60%	7	A
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	01-11-08	31-10-10		40.000	5.785	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	8	51	SALTA	34	Emp. RNN°81 - General Mosconi	km 1398 - km 1431	5	33,0	14-11-95	12-01-97		1.281	0	63	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río Salado	8	6,7	22-10-96	20-12-03		3.045	2.558	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01-02-99	30-01-04		16.289	100	9.999	9.899	0,00%	98,97%	7	
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16-05-05	31-07-08		57.201	2.660	29.947	1.347	0,93%	98,52%	6	A-C
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30-09-05	30-06-08		254.214	1.357	1.357	23.510	9,16%	85,14%	6	
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 46,3	8	8,4	09-09-05	30-06-08		119.719	2.617	2.617	9.064	1,25%	96,61%	6	A-C
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12-04-05	11-07-08		35.624	2.760	2.760	2.468	7,48%	85,05%	6	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01-11-08	31-10-10		56.000	4.743	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	km 1867 - km 1909	8	41,6	01-11-08	31-10-10		106.000	5.492	492	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01-10-03	31-05-06		23.681	2.732	232	0	0,00%	96,29%	8	
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte.s/Río Las Vueltas - Villa Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	8	20,5	27-09-06	31-07-08		37.013	100	12.757	12.657	14,12%	85,83%	6	A-C
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.II)	km 78 - Perito Moreno	5	90,0	10-11-03	08-01-06		39.924	100	100	0	0,00%	0,00%	7	
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec.I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24-09-03	23-04-06		34.798	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14-01-08	14-01-10		172.999	4.862	14.016	6.457	6,29%	10,80%	6	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15-10-04	16-03-07		86.183	100	3.100	1.450	0,00%	97,55%	8	
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María	km 5,0 - 30-11-08	8	5,0	30-11-08	31-05-10		19.000	4.603	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17-11-06	30-11-09		111.058	25.684	13.184	13.016	2,70%	20,49%	6	A
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01-11-03	31-08-07		37.112	3.752	252	0	0,00%	94,57%	7	
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08-09-03	07-10-04		7.038	3.713	213	0	0,00%	91,63%	7	
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14-05-04	13-05-05		13.654	1.430	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik-Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01-02-01	30-08-08		337.039	100	4.600	2.516	0,00%	68,64%	6	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18-05-03	31-08-08		501.336	100	14.320	10.524	0,12%	99,89%	6	A-C
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN°127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09-09-03	07-09-04		7.653	3.126	126	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18-03-04	17-08-06		10.479	6.130	130	0	0,00%	99,58%	7	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08-10-04	06-11-09		56.333	3.303	803	219	0,00%	10,90%	6	
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersecc. Norte RNN°3 - Intersecc. Sur RNN°3	8	7,0	28-09-09	30-09-09		179.938	40.363	9.574	9.574	1,47%	24,10%	6	A
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20-01-04	20-07-05		13.954	2.136	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08-10-04	08-04-06		1.291	2.151	0	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	54	51	FORMOSA	11	Av														

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte.s/Río Corrientes)	Km. 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	01-11-08	31-01-10	2.782	0	492	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A°Curupí-Bzo.Guayquiraró-R.Guayquiraró-A°Carumbé - km 646/km 648	8	1,0	01-06-07	31-08-08	12.488	3.979	2.979	2.547	6,58%	33,01%	6	
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19-02-04	31-07-08	33.192	3.760	4.452	4.452	8,28%	81,78%	6	
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18-11-03	16-02-08	61.051	600	600	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18-11-03	31-03-08	71.684	100	10.100	5.294	1,40%	85,44%	7	A
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN°29	Acc Senador Rey, desvío tránsito pesado y calles internas	5	1,9	20-07-04	20-05-05	3.497	100	100	0	0,00%	92,22%	7	
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01-01-03	31-12-03	6.541	3.163	163	0	0,00%	87,05%	7	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	km 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14-10-04	13-12-06	23.840	100	11.363	11.244	0,00%	99,76%	7	
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acc. a Pozo del Mortero	8	25,0	14-10-04	13-10-06	34.499	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juarez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14-10-04	14-04-07	38.033	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ing. Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguanos	8	28,0	13-10-04	13-07-07	40.501	100	100	0	0,00%	97,72%	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	13-10-04	12-07-08	48.581	100	100	0	0,00%	93,26%	6	A
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte.C/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29-11-06	28-01-08	53.363	10.000	10.000	0	0,00%	98,78%	7	
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10-10-06	08-12-08	41.991	18.878	18.878	0	0,00%	99,83%	6	S/D
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15-07-05	14-10-07	32.885	100	100	0	0,00%	99,91%	7	
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07-06-05	06-08-07	27.008	2.500	2.500	0	0,00%	91,09%	7	
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12-07-05	11-07-07	29.153	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.III)	8	30,0	01-04-06	31-03-07	13.666	100	100	0	0,00%	99,11%	7	
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.II)	8	30,0	15-04-06	15-05-07	21.091	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.I)	8	30,0	15-04-06	15-05-07	21.541	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc. I	Emp. RPN°436 (Quebr.de Las Burras) - Emp. RPN°12 (Pachaco-Pte.S/Río San Juan)	8	16,0	05-05-04	04-04-05	5.454	2.203	0	0	0,00%	99,01%	7	
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16-04-04	15-04-06	48.775	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22-10-04	20-02-07	37.637	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y pavimentación cruce RPN°5		8	8,0	29-05-03	26-12-04	9.402	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0-km 14,51	8	14,5	28-10-03	31-07-08	43.296	100	100	0	0,00%	56,32%	6	S/D
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12-11-03	10-12-08	86.828	100	4.100	2.221	3,45%	85,96%	6	A
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16-02-04	17-07-07	80.693	100	100	0	0,00%	83,88%	7	
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27-05-04	31-07-08	70.028	100	6.100	3.361	0,00%	96,01%	6	S/D
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27-05-04	31-07-08	59.913	100	100	0	0,00%	97,47%	6	S/D
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22-11-03	31-07-08	32.190	100	100	0	0,00%	88,42%	6	S/D
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN°11	8	28,4	07-02-03	07-06-04	37.081	100	1.000	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27-10-00	25-12-04	66.317	100	100	0	0,00%	80,37%	7	
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02-05-00	30-10-04	28.335	100	100	0	0,00%	96,12%	7	
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 21.252 - km 28,740	8	7,5	22-08-01	21-05-04	19.050	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01-02-06	03-07-07	67.012	3.366	366	0	0,00%	100,00%	8	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. María) - V. María - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17-04-06	15-08-08	363.170	116.932	148.062	211.842	12,07%	85,58%	6	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P. N° E-59 - Ballesteros	8	63,0	16-05-06	13-01-09	393.619	94.183	79.183	0	4,12%	38,60%	6	
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp R.P. N° E-59 - Int. C/RNN°9 Actual	8	45,0	01-06-08	31-05-10	323.703	6.744	6.744	0	0,00%	0,00%	2	
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc IV: Int. con RNN°9 Actual - Emp. RNN°178 (Armstrong)	8	36,0	15-11-06	13-11-08	334.840	88.194	88.194	675	12,56%	47,35%	6	
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc V: Emp. RNN°178 - Carcaraña	8	39,6	02-10-06	30-09-08	346.112	125.512	82.964	675	12,01%	65,57%	6	
22	4	83	51	FORMOSA	86	Gral. Belgrano (M. Tacaagle) - Gral. Güemes	km 1458,05 - km 1488,25	8	29,6	28-11-06	28-11-08	57.225	26.002	18.301	14.334	7,08%	63,96%	6	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco- Sec. I	Lte. C/Chaco- Prog 29.800 (C. B. Vista - Pto Lavalle)	8	25,0	14-05-07	15-05-09	108.107	5.132	16.931	20.064	5,25%	30,90%	6	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. c/Chaco- Sec. II	Prog 29.800 - Emp. RNN°81	8	29,8	09-05-06	30-11-08	89.886	20.417	17.417	10.140	11,50%	89,98%	6	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN°34		8	31,0	01-11-08	31-10-10	30.000	4.529	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Lim. Santa Fe - Bandera	km180,79 - km.226,67	5	46,1	21-02-06	31-10-08	76.185	2.256	13.600	11.690	9,29%	80,07%	6	C
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquén (Sección II)	Sección II - km 393 - km 445	8	52,0	01-11-08	31-10-10	70.000	3.613	113	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquén (S III)	Sección III km 445 - km 502	8	57,0	01-11-08	31-10-10	70.000	4.118	118	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01-11-08	30-10-13	193.000	8.406	6	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	31-07-08	30-07-09	4.400	3.435	435	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	17-09-01	15-11-04	21.266	1.302	0	0	0,00%	79,94%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso P/ ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	03-08-05	30-06-08	56.337	99	13.823	11.823	9,88%	83,81%	6	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	01-06-08	31-05-11	70.400	3.755	255	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Cmdte. Luis Piedrabuena	8	111,7	15-09-05	15-12-08	86.759	1.355	11.355	10.371	0,00%			

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA													AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO		Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I - II - Sobre RPN° 25	8	66,5	01-06-08	31-05-10	65.000	4.717	4.717	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre RPN°29	8	57,0	01-06-08	31-05-10	55.000	4.193	4.193	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acc. Tres Lagos por RNN°288 -km 2411,37 - km 2526	8	116,8	01-06-08	31-05-11	115.000	2.867	2.867	0	0,00%	0,00%	0	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06-01-07	30-01-09	123.783	28.350	13.350	11.745	2,86%	33,04%	6	A
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Emp. RPN°25 - km 245,00 (Gdor Moyano)	8	204,0	30-12-04	30-09-08	102.677	25.875	20.249	0	0,00%	93,05%	6	S/D
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acc. A Rospentek y Pavim. en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19-01-06	30-06-08	37.742	2.255	2.755	1.709	2,43%	73,07%	6	A-C
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30-05-06	27-11-08	69.032	18.429	5.810	3.649	4,35%	44,57%	6	A
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas						7.694.067	961.432	818.178	493.142				
						Obras por Concesión sin Peaje COT													
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01-06-98	28-05-11	170.700	14.527	14.527	6.485	2,28%	68,85%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. RNN°5	13	329,2	02-02-98	29-01-11	162.439	15.064	15.064	6.484	2,40%	74,46%	6	
						Total Obras por Concesión sin Peaje COT						333.139	29.591	29.591	12.969				
						Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes													
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1º Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01-11-08	31-10-09	3.300	3.392	140	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	31-07-08	30-12-08	1.500	1.321	67	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01-11-08	31-10-09	6.700	1.589	267	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23-08-02	22-04-04	6.344	3.317	0	0	0,00%	99,53%	7	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29-01-03	29-07-04	8.112	3.600	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		8	80,0	01-11-08	31-10-09	1.175	1.326	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24-01-03	24-11-03	12.406	100	100	0	0,00%	66,96%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-R. Gallegos)	8	90,0	28-06-05	31-07-08	18.824	1.399	4.601	2.800	0,00%	94,53%	6	S/D
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	31-07-08	30-07-09	1.700	1.613	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01-11-08	31-10-09	1.200	1.321	67	0	0,00%	0,00%	2	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	01-11-08	31-10-09	1.300	1.272	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 3º Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01-11-08	31-01-10	1.250	1.289	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 2º Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05-12-07	31-12-08	13.225	1.549	5.369	4.360	26,06%	45,91%	6	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	31-07-08	30-07-09	1.470	1.298	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	31-07-08	30-07-09	1.140	1.249	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	31-07-08	30-07-09	1.460	1.262	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Aº de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	31-07-08	30-07-09	1.170	1.253	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/Aº El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	30-06-08	29-06-09	1.500	1.267	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Santiago del Estero (Pte. s/Aº San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	30-06-08	29-06-09	1.500	1.267	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01-11-08	31-01-10	2.100	1.313	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01-06-08	31-05-10	18.487	3.598	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/Aº Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	31-07-08	30-07-09	1.900	1.104	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01-11-08	31-10-09	3.000	2.385	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12-09-06	10-09-08	15.528	7.103	3.103	1.801	10,79%	62,83%	6	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Aº San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	31-07-08	30-07-09	3.700	1.321	67	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01-08-08	30-01-10	3.300	1.347	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/Aº El Chileno		8	30,0	01-11-08	31-10-09	1.300	1.254	0	0	0,00%	0,00%	0	
						Reparación de Obenques en Puentes s/Río Paraná Guazú y Paraná de las Palmas		5	1.200,0	01-09-04	31-08-08	69.497	2.660	2.660	1.178	6,39%	83,06%	6	
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo		5	20,0	29-08-03	28-07-04	10.687	100	100	0	0,00%	98,48%	7	
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	39,0	31-07-08	30-07-09	1.400	1.283	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Santo Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	8	126,0	07-03-07	28-03-09	28.779	14.362	12.362	7.083	12,96%	52,55%	6	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/Aº Feliciano)	Prog. 572	8	310,0	01-06-08	30-11-09	20.297	941	305	0	0,00%	0,00%	2	
22	6	41	51	JUJUY	9	Alto Comedero - El Carmen (Puente s/Río Perico y Arroyos)	Prog. 1677,39	8	60,0	01-11-08	31-10-09	1.500	1.623	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	80,0	01-08-08	30-01-10	2.000	1.392	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	30,0	30-06-08	29-06-09	1.500	1.319	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Emp. RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	70,0	31-07-08	30-07-09	1.200	1.544	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcarañá)	Prog. 343,44	8	20,0	01-11-08	31-10-09	1.350	1.380	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/Aº Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	30,0	01-11-08	31-10-09	1.500	1.313	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	70,0	27-06-06	31-07-08	15.611	1.350	3.564	3.535	0,19%	98,91%	6	A-C
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	km 1480,80	8	60,0	01-11-08	31-10-09	3.800	1.394	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapará	INCISO 5	8	50,0	16-02-07	30-06-08	20.689	0	0	0	1,63%	68,20%	6	
22	6	50	51	CORDOBA		Nuevo Puente sobre Río Cuarto	Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclín	8	100,0	01-11-08	31-10-09	2.500	1.324	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo													
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano, s/ Aº del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01-11-08	31-10-10	50.000	1.931	556	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01-11-08	02-05-10	30.000	1.833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km.)	8	200,0	01-08-08	31-07-09	25.260	1.900	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km. 97,77	8	30,0	01-08-08	30-01-10	13.600	378	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01-11-08	31-10-09	4.000	28	28	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO		La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	8,6	01-11-08	31-10-10	25.000	521	521	0	0,00%	0,00%	0	
22	6	58	51	CORRIENTES	P 114	RPN°40 - RNN°14	Puente de H º s/Río Miriñay (Paso Meza)	8		30-08-08	28-02-10	17.951	345	345	0	0,00%	0,00%	4	
						Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes						482.712	89.024	34.600	20.757				

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	OBRA en Corredores Viales Concesionados													
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN°3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15-07-04	13-01-05	8.823	100	100	0	0,00%	97,61%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN°6 - Acc.Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05-08-04	03-02-05	6.855	100	100	0	0,00%	96,56%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acc.Videla Dorna - Emp.RPN°61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27-01-06	28-03-07	15.332	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Altto Nivel RPN°4 y FFCC Gral.San Martín- Emp.RPN°10	km 500 - km 539	5	39,0	20-07-04	19-12-04	12.738	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN°1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04-10-04	03-10-05	17.420	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08-10-04	08-06-05	13.317	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	8	29,0	23-07-04	21-09-06	15.086	100	396	25	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	km 188 - km 278	5	90,0	23-07-04	22-12-05	46.473	100	100	468	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Emp RNN°11	km 0 - km 12	5	12,0	28-09-05	29-05-06	10.418	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN°9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20-07-04	19-04-05	6.704	100	100	417	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN°168 - Emp. RPN°39	km 476 - km 607	5	131,0	04-01-06	04-10-06	7.637	750	750	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Emp. RPN°38 - Emp. RPN°98	km 684 - km 720	5	36,0	05-08-04	04-12-04	2.566	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Emp. RNN°98 - Emp. RPN°40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06-12-05	06-08-06	24.037	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05-08-04	05-05-05	20.732	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Emp. RPN° 66 - Emp. RPN°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-km471	5	63,0	05-08-04	05-06-05	16.386	100	100	0	0,00%	99,90%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Emp. RNN°8	km 535,55 - km 631	5	95,5	23-11-04	23-12-05	17.560	100	19.100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	km 676 - 754	5	78,0	28-07-04	27-06-05	18.721	100	100	835	0,00%	100,00%	8	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Emp.RNN°9 - Emp. RNN°8	km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19-12-05	18-06-08	30.957	100	100	15.401	14,60%	94,99%	6	
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30;km631,60-km640;km646-km649,5;km666-km673;km717-km719;km728-km732;km754-km761	5	42,0	19-05-05	18-04-07	30.444	100	3.100	1.810	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Emp. RPN°64 - Rafaela	km 151 km 225	5	74,0	20-07-04	20-05-05	24.083	100	600	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Emp. RPN°13	km 225 km 247	5	22,0	14-07-04	13-12-04	1.626	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Emp. RPN° 80 (S) - Emp. RPN°33	km 299 - km 330	5	31,0	16-11-05	16-12-06	14.444	100	100	118	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Emp. RPN°23 - Lte.c/Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20-07-04	19-12-04	2.742	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Emp. 2° Circunvalación de Rosario - RPN°65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05-01-05	05-12-05	29.468	100	100	356	0,00%	100,00%	8	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Emp.RNP°65 - Emp. RNP°66	km 86 - km 129	5	43,0	13-01-05	13-10-05	23.224	100	100	0	0,00%	98,30%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Emp. RNN°95	km 62 - km 169	5	107,0	20-08-04	20-05-05	13.346	100	100	0	0,00%	98,43%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21-12-05	20-04-08	18.257	100	11.100	7.111	6,97%	98,14%	7	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mendoza-Acceso a La Paz)	5	5,0	06-04-06	04-11-06	1.775	750	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Emp. RPN°81-A (S)	km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24-04-06	23-08-07	16.339	556	1.106	1.337	0,00%	100,00%	8	
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N°207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18-05-06	16-01-08	29.345	463	463	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN°188 - Emp. RPN°6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20-04-06	17-01-09	37.940	225	12.197	4.517	29,72%	62,90%	6	
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	08-05-06	07-07-07	37.455	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06-02-07	30-09-08	13.208	100	14.983	4.834	0,00%	89,15%	14	
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp.RPN°208 - Emp.RPN°347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23-01-06	23-06-08	38.530	100	100	9.003	8,79%	96,64%	6	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. RPN°100 (S) - Emp. RNN°16	km 898 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08-02-06	07-09-08	33.132	225	9.059	8.384	3,24%	99,99%	6	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N°27 - Emp. RNN°123 - Emp. RPN°19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01-03-05	29-09-05	4.363	100	100	0	0,00%	100,00%	6	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. RPN°61 - Acc. A Parish	km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01-01-06	02-04-07	11.515	100	2.900	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Acc. a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01-06-06	30-01-07	17.046	337	337	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp.RPN°61 - Emp. RPN°65	km 260 - km 276	5	16,0	07-04-06	06-04-07	12.105	2.466	2.466	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 ; km 129 - km 135	5	10,0	17-01-07	16-01-08	12.704	100	100	3.394	0,00%	97,07%	7	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01-03-06	28-02-07	26.478	225	10.256	1.787	0,00%	100,00%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14-03-06	30-04-08	26.613	470	470	4.250	21,95%	98,75%	7	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 Obra N° 204 - Emp. RNN°36 - Acceso a Suco	km 600 - km 604 y km 635 - km 657	5	4,0	06-04-06	06-05-07	17.910	2.466	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acc Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30-12-04	30-08-05	11.807	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. RPN°13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26-06-06	25-08-07	25.855	2.171	7.015	2.005	0,00%	98,34%	7	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. RPN°34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	04-04-06	03-08-07	8.098	224	224	0	0,00%	97,44%	7	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. RPN°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24-04-06	30-06-08	29.388	224	224	2.947	13,19%	85,12%	6	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°148	km442-km468/km475-km480/km595-km600/km695-km723	5	64,0	01-05-06	31-07-07	36.836	100	100	0	0,00%	99,40%	7	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Emp. RPN° 79 (S) - Calchaquí	km 635 - km 661	5	26,0	28-02-07	30-09-08	21.351	100	100	0	5,46%	92,26%	6	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acc. a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01-12-06	31-12-07	18.111	5.683	5.683	0	0,00%	94,33%	8	
						Total Obras en Corredores Viales Concesionados						937.300	20.736	105.230	69.000				
						Obras en Circuitos Turísticos													
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2	01-11-08	31-10-10	9.000	994	34	0	0,00%	0,00%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8	51,5	26-11-07	30-11-09	35.000	287	1.401	310	0,99%	1,99%	6	A
						Total Obras en Circuitos Turísticos						44.000	1.282	1.435	310				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II													

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01-11-08	31-10-10	25.000	1.417	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. RNN°52	Secc. I y II	8	97,5	01-10-09	30-09-11	100.000	4.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01-11-08	31-10-11	7.000	417	417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Emp. RNN°226 - Emp. RNN°3	8	40,0	23-11-07	30-11-09	82.218	1.713	192	0	5,33%	10,96%	6	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	220,0	01-11-08	30-10-12	47.800	1.042	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	01-11-08	31-10-10	7.500	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01-10-08	30-09-10	10.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres- Minapona		8	160,0	01-10-08	29-09-12	73.000	1.666	1.666	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01-11-08	31-10-10	120.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01-11-08	31-10-10	120.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01-11-08	31-10-09	48.000	417	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01-11-08	31-10-10	90.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	01-11-08	31-10-11	100.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	RN°149 Uspallata Limite con San Juan	Secc. Est. Tambillos-Lte. c/San Juan	8	27,0	15-11-08	13-11-13	100.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Limite con Mendoza-Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01-11-08	30-10-13	100.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex RP°319		8	100,0	01-11-08	31-10-10	40.000	2.083	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN°14 - Empalme RPN°4		8	0,5	01-11-08	02-05-09	3.000	208	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. RPN°63 - Emp. RNN°11 (Prog. 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18-10-06	16-10-08	47.499	20.407	5.407	7.488	18,36%	69,84%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp. RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18-10-06	18-10-08	60.839	9.043	6.043	0	14,33%	39,78%	6	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01-08-07	31-07-08	46.083	958	3.927	3.075	12,05%	26,35%	6	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	01-11-08	31-10-10	40.000	1.139	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	21	51	CHACO	89	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	01-11-08	31-10-11	150.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	08-03-07	08-03-09	115.677	1.405	0	0	10,37%	56,68%	6	
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Parque Nacional Calchaquí	Entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle	8	80,0	01-11-08	31-10-10	50.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	01-11-08	31-10-10	80.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01-11-08	31-10-09	8.000	250	250	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Emp. RNN°89 - Cem. Parque Jazmín	8	16,9	01-11-08	31-10-10	80.000	833	0	0	0,00%	0,00%	2	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	01-11-08	31-10-10	50.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belén	8	14,7	01-11-08	31-10-10	70.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	27	51	CHACO	P12	Obras Empalme RPN°12		8		01-11-08	31-10-11	17.000	208	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01-11-08	30-10-13	200.000	4.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai	Sección I	8	47,0	01-11-08	30-10-13	5.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. II)	Sección II	8	46,9	01-11-08	30-10-13	150.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. III)	Sección III	8	44,6	01-11-08	30-10-13	210.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	01-11-08	30-10-13	150.000	1.979	1.583	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. V)	Sección V	8	42,4	01-11-08	30-10-13	180.000	1.770	1.416	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VI)	Sección VI	8	45,1	01-11-08	30-10-13	210.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VII)	Sección VII	8	45,0	01-11-08	30-10-13	180.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	46,7	01-11-08	30-10-13	180.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Secc. IX km 621,12-677,81	8	46,7	01-07-08	30-06-10	85.000	1.771	1.417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01-07-08	30-06-10	80.000	1.666	1.333	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvia	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	01-11-08	31-10-09	4.400	125	125	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	31	51	CHACO		Puente Neembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01-11-08	31-10-09	6.000	208	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	01-11-08	31-10-09	8.000	167	167	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp RNN°258 (Emp RNN 40) - Cholla	km 0 - km 30	8	30,0	15-12-05	31-05-09	36.995	422	3.296	3.296	9,00%	46,54%	6	
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Maiten - Emp. RNN°40 (ex 258-Epuen)-Acc. a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40)-km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22-11-05	21-12-08	37.931	733	3.233	2.194	7,90%	84,88%	6	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1ra. Sección km 0 - km 30	8	30,0	01-02-06	31-12-08	44.170	3.267	14.962	9.296	10,28%	78,29%	6	
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel	km 9,14 -km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01-04-07	31-03-09	17.550	663	6.663	4.647	7,45%	82,42%	6	C
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Limite c/Catamarca km 154		8	100,0	01-11-08	31-10-11	70.000	323	323	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01-11-08	30-10-12	300.000	6.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	30-06-08	29-06-10	50.000	2.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.RNN°8	km 702 -km 704 - A° Corralito	5	2,0	27-01-06	27-11-06	2.649	225	225	0	0,00%	100,00%	8	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de estabilización y contención de barrancas - Santa Elena		17		01-11-08	31-10-10	10.000	417	417	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5		30-11-08	31-05-10	5.0							

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RPN°19	Piñalito - Deseado - Emp. RPN°19	8	31,0	22-03-06	22-03-09	92.326	13.000	13.024	12.611	0,10%	92,16%	6	A
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de puentes	5	0,1	14-02-08	31-08-08	3.148	513	513	0	42,06%	43,14%	6	
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata		8	6,0	01-11-08	31-10-10	20.000	743	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Partido Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20-04-06	17-11-08	60.090	12.557	15.343	14.380	7,60%	90,14%	6	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acc.a Parque. Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acc.a Parque Industrial	8	2,8	01-11-06	31-07-08	16.021	723	2.506	2.222	7,68%	89,35%	6	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24-02-06	23-02-08	44.288	704	8.153	8.153	1,18%	97,47%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24-01-05	23-02-07	25.238	712	0	0	0,00%	99,99%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I,V	8	10,7	01-03-07	28-02-09	50.430	15.885	15.885	9.791	9,59%	43,79%	6	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01-11-08	31-10-09	6.000	227	227	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	31-08-08	01-03-10	50.000	333	333	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	RPN° 33, Puente s/Río del Valle	8	4,7	01-11-08	02-05-10	13.000	208	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14-01-08	30-09-08	4.147	583	0	0	26,86%	61,08%	6	A
22	9	66	51	CHACO	P12	Charata - Emp. RPN°6		8	86,0	01-11-08	31-10-11	200.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01-11-08	30-10-12	36.000	1.500	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque		5		30-06-08	29-06-10	4.000	208	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01-02-07	01-02-09	41.350	11.884	5.884	4.493	7,90%	48,96%	6	
22	9	71	52	CHUBUT	P12	Emp. RPN°14 (Gualjaina)- Emp. RNN°40- Sec. II	km 27 - km 62	8	35,0	01-11-08	31-10-10	45.000	917	917	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelín - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08-03-07	06-03-10	54.948	21.979	5.979	6.059	2,26%	23,79%	6	
22	9	72	52	CHUBUT	P17	Trevelín - Corcovado - Sección II	km 26,28 - km 62	5	35,7	01-11-08	31-10-10	40.000	867	867	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01-02-08	30-01-10	44.694	750	5.829	5.827	7,46%	10,11%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguerr - Emp. RPN°20	km 0 -km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09-03-06	30-11-08	28.365	10.000	7.200	3.712	10,39%	52,53%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01-11-08	31-10-10	25.000	625	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RN N°7 - Emp. RNN°8	Puente s/A° El Gato (km 669,87)	5	0,1	27-12-05	27-04-06	228	856	0	0	0,00%	100,00%	8	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01-09-06	30-08-10	4.628	250	1.871	1.679	0,00%	69,77%	6	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	01-11-08	30-10-13	530.000	2.760	11.000	8.047	0,00%	0,00%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RNN°81	km ,1167 - km 1184,44	8	10,9	23-11-06	30-06-08	14.819	100	6.713	6.314	13,01%	99,97%	6	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalacion de Formosa		8	20,4	01-09-08	31-08-10	32.762	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	88	51	FORMOSA	86	Mision Tacaagle - RNN°95	Emp. RNN°22 - Emp. RNN°95 y Acc. a Va. Gral. Güemes	8		30-06-08	30-06-09		20.000	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07-05-07	30-05-09	88.366	1.538	45.186	15.680	17,51%	43,64%	6	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N° 2	8	32,7	10-08-07	08-08-09	100.466	1.736	1.736	2.541	8,11%	24,00%	6	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20-11-07	25-11-09	70.886	1.257	1.257	14.773	5,73%	9,67%	6	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10-10-07	31-08-09	101.671	1.788	1.788	11.587	7,33%	8,94%	6	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Mision Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27-06-05	30-11-07	16.882	733	2.733	2.471	0,00%	100,00%	8	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20-05-05	31-07-08	54.854	427	26.153	26.087	7,19%	99,77%	6	A-C
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc. sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J.M. Gorriti - Emp. RNN°9	8	8,0	07-08-06	04-02-09	111.921	2.500	25.080	22.461	13,19%	84,22%	6	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Lujan - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05-02-07	06-08-07	701	369	369	0	0,00%	98,57%	7	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo - Tunuyan - Sección II	Emp. RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25-01-05	24-01-08	54.192	465	17.300	17.199	0,00%	83,44%	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22.900 - Acc. A Cajón Grande	8	20,9	01-11-08	02-05-10	25.427	1.028	1.028	0	0,00%	0,00%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km. 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02-01-07	30-12-08	73.923	28.500	24.080	3.528	4,28%	22,15%	6	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acc. A Cajón Grande - Lte, c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15-01-07	31-01-09	64.170	35.143	49.907	21.274	8,57%	57,17%	6	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II						6.927.484	300.396	410.577	279.766				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III													
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01-11-08	31-10-09	25.000	903	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	2	51	MISIONES		Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0	01-11-08	31-10-11	10.000	271	271	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	31-07-08	30-07-09	1.500	233	233	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte s/A° Pilmatue	Ptes s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15-03-07	14-07-07	2.309	392	392	0	0,00%	100,00%	8	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01-06-08	31-05-10	36.000	325	325	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. RN N°231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. RNN°231	8	20,6	21-02-06	21-08-08	75.759	20.694	16.995	13.085	9,67%	63,18%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Neuquen	Acceso a chichinales - Acc. A Godoy	8	21,0	13-02-08	30-05-09	127.458	2.021	2.896	5.936	3,07%	7,84%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Godoy- Acc. a Cervantes	8	21,0	01-11-08	31-10-10	98.000	2.042	42	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti													

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - RNN°40	R. Bermejo - Emp. RNN°40 (Sección III)	8	36,4	01-06-07	30-05-09	77.930	1.413	1.413	0	16,41%	47,22%	6	
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp. RPN°414 - Emp RPN°12	8	0,1	26-10-05	26-07-08	17.933	225	225	0	1,67%	55,43%	6	A-C
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente sobre Río Santa Cruz	5	0,2	31-07-08	30-07-09	5.000	166	166	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Rio Colastine - Tunel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31-07-07	30-11-10	155.922	29.820	27.038	13.567	9,34%	32,82%	6	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	5	3,5	01-11-08	31-10-11	140.269	451	451	0	0,00%	0,00%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNN° 33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	31,0	01-09-08	31-08-10	90.000	2.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N. 34	203-233	8	30,0	31-07-08	30-07-09	20.000	2.167	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31-01-07	02-05-07	400	225	225	0	0,00%	100,00%	7	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Rio Parana - Autopista Rosario - Cordoba (Av.Pellegrini)	Rio Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13-02-06	31-07-08	65.265	225	4.181	4.181	2,22%	86,02%	6	C
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso alternativo tránsito pesado desde RNN°9	8	4,0	01-11-08	31-10-10	2.000	108	108	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	Pavimentacion urbana- 34 arterias urbanas	8	3,4	01-11-08	31-10-10	1.948	391	391	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Naciona - Bahía Lapataia		8	16,0	31-07-08	30-07-09	20.000	363	363	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa(Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	19,9	01-10-08	30-09-10	130.000	2.708	208	0	0,00%	0,00%	2	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza actual - Principio Autopista	8	13,9	08-03-07	09-03-09	105.140	2.190	21.653	14.701	11,41%	62,36%	6	
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Interseccion Av. Gral.Paz y Camino Negro		8	1,0	01-11-08	31-10-10	50.000	433	433	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	18	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-127/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01-11-08	31-10-10	6.500	352	352	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Interseccion RN N°a015 y calle Rösch	Conexión acceso a Salto Grande y RNN°14	8	1,0	01-11-08	02-05-09	653	50	50	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01-11-08	30-10-12	30.000	870	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Interseccion (Castex)		8	0,5	01-10-08	01-04-09	2.500	3.565	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	01-06-08	31-11-08	2.500	4.506	506	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. RPN°13	8	5,1	01-09-08	31-08-11	21.687	1.175	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y pte. s/desvío ferroviario	8	2,4	14-11-06	25-07-08	34.560	2.907	4.763	4.763	5,17%	81,28%	6	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Inters. Av. H. Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acc.Pque.Nacional de Tierra del Fuego	5	6,0	01-08-08	30-01-10	18.000	567	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda polivalente de Arte- Emp. Vte. RNN°3		8	5,0	01-08-08	30-01-10	10.000	567	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	km 64,50 -km 72,00	8	7,5	01-11-08	31-10-10	30.000	1.011	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01-11-08	31-10-11	170.000	1.300	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Limite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01-10-08	30-09-11	130.000	1.679	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	30,0	01-08-08	31-07-11	100.000	2.166	2.166	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección I: Emp. RNN°34 - Emp RPN°20	8	32,0		30-04-10		5.692	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección II: Emp RPN°20 - Lte. c/Córdoba	8	22,0		31-07-10		4.875	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/ Santa Fe - RNN°158	8	6,2	01-11-08	02-07-10	51.987	3.250	250	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construccion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05-06-06	03-12-08	43.664	10.620	7.275	964	6,63%	56,72%	6	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	km 333 - km 374,50 (Sección I)	km 333 - km 374,50 (Sección I)	8	33,5	19-05-06	16-02-08	26.316	226	11.449	11.449	0,21%	99,07%	8	
22	10	57	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Limite Córdoba/San Luis-Quines	km 198,65- km 266,4	11	67,8	20-12-07	31-07-08	23.403	722	1.099	1.099	43,61%	50,30%	6	
22	10	58	51	CHACO	89	Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S I	Prog. 0,00 - 22,05	8	22,0	01-11-08	31-10-11	80.000	1.027	1.027	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	59	51	CHACO	89	Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. S II	Prog. 22,05 - 43,28	8	22,0	01-11-08	31-10-11	80.000	903	903	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	60	51	CHACO	89	Cotte-Lai - Emp. RPN° 7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80	Prog. 43,28 - 75,80	8	30,0	01-11-08	31-10-11	100.000	1.914	542	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	61	51	CHACO	89	Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4	Prog. 81,28 - 135,18	8	53,9	01-11-08	31-10-11	70.000	993	993	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	62	51	CHACO	89	Samuhu Emp. RPN °4 - Emp. RNN°95 (Villa Angela)		8	36,0	01-11-08	31-10-11	120.000	677	677	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RPN°20 (Gramado) - Emp. RPN°17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	01-09-08	31-08-11	140.000	2.166	2.166	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. RPN°20 - Emp. RPN°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117	8	27,0	01-09-08	31-08-11	170.000	1.897	1.897	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	65	51	CORDOBA	S/N	Ciercunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	8,0	01-10-08	30-09-10	200.000	5.417	417	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	RNN°293-Tr.: Emp RNN°40 -Paso Fronterizo Laurita	8	75,0	01-08-06	30-07-09	155.167	37.800	39.364	2.012	0,67%	19,44%	6	A
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista	8	81,5	22-03-07	31-03-10	203.656	2.458	2.458	7.434	0,27%	10,05%	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras (en sigo 464878/2007)	8	41,0	09-04-07	30-10-09	120.273	1.319	1.319	36.445	2,54%	17,16%	6	A
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09-04-07	30-10-09	118.995	2.777	2.777	0	6,18%	28,66%	6	A
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	Calle San Martín - Acc. Planta Cementera	8	9,5	29-06-06	30-06-08	5.888	1.963	311	311	5,10%	82,47%	6	A-C
22	10	69	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. III)	Planta Ind. Villavicencio - Monumento Canota	8	9,8	01-11-08	31-10-09	6.000	167	167	0	0,00%	0,00%	3	
22	10	69	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sec. V)	Fin pavimento - Acc. Hotel Villavicencio	8	8,2	01-11-08	31-10-09	6.000	354	6	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian - (Dos Secciones)	km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20-12-05	30-06-08	148.562	100	18.735	14.613	4,18%	34,91%	6	A-C
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20-05-06	30-07-09	120.420	22.424	22.424	11.767	5,40%	61,24%	6	A
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2164,79 - km 2184,79	8	20,0	01-11-08	31-10-10	100.000	500	500	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2284,79 - 2303	5	18,6	22-08-07	31-08-08	43.103	802	802	17.493	1,75%	83,63%	6	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julian	km 2088- 2164,79	8	76,8	01-11-08	31-10-10	80.000	1.667	1.667	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. RNN°38 - Lte c/Catamarca		8	30,0	01-10-08	30-09-10	100.000	1.458	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Illico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27-07-06	26-10-07	1.333	465	500	435	0,00%	100,00%	8	
22	10	75	51	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acc. a diferentes localidades desde la autopista	Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31-08-07	30-04-09	9.891	253	2.425	2.425	12,38%	45,67%	6	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01-06-08	31-05-10	35.550	542	542	0	0,00%	0,00%	2	
22	10	77	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		8	15,0	01-08-08	30-01-10	20.000	204	204	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomus	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	01-03-08	28-02-09	5.017	146	424	424	12,08%	32,89%	6	A
22	10	79	51	CORDOBA	S/N	Reordenamiento accesos a Cosquin - 2 Puentes		8	1,0	05-05-07	02-11-08	31.609	1.141	5.994	4.042	19,20%	51,57%	6	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de interseccion RNN ° 8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	31-07-08	29-01-09	1.600	87	87	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovia 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	31-08-08	01-03-10	40.000	1.556	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Emp. RNN°81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18-10-07	30-10-09	152.151							

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA											AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs	
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	01-07-08	30-06-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01-08-08	31-07-10	70.000	1.458	208	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01-10-08	30-09-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01-10-08	30-09-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Limite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28-06-06	26-02-07	1.281	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
22	10	86	51	SANTA CRUZ		Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia - Convenio		8	4,0	01-11-08	31-10-10	16.000	867	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	La Paz - Santa Rosa	8	66,0	29-11-07	01-05-10	208.911	3.000	9.073	11.073	3,48%	8,78%	6	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martin	Desaguadero - La Paz	8	42,0	01-11-08	02-05-11	120.000	2.000	2.000	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Limite con Cordoba - Quines	8	48,0	01-09-08	01-04-09	20.625	139	139	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	92	51	BUENOS AIRES		Acceso a Campo Universitario Tandil		8	1,0	01-11-08	31-10-09	3.000	292	292	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	93	51	BUENOS AIRES		Intercambiador Centenario - Partido Vicente Lopez		8	0,5	01-11-08	31-10-10	12.000	650	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	96	51	SANTA FE	177	Empalme Ruta Provincial N° 21 - Alto Nivel RNN° 9	km 0,00 - km 7,82	8	7,8	25-07-07	30-09-08	12.192	325	2.079	1.743	9,06%	29,87%	6	
22	10	97	51	BUENOS AIRES	178	Pergamino - Limite con Santa Fe		8	50,0	01-11-08	31-10-09	8.000	144	144	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	98	51	SANTA FE	178	Limite con Buenos Aires- Emp. RNN°33 - Acceso a Villa Eloisa		8	110,0	01-11-08	31-10-10	42.285	573	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	10	99	51	CORRIENTES		Isla Apipe San Antonio - Puerto Tonla		8		01-11-08	31-10-09	2.000	971	0	0	0,00%	0,00%	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III						6.129.405	237.840	267.873	207.434				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV													
22	11	4	51	CORDOBA	P21	RPN°20- RPN°19 - Puente sobre A° El Gato y San Antonio		8	0,2	01-11-08	31-10-09	5.000	1.479	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	5	51	ENTRE RIOS	P42	Puente Mendez - Casariego (s/Río Gualaguaychú) hasta RNN°136		8	15,0	01-11-08	31-10-09	6.000	528	528	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Limite con Mendoza - Secciones I y II y Acc. Pque. Nacional El Leoncito	8	43,0	20-09-08	19-09-10	42.000	875	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	9	51	SALTA	S/N	Tolombon - Hualinchay		8	40,0	01-11-08	31-10-10	15.000	1.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	11	51	CORRIENTES	123	Empalme RNN°12 - Mercedes		8	73,0	01-11-08	31-10-10	20.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01-11-08	31-10-10	6.000	233	233	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01-10-08	30-09-11	230.600	3.203	3	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01-10-08	30-09-11	160.750	2.233	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01-10-08	30-09-11	187.350	2.602	62	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa Maria	La Playosa - Villa Maria	8	43,4	01-10-08	30-09-11	218.800	3.011	11	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Villa Maria - Emp. RPN°6	8	36,6	01-10-08	30-09-11	183.100	2.542	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa Maria - Gral. Deheza	Emp. RPN°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01-10-08	30-09-11	146.050	2.028	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul	8	39,7	01-10-08	30-09-11	198.550	2.758	158	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. S/ Río Chucul - Río Cuarto		8	21,2	01-10-08	30-09-11	106.150	1.474	277	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en intersección RNN°228 Y RPN°73		8	0,5	01-11-08	31-10-09	3.000	530	530	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0	01-11-08	30-10-13	200.000	627	627	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	20	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. C/San Luis	La Paz - Lte. c/San Luis	8	18,0	17-08-07	30-11-08	9.792	0	0	0	0,00%	41,62%	6	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martin - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22-11-07	30-06-08	1.996	282	282	0	66,53%	86,92%	6	C
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Sgo del Estero	Emp. RNN°9 (N) - Emp. RNN° 9 (S)	8	7,5	01-02-08	31-01-10	49.396	722	2.510	2.510	7,19%	12,27%	6	
22	11	30	51	ENTRE RIOS	40	Trama urbana Ciudad de Nogoyá	Emp. RNN°12 - Emp. RPN°26	8	3,8	13-06-07	13-03-08	8.670	605	5.128	4.463	1,33%	96,64%	7	
22	11	31	51	MISIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acc. A Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	01-11-08	31-10-10	40.000	1.458	0	0	0,00%	0,00%	4	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01-11-08	31-10-11	54.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Emp. Acceso a Dique Ballester		8		01-11-08	31-10-09	4.000	813	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. RPN°69		8		01-11-08	31-10-09	3.000	650	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. RN°66 - Emp. RN°34	8	13,0	01-11-08	31-10-11	60.000	1.250	1.250	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. RN°66 - Emp. RN°34	8	12,4	01-11-08	31-10-10	50.000	1.250	1.250	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte con Salta - Acc a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01-11-08	30-10-12	150.000	35.666	4.333	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	Acceso San Pedor de Jujuy-Libertador Gral. San Martín		8	57,0	01-11-08	30-10-14	400.000	60.111	4.889	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S IV)	S IV: 114,000 - 137,416	8	23,4	08-05-07	31-10-09	38.736	625	12.101	10.738	17,66%	50,96%	6	
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte con Chile		8		25-06-04	24-12-05	42.846	100	100	0	0,00%	0,00%	7	
22	11	43	51	SANTA CRUZ		Desvío Transito Pesado por Asv. Asturias		8	10,0	01-11-08	31-10-11	60.000	550	550	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte Bella Vista - Emp Aut RNN°38		8	8,0	15-11-08	16-05-10	21.000	343	343	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerite (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01-11-08	31-10-10	15.000	937	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	48	51	SAN JUAN	P511	San Agustín del Valle Fértil - San Ramon		8	50,0	01-11-08	31-10-11	70.000	889	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	49	51	ENTRE RIOS	P20	I - RPN°39 - Las Moscas	Sección I	8	30,6	01-11-08	31-10-11	50.000	903	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	50	51	ENTRE RIOS	P20	II - Las Moscas - Villaguay	Sección II	8	24,4	01-11-08	31-10-11	50.000	722	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	51	51	ENTRE RIOS	P51	I - Larroque - Estación Parera	Sección I	8	27,4	01-11-08	31-10-10	40.000	758	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	52	51	ENTRE RIOS	P51	II - Estación Parera - Urdinarain	Sección II	8	14,2	01-11-08	31-10-10	40.000	794	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	25-04-08	31-10-09	53.081	879	0	0	2,94%	2,94%	6	
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26-04-07	23-01-09	45.758	896	12.523	9.054	17,25%	54,71%	6	
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (SIII)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08-05-07	31-10-09	44.254	958	14.485	11.389	10,80%	49,85%	6	
22	11	56	51	CORDOBA	PE86	Achiras - Sampacho		8	36,8	01-11-08	31-10-11	60.000	389	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	57	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo		8	6,2	01-11-06	31-07-08	5.064	1.327	0	0	0,00%	99,57%	6	
22	11	58	51	CORDOBA	PS 358	La Palestina - Arroyo Cabral - Departamento General San Martín	La Palestina - Arroyo Cabral	8	15,2	28-02-07	31-12-09	14.362	0	0	0	13,72%	33,27%	6	
22	11	59	51	CORDOBA	P23	Alpa Corral - El Esquinazo	Alpa Corral - El Esquinazo	8	38,9	16-08-07	31-03-09	28.049	0	0	0	4,66%	82,16%	6	
22	11	60	51	CORDOBA	PE 79	Tancacha - Villa Ascasubi	Tancacha - Villa Ascasubi	8	13,3	31-05-07	31-05-09	17.392	0	0	0	5,95%	45,64%	6	
22	11	62	51	CORDOBA	P 32	La Posta - Las Arrias	La Posta - Las Arrias	8	24,8	10-07-07	10-07-10	21.721	0	0	0	2,50%	14,93%	6	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. RNN°13 - Km17		8	6,0	01-11-08	31-10-09	8.000	271	3.966	3.966	0,00%	0,00%	0	
22	11	64	51	RIO NEGRO		Circuito Turístico Tronador - Cascada Los Alerces		8	67,0	01-11-08	31-10-09	3.000	722	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	65	51	CORDOBA	RP N° 34	Puesto Bustos - Giulio Cesare	Intersecc.c/Acc. al Parque Nacional Quebrada del Condorito y Camino de Acceso	8		01-11-08	31-10-09	5.000	206	206	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	66	51	SANTA CRUZ	RP N° 63	Emp. RNN°3 - Parque Nacional Monte Leon (Costa)	Acc. Parque Nacional Monte Leon	8	30,0	01-11-08	31-10-11	50.000	127	127	0	0,00%	0,00%		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
22	11	67	51	TUCUMAN	RP N° 330	Alpachiri - Rio Jaya	Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos	8	12,7	01-11-08	31-10-10	10.000	81	81	0	0,00%	0,00%	2	
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acc. Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26-06-07	24-09-08	6.167	460	4.000	3.962	18,24%	99,01%	6	A
22	11	69	51	CHACO		Capitan Solari - Parque Nacional Chaco	Acceso a Parque Nacional Chaco	8	5,2	01-11-08	31-10-09	5.000	1.083	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01-11-08	31-10-10	20.000	903	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	71	51	SAN JUAN		Chigua de Abajo - Quebrada Alcaparrosa	Acc. Parque Nacional San Guillermo	8	60,0	01-11-08	31-10-10	20.000	614	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	72	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Limite con Salta - Abra Pampa	Sección: I	8	40,0	01-11-08	31-10-11	50.000	659	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	73	51	TUCUMAN	RP N° 307	Tafi del Valle - Limite con Catamarca		8	60,0	01-11-08	31-10-11	50.000	54	54	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	74	51	CATAMARCA	P46	Emp. RNN° 60 - Emp. RNN°40 (Belen)	Andalgala - La Puntilla (Secc. II y III)	8	82,8	01-11-08	31-10-11	144.500	867	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	75	51	CATAMARCA	RP N° 219	Acc. Ruinas el Shincal		8	6,0	01-11-08	31-10-09	6.000	233	233	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	76	51	SAN LUIS	RP N° 29	Ruta de los Dinosaurios	La Chañarienta - Las Liebres - Ruta de los Dinosaurios	8	63,0	01-11-08	31-10-11	45.000	163	163	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01-11-08	31-10-10	10.000	714	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22	km 111,00 - km 136,48 (Emp. RNN°22)	8	25,5	01-11-08	31-10-10	15.000	2.564	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	79	51	JUJUY	S/N	Av. De Circunvalacion y Acc. a Perico		8	4,0	01-08-09	30-07-13	30.000	1.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	80	51	BUENOS AIRES	RP N° 72	San Francisco de Bellocq - Copetonas - Acc. Balneario Reta	Puente sobre el Arroyo Claromecó	8	45,5	01-11-08	30-10-12	90.000	90	90	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	81	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Emp. RNN°141 - Caucete y Difunta Correa	Seccion: I y Ia: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	01-11-08	31-10-09	7.000	983	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	82	51	SANTA FE	S/N°	Sistema Margen Izquierdo Río Grande	Vinculación Pte. Los Perales - La Viña	8		15-11-08	14-11-10	15.000	313	313	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	01-11-08	02-05-10	36.304	488	488	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	84	51	TUCUMAN	P323	Famailia - Rio Colorado (Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157)	km 2164,79 - km 2184,79	5	20,0	03-03-08	01-11-08	8.848	217	217	0	10,59%	10,59%	6	
22	11	85	51	TUCUMAN	P325	Emp. RNN°38 (Monteros) - Emp. RNN° 157 (Simoca)		8	18,0	26-02-08	24-02-09	12.814	584	0	0	18,57%	21,71%	6	C
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Pque. Industrial	8	22,0	01-11-07	31-12-09	79.292	50	10.076	10.076	12,46%	31,46%	6	A
22	11	87	51	SALTA		Mejoramiento y ampliación de la pista del Aeropuerto General Mosconi		8		01-11-08	31-10-10	22.000	87	87	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8		01-11-08	31-10-10	14.000	111	111	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	89	51	LA RIOJA	12	Pista de aterizaje y Acceso al Aeropuerto de Chimalcal		8		01-11-08	31-10-10	3.229	108	108	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	90	51	ENTRE RIOS	EX RPN° 11	Oro Verde - Paraná		5		01-11-08	31-10-10	4.105	645	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	91	51	ENTRE RIOS		Acceso a Parque Nacional el Palmar		8		01-11-08	31-10-09	4.000	813	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. RNN°34 - Valle Colorado		8	28,0	01-11-08	31-10-10	23.820	813	5.715	5.097	0,00%	0,00%	0	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc:II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,0	24-07-07	31-12-08	6.792	0	0	0	0,00%	36,45%	6	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25-07-07	31-12-08	8.335	0	0	0	0,00%	31,45%	6	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp.RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22-10-07	30-12-08	3.415	0	0	0	0,00%	13,56%	6	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8		01-11-08	31-10-10	30.000	81	81	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. RNN°40- Pte. s/Río Korich	8		01-11-08	31-10-10	30.000	1.259	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en intersección RNN°228 Y RPN°73		8		01-11-08	31-10-09	3.000	542	542	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acc. a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01-01-08	31-05-12	308.303	2.792	292	0	1,95%	7,73%	6	
22	11	97	51	TUCUMAN	P308	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	38,0	01-11-08	01-12-09	20.000	361	361	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	98	51	TUCUMAN	P321	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	2,0	01-11-08	02-05-09	1.000	975	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	11	99	51	TUCUMAN	P329	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	37,0	01-11-08	31-10-09	20.000	521	521	0	0,00%	0,00%	0	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV						4.503.391	163.886	90.393	61.255				
						Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V													
22	12	1	51	PAIS	Vs	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		8	40,0	01-01-08	31-12-08	0	1.042	0	0	100,00%	100,00%	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojaras - Emp. RPN°357 (Acc a Quimes)	Secc. I y II	8	21,0	01-03-09	30-08-10	35.200	831	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación colectoras e iluminación en Las Talitas		8	2,0	01-11-08	02-05-09	2.000	2.031	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	4	51	TUCUMAN	ex RNN° 34	Gobernador Garmendia - Las Cejas		8	42,0	01-11-08	31-10-09	23.000	632	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	5	51	CORDOBA	P32	Obispo Trejo - La Posta	Prog 0,00 - Prog 25,70	8	22,0	17-09-07	31-03-09	26.128	417	417	0	0,00%	90,97%	6	
22	12	6	51	CATAMARCA	P S/N°	Emp. RPN°46 - Tucumanao y Acc. a Tucumanao		8	35,0	01-11-08	31-01-10	35.000	2.163	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	8	51	CHUBUT	P1	Comodoro Rivadavia - Camarones		8	115,0	01-11-08	30-10-12	200.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	9	51	ENTRE RIOS	P 19	Emp. RNN°12 - Emp.RPN°20 (Puente Vasallo s/ Río Gualaguay)		8		01-11-08	31-10-09	8.000	1.806	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	10	51	LA PAMPA	P1	General Pico - RNN°5		8	93,0	01-11-08	02-05-10	47.000	95	95	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	11	51	LA PAMPA	P1	RNN° 5 - RNN°35		8	165,0	01-09-08	31-08-10	30.000	126	126	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Acceso a Conscripto Bernardi		8	7,0	01-11-08	31-10-09	7.000	1.959	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01-11-08	02-05-10	7.000	361	361	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17-09-07	17-09-08	61.279	1.611	0	0	41,66%	75,10%	6	
22	12	15	51	RIO NEGRO		Acceso a Parque Nacional Nahuel Huapi		8	10,0	01-11-08	02-05-10	10.000	50	50	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	16	51	ENTRE RIOS	12	Emp. RNN°127 - La Paz		8	113,0	01-11-08	31-10-11	60.000	948	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	17	51	NEUQUEN	40	Acceso a Barrancas		8	1,0	01-11-08	02-05-09	1.000	2.844	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinc RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acc. al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01-11-08	31-10-10	70.000	1.463	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8		01-06-08	30-01-09	35.000	6.250	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01-09-08	31-08-09	10.000	417	417	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN°3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01-09-08	31-08-10	70.000	1.458	0	0	0,00%	0,00%	0	
22	12	22	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola		8					2.519	0	0	0,00%	0,00%	12	
22	12	23	51	SANTA CRUZ															

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA														AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est			
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8		01-09-08	31-08-10	23.400	488	488	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14-12-07	12-12-08	29.625	458	458	0	5,91%	13,91%	6	A		
22	12	27	51	SANTA CRUZ		Pavimentación urbana El Chaltén y protección márgenes río Fitz Roy		11	5,8	20-12-06	30-06-08	20.801	833	0	0	15,49%	92,54%	6	A		
22	12	28	51	SANTA CRUZ	281	Emp. RNN°3 - Pto Deseado	Emp. RNN°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	8	67,6	25-04-07	30-04-09	108.252	2.792	0	0	1,39%	47,29%	6			
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN°9 - Lte. con Formosa		8		01-09-08	31-08-10	50.000	1.042	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovia Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	15-11-08	14-11-10	28.000	583	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	31	51	TIERRA DEL FUEGO	P 30	Camino del Atlantico Ushuaia - Pto. Brown		8		01-09-08	31-08-10	150.000	3.125	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	32	51	CHACO		Acceso a Fontana 25 de mayo - Empalme RNN°11		8		01-09-08	31-08-10	19.500	406	406	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	33	51	MENDOZA	60	Revestimiento Colector y Obra de Pavimentación Calle Maza		8		01-09-08	31-08-10	2.042	50	50	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	34	51	MENDOZA		Obra de Pavimentación Cuidad de Las Heras		8		01-09-08	31-08-10	3.478	65	65	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	35	51	MENDOZA		Obra de Pavimentación Dto. Lavalle (calle Dorrego, Quiroga)		8		01-09-08	31-08-10	6.300	131	131	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	36	51	CORDOBA		Obra Costanera Ciudad Villa Nueva		8		01-09-08	31-08-10	3.500	73	73	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	37	51	MENDOZA	86	Nueva Traza Tupungato		8		01-09-08	31-08-10	39.000	813	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	38	51	SANTA FE	P90	Enlace Autopista RNN°9 - RPN°21		8		01-11-08	31-10-09	10.000	271	271	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Av. Circunvalación de Rosario		8	29,0	01-07-08	30-06-11	300.000	4.167	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Emp. RPN°65 - Emp. RNN°33	Sección I	8	58,7	01-07-08	30-06-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Emp. RPN°65 - Emp. RNN°33	Sección II	8	54,6	01-07-08	30-06-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Emp. RPN°65 - Emp. RNN°33	Sección III	8	50,9	01-07-08	30-06-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Emp. RPN°65 - Emp. RNN°33	Sección IV	8	53,9	01-07-08	30-06-10	60.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	41	51	BUENOS AIRES	S/N	Av de Circunvalación - Rama Sur - Prolongación	km 0,00 - km 5,95	8	6,0	01-11-08	31-10-09	6.000	250	250	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01-11-08	31-10-10	100.000	2.083	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Emp. RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Pirámides	Emp. RNN°3 - Emp. RPN°1	8	87,3	01-11-08	31-10-10	134.301	2.798	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcarañá		8	39,0	01-11-08	31-10-09	30.000	1.250	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	01-11-08	31-10-09	45.100	1.879	0	0	0,00%	0,00%	4			
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01-11-08	31-10-10	40.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso - Lamadrid	8	250,0	01-11-08	30-10-13	250.000	2.083	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	48	51	LA RIOJA	P27	Lte. con San Juan - San Ramón		8	28,0	01-11-08	31-10-10	15.064	314	314	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01-10-08	30-09-10	70.000	1.458	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	50	51	SGO DEL ESTERO	P 4	Nueva Esperanza - Santo Domingo	Prog. 0,00 - Prog. 25000	8	25,0	01-11-08	31-10-10	28.659	710	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	51	51	SGO DEL ESTERO	P 13	Sumampa - Pinto (RNN°34)	Prog. 58 - Prog. 88,673	8	30,7	01-11-08	31-10-10	52.104	1.199	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01-06-08	31-05-10	20.000	417	417	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	53	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - km 2303,40	8	18,6	01-06-08	31-05-09	41.183	1.716	0	0	0,00%	0,00%	2			
22	12	54	51	SANTA CRUZ	P 39	Emp. RPN°43 - Bajo Caracoles	Km 0,00 - Km 184	8	184,0	13-04-07	11-04-10	223.277	46.888	378	0	1,88%	40,32%	6	A		
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Emp. RPN°39 - Emp. RNN°3		8	200,0	30-12-07	28-12-10	127.997	2.229	0	0	3,91%	14,38%	6	A		
22	12	56	51	SANTA CRUZ	P 2	Condor Cliff - La Esperanza		8	85,0	01-11-07	30-10-10	94.426	1.646	0	0	1,64%	33,16%	6	A		
22	12	57	51	SANTA CRUZ	P 9	Emp. RNN°3 - Emp. RNN°40	Emp. RNN°3 (Poste S.O.S. N° 25) - Emp. RNN°40	8	192,0	06-03-07	30-10-09	238.248	4.964	0	0	1,06%	21,65%	6	A		
22	12	58	51	SANTA CRUZ	S/N	Accesos a Puerto Deseado desde RNN°281		8	22,0	01-11-08	31-10-10	47.000	979	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	59	51	CHACO	RP N 4	Quitilpi - Pampa del Indio	Pampa Verde - Pampa del Indio	8	48,0	01-08-08	31-07-11	60.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106	Emp. RNN°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01-10-08	30-09-11	100.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. RNN°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01-10-08	30-09-11	100.000	1.389	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. RNN°152 - Chelforo	Sección III	8	42,0	01-11-08	31-10-11	80.000	1.111	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	63	51	SANTA FE	34	Rosario - Emp. RNN°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,6	01-11-08	02-05-10	20.000	556	204	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	64	51	TIERRA DEL FUEGO	RP 23	Rio San Pablo - Río Lainez - Río Irigoyen		8	42,0	01-07-08	30-06-09	4.924	137	137	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	65	51	TIERRA DEL FUEGO	RPN 9	Emp. RNN°3 - Acc. Estancia El Roble		8	25,5	01-07-08	30-06-09	896	402	402	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	66	51	TIERRA DEL FUEGO	RPN 5	Acc. Estacia Los Flamencos - Estancia el Salvador		8	32,0	01-07-08	30-06-09	894	402	402	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. RPN°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01-11-08	02-07-09	6.449	403	403	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	68	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 1 - Emp. RNN°123 - Puesto Ciro	Prog. 0,00 - Prog. 34,00	8	34,0	01-09-08	31-08-10	118.499	1.280	0	0	0,00%	0,00%	4			
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Siro - Emp. RPN°114	Prog. 34,00 - Prog. 76,221	8	42,2	01-09-08	31-08-10	97.908	2.040	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351	8	28,3	01-11-08	31-10-10	51.000	1.063	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	71	51	BUENOS AIRES	9	Rehabilitacion antigua Traza E/A° Escobar y Calle Don Bosco		8		15-11-08	16-07-09	7.000	438	438	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	72	51	CATAMARCA	P2	Emp. RPN°42 (La Cumbre) - Emp. RNN°157 (San Antonio de la Paz)	Ancasti Prog 595,24 - 12800	8	12,2	18-02-08	18-08-09	7.008	254	254	0	6,61%	9,08%	6			
22	12	73	51	CHUBUT	P71	Portada Norte Pque. Nac. Los Alerces - Villa Futalaufquen	km 47,336 - km 81,96	8		01-10-08	31-05-13	141.736	1.778	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	74	51	LA PAMPA	P1	RNN°188 RPN°102	km 78,80 - km 81,96	8	3,2	01-10-08	01-04-09	238	50	50	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	75	51	LA PAMPA	P7	Metileo - RNN°5	km 88,12 - km 132,58 y Acceso a Mirasol	8	49,5	15-11-08	16-07-09	3.719	125	125	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	76	51	LA PAMPA	P11	RPN°102 - RPN°110	km 0,154 - km 24,763	8	24,8	11-11-08	12-07-09	1.862	116	116	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	77	51	LA PAMPA	P102	RPN°1 - Luant Toro	km 0,00 - km 7,575; km 84,89 - km 116,85; km 129,44 - Acc. a Rucanelo	8	55,6	15-11-08	14-11-09	4.178	174	174	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	78	51	LA RIOJA	P5	La Rioja - Paraje San Juan	RNN°38 - Acc. a Aeropuerto (4518-07)	8	5,0	15-12-07	14-08-08	7.749	492	492	0	13,16%	41,39%	6			
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av General Paz - Cañuelas	km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20-05-08	19-05-11	181.472	29.063	0	0	3,14%	3,14%	6			
22	12	80	51	SGO DEL ESTERO	P4	Nueva Esperanza - Sto Domingo	Prog 25000 - Prog 49900	8	24,9	15-11-08	14-11-10	30.956	645	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	81	51	SGO DEL ESTERO	P13	Sumanpa-Pinto	Prog 0 0 Prog 28500 00	8	30,0	01-11-08	31-10-10	38.928	811	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	82	51	SGO DEL ESTERO	P3	Sumanpa-Pinto	Prog 28500 Prog 58000	8	30,0	01-11-08	31-10-10	54.000	1.125	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	83	51	TUCUMAN	EX365	RN°65 (Ex365) Emp. RN°38 Lte. con Catamarca	RN°38-Alpachiri	8	18,0	15-11-08	14-11-09	20.000	833	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez	Emp. NN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17-10-07	17-03-08	10.762	278	10.354	10.354	0,00%	98,07%	7	A		
22	12	85	51	SGO DEL ESTERO	P6	Pampa de los Guanacos - Sachayoj	km 0,00 - km 48,60	8	48,6	01-11-08	31-08-14	72.000	1.000	0	0	0,00%	0,00%	0			
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza-Los Menucos	km 56,00-km 62.634	8	6,6	07-12-07	06-10-08	9.993	416	416	0	20,11%	39,30%	6			
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V						4.609.535	174.056	19.2							

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA													AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin		Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
						Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI							38.045	0	0	0				
						Total Construcciones							37.550.793	3.396.610	2.948.067	1.652.070				
						CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO														
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I														
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte.c/Chubut - Prog 1909,89 - Prog 1913,01 - Pro.1971,77	13	111,4	26-05-97	23-05-05		14.043	465	465	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog 1971,77- Prog 1996,82-Pto. Deseado - Emp. RNNº3	13	132,3	24-04-97	21-12-04		13.515	465	465	0	0,00%	99,75%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. RNNº35 - Chacharramendi	13	127,8	03-07-97	30-10-04		9.733	465	465	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. a Cruz del Eje - Chemical / Emp. RPNº31 - Chemical	13	243,8	18-06-97	15-06-04		11.169	465	626	626	0,00%	97,71%	8	
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. RPNº307 - San Carlos / Emp. RNNº40N - Río Conchas (Puente)	13	142,3	04-06-97	31-10-08		22.861	465	1.114	1.000	1,50%	96,30%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30-04-97	30-09-08		40.875	566	832	594	0,87%	53,42%	6	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNNº60 - Belén/Aimogasta- Acc. Tinogasta/Aminga - Emp.RNº60	13	226,3	04-07-97	01-07-04		17.762	365	365	0	0,00%	97,75%	7	
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy- Río Yala (Pte)/Emp.R9-Emp.R 34/Emp.R66-R34	13	148,9	05-04-97	02-09-04		12.938	225	225	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acc. Gral. Pinedo - Lte. c/ Sgo del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22-05-97	18-12-05		23.197	850	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Emp. RNNº34	13	79,7	10-04-97	08-07-06		19.845	337	337	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp.RNNº117- Emp.RPNº155-km139,00-Emp. RNNº14- Emp.RNNº14-Yapeyú	13	144,7	07-07-97	04-10-06		27.283	224	224	0	0,00%	85,76%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Emp. RNNº127-Lte. c/Corrientes -Emp. RNNº12-Emp. RPNº32-Emp. RNNº12-Hansenkamp	13	271,4	27-08-97	23-09-08		28.762	259	3.416	2.889	2,74%	99,10%	6	A
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. RNNº14 - Emp. RNNº123 - Emp. RNNº12 - km 139,00	13	217,6	03-11-97	02-04-04		20.456	224	224	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10-02-98	08-04-09		22.308	300	1.747	1.248	3,36%	95,49%	6	A
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07-07-97	03-09-04		15.340	101	101	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp RPNº20	13	272,6	14-10-97	11-10-04		20.028	101	101	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. RNNº50 / Emp. RNNº34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18-07-97	15-08-04		16.672	101	101	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte.c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNNº20	13	286,8	15-08-97	13-08-03		16.006	850	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. RNNº74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02-08-97	31-07-02		6.378	221	221	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. RNNº150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13-01-98	12-04-04		10.860	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNNº74 / Emp. RNNº74 - Emp. RNNº60 / Patquia - Emp. RNNº40N	13	327,8	30-09-97	28-02-04		17.876	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11-11-97	08-10-08		22.317	223	250	207	2,43%	95,78%	6	
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. RNNº281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25-11-97	24-04-05		20.207	112	112	0	0,00%	89,58%	7	
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. RNNº12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	13-01-98	11-03-09		21.661	835	835	84	0,58%	97,90%	6	A-C
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNNº3- P.Alta/Emp. RNNº3- Emp.RNNº229/Emp. RNNº3-Pte.s/R.Colorado	13	167,1	17-07-97	13-04-09		24.857	405	439	292	2,44%	89,84%	6	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. RNNº11 - km 123,43	13	123,4	09-12-97	08-05-04		26.066	224	224	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro-Emp. RNº40S-Emp. RNº258-Emp. RNº25 Emp. RNNº40s Trevelin	13	201,2	01-12-97	31-12-08		33.118	1.688	1.688	1.529	3,09%	96,55%	6	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNNº25 -Prog. 1512,60-Rawson-Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14-11-97	11-11-04		21.472	100	100	0	0,00%	99,78%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNNº11 - Acc. a Las Lomitas	13	285,6	01-08-97	29-10-04		17.069	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01-04-98	27-12-08		26.693	1.700	6.252	4.452	3,44%	77,78%	6	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acc.Quines - Lte.c/San Juan /Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	187,7	17-06-98	14-11-04		13.993	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. RNNº7 - Pte. s/Río Diamante	13	211,2	13-01-98	12-04-04		13.402	436	436	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María- Lte.Santiago del Estero-Emp. RNNº9-Lte.c/Catamarca	13	309,5	12-07-97	09-06-04		15.095	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. RNNº20 - Emp. RNNº147 / Emp. RNNº7 - Emp. RNNº20	13	245,6	20-06-97	17-02-04		14.250	228	228	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. RNNº35 - Emp. RNNº22	13	136,8	23-06-97	20-09-04		18.091	100	100	0	0,00%	99,98%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. RPNº 86 - Emp. RNNº3	13	139,9	04-03-98	31-12-08		28.532	212	1.902	1.902	2,98%	90,13%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNNº40S / Pte.s/R. Diamante - Emp. RNNº143	13	223,3	13-08-97	11-03-04		15.295	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNNº14 - Emp. RNNº14 - Villaguay	13	173,0	25-10-97	20-02-09		28.724	480	668	668	1,40%	44,38%	6	A
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.del Morro - Lte.c/Cordoba / Lte.c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acc. a Quines	13	220,0	05-09-97	03-10-04		18.064	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. RNNº12 - Emp. RNNº14 Y 119	13	259,2	03-10-97	30-06-08		51.741	290	2.598	2.296	1,10%	59,42%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex RNNº3	13	258,3	05-11-97	31-12-08		29.828	740	1.100	1.091	2,51%	98,92%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. RNNº152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14-06-97	12-06-03		14.887	224	224	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. RNNº152	13	221,6	31-07-97	28-10-04		17.642	100	100	0	0,00%	98,65%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - A° La Teresa	13	195,7	29-10-97	27-07-04	9.896	224	224	9	0,00%	100,00%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp.RNN°237- Emp.RNN°234	13	275,5	14-11-97	12-06-05	17.348	100	100	0	0,00%	90,11%	7	
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03-12-97	01-12-02	6.976	101	101	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31-10-97	28-02-09	30.858	267	4.170	3.136	2,43%	90,41%	6	A
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acc. Larramendi	13	113,7	09-10-97	06-10-04	14.367	556	0	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte.c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte.c/San Juan	13	282,8	13-11-97	12-05-04	13.412	100	100	0	0,00%	100,00%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. RNN°22 - Emp. RNN°250	13	118,7	25-07-97	23-03-04	14.994	126	126	0	0,00%	98,53%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55- Lte.c/Santa Cruz-Emp. RNN° 3-Emp. RPN°20	13	140,7	23-06-97	30-11-08	23.496	1.933	933	437	2,00%	90,75%	6	A
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acc. Larramendy - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20-05-99	17-08-05	14.584	112	112	100	0,00%	96,26%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acc. Malaspina	13	180,6	14-11-97	11-11-04	20.165	112	112	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123.43 - Tostado	13	209,1	19-12-97	17-12-03	21.313	100	100	0	0,00%	100,00%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte)	13	113,5	17-11-97	14-11-08	19.861	112	112	97	0,74%	95,89%	6	A-C
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. RNN°Ex 3 - Emp. RNN°251	13	185,2	23-02-98	21-12-08	32.235	2.000	6.168	2.501	8,58%	89,40%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I						1.120.416	21.690	41.341	25.158				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II													
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01-12-04	29-11-09	46.074	2.570	1.168	528	0,70%	86,99%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RNN°95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01-01-05	30-12-09	49.896	1.400	4.000	3.642	1,07%	97,22%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01-12-04	29-11-09	46.302	1.388	1.361	775	0,92%	94,23%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintín (O.faltantes)	13	313,8	09-09-03	08-10-07	19.509	1.970	970	214	0,00%	96,62%	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01-03-05	27-02-10	60.293	900	2.100	855	0,54%	71,38%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01-11-05	30-10-10	49.953	687	1.987	999	0,70%	93,49%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. RPN°10	13	111,3	01-05-05	29-04-10	66.138	1.073	10.777	8.777	9,88%	66,00%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp.c/Avda. Belgrano	13	27,9	19-11-03	17-01-07	38.487	146	146	0	0,00%	99,24%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10-01-04	31-05-08	32.892	337	6.403	5.276	18,27%	98,49%	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Córdoba - Emp. RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01-02-05	31-01-10	36.957	1.100	1.286	582	0,79%	94,75%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. RNN°38 - Aimagasta	13	166,7	03-12-04	01-12-09	59.945	1.500	2.500	626	0,63%	93,63%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp. RNN°157 - Emp.RNN°38	13	171,9	02-05-05	30-06-10	53.282	1.200	1.312	378	0,08%	93,34%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19-06-01	16-11-08	24.284	1.531	898	140	0,61%	99,78%	6	
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05-06-01	30-04-07	26.806	4.650	1.650	0	0,00%	97,56%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. RNN°5 - Est. El Recreo	13	69,2	01-03-05	02-03-10	42.472	1.000	760	524	0,61%	95,68%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01-04-05	30-03-10	43.723	1.000	760	394	0,45%	96,71%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp.RNN°35 - Acc. Quetrequén	13	158,3	01-04-05	30-04-10	42.039	910	2.193	1.131	1,30%	91,94%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. RNN°7	13	71,9	01-03-05	27-02-10	40.405	1.048	772	400	0,50%	96,37%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento II C.Re.Ma. II						779.457	24.410	41.043	25.242				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento III C.Re.Ma. III													
26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. R.P Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01-11-08	30-11-13	43.116	1.916	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp.RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Oriental del Uruguay	13	151,8	01-01-05	30-12-09	45.290	1.498	2.930	818	1,36%	96,61%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01-01-05	30-12-09	42.140	1.720	2.563	602	0,94%	94,00%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01-10-05	30-09-10	26.392	5.156	2.379	159	0,00%	100,00%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15-01-05	30-11-09	54.523	3.000	3.774	516	0,71%	84,49%	6	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 -CHUBUT	Lte.c/Río Negro - Emp.RNN° 259	13	149,1	01-08-08	30-07-13	97.343	4.326	1.120	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp.RNN°20 - Emp.RNN°147 / Emp.RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01-02-05	30-01-10	61.802	1.200	2.008	672	0,66%	67,18%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acc. a Quetrequén - Emp. RPN°3	13	129,4	01-09-05	30-08-10	42.548	500	1.348	689	0,82%	92,38%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01-09-08	30-08-13	184.047	8.985	985	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02-01-07	30-04-12	103.265	28.699	46.156	12.509	12,02%	55,60%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acc. Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02-05-05	02-10-10	64.262	1.600	6.283	4.549	0,63%	95,71%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. del Estero (Entrada)	13	120,9	01-01-06	30-12-10	56.142	6.242	7.180	781	0,83%	91,97%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R9-Emp.R34/Emp.R66-Emp.R34	13	148,9	01-10-05	30-09-10	46.409	1.000	3.636	1.301	1,62%	96,15%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN°38	13	151,9	01-08-05	30-08-10	52.920	1.217	2.263	871	0,99%	83,83%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN°329	13	128,0	01-04-05	30-03-10	44.916	1.000	2.735	1.605	0,87%	89,50%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Emp. RPN°32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01-03-05	31-03-10	46.073	1.000	2.064	760	1,09%	95,45%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA													AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO		Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3	13	180,1	01-11-08	30-10-13	81.023	3.601	101	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01-12-04	29-11-09	47.004	6.658	7.619	961	0,77%	63,12%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01-12-04	31-01-10	58.836	3.905	18.907	14.227	0,92%	66,22%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02-01-06	30-12-10	37.385	6.068	7.031	828	1,11%	88,55%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01-05-05	28-04-10	52.668	1.473	1.970	497	0,95%	87,01%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp.RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa- Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237-Lte.c/R.Negro	13	291,2	01-02-05	31-01-10	48.487	4.888	6.984	1.497	2,03%	86,25%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Quilichao / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01-07-05	29-06-10	51.440	2.606	4.702	797	0,93%	84,34%	6	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	13	286,1	01-06-05	30-11-10	49.000	4.806	6.329	1.088	1,33%	80,37%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael- Emp.RNN°40S/Pte.s/R.Diamante-Emp.RNN°143	13	223,3	01-03-05	27-02-10	38.971	600	1.891	789	1,29%	90,93%	6	
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01-07-05	30-08-10	44.867	3.264	3.252	487	0,82%	90,58%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN°14 - km 139	13	108,2	30-04-08	30-05-13	64.755	2.171	12.737	5.839	3,26%	3,26%	6	A
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	30-06-08	31-08-10	35.536	2.471	0	0	0,00%	0,00%	11	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN° 3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01-09-07	31-08-12	68.181	3.030	23.637	19.165	17,42%	52,00%	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN° 40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Río Aluminé	13	123,0	01-10-07	30-09-12	53.908	1.953	12.286	7.846	9,03%	31,43%	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Emp. RPN°2 - Emp. RPN°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01-11-08	30-10-13	39.722	3.111	111	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. RNN°8	13	203,3	01-10-08	29-09-13	91.463	4.065	3.252	0	0,00%	0,00%	1	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01-10-08	29-09-13	57.227	2.375	2.375	0	0,00%	0,00%	1	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03-04-07	30-03-12	102.757	3.859	35.634	24.724	15,17%	61,11%	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - S.M.Tucumán	13	145,7	01-05-06	30-11-11	96.149	15.979	24.825	15.699	0,94%	38,23%	6	A
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01-01-08	31-12-12	80.381	3.572	5.259	5.093	3,94%	10,28%	6	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN°123 - Emp. RNN°123	13	109,3	01-11-08	30-10-13	49.194	2.889	2.311	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01-09-07	01-09-12	117.388	4.662	24.272	20.813	4,34%	24,92%	6	
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28-02-08	31-10-12	96.034	3.604	104	0	9,67%	11,35%	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	129,5	01-08-08	30-07-13	41.050	2.666	2.666	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	41	51	RIO NEGRO	251-22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp.RNN°22-Emp.RNN°250 / Lte.c/La Pampa-Chimpay / km258-Emp.RNN°22	13	340,7	01-07-08	29-06-13	27.370	4.309	3.447	0	0,00%	0,00%	1	
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01-11-08	30-10-13	50.784	4.444	444	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN°33	13	104,9	01-11-08	30-10-13	47.183	4.222	222	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp.RNN°3-Pte.S/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol- P.Alta / Emp.RNN°3-Emp.RNN°229	13	167,8	01-09-08	30-08-13	7.515	4.000	3.200	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. RNN°7 - Pte sobre Río Diamante	13	211,2	01-08-07	30-11-13	62.922	2.246	15.090	13.293	25,91%	73,19%	6	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	106,2	30-09-08	28-09-13	65.849	4.000	500	0	0,00%	0,00%	0	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01-02-08	31-10-12	105.469	4.688	1.874	1.874	9,86%	11,64%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RPN°20	13	134,7	01-05-08	31-05-13	104.969	2.694	0	0	1,70%	1,70%	6	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30-04-08	30-04-13	80.473	0	0	0	6,10%	6,10%	6	
						Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento III C.Re.Ma. III						3.067.148	193.938	320.455	161.352				
						Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV C.Re.Ma.IV													
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01-11-08	30-10-13	60.183	2.675	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143	13	114,1	01-11-08	30-10-13	69.000	3.555	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01-11-08	30-10-13	99.900	5.333	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31-03-07	31-03-13	47.890	21.639	2.639	668	5,63%	12,29%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01-08-06	30-07-11	43.479	5.234	18.867	12.690	20,26%	61,74%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	13	98,0	01-11-08	30-10-13	44.100	1.960	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31-05-07	30-06-12	83.958	3.732	31.845	24.260	16,96%	53,74%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01-07-07	30-06-12	76.776	3.151	23.030	17.009	12,44%	45,49%	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01-10-07	31-10-12	88.892	3.951	27.773	16.541	16,90%	35,51%	6	
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp RPN°116 - Emp RNN°34	13	140,7	01-11-08	30-10-13	39.758	1.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp.RNN°117-Emp.RPN°155-Km139,00-Emp. RNN°14- Emp.RNN°14-Yapeyú	13	144,7	01-08-06	30-07-12	47.315	5.670	13.896	11.345	14,52%	49,36%	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. RNN°12 - Emp. RNN°14 y 19	13	259,2	01-11-08	30-10-13	116.618	5.183	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01-11-08	30-10-13	32.670	1.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01-12-07	30-11-12	107.197	4.764	22.483	11.557	14,99%	25,78%	6	
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	31-08-08	29-08-13	62.618	2.783	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/Chile	13	236,1	01-11-08	30-10-13	106.245	4.722	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°22 / Emp. RNN°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01-11-08	30-10-13	30.689	3.420	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	31-08-08	29-08-14	114.700	5.098	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01-11-08	30-10-13	50.117	2.667	0	0	0,00%	0,00%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/06/2008

DATOS DE OBRA													AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO		Obs
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 30/06/2008	Devengado al 30/06/2008	Avance al 2º Trim	Avance Total	Est	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp.RNN° 3 - Emp.RPN°20	13	135,5	01-11-07	30-06-12	101.525	4.388	19.262	15.842	15,16%	30,77%	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01-11-08	30-10-13	60.633	2.695	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. RPEx RNN°3 - Lte. con Río Negro/Emp. RNN°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01-11-08	30-10-13	80.000	4.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01-02-07	31-01-13	64.644	23.942	2.936	2.145	1,13%	11,05%	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos Pte. Piloto Basilio	13	153,2	01-09-08	30-08-13	70.000	3.678	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN°11 - Prog. 123	13	123,4	01-11-08	30-10-13	55.544	3.111	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01-11-08	30-10-13	125.100	5.560	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01-11-08	30-10-13	51.503	2.289	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chemical - Emp. RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01-07-06	30-06-12	68.138	5.516	13.942	9.372	15,11%	40,90%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	01-11-08	30-10-13	65.849	2.926	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp RPN°13 - Lte. con Stgo del Estero / Lte. con Chaco - Emp RPN°116	13	122,8	01-09-08	30-08-13	66.058	4.445	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN° 50	13	205,1	01-11-08	30-10-13	130.000	4.860	0	0	0,00%	0,00%	4	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30-04-08	28-04-13	142.998	4.000	0	0	6,25%	6,25%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Emp. RNN°12/Acceso a Yacireta	13	194,5	01-11-08	30-10-13	87.512	4.445	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp.RNN°14 - Emp.RNN°14 - Villaguay	13	173,0	01-11-08	30-10-13	77.859	3.467	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. RPN°86 - Emp. RNN°3	13	139,6	01-11-08	30-10-13	62.829	2.792	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16- Emp. RPN°13	13	88,4	01-04-08	29-10-12	99.951	4.442	6.426	0	9,59%	9,59%	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01-11-08	30-10-13	54.000	2.400	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	01-11-08	30-10-13	98.433	4.375	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RNN°62 - km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01-11-08	30-10-13	74.430	3.308	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01-11-08	30-10-13	69.354	3.082	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01-08-06	01-08-11	56.292	5.188	11.320	8.797	6,39%	73,95%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01-11-08	30-10-13	56.174	2.408	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RNN°20	13	78,0	01-11-08	30-10-13	70.038	3.113	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01-11-08	30-10-13	42.319	3.556	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. RNN°251- Pasaje Aº Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	01-11-08	30-10-13	114.291	3.556	170	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01-11-08	30-10-13	64.278	2.857	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	01-11-08	30-10-13	92.309	4.103	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. RNN°12 Sur - Pje. Iguaté Porá	13	84,3	01-11-08	30-10-13	37.930	1.778	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte)	13	113,5	01-11-08	30-10-13	51.053	2.311	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	01-11-08	30-10-13	61.542	2.735	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. RPN°31 ; Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31-12-07	28-12-12	93.496	4.155	17.822	9.454	12,63%	22,74%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Río Agua Clara ; Almogasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01-11-08	30-10-13	108.972	4.843	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. RNN°150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01-11-08	30-10-13	138.038	6.135	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Ollerios	13	114,0	01-11-08	30-10-13	51.282	2.279	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RPN° 6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01-07-06	28-06-12	43.558	6.004	8.623	8.424	0,68%	88,83%	6	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Ollerios - Emp. RNN°9 y N°34	13	90,0	01-11-08	30-10-13	40.698	1.809	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30-11-07	27-11-12	118.194	4.432	7.539	6.039	10,40%	24,64%	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acc.Quines - Lte.c/San Juan / Acc. Quines - Lte.c/La Rioja	13	188,0	01-11-08	30-10-13	84.465	3.754	0	0	0,00%	0,00%	2	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01-11-08	30-10-13	76.500	3.000	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01-11-08	30-10-13	62.312	2.769	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. RPN°3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01-11-08	30-10-13	100.000	3.230	0	0	0,00%	0,00%	1	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - Km 3568,79	13	141,5	01-11-08	30-10-13	40.000	2.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RNN°40 -Arreuntin	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01-11-08	30-10-13	40.000	2.667	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Emp. Ex RPN°20 - Emp. RNN°40 / Río Mayo - Acc.a Facundo	13	175,3	01-11-08	30-10-13	52.581	2.337	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. RPN°14	13	119,8	01-11-08	30-10-13	78.000	3.467	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RNN°3	13	124,7	30-11-07	29-11-12	103.686	4.608	17.032	9.082	11,52%	20,28%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01-10-09	29-09-14	80.000	4.444	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251 - 3	Malla 139	Emp. RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	01-10-08	29-09-13	120.000	5.333	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Emp. RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13		01-10-08	29-09-13	50.000	2.222	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01-08-08	30-07-13	80.000	3.556	0	0	0,00%	0,00%	0	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avda. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01-11-08	31-10-13	60.000	2.666	0	0	0,00%	0,00%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV C.Re.Ma.IV												5.296.473	296.796	245.605	163.226				
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma.												10.263.494	536.834	648.443	374.978				
Total Proyectos Dirección Nacional de Vialidad												48.783.995	4.410.101	3.825.353	2.207.514				

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

- A** Certificación demorada. Valor estimado
- B** Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
- C** Modificación de Obra en trámite
- D** Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E** Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F** Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H** Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I** Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J** Reinicio de obra en estudio
- K** Certificación de Pago Diferido

S/D Sin datos

Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/06/2008
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.636.637.057	1.767.006.579	359.438.266	234.716.044	7,5%
Provincia de Buenos Aires	914.819.552	947.650.746	320.404.687	293.954.559	9,4%
Provincia de Catamarca	84.882.487	58.821.255	46.602.622	46.552.879	1,5%
Provincia de Córdoba	270.110.153	175.635.833	108.071.705	103.974.998	3,3%
Provincia de Corrientes	158.544.599	179.001.134	55.163.241	54.986.905	1,8%
Provincia del Chaco	130.287.521	43.308.455	32.847.621	32.216.446	1,0%
Provincia del Chubut	200.069.859	188.391.030	94.290.602	94.158.130	3,0%
Provincia de Entre Ríos	192.105.686	219.297.068	138.515.294	138.494.525	4,4%
Provincia de Formosa	223.783.912	272.500.288	189.469.389	189.430.275	6,1%
Provincia de Jujuy	156.305.857	85.161.848	45.056.980	45.024.980	1,4%
Provincia de La Pampa	67.604.943	51.087.434	30.772.271	30.634.540	1,0%
Provincia de La Rioja	183.562.219	96.558.916	68.783.478	68.783.478	2,2%
Provincia de Mendoza	148.855.016	142.038.913	81.219.439	80.256.767	2,6%
Provincia de Misiones	121.918.364	58.395.523	32.100.183	31.937.498	1,0%
Provincia del Neuquén	84.274.845	68.248.160	43.654.849	43.648.200	1,4%
Provincia de Río Negro	315.818.758	267.895.790	133.777.939	130.220.353	4,2%
Provincia de Salta	151.425.567	126.476.411	72.553.909	52.516.260	1,7%
Provincia de San Juan	68.853.654	70.068.261	42.372.029	42.240.656	1,4%
Provincia de San Luis	17.143.635	23.254.689	18.243.582	18.200.834	0,6%
Provincia de Santa Cruz	208.893.658	156.790.724	100.888.892	100.863.732	3,2%
Provincia de Santa Fe	400.764.619	432.326.280	240.238.255	233.937.439	7,5%
Provincia de Santiago del Estero	111.472.093	154.359.590	82.808.902	82.808.902	2,7%
Provincia de Tucumán	55.831.817	80.450.416	55.030.284	54.225.744	1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	27.516.050	20.767.190	3.936.354	3.932.360	0,1%
Interprovincial	1.354.689.564	1.217.418.711	457.036.487	455.956.745	14,6%
Nacional	653.538.406	546.913.620	377.145.480	364.449.839	11,7%
Binacional	110.192.000	104.600.511	46.918.382	46.918.382	1,5%
No Clasificado	85.254.335	99.797.417	59.021.740	41.309.531	1,3%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	7.654.222.792	3.336.362.862	3.116.351.001	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/06/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	19.729.000	26.477.000	6.748.000	34,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.078.000	17.332.623	16.254.623	1507,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	2.599.000	2.777.400	178.400	6,9%
Ministerio de Economía y Producción	30.233.750	42.233.750	12.000.000	39,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	7.320.945.530	8.090.537.590	769.592.060	10,5%
Ministerio de Educación	351.920.392	358.770.458	6.850.066	1,9%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	18.006.000	18.006.000	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	73.050.000	83.750.000	10.700.000	14,6%
Ministerio de Salud	71.260.423	74.801.423	3.541.000	5,0%
Ministerio de Desarrollo Social	4.031.000	3.457.000	-574.000	-14,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.802.344.000	1.804.659.504	2.315.504	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	10.523.802.748	827.905.653	8,5%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	19.729.000	26.477.000	12.526.287	12.472.037	47,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.078.000	17.332.623	43.000	43.000	0,2%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	2.599.000	2.777.400	2.378.147	2.378.147	85,6%
Ministerio de Economía y Producción	30.233.750	42.233.750	12.178.396	11.447.832	27,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	7.320.945.530	8.090.537.590	4.472.000.544	4.468.550.376	55,2%
Ministerio de Educación	351.920.392	358.770.458	106.379.696	106.379.696	29,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	18.006.000	18.006.000	11.947.427	11.947.427	66,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	73.050.000	83.750.000	16.440.365	16.242.609	19,4%
Ministerio de Salud	71.260.423	74.801.423	51.216.978	22.619.501	30,2%
Ministerio de Desarrollo Social	4.031.000	3.457.000	1.133.624	1.133.624	32,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.802.344.000	1.804.659.504	452.583.504	452.583.504	25,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	10.523.802.748	5.139.527.968	5.106.497.753	48,5%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.827.670.733	3.459.266.007	1.408.793.387	1.405.669.907	27,5%
Provincia de Buenos Aires	1.394.734.946	1.915.247.868	669.623.926	655.252.163	12,8%
Provincia de Catamarca	189.577.286	171.685.453	28.915.205	28.662.827	0,6%
Provincia de Córdoba	393.746.439	484.715.518	199.107.645	196.462.629	3,8%
Provincia de Corrientes	124.738.468	172.290.358	62.691.128	62.522.198	1,2%
Provincia del Chaco	224.161.046	280.692.450	124.504.228	124.444.952	2,4%
Provincia del Chubut	230.273.973	154.741.818	129.653.701	129.120.899	2,5%
Provincia de Entre Ríos	177.078.304	183.882.486	57.151.148	56.025.136	1,1%
Provincia de Formosa	93.689.212	113.579.038	73.819.943	73.714.337	1,4%
Provincia de Jujuy	189.721.058	176.164.819	101.796.682	101.605.379	2,0%
Provincia de La Pampa	147.786.912	198.944.617	112.721.746	112.227.780	2,2%
Provincia de La Rioja	171.301.902	154.410.684	100.629.539	99.970.039	2,0%
Provincia de Mendoza	189.146.496	203.341.649	67.125.111	65.281.926	1,3%
Provincia de Misiones	145.748.686	74.049.812	94.486.494	94.306.165	1,8%
Provincia del Neuquén	136.630.349	119.456.329	32.911.467	32.203.441	0,6%
Provincia de Río Negro	148.696.847	55.048.609	37.768.910	37.111.608	0,7%
Provincia de Salta	164.912.299	125.969.306	78.381.912	78.092.325	1,5%
Provincia de San Juan	206.317.391	223.288.856	204.059.057	203.021.925	4,0%
Provincia de San Luis	152.444.589	59.951.560	6.564.376	5.953.902	0,1%
Provincia de Santa Cruz	479.032.796	453.264.400	834.862.499	834.279.012	16,3%
Provincia de Santa Fe	360.477.763	289.718.234	151.071.173	148.425.950	2,9%
Provincia de Santiago del Estero	166.419.942	107.930.406	121.554.658	121.275.029	2,4%
Provincia de Tucumán	264.990.336	167.535.570	214.604.843	214.579.385	4,2%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	86.698.604	102.522.163	26.416.813	25.976.462	0,5%
Interprovincial	1.004.244.483	780.845.103	197.434.230	197.434.230	3,9%
Nacional	23.162.235	292.587.235	0	0	0,0%
No Clasificado	2.494.000	2.672.400	2.878.147	2.878.147	0,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	10.523.802.748	5.139.527.968	5.106.497.753	100,0%

CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 30/06/2008
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	2.390.061	0	2.390.061	0	0	0
Judicial	20.305.357	0	20.305.357	45.726	0	45.726
Dirección Superior Ejecutiva	8.153.882	1.961.232	10.115.114	0	0	0
Relaciones Exteriores	4.321.285	700.000	5.021.285	0	0	0
Relaciones Interiores	716.892	6.210.504	6.927.396	344.870	0	344.870
Administración Fiscal	1.811.015	0	1.811.015	33.671	0	33.671
Control de la Gestión Pública	3.128.587	0	3.128.587	223.485	0	223.485
Información y Estadística Básicas	480.925	0	480.925	0	0	0
Subtotal	41.308.004	8.871.736	50.179.740	647.752	0	647.752
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	8.056.195	0	8.056.195	0	0	0
Seguridad Interior	70.435.761	2.378.147	72.813.908	0	0	0
Sistema Penal	3.421.729	0	3.421.729	0	0	0
Inteligencia	7.521	0	7.521	0	0	0
Subtotal	81.921.206	2.378.147	84.299.353	0	0	0
Servicios Sociales						
Salud	13.362.958	29.492.153	42.855.111	3.396.693	0	3.396.693
Promoción y Asistencia Social	1.357.897	280.122.507	281.480.404	234.845	1.077.624	1.312.469
Seguridad Social	192.762	0	192.762	9.062.390	0	9.062.390
Educación y Cultura	23.541.858	388.361.293	411.903.151	1.540.566	1.047.180	2.587.746
Ciencia y Técnica	22.792.915	0	22.792.915	96.210.716	15.559.347	111.770.063
Trabajo	6.282.186	16.242.609	22.524.795	192.280	0	192.280
Vivienda y Urbanismo	3.056	1.598.855.371	1.598.858.427	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	10.606.544	222.187.284	232.793.828	237.809.288	102.184.544	339.993.832
Subtotal	78.140.176	2.535.261.217	2.613.401.393	348.446.778	119.868.695	468.315.473
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	7.473	1.530.424.589	1.530.432.062	2.663.395	0	2.663.395
Comunicaciones	0	17.750.000	17.750.000	674.385	0	674.385
Transporte	107.254.065	221.355.856	328.609.921	2.424.301.762	657.103.975	3.081.405.737
Ecología y Medio Ambiente	9.051.723	43.000	9.094.723	6.701.707	0	6.701.707
Agricultura	1.728.292	0	1.728.292	1.957.955	0	1.957.955
Industria	53.924	7.250.912	7.304.836	2.045.270	0	2.045.270
Comercio, Turismo y Otros Servicios	8.698.155	6.189.626	14.887.781	89.977	0	89.977
Seguros y Finanzas	0	0	0	659.002	0	659.002
Subtotal	126.793.632	1.783.013.983	1.909.807.615	2.439.093.453	657.103.975	3.096.197.428
TOTAL	328.163.018	4.329.525.083	4.657.688.101	2.788.187.983	776.972.670	3.565.160.653

RESUMEN	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Dir. %	Transf. %
-Administración Central	328.163.018	4.329.525.083	4.657.688.101	10,53%	84,78%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social	2.788.187.983	776.972.670	3.565.160.653	89,47%	15,22%
TOTAL	3.116.351.001	5.106.497.753	8.222.848.754	100,00%	100,00%
