

INVERSION PUBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Tercer Trimestre 2008


INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.


La Inversión Real Directa (IRD) abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. Su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$8.135,2 millones y el Crédito Vigente (CV) al 30/09/08 resultó de \$8.893,8 millones (suba de \$758,6 millones, 9,3%), con un devengado de \$5.041,4 millones (ver Gráfico N° 1):

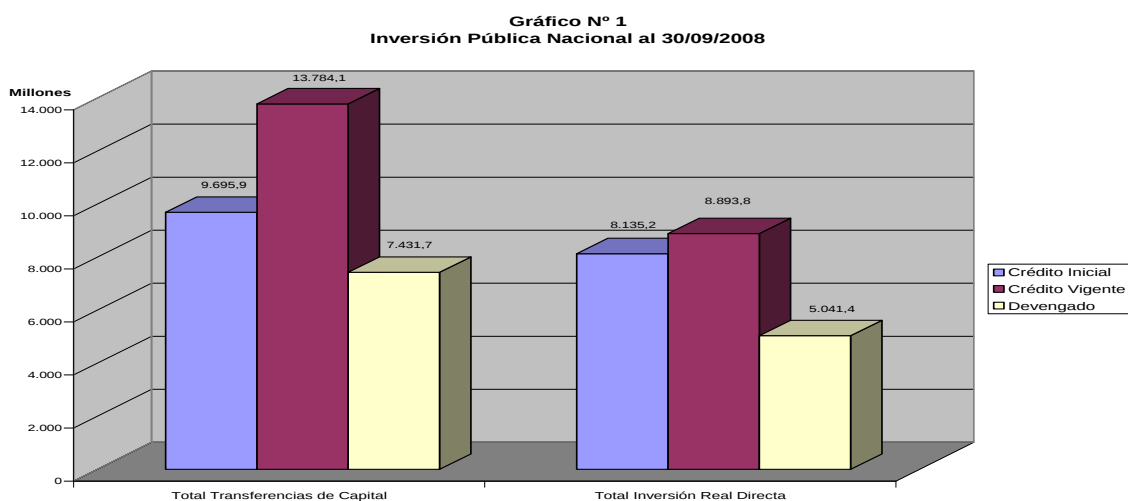

Los proyectos de inversión, principal componente de la IRD, atañen gastos para crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios públicos y su CV al 30/09/08 ascendió a \$7.176,9 millones, correspondiendo \$6.785,5 millones a construcciones (ejecución de \$4.514,9 millones), \$128,4 millones a maquinarias y equipos (\$65,2 millones) y \$263,0 millones a otros gastos (\$150,5 millones). Asimismo la IRD incluye la adquisición de bienes de capital, con \$1.452,3 millones para maquinarias y equipos (ejecución de \$270,2 millones), \$78,1 millones de activos intangibles (\$16,0 millones), \$158,1 millones de edificios e instalaciones (\$19,4 millones) y \$28,3 millones de otros conceptos (\$5,2 millones) (ver Gráfico N°2):

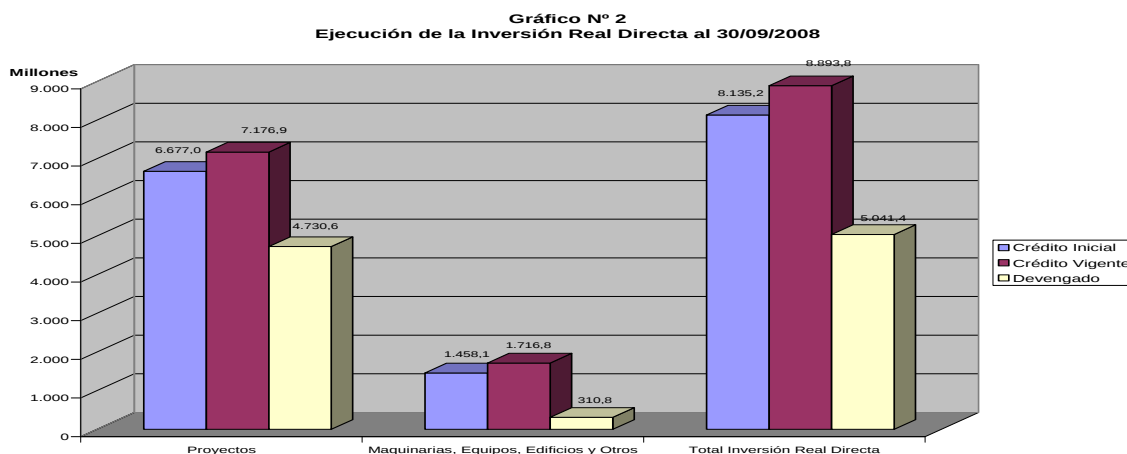

Por otra parte la Administración Nacional transfiere recursos a agentes económicos públicos o privados, para gastos de capital que impliquen un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al 30/09/08, sobre un CV de \$13.784,1 millones, las transferencias de capital ascendieron a \$7.431,7 millones (ver Gráfico N° 3):

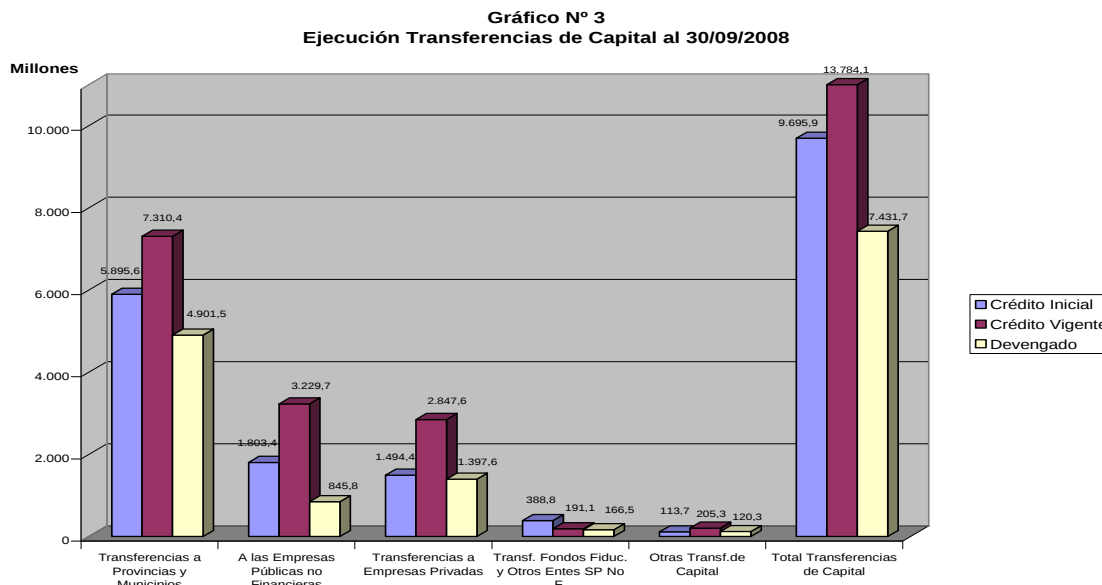

Al 30/09/08, de la ejecución de las transferencias de capital, \$4.901,5 millones (65,9%) correspondieron a provincias y municipios, \$1.397,6 millones (18,8%) a empresas privadas, \$845,8 millones (11,4%) a empresas públicas no financieras, \$166,5 millones (2,2%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$120,3 millones (1,6%) a otros tipos. El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la Ejecución de la Inversión Total durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/09/08 (en pesos)				
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejecución
Inversión Real Directa	8.135.156.226	8.893.777.647	5.041.418.587	56,7%
Proyectos	6.677.014.128	7.176.947.506	4.730.610.468	65,9%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.458.142.098	1.716.830.141	310.808.119	18,1%
Transferencias de Capital	9.695.897.095	13.784.094.544	7.431.663.494	53,9%
Inversión Total	17.831.053.321	22.677.872.191	12.473.082.081	55,0%


Se observa que los proyectos registraron un mayor nivel de ejecución respecto al resto de los conceptos al cierre del tercer trimestre. Debe destacarse que los proyectos tuvieron un incremento de su crédito respecto al crédito inicial de \$499,9 millones (7,5%) mientras que las transferencias de capital arrojaron un incremento en el crédito inicial de \$4.088,2 millones (42,2%) y que para la adquisición de bienes de uso aumentó \$258,7 millones (17,7%).

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2008

La ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) alcanzó a \$5.041,4 millones al tercer trimestre, mientras que la tasa de crecimiento anual acumulativa alcanzó a 57,3% para el período 2004/2008.

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 30/09

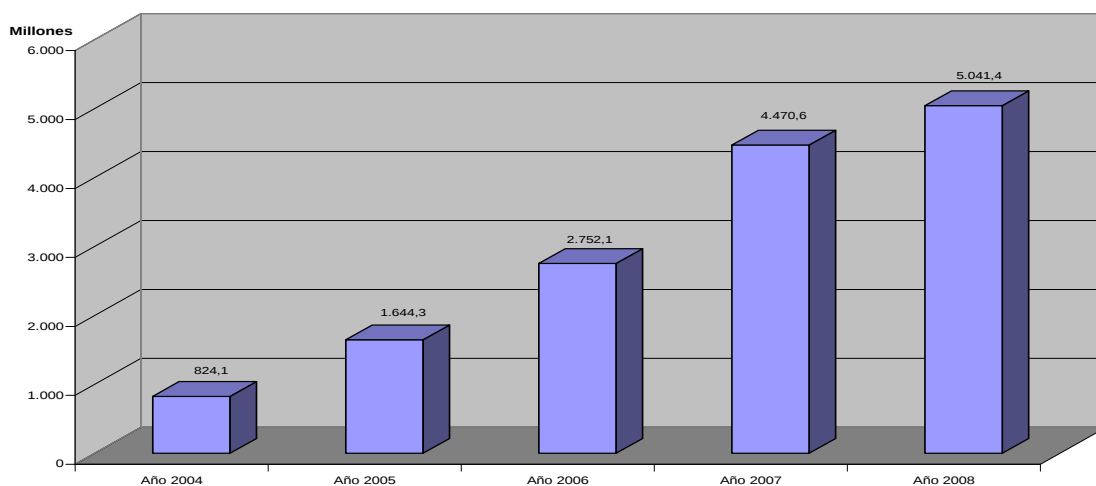

1- Según Nivel Institucional

Al 30/09/08 el Crédito Inicial destinado al financiamiento de la IRD aumentó en \$758,6 millones (9,3%), de acuerdo al detalle por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 30/09/08 (en pesos)				
Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	2.103.586.233	2.285.797.713	561.118.678	24,5%
Organismos Descentralizados	5.951.719.993	6.517.679.934	4.455.268.956	68,4%
Instituciones de Seguridad Social	79.850.000	90.300.000	25.030.953	27,7%
Total	8.135.156.226	8.893.777.647	5.041.418.587	56,7%


A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 30/09/08 y la variación interanual respecto a 2007:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada Tercer Trimestre 2007/2008 (en miles de pesos)			
Organismo	Ejecución al 30/09/07	Ejecución al 30/09/08	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	3.120,8	3.555,4	13,9%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	253,7	369,3	45,6%
Órgano de Control de Concesiones Viales	325,3	292,9	-10,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	286,9	259,3	-9,6%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	69,5	119,3	71,7%
Total	4.056,2	4.596,2	13,3%

2- Según Fuente de Financiamiento

Alrededor del 78% de la inversión realizada al 30/09/08 se financió con Tesoro Nacional. A continuación se expone un gráfico relativo a las fuentes de financiamiento del gasto:

Gráfico N° 5
Inversión Real Directa-Comparativo 2007/2008-Fuente de Financiamiento

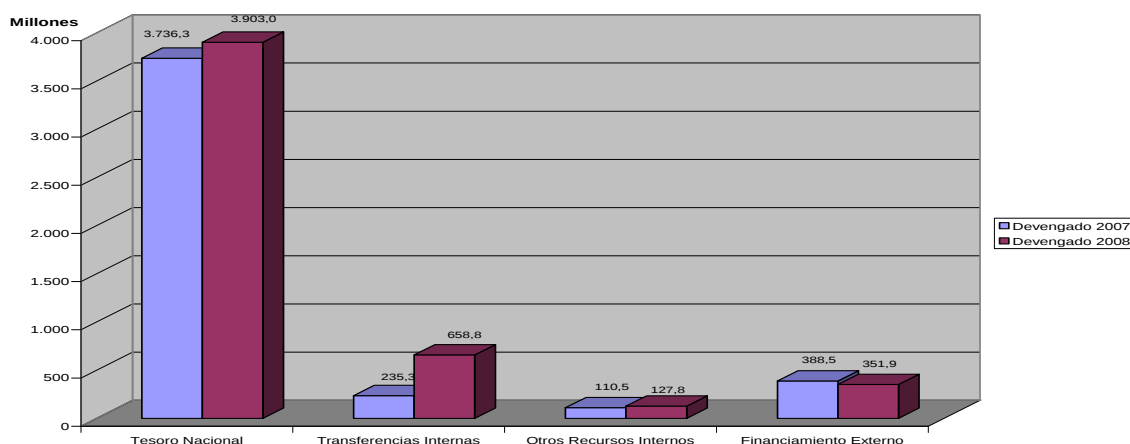


Al 30/09/08 la ejecución se incrementó en Tesoro Nacional (\$166,7 millones, un 4,5%), en Transferencias Internas (\$423,4 millones, un 179,9%) y en otros recursos internos (\$17,3 millones, un 15,6%). Por su parte, el financiamiento externo disminuyó (\$36,6 millones, un 9,4%), de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 30/09/08 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	5.632.487.583	6.397.813.976	3.902.980.212	61,0%
Transferencias Internas	772.005.000	787.119.000	658.773.077	83,7%
Otros Recursos Internos	441.125.526	611.640.332	127.790.246	20,9%
Financiamiento Externo	1.289.538.117	1.097.204.339	351.875.052	32,1%
Total	8.135.156.226	8.893.777.647	5.041.418.587	56,7%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$2.692,8 millones destinados a obras de construcción de rutas y al mantenimiento del sistema vial nacional, \$369,3 millones a saneamiento y cloacas y \$233,8 millones en corredores viales concesionados. Con **Transferencias Internas** se financiaron proyectos en rutas por \$597,8 millones y mediante el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte por \$59,1 millones. Con **Financiamiento Externo** sobresalió la ejecución de \$261,6 millones destinados a proyectos de construcciones de rutas.

Gráfico N° 6
Inversión Real Directa-Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 30/09//2008

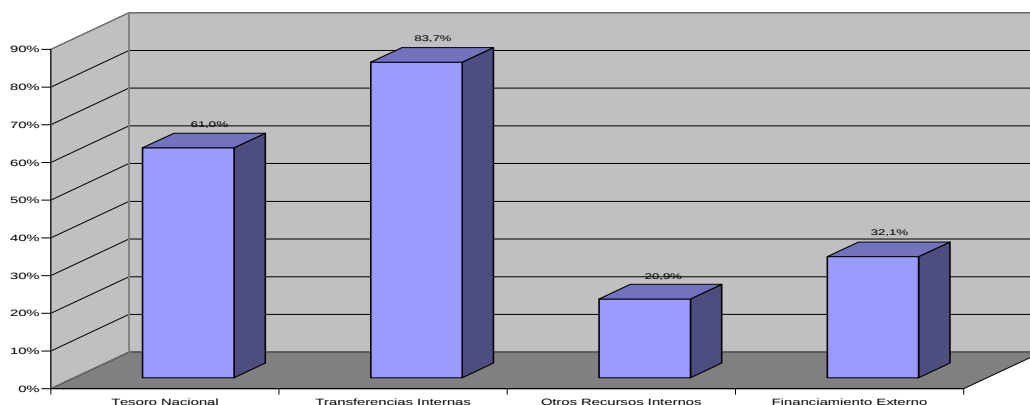

3- Según Ubicación Geográfica

La Inversión Real Directa se concentró (21%) en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa. Las provincias que presentaron menor inversión fueron Tierra del Fuego, San Luis, La Pampa y Misiones (2,7% en conjunto).

En la **provincia de Buenos Aires** se ejecutaron \$457,4 millones incluyendo, principalmente, proyectos en rutas y corredores viales (311,3 millones) y las obras hídricas de saneamiento (\$77,6 millones).

En la **provincia de Santa Fe** la ejecución alcanzó los \$335,7 millones y correspondió, mayormente, a construcciones viales (\$131,0 millones) sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286 (\$42,8 millones) y en la Ruta Nacional N° 168 (\$25,8 millones). Asimismo mostró grandes avances la construcción del Acueducto Centro Oeste Santa Fe (\$65,4 millones) y del Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (\$82,8 millones).

En la **provincia de Formosa** se devengaron \$254,5 millones, comprendiendo, entre otras, las obras en la Ruta Nacional N° 86 General Güemes Posta Cambio a Salazar (\$65,2 millones), Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Nacional N° 81 Límite con Chaco (\$39,7 millones) y en la Optimización del Sistema de Distribución de Agua Potable (\$52,9 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se analiza la ejecución física de los proyectos de inversión al 30/09/08, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 71,7% del costo total de los proyectos en cartera y el 81,5% de la ejecución al tercer trimestre:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/07	Devengado 01/01 al 30/09/08	% Dev. Acumulado al 30/09/08/ CT
DNV	Construcción de Rutas	37.903.238.373	8.223.615.170	2.675.053.572	28,75
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	10.401.054.126	2.814.902.000	588.332.717	32,72
Sec. de Transporte	Soterramiento Corredor Ferroviario Caballito-Moreno	2.798.956.410	0	180.778	0,01
DNV	Mantenimiento de Rutas	1.902.648.199	155.440.900	280.828.408	22,93
CONAE	Misiones Satelitales	786.260.882	276.871.672	110.933.145	49,32
Sec. de Transporte	Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa, Santa Fe	195.055.242	80.620.813	83.673.114	84,23
Sec. Rec. Hídricos	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	156.926.500	0	7.568.068	4,82
ENOHSA	Construcción Acueducto Centro Oeste Santa Fe	159.497.933	83.265.404	65.854.159	93,49
OCCOVI	Autopista Mesopotámica, Tramo Ceibas-Gualedguaychú	155.023.867	18.128.037	41.321.365	38,35
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	139.827.069	67.385.870	33.028.835	71,81
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	131.539.952	72.136.786	52.907.685	95,06
OCCOVI	Vinculación y Remodelación RP 36 – Rotonda Gutiérrez y RP II Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires	126.625.949	104.494.172	18.004.821	96,74
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	123.863.414	102.588.415	17.759.124	97,16
OCCOVI	Autopista Luján-Mercedes Secciones I y III, Buenos Aires	108.564.115	31.303.978	27.331.000	54,01
ENOHSA	Planta Tratamiento Cloacal Subsistema Rawson, San Juan	105.672.929	53.485.348	29.068.643	78,12
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo	104.723.411	54.861.975	18.516.208	70,07
ENOHSA	Planta Potabilizadora y Sistema de Captación, Entre Ríos	103.487.098	80.594.912	22.887.707	100,00
ENOHSA	Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Villa Carlos Paz, Córdoba	85.348.848	66.409.246	16.285.896	96,89
OCCOVI	RN N°9 Tramo Campana-Zárate, Buenos Aires	80.266.598	46.069.730	20.115.282	82,46
Sutotal		55.568.580.915	12.332.174.428	4.109.650.527	29,59
Total I.R.D.		77.517.118.382	13.725.408.061	5.041.418.587	24,21

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2008


A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV)

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.154 kilómetros de la red vial nacional y, durante el tercer trimestre de 2008, ha realizado intervenciones en 5.371 kilómetros de rutas provinciales.

Construcción de Rutas

La ejecución financiera, al 30/09/08 acumuló el 28,8% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 599 kilómetros (provincias de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santiago del Estero), finalizándose el tramo en la Ruta Nacional N° 40 Río Agua Clara-Río Las Cuevas, provincia de Catamarca. En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 1.216 kilómetros, concluyéndose los tramos Ruta Nacional N° 23 Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos (76,8 Km.) en la provincia de Río Negro, Ruta Nacional N° 76 Vinchina-Pircas Negras (30,0 Km.) en la provincia de La Rioja, Ruta Nacional N° 95 Empalme Ruta Provincial N° 286 (29,2 Km.) en la provincia de Santa Fe y otros por 413 kilómetros. En **Obras en Corredores Viales Concesionados** se encontraban en ejecución 249 kilómetros, terminándose 279 Kilómetros en las provincias de Santa Fe (164 Km.), Santiago del Estero (44 Km.), Córdoba (40 Km.) y Buenos Aires (31 Km.). Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 626 kilómetros (Corredor 28 de Resistencia-Límite con Paraguay y Corredor 31 de Bahía Blanca-Empalme Ruta Nacional N° 5). Por último, en el subprograma **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.410 kilómetros, concluyéndose 770 Km. en las provincias de Buenos Aires (207 Km.), Formosa (167 Km.), Santa Cruz (92 Km.) y La Rioja (34 Km.), entre otras. Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el tercer trimestre de los últimos 8 ejercicios:

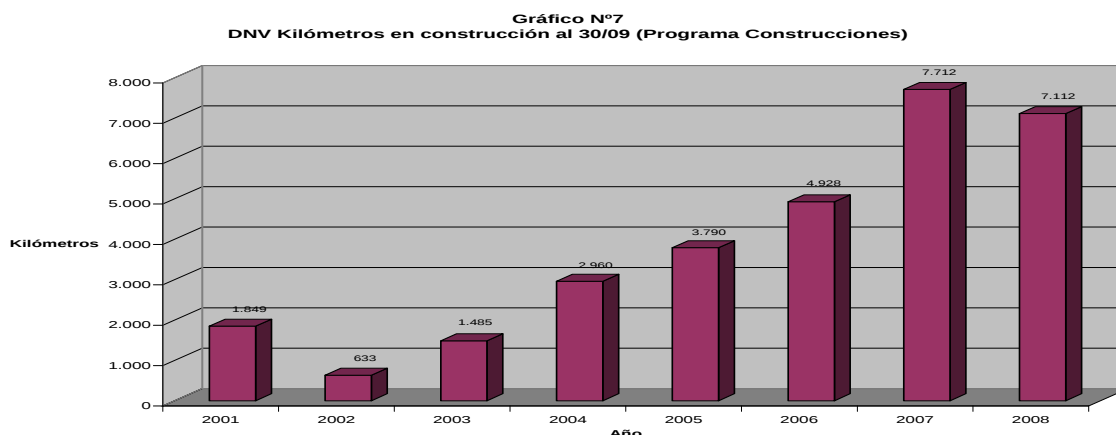

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.)

Al 30/09/08 las mallas en ejecución ascendían a 2.462 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.685 Km. para C.Re.Ma II, a 5.702 Km. C.Re.Ma III y a 2.968 Km. para C.Re.Ma IV. Durante el año 2008 se finalizaron las Mallas 102A (250 km. en la provincia de Chubut), Malla 502 (271 km. en la Provincia de Entre Ríos) y Malla 202B (96 km. en la provincia de Santa Fe).

Mantenimiento de Rutas

Al 30/09/08 la DNV efectuó el mantenimiento directo de caminos en 5.533 kilómetros (equipos y mano de obra propios) e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de**

Funciones Operativas (se fija por convenio, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.256 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	5.533,0
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.256,0
Total	11.789,0

Durante el tercer trimestre las obras del **Sistema Modular** incluyeron trabajos en 2.563 kilómetros en las provincias de Salta (694 Km.), Chaco (328 Km.), Mendoza (429 Km.), Santa Fe (14 Km.), Catamarca (254 Km.), Buenos Aires (1 Km.) y Chubut (843 Km.), concluyéndose tramos en la Ruta Nacional N° 25 Los Altares - Empalme Ruta Nacional N° 40 (278 Km.), Ruta Nacional N° 40 Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 (289 Km.) y Ruta Nacional N° 34 Empalme Ruta Nacional N° 50 - Límite con Bolivia Empalme Ruta Nacional N° 34 (249,3 Km.). Asimismo comenzaron otras obras en la citada Ruta Nacional N° 40 Empalme Ruta Nacional N° 25 - Empalme Ruta Provincial N° 56 (272 Km.).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

Misiones Satelitales

Al 30/09/08 dentro del Plan Espacial 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso		
Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia (A.S.I.)/Bélgica (Centro Espacial de Lieja)/Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA/Italia/Bélgica/Brasil/Dinamarca/Francia

En la obra **Misión SAOCOM** se realizó la licitación de los servicios de lanzamiento y la compra de componentes electrónicos de vuelo. En la obra **Misión CESAR (SAC-D)** se comenzó con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la firma INVAP, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA)

Proyectos Cloacales y de Saneamiento

Al 30/09/08 continuó la ejecución del proyecto **Construcción de Colectores Cloacales, Estación Elevadora y Planta Depuradora del Lago San Roque-Carlos Paz** (provincia de Córdoba, avance físico acumulado del 96,89%), beneficiando a 100.000 personas y la **Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson** (provincia de San Juan) con un 67,34% acumulado físico. Asimismo se prevé la finalización de las obras **Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa** (avance del 92,71%), **Planta Depuradora Cloacal Merlo** en Buenos Aires, (avance del 90,61%), **Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de**

Captación en Entre Ríos (avance del 100%) y **Acueducto Centro Oeste Santa Fe** (avance del 96,37%).

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI)

A continuación se detallan los proyectos que constituyen la cartera del OCCOVI:

Cuadro N° 7. Programas y Proyectos de Inversión del OCCOVI. En miles de \$

Programas	CV Proyectos	Devengado Proyectos	Q de Proy. en 2008	Q de Proy. Devengado al 30/09/08	Q Proy. con Ejecución Física 30/09/08	Q de Proy. a finalizar 2008
17 - Infraestructura en Concesiones Viales	583.428	381.930	63	27	26	14
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas	175.680	111.164	24	9	8	7
19 - Obras de Mejora en Corredores Viales Nacionales	126.797	92.621	15	4	4	3
Totales	885.905	585.715	102	40	38	24

Sobresalen la **Autopista Mesopotámica** Tramo Ceibas-Gualeguaychú (ejecución física acumulada de 29% y financiera de 90,6%), las obras **Ruta Provincial N° 25** Tramo Pilar-Acceso Norte-Acceso Oeste (acumulado físico de 49,80% y financiero de 57,5%), **Ruta Nacional N° 9 Tramo Campana-Zárate** (acumulado físico de 82,68% y financiero de 54,9%) y **Ruta Nacional N° 12** Construcción Terceras Trochas (acumulado físico de 73,5% y financiero de 99,9%).

Secretaría de Transporte

Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito – Moreno Línea Sarmiento

El proyecto integra el plan de modernización de la Línea de Ferrocarril Sarmiento y postula eliminar las interferencias entre el servicio ferroviario y el entorno urbano y la posibilidad de accidentes, como así también incrementar la capacidad de transporte del servicio. Al 30/09/08, sobre un CV de \$2,0 millones, la ejecución financiera ascendió a \$181 miles.

Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario por encima de la Laguna La Picasa

El proyecto (ubicado en la provincia de Santa Fe) restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la República de Chile. Al 30/09/08 arrojó una ejecución física trimestral del 45,53%, mientras el total acumulado ascendió al 94,01%.

Ampliación Puerto Caleta Paula

Se encuentra ubicado próximo a la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur y una longitud de 150 metros en sentido este-oeste y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 30/09/08, la ejecución física resultó del 23,85%, con un total acumulado de 64,85%.

Recursos Hídricos

Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional

El proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional abarca la construcción e instalación del instrumental de nuevas estaciones de medición, la contratación del

servicio de ingeniería para la operación y mantenimiento y la sistematización de la base de datos hidrometeorológicos y de calidad de agua. El 28/02/08 se firmó el contrato del proyecto y la ejecución física al 30/09/08 ascendió al 4,73%.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2008

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 30/09/08 (en pesos)				
Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	9.111.855.942	12.698.259.331	6.494.864.834	51,1 %
Organismos Descentralizados	584.041.153	1.085.835.213	936.798.660	86,3 %
TOTAL	9.695.897.095	13.784.094.544	7.431.663.494	53,9 %

En cuanto al comportamiento interanual de las transferencias de capital se registra un aumento de \$1.579,3 millones respecto al tercer trimestre 2007 **(27,0%)** y de \$1.100,9 millones **(17,4%)** respecto a 2006. A continuación se expone una tabla que muestra los Organismos con mayor ejecución al 30/09/08 y la variación interanual respecto a 2007:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital. Comparada Tercer Trimestre 2007/2008 (en miles de pesos)

Organismo	Ejecución al 30/09/07	Ejecución al 30/09/08	Variación
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	4.670,4	5.325,7	14,0%
Dirección Nacional de Vialidad	485,6	750,0	54,4%
Ministerio de Educación	216,7	206,6	-4,7%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	121,1	151,9	25,4%
Total	5.493,8	6.434,2	17,1%

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para infraestructura habitacional, políticas energética y ferroviaria, obras públicas y las destinadas a las empresas públicas AySA S.A., NASA S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras.


2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 30/09/2008 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	8.018.976.656	9.952.143.718	6.410.874.199	64,4%
Recursos con Afectación Específica	248.902.224	311.555.500	199.222.025	63,9%
Otros recursos internos	26.038.050	44.846.123	23.445.178	52,3%
Financiamiento Externo	1.401.980.165	3.475.549.203	798.122.092	23,0%
Total	9.695.897.095	13.784.094.544	7.431.663.494	53,9%

El **Tesoro Nacional** concentró el 86,3% de las transferencias sobresaliendo las destinadas al desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$1.569,5 millones), a energía eléctrica (\$948,2 millones), a infraestructura social (\$318,9 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$305,5 millones), a mejoramiento habitacional (\$210,2 millones) y para urbanización de asentamientos precarios (\$159,6 millones). También se realizaron transferencias a empresas privadas de transporte ferroviario (\$290,8 millones), a AySA S.A.(\$370,6 millones), a NASA S.A. (\$310,0 millones), a "Más Escuelas, Mejor Educación" (\$178,0 millones), al Dique y Central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$143,3 millones), al saneamiento (\$140,8 millones) y a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$90,0 millones).

Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo Interior (\$182,4 millones). El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a la Interconexión 3º tramo Yacyretá (\$339,6 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$178,2 millones), al programa Mejoramiento de Barrios (\$118,6 millones) y para Atención de Emergencias por Inundaciones (\$51,0 millones).

Gráfico N° 9
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 30/09/2008

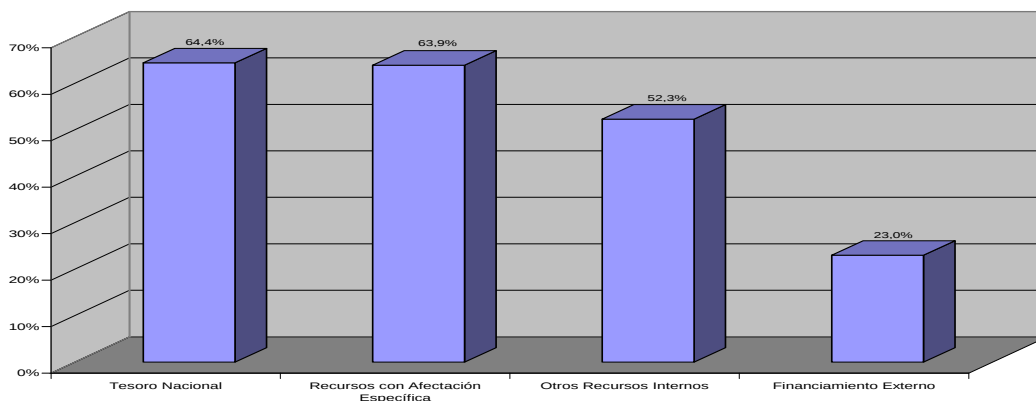

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron (alrededor del 65,1%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Tucumán y San Juan. En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (28,8%) se destacaron, entre otros, los fondos para AySA S.A. (\$370,6 millones), a NASA S.A. (\$310,0 millones) y a TBA S.A. (\$109,4 millones).

Las asignaciones inherentes a la **provincia de Buenos Aires** (14,1%) comprendieron, mayormente, al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$469,2 millones), urbanización de asentamientos precarios (\$107,0 millones), a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$102,1 millones) y para infraestructura urbana en municipios (\$71,1 millones).

En la provincia de **Santa Cruz** (13,1% del total) sobresalieron las obras viales por convenio (\$606,8 millones), para infraestructura social y obras municipales (\$115,4 millones), los fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$90,0 millones) y las obras para agua potable y desagües (\$74,9 millones). En la provincia de **Tucumán** (5,0%) se incluyeron transferencias al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$115,0 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$106,0 millones) y a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$50,5 millones).

Las transferencias a la provincia de **San Juan** (4,1%) abarcaron, fundamentalmente, el financiamiento del dique y central Hidroeléctrica Los Caracoles (\$143,3 millones) y al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$86,2 millones).

Por su parte las transferencias con ubicación geográfica **interprovincial** (asociadas a dos o más jurisdicciones), se concentraron en el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$166,5 millones) y en otras transferencias a empresas privadas en el marco del programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica (\$100,0 millones).

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	38.790.352	38.536.653	-253.699	-0,7%
Presidencia de la Nación	50.839.980	38.166.851	-12.673.129	-24,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	37.910.304	68.830.610	30.920.306	81,6%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	203.909.252	219.828.960	15.919.708	7,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	80.002.930	64.980.930	-15.022.000	-18,8%
Ministerio de Defensa	74.002.411	108.779.188	34.776.777	47,0%
Ministerio de Economía y Producción	45.664.629	73.574.750	27.910.121	61,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	6.104.776.270	6.541.315.304	436.539.034	7,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	760.000	510.000	-250.000	-32,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.990.000	1.940.000	-4.050.000	-67,6%
Ministerio de Salud	18.435.000	8.951.260	-9.483.740	-51,4%
Ministerio de Desarrollo Social	15.933.000	11.533.000	-4.400.000	-27,6%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	6.677.014.128	7.176.947.506	499.933.378	7,5%
Poder Legislativo Nacional	16.424.720	25.095.620	8.670.900	52,8%
Poder Judicial de la Nación	60.545.965	145.543.021	84.997.056	140,4%
Ministerio Público	14.855.425	21.799.175	6.943.750	46,7%
Presidencia de la Nación	36.175.020	66.593.486	30.418.466	84,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	106.127.197	120.550.929	14.423.732	13,6%
Ministerio del Interior	12.050.643	21.654.743	9.604.100	79,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.737.549	15.566.549	-1.171.000	-7,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	344.910.908	381.255.272	36.344.364	10,5%
Ministerio de Defensa	185.366.071	180.214.724	-5.151.347	-2,8%
Ministerio de Economía y Producción	138.115.168	175.082.961	36.967.793	26,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	240.795.504	217.080.183	-23.715.321	-9,8%
Ministerio de Educación	4.350.515	8.795.128	4.444.613	102,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	31.677.000	39.847.000	8.170.000	25,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131.184.600	156.137.100	24.952.500	19,0%
Ministerio de Salud	87.576.813	92.762.654	5.185.841	5,9%
Ministerio de Desarrollo Social	9.323.000	16.925.100	7.602.100	81,5%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	21.926.000	31.926.496	10.000.496	45,6%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.458.142.098	1.716.830.141	258.688.043	17,7%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	8.893.777.647	758.621.421	9,3%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 30/09/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	38.790.352	38.536.653	30.617.270	18.006.536	46,7%
Presidencia de la Nación	50.839.980	38.166.851	12.459.777	9.454.356	24,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	37.910.304	68.830.610	19.959.014	14.808.283	21,5%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	203.909.252	219.828.960	141.385.327	121.708.332	55,4%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	80.002.930	64.980.930	38.129.471	11.958.764	18,4%
Ministerio de Defensa	74.002.411	108.779.188	53.855.550	36.175.170	33,3%
Ministerio de Economía y Producción	45.664.629	73.574.750	42.962.295	22.423.919	30,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	6.104.776.270	6.541.315.304	4.539.942.432	4.493.520.286	68,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	760.000	510.000	185.587	185.587	36,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.990.000	1.940.000	1.669.016	1.156.202	59,6%
Ministerio de Salud	18.435.000	8.951.260	2.057.363	1.213.033	13,6%
Ministerio de Desarrollo Social	15.933.000	11.533.000	0	0	
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	6.677.014.128	7.176.947.506	4.883.223.102	4.730.610.468	65,9%
Poder Legislativo Nacional	16.424.720	25.095.620	6.261.169	3.874.501	15,4%
Poder Judicial de la Nación	60.545.965	145.543.021	42.261.818	10.073.676	6,9%
Ministerio Público	14.855.425	21.799.175	7.995.874	7.674.545	35,2%
Presidencia de la Nación	36.175.020	66.593.486	19.033.102	14.881.744	22,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	106.127.197	120.550.929	6.315.139	4.540.173	3,8%
Ministerio del Interior	12.050.643	21.654.743	13.886.342	7.745.723	35,8%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	16.737.549	15.566.549	6.819.238	5.893.588	37,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	344.910.908	381.255.272	119.470.042	93.183.303	24,4%
Ministerio de Defensa	185.366.071	180.214.724	51.435.022	32.170.977	17,9%
Ministerio de Economía y Producción	138.115.168	175.082.961	30.287.225	22.459.021	12,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	240.795.504	217.080.183	46.150.982	37.455.962	17,3%
Ministerio de Educación	4.350.515	8.795.128	1.722.223	865.750	9,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	31.677.000	39.847.000	29.048.404	23.142.107	58,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131.184.600	156.137.100	32.676.013	32.435.578	20,8%
Ministerio de Salud	87.576.813	92.762.654	14.972.513	11.408.003	12,3%
Ministerio de Desarrollo Social	9.323.000	16.925.100	6.370.392	3.003.468	17,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	21.926.000	31.926.496	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.458.142.098	1.716.830.141	434.705.498	310.808.119	18,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	8.893.777.647	5.317.928.600	5.041.418.587	56,7%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
5						Poder Judicial de la Nación							
	320					CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.810.000	2.308.909	15.352	0,00	100,00	s/i	
				51		Adecuación para instalación Subdirección de Notificaciones	2.810.000	2.308.909	15.352	0,00	100,00	s/i	
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	3.190.000	3.066.430	0	50,00	50,00	0,00 0,00	
				61		Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Yrigoyen 2041	3.150.000	3.066.430	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				68		Construcción de locales subsuelo Avenida de los Inmigrantes	40.000	0	0	100,00	0,00	0,00 100,00	
		22				Justicia de Casación Penal							
				1		Adecuación y Remodelación Sede Judicial	3.090.000	3.863.018	3.466.585	35,00	65,00	s/i	
				51		Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	3.050.000	3.575.682	3.179.249	70,00	30,00	s/i	
				52		Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 Capital Federal	40.000	287.336	287.336	0,00	100,00	s/i	
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
				1		Fuero Criminal y Correccional							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	0	0	57,00	43,00	0,00 0,00	
				52		Construcción Sala de Audiencias y Adecuación Edificio Lavalle	40.000	0	0	57,00	43,00	0,00 0,00	
				2		Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	2.440.000	0	0	61,00	39,00	0,00 0,00	
				53		Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 Capital Federal	2.440.000	0	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
		24				Justicia Federal							
				3		Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	3.248.100	11.232.240	5.298.990	63,00	37,00	s/i	
				51		Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	3.248.100	11.232.240	5.298.990	63,00	37,00	s/i	
				4		Fuero Federal de la Seguridad Social							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (****)	0	237.116	237.114	100,00	0,00	0,00 100,00	
				51		Adecuacion Edificio Anexo M.T.de Alvear 1840-Capital Federal	0	237.116	237.114	100,00	0,00	0,00 100,00	
				7		Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	845.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				51		Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	550.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				52		Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	295.000	0	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				10		Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.890.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				51		Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.860.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				52		Tribunales Orales de San Luis - Construcción Edificio	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				11		Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	1.354.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				51		Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio	925.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				52		Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe	429.000	0	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				12		Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	2.085.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				52		Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				53		Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio	985.000	0	0	0,00	100,00	0,00 0,00	
				15		Área Cámara Resistencia							

AI 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al			Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
335	21	16	17	18	2	Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	650.000	1.668.171	1.206.503	0,00	100,00	s/i	
					51	Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	650.000	1.668.171	1.206.503	0,00	100,00	s/i	
						Área Cámara de Córdoba							
					1	Ampliación y Remodelación Sede Judicial	662.900	721.152	59.377	0,00	100,00	s/i	
					51	Reparación Edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	662.900	721.152	59.377	0,00	100,00	s/i	
						Área Cámara San Martín							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.245.000	500.000	0	70,00	30,00	0,00	0,00
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					53	Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio	1.185.000	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Juzgado Federal de Campana Adecuación Edificio a Adquirir	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Área Cámara Tucumán							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	40.000	1.718.365	1.287.035	73,00	27,00	s/i	
					52	Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	40.000	1.718.365	1.287.035	73,00	27,00	s/i	
						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)							
						Justicia de Máxima Instancia							
					1	Refacciones en el Palacio de Justicia	2.199.733	973.733	451.609	15,03	50,00	s/i	
					51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	200.000	970.000	451.609	69,25	30,00	s/i	
					53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.137.950	950	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					57	Reparación Integral de la Terraza del Palacio de Justicia	100.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					62	Traslado Biblioteca al Subsuelo del Palacio de Justicia	361.783	783	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad Buen	400.000	1.000	0	0,00	90,00	0,00	0,00
					2	Refacciones en Sedes Periciales	3.030.050	3.440.050	2.908.148	37,20	52,80	s/i	
					56	Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718	3.030.050	3.430.050	2.898.941	41,00	49,00	s/i	
					70	Adecuación Locales P.H. Hem. y Locales Anexos Tras.Cuerpo Médico Fc	0	10.000	9.206	85,00	15,00	s/i	
					3	Refacciones Varias	590.412	675.412	209.580	0,69	99,31	s/i	
					76	Reformas - Edificio Lavalle 1250	590.412	675.412	209.580	0,00	100,00	s/i	
					4	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano	671.510	3.360.010	2.591.902	40,00	57,00	s/i	
					51	Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia y Talcahuano	671.510	3.360.010	2.591.902	40,00	57,00	s/i	
					5	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	0	50.400	43.819	78,00	22,00	s/i	
					51	Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	0	50.400	43.819	78,00	22,00	s/i	
					6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	2.426.483	256.483	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	2.426.483	256.483	0	0,00	65,00	0,00	0,00
					7	Mejoras en el Palacio de Justicia	2.012.174	10.174	0	0,00	56,00	0,00	0,00
51	Mejoras en el Palacio de Justicia	2.012.174	10.174	0	0,00	56,00	0,00	0,00					
8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia	1.740.484	705.484	230.523	20,00	75,00	s/i						
51	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia	58.800	239.800	230.523	20,00	75,00	s/i						
52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia N°1 al N°12 -	1.681.684	465.684	0	0,00	55,00	0,00	0,00					
9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires	520.828	30.828	0	0,00	55,00	0,00	0,00					
51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad Buenos Aires	520.828	30.828	0	0,00	55,00	0,00	0,00					
10	Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.008.678	18.678	0	0,00	35,00	0,00	0,00					
51	Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.008.678	18.678	0	0,00	35,00	0,00	0,00					
20						Presidencia de la Nación							
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
		17				Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
					4	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales	1.300.000	3.812.160	173.479	0,00	100,00	7,00	0,07
					51	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques Nacionales	1.300.000	3.812.160	173.479	0,00	100,00	7,00	0,07
				20		Areas Protegidas y Conservación de Corredores-BIRF 7520/AR (6)							
					36	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lanin (6)	0	197.722	0	0,00	s/i	s/i	
					58	Centro de Interpretación en San Martin de Los Andes (6)	0	197.722	0	0,00	s/i	s/i	
				21		Conservación de la Biodiversidad GEF TF 028372/AR							
					38	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional San Guillermo	1.000.000	2.111.597	1.978.926	51,25	48,75	18,00	0,37
					52	Obras en Junta de la Palca	1.000.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en Agua del Godo (1)	0	2.111.597	1.978.926	0,00	s/i	s/i	
					39	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Quebrada del Condori	0	15.500	15.355				
					55	Refuncionalización de Viviendas en Area Trinidad (6)	0	15.500	15.355				
				40		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Copo	400.000	914.801	838.691	53,82	46,18	34,00	0,74
					53	Centro Operativo Área Pobladores	200.000	543.801	153.801	15,00	85,00	0,00	0,00
					54	Centro Operativo Área Robles	200.000	371.000	684.890	92,62	7,38	7,00	0,95
				41		Mejoras e Infraestructura Parque Nacional en Formación Monte León	873.000	1.196.591	747.971	94,86	5,14	5,00	0,97
					51	Obras Etapa I - Infraestructura	123.000	96.511	96.511	98,00	2,00	0,00	0,00
					52	Adecuación Galpón de Esquila Como Centro de Interpretación	750.000	1.100.080	651.461	0,00	100,00	10,00	0,10
					43	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya(1)	0	415.000	415.000	0,00	s/i	s/i	
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Mburucuya(1)	0	415.000	415.000	0,00	s/i	s/i	
				22		Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-AR							
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR	7.111.350	6.511.350	117.174	59,00	41,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín BID 1648/OC-AR	7.111.350	6.511.350	117.174	59,00	41,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AI	6.915.600	5.185.500	630.039	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi BID 1648/OC-AI	6.915.600	5.185.500	630.039	50,00	50,00	0,00	0,00
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR	2.790.560	1.392.560	717.216	65,00	35,00	9,00	0,26
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces BID 1648/OC-AR	2.790.560	1.392.560	717.216	65,00	35,00	9,00	0,26
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR	6.065.490	2.265.490	29.409	0,00	100,00	1,00	0,01
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo BID 1648/OC-AR	6.065.490	2.265.490	29.409	0,00	100,00	1,00	0,01
116						BIBLIOTECA NACIONAL							
				25		Servicios de la Biblioteca Nacional							
					1	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Ai	1.621.000	1.651.600	1.275.718	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Ai	1.621.000	1.651.600	1.275.718	0,00	0,00	0,00	0,00
301						SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION							
				1		Actividades Centrales							
					2	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos (****)	1.360.000	1.360.000	511.850	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	1.360.000	1.360.000	511.850	100,00	0,00	0,00	100,00
					3	Remodelación Casa de Gobierno Etapa II	16.665.980	6.357.980	420.675	76,18	23,82	2,36	0,10
					51	Remodelación Casa de Gobierno Etapa II	16.665.980	6.357.980	420.675	76,18	23,82	2,36	0,10
					4	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial (****)	0	308.000	67.788	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	0	308.000	67.788	100,00	0,00	0,00	100,00
337						SECRETARIA DE CULTURA							
				36		Difusión de la Música y Danza							
					1	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	10.000	10.000	9.991	94,34	5,66	90,50	15,99
					51	Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	10.000	10.000	9.991	94,34	5,66	90,50	15,99

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO						
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%			
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.			
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual				
25	317	31	37			Preservación y Exhibición Artística - Cultural										
			1			Mejoras en Museos	477.000	211.000	58.279	25,94	46,22	7,31	0,16			
			51			Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	100.000	7.956	72,80	27,20	13,40	0,49			
			52			Mejoras en el Museo Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	17,42	0,00	0,00			
			53			Mejoras en el Museo Roca	50.000	50.000	50.323	0,00	45,45	9,09	0,20			
			54			Mejoras en el Museo Mitre	42.000	2.000	0	0,00	25,93	0,00	0,00			
			55			Mejoras en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos	35.000	35.000	0	0,00	36,84	0,00	0,00			
			56			Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			57			Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			58			Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia - Ciudad de Bs.	50.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			59			Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			60			Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			61			Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			62			Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			63			Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	14.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00			
			38			Desarrollo y Promoción Cultural										
			5			Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	250.000	250.000	39.576	41,42	22,21	0,56	0,03			
			51			Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	50.000	0	88,44	11,56	0,00	0,00			
			52			Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	71,73	0,00	0,00			
			53			Obra en el Edificio de la Calle Alsina	75.000	75.000	0	0,00	35,05	0,00	0,00			
			54			Mejoras en el Edificio de la Calle México	50.000	50.000	0	2,76	33,56	0,00	0,00			
			55			Mejoras en el Palais de Glace	10.000	10.000	39.576	85,91	11,11	4,44	0,40			
			56			Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	25.000	0	0,00	13,51	0,00	0,00			
			6			Remodelación Edificio Festejo Bicentenario	4.000.000	4.000.000	1.407.219	27,22	54,87	29,53	0,54			
			51			Remodelación Edificio Festejo Bicentenario	4.000.000	4.000.000	1.407.219	27,22	54,87	29,53	0,54			
						Jefatura de Gabinete de Ministros										
						SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE										
						Coordinación de Políticas Ambientales										
						1			Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	3.000.000	10.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						51			Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	3.000.000	10.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						2			Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	1.300.000	50.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						51			Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	1.300.000	50.000	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						3			Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	2.000.000	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						51			Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	2.000.000	0	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						4			Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51			Construcción Accesoría Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	3.000.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						5			Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.700.000	50.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
			51			Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.700.000	50.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00			
			7			Construcción y Puesta en Marcha Planta Compostaje Rosario (6)	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
			51			Construcción y Puesta en Marcha Planta Compostaje Rosario (6)	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
			8			Construcción Puntos Verdes - Rosario (6)	0	595.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
			51			Construcción Puntos Verdes - Rosario (6)	0	595.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
			9			Refacción de la Planta de Tranferencia-Rosario (6)	0	200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			
			51			Refacción de la Planta de Tranferencia-Rosario (6)	0	200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00			

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

								FINANCIERO			FISICO				
								Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%	
								Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.	
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	Original	30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual		
35	106	1	10			Equipamiento para Minimizar, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	12.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Equipamiento para Minimizar, Recuperación y Reciclaje Residuos-Rosario	0	12.000.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			11			Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (6)	0	400.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza (6)	0	400.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			12			Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (6)	0	400.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza (6)	0	400.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			13			Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martin Sur (6)	0	56.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martin Sur (6)	0	56.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			14			Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Provincia de Bueno	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa Provincia de Bueno	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			15			Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón (6)	0	45.600	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón (6)	0	45.600	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			16			Construcción Relleno Sanitario Chubut (6)	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
			51			Construcción Relleno Sanitario Chubut (6)	0	100.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00		
		34				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC-AR									
		1				Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo BID 1059	26.910.304	54.724.010	14.808.283	5,00	42,00	9,00	0,21		
		51				Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza BID 1059/OC-AR (6)	0	14.664.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		52				Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza BID 1059/OC-AF	1.887.604	4.687.604	4.292.712	0,00	30,00	2,00	0,07		
		53				Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza BID 1059/OC-AR	15.190.500	25.540.006	10.515.571	16,00	74,00	28,00	0,38		
		54				Rectificación Avenida Carlos Pellegrini Villa Diamante - Lanús	6.712.200	6.712.200	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		55				Relleno Sanitario Cuenca Alta BID 1059/OC-AR	3.120.000	3.120.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00		
						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional									
						COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES									
						Actividades Centrales									
						3		Remodelación de la Sede Central de la CONAE	40.799	40.799	0	92,63	5,59	0,00	0,00
						51		Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CONAE	40.799	40.799	0	92,63	5,59	0,00	0,00
						4		Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I	464.201	1.244.201	747.239	0,00	8,44	8,39	0,99
						51		Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase I	464.201	1.244.201	747.239	0,00	8,44	8,39	0,99
						5		Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.000.000	1.000.000	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						51		Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	1.000.000	1.000.000	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						16		Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
						1		Infraestructura Terrestre	2.680.000	3.420.000	1.658.234	44,80	3,03	1,33	0,44
						0		Infraestructura Terrestre	150.000	150.000	0				
						51		Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.000.000	1.540.000	1.222.386	87,96	4,25	2,84	0,67
				52		Construcción del Instituto Gulich	5.000	5.000	0	13,98	0,12	0,00	0,00		
				55		Construcción Antena Multipropósito N° 3	5.000	155.000	94.262	14,33	0,11	0,00	0,00		
				56		Construcción Antena Multipropósito N° 4	5.000	5.000	0	0,00	0,11	0,00	0,00		
				57		Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	82,73	0,08	0,00	0,00		
				58		Construcción de Antenas Educativas	5.000	55.000	66.741	6,32	0,03	0,21	7,00		
				59		Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,07	0,00	0,00		
				60		Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	1.500.000	274.845	2,30	13,36	2,45	0,18		
				2		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	151.049.801	153.389.801	110.933.145	47,24	16,71	11,55	0,69		
				0		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	2.000.000	2.050.000	1.334.147						
				52		Misión SAOCOM	97.197.645	59.365.645	67.312.515	37,89	15,21	10,30	0,68		

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO								
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.					
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual						
307	1	16				53 Misión SABIA	16.604.761	16.604.761	3.016.337	15,19	68,61	13,13	0,19					
						54 Misión CESAR	35.247.395	75.369.395	39.270.146	57,57	27,53	26,74	0,97					
						4 Infraestructura Terrestre Etapa II	20.000	20.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00					
						51 Antena Multipropósito N° 5	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00					
						52 Antena Multipropósito N° 6	10.000	10.000	0	0,00	0,22	0,00	0,00					
						5 Subsistemas de Propulsión de Satélites	5.000	5.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00					
						51 Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	5.000	5.000	0	0,00	0,25	0,00	0,00					
						6 Construcción Satélite "SARE - 1"	1.500.000	1.500.000	0	0,29	33,33	0,00	0,00					
						51 Construcción Satélite "SARE - 1"	1.500.000	1.500.000	0	0,29	33,33	0,00	0,00					
						Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio												
						1 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	10.903.000	16.993.000	2.447.361	2,43	13,33	2,93	0,22					
						0 Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	103.000	103.000	0									
						51 Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	1.190.000	324.849	19,42	14,64	5,23	0,36					
						52 Configuración de Vehículo Espacial	10.000.000	15.700.000	2.122.512	1,01	13,95	2,90	0,21					
						Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen												
						1 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00					
						0 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0									
						51 Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,06	0,00	0,00					
						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO												
						Actividades Centrales												
						2 Remodelación Palacio San Martín	700.000	102.000	0	60,00	22,00	0,00	0,00					
						51 Remodelación Palacio San Martín	700.000	102.000	0	60,00	22,00	0,00	0,00					
						3 Culminación Auditorio Edificio Cancillería	460.000	102.000	0	70,00	30,00	10,00	0,33					
						51 Culminación Auditorio Edificio Cancillería	460.000	102.000	0	70,00	30,00	10,00	0,33					
						16 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Interr	945.000	102.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00					
						51 Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores, Comercio Interr	945.000	102.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00					
						17 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comerci	1.200.000	102.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00					
						51 Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores, Comerci	1.200.000	102.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00					
						Acciones Diplomáticas de Política Exterior												
						6 Construcción de la Embajada en Brasilia	18.972.414	18.972.414	5.013.200	0,00	65,00	20,00	0,31					
0 Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.148.000	316.317															
51 Construcción de la Embajada en Brasilia	18.972.414	17.824.414	4.696.884	0,00	65,00	20,00	0,31											
9 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	190.200	460.400	275.158	43,00	22,00	16,00	0,73											
51 Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	190.200	460.400	275.158	43,00	22,00	16,00	0,73											
10 Remodelación Consulado en Nueva York	500.000	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00											
51 Remodelación Consulado en Nueva York	500.000	0	0	0,00	9,00	0,00	0,00											
11 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.530.538	6.530.538	0	40,00	30,00	0,00	0,00											
51 Remodelación Embajada y Residencia en Washington	6.530.538	6.530.538	0	40,00	30,00	0,00	0,00											
12 Remodelación de la Embajada de Francia	3.829.442	3.829.442	0	0,00	84,00	0,00	0,00											
51 Remodelación de la Embajada de Francia	3.829.442	3.829.442	0	0,00	84,00	0,00	0,00											
15 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	2.200.000	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00											
51 Remodelación Residencia y Embajada en Países Bajos	2.200.000	2.200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00											
16 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	120.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00											
51 Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	120.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00											

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%	
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.	
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual		
40	326	21			17	Remodelación Residencia en Canberra, Australia	388.857	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación Residencia en Canberra, Australia	388.857	0	0	0,00	43,00	0,00	0,00	
					18	Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Puesta en Valor Inmueble Consulado en Punta Arenas, Chile	200.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					19	Remodelación Embajada,Residencia y Consulado en Lima-Perú (6)	0	638.657	0	0,00	s/i	s/i		
					51	Remodelación Embajada,Residencia y Consulado en Lima-Perú (6)	0	638.657	0	0,00	s/i	s/i		
						Desarrollo del Plan Antártico								
					15	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (6)	0	611.460	0	0,00	s/i	s/i		
					51	Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico (6)	0	611.460	0	0,00	s/i	s/i		
					16	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Jubany (6)	0	5.713.248	0	0,00	s/i	s/i		
					51	Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Jubany (6)	0	5.713.248	0	0,00	s/i	s/i		
					332	1				Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos				
	POLICIA FEDERAL ARGENTINA													
	Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes													
	22	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000						0	90,00	10,00	0,00	0,00
	51	Construcción Delegación Campana	156.000	156.000						0	90,00	10,00	0,00	0,00
	33	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Int	775.000	775.000						0	0,00	11,00	0,00	0,00
	51	Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia de Int	775.000	775.000						0	0,00	11,00	0,00	0,00
	34	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	850.000	850.000						0	0,00	100,00	0,00	0,00
	18					51	Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	850.000	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
37						Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños	780.000	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
51						Cuerpo Policía de Tránsito - Construcción de Vestuarios y Baños	780.000	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
43						Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
51						Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	67.000	67.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
48						Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	
51						Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	550.000	550.000	0	0,00	31,00	0,00	0,00	
51						Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas	560.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Ampliación y Mejoramiento de la División Operaciones Urbanas	560.000	560.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia									
					9	Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca	310.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación pisos 3º y 4º del Edificio Bartolomé Churruca-Visca	310.000	0	0	0,00	31,00	0,00	0,00	
					MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS									
					Actividades Centrales									
					3	Reparaciones Varias y Equipamiento Diversas Dependencias	270.000	280.000	53.788	99,59	0,41	9,92	24,20	
					51	Reparaciones Varias	180.000	190.000	28.268	100,00	0,00	0,00	100,00	
					52	Equipamientos Varios	45.000	45.000	2.762	90,08	9,92	9,92	1,00	
					53	Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	45.000	45.000	22.759	100,00	0,00	0,00	100,00	
					Política e Infraestructura Penitenciaria									
					10	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	880.260	880.260	880.260	0	10,00	0,00	0,00	
					0	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	100.000	100.000	100.000	0				
					51	Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes Bs.As.	780.260	780.260	780.260	0	10,00	0,00	0,00	
					11	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	22.179.402	22.179.402	22.179.402	10.171.248	18,00	16,88	0,94	
					0	Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	100.000	100.000	100.000	8.240				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		30/09/2008	anual	
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	22.079.402	22.079.402	22.079.402	10.163.008	18,00	16,88	0,94
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	17.118.500	17.118.500	12.448.882	4.400	14,00	0,00	0,00
				0		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	100.000	100.000	100.000	4.400			
					51	Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe	17.018.500	17.018.500	12.348.882	0	14,00	0,00	0,00
				15		Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	6.715.146	6.715.146	6.715.146	567.202	26,00	3,00	0,12
				0		Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	100.000	100.000	100.000	36.142			
					51	Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	6.615.146	6.615.146	6.615.146	531.060	26,00	3,00	0,12
				16		Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	11.967.310	11.967.310	11.967.310	1.047.135	6,00	0,00	0,00
				0		Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	100.000	100.000	100.000	0			
					51	Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	11.867.310	11.867.310	11.867.310	1.047.135	6,00	0,00	0,00
				17		Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5)	0	350.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Ampliación Colonia Penal de Saenz Peña Unidad 11-Chaco (1) (5)	0	350.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				18		Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	2.955.382	200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				0		Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	200.000	200.000	0				
					51	Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	2.755.382	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				19		Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	7.750.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				0		Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	100.000	100.000	0				
					51	Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	7.650.000	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
29						Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad							
				1		Construcción Prefectura y Vivienda de Servicio Chana Mini (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Prefectura y Vivienda de Servicio Chana Mini (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
				2		Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques-Rosario (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques-Rosario (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
				3		Construcción Centro Control de Trafico de Buques, Mar del Plata (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Centro Control de Trafico de Buques, Mar del Plata (6)	0	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
375						GENDARMERIA NACIONAL							
40						Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional							
				2		Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	96.830	96.830	0	0	39,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Jefatura Escuadrón 54 Pocitos	96.830	96.830	0	0	39,00	0,00	0,00
				20		Mejoramiento Infraestructura Gendarmeria Nacional-Etapa I(1)	0	906.416	0	20,70	23,04	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura General Escuela Gendarmeria Nacional Martín Miguel Güe	0	906.416	0	23,60	23,04	0,00	0,00
				21		Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional	665.100	757.567	114.990	67,20	32,80	0,00	0,00
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón 9 - Oberá	81.900	253.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón 9 - Oberá	57.200	255.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					55	Ampliación Grupo Federacion-Escuadron 4-Concordia (1)	0	125.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Refacción Escuadrón 19 - Ingeniero Juarez (1)	0	124.567	114.990	0,00	100,00	0,00	0,00
					59	Refacción Escuadrón 21 "La Quiaca" (****)	26.000	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					62	Ampliación Grupo "Alfárez Pedrozo" - Agrupación XII "Comahüe (****)	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu	130.000	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio para Grupo Teniente General Fraga Escu	130.000	96.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV(1)	0	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cocina-Comedor Destacamento Móvil IV(1)	0	279.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				24		Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5 (****)	705.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
						51 Construcción Sección Seguridad Vial Saenz Peña - Escuadrón 5	705.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				25		Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Trevelín - Escuadrón 36 - Esquel	300.000	300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción Sección San Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe	680.000	680.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección San Rafael - Escuadrón 39 - Malargüe	680.000	680.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				27		Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualaguaychú	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón 56 - Gualaguaychú	250.000	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				28		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Cerro Catedral	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				29		Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada	2.491.750	1.398.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada	2.491.750	1.398.997	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				30		Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes (1)	0	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes (1)	0	250.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
45						Ministerio de Defensa							
	370					MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)							
		18				Equipamiento y Material de las Fuerzas Armadas							
				1		Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	8.704.884	34.089.757	17.650.046	14,00	14,00	50,00	3,57
					0	Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	100.000	673.200	15.654				
	371					51 Fabricación e Instalación de Radars Monopulso (RSMA)	8.604.884	33.416.557	17.634.392	14,00	14,00	50,00	3,57
				20		ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.							
						Sostén Logístico Antártico							
				2		Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	20.853.760	3.853.760	0	46,00	50,00	25,00	0,50
	372					51 Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	20.853.760	3.853.760	0	46,00	50,00	25,00	0,50
				17		INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A							
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
				2		Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	364.650	364.650	9.900	40,00	30,00	0,00	0,00
					51	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	364.650	364.650	9.900	40,00	30,00	0,00	0,00
				3		Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración	129.000	129.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Remodelación de Sistema de Calefacción - Refrigeración	129.000	129.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.357.300	1.357.300	79.822	0,00	45,00	0,00	0,00
	374					51 Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.357.300	1.357.300	79.822	0,00	45,00	0,00	0,00
				16		ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
						Capacidad Operacional y Apoyo							
				58		Reemplazo y Provisión de Caldera	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reemplazo Provisorio Caldera 2º Etapa Hospital Militar Central	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				64		Construcciones Tinglado Intermedio Escuadrón Ingenieros Blindado 1-Of	0	430.000	129.402	0,00	100,00	30,09	0,30
					51	Construcciones Tinglado Intermedio Escuadrón Ingenieros Blindado 1-Of	0	430.000	129.402	0,00	100,00	30,09	0,30
				65		Construcción Parque Automotor Comando III Brigada Monte-Resistencia	0	850.000	225.764	0,00	100,00	26,56	0,27
					51	Construcción Parque Automotor Comando III Brigada Monte-Resistencia	0	850.000	225.764	0,00	100,00	26,56	0,27
				66		Construcciones Parque Automotor en Compañía Cazadores Montaña 8, F	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcciones Parque Automotor en Compañía Cazadores Montaña 8, F	0	850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				69		Instalación Red Gas Natural Regimiento Caballería Exploración 13-Gener	0	980.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Instalación Red Gas Natural Regimiento Caballería Exploración 13-Gener	0	980.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				70		Construcción Cisterna Batallón Arsenales 604-Holmberg (6)	0	525.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO								
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%					
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.					
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		30/09/2008	anual						
379	19	16	18	1	51	Construcción Cisterna Batallón Arsenales 604-Holmberg (6)	0	525.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					72	Remodelación Redes Electricas en Comando Operaciones Terrestres-Ca	0	475.000	350.000	0,00	100,00	78,28	0,78					
					51	Remodelación Redes Electricas en Comando Operaciones Terrestres-Ca	0	475.000	350.000	0,00	100,00	78,28	0,78					
					73	Reposición Red Electrica Regimiento Caballería Tanques 12-Gualeguayc	0	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					51	Reposición Red Electrica Regimiento Caballería Tanques 12-Gualeguayc	0	780.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					74	Construcción Parque Automotor en Compañía de Ingenieros Paracaidista	0	765.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					51	Construcción Parque Automotor en Compañía de Ingenieros Paracaidista	0	765.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					75	Ampliación Casino de Suboficiales del Comando de Brigada de Monte III	0	515.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					51	Ampliación Casino de Suboficiales del Comando de Brigada de Monte III	0	515.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
					62	Remonta y Veterinaria												
						Construcciones Agropecuarias	46.849	46.849	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
						51 Construcción Galpón Tinglado	20.500	20.500	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
						52 Tanque Australiano Placas Hormigón	26.349	26.349	0	0,00	100,00	0,00	0,00					
						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA												
						Capacidad Operacional de la Armada												
						3	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrar	1.500.000	1.500.000	0	62,71	30,00	0,00	0,00				
						51	Construcción Planta Tratamiento de Efluentes Base Naval Puerto Belgrar	1.500.000	1.500.000	0	62,71	30,00	0,00	0,00				
							Formación y Capacitación											
						1	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	10.563.000	3.772.000	1.664.712	93,62	6,38	2,18	0,34				
						51	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	10.563.000	3.772.000	1.664.712	93,62	6,38	2,18	0,34				
						2	Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4)	0	761.000	714.274	22,00	78,00	26,00	0,33				
						51	Adecuación Instalaciones Edificio Libertad (1) (4)	0	761.000	714.274	22,00	78,00	26,00	0,33				
						3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	11.650.473	11.650.473	5.463.034	32,25	25,00	18,66	0,75				
						51	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	11.650.473	11.650.473	5.463.034	32,25	25,00	18,66	0,75				
						4	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	1.102.495	6.785.495	2.352.651	9,41	25,00	29,59	1,18				
						51	Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	1.102.495	6.785.495	2.352.651	9,41	25,00	29,59	1,18				
						5	Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4)	0	347.000	275.130	88,03	11,97	11,97	1,00				
						51	Remodelación para la Reubicación de Servicios (1) (4)	0	347.000	275.130	88,03	11,97	11,97	1,00				
						7	Construcción del Liceo Naval	8.512.000	8.512.000	0	0,00	33,55	5,00	0,15				
						51	Construcción del Liceo Naval	8.512.000	8.512.000	0	0,00	33,55	5,00	0,15				
					381						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA							
						1					Actividades Centrales							
									1		Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4)	0	185.582	111.088	79,30	20,70	20,70	1,00
				51		Ampliación Estructura Anexo Edificio Condor (1) (4)	0	185.582	111.088	79,30	20,70	21,70	1,05					
16						Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea												
				3		Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1)	0	7.300.000	2.529.437	0,00	100,00	34,64	0,35					
				51		Estructura de Apoyo Base Aerea Militar Resistencia (1)	0	7.300.000	2.529.437	0,00	100,00	34,64	0,35					
				4		Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	8.218.763	2.685.050	0,00	100,00	37,04	0,37					
				51		Estructura de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	8.218.763	2.685.050	0,00	100,00	37,04	0,37					
				5		Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	3.245.737	1.006.586	0,00	100,00	31,01	0,31					
				51		Obras de Apoyo Radar 3D Movil (1)	0	3.245.737	1.006.586	0,00	100,00	31,01	0,31					
				6		Mejoramiento Infraestructura VII Brigada Aérea (6)	0	67.500	0	0,00	s/i	s/i						
				51		Mejoramiento Infraestructura VII Brigada Aérea (6)	0	67.500	0	0,00	s/i	s/i						
				7		Mejoramiento de las Capacidades de Mantenimieto del Grupo Técnico VI	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i						

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%	
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.	
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual		
50						51 Mejoramiento de las Capacidades de Mantenimiemo del Grupo Técnico VI	0	300.000	0	0,00	s/i	s/i		
	19					Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea								
					3	Construcción Consultorios Externos para Centro Asistencial Retiro (1)	0	2.852.542	1.316.244	0,00	100,00	46,14	0,46	
						51 Construcción Consultorios Externos para Centro Asistencial Retiro (1)	0	2.852.542	1.316.244	0,00	100,00	46,14	0,46	
	20					Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea								
					2	Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar (6)	0	20.000	0	0,00	50,00	s/i		
						51 Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar (6)	0	20.000	0	0,00	50,00	s/i		
	450					INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR								
	16					Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional								
					3	Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	651.500	651.500	518.405	61,40	25,00	21,90	0,88	
						51 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	651.500	651.500	518.405	61,40	25,00	21,90	0,88	
					4	Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	6.560.500	1.910.000	157.140	0,00	35,60	3,53	0,10	
						51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República	6.560.500	1.910.000	157.140	0,00	35,60	3,53	0,10	
					5	Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185	6.000	2.688.280	187.657	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Mantenimiento y Tecnificación de Aeronave Citation, AE 185	6.000	2.688.280	187.657	0,00	100,00	0,00	0,00	
						Ministerio de Economía y Producción								
		357					MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION							
							Actividades Centrales							
						6	Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentina (****)	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	100,00
							51 Reciclaje Edificio Ex Aerolineas Argentinas	0	107.805	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						13	Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción	0	82.817	35.738	90,65	9,35	9,35	1,00
							51 Refacción Núcleos Sanitarios Sede Ministerio de Economía y Producción	0	82.817	35.738	90,65	9,35	9,35	1,00
						14	Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	3.483.000	3.483.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
							51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	3.483.000	3.483.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						15	Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC-	0	24.419	0	100,00	0,00	0,00	100,00
							51 Restauración Integral del Patio Principal 1piso - PAHAC -	0	24.419	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						17	Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	345.000	1.151.472	0	0,00	100,00	0,00	0,00
							51 Refación Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7º Piso	345.000	1.151.472	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						18	Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.610.000	2.198.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
							51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	1.610.000	2.198.562	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						19	Refaccción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secrete	3.050.000	3.050.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
							51 Refaccción Centro Cómputos de Respaldo de Unidad Informática Secrete	3.050.000	3.050.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						20	Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..	785.000	785.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
							51 Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada EdificioJ.A..	785.000	785.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						21	Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones - M	1.376.000	1.376.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones. - M	1.376.000	1.376.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
					22	Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	518.000	1.010.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2º SS al 6º Piso Inclusive	518.000	1.010.004	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					23	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	743.000	743.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	743.000	743.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
					24	Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	692.000	692.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación SAGPyA - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	692.000	692.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
					25	Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651	1.522.454	502.375	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
						51 Intslación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651	1.522.454	502.375	0	0,00	20,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
					26	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica	1.174.000	1.174.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Eléctrica	1.174.000	1.174.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					27	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	612.000	612.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	612.000	612.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					28	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	395.000	480.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	395.000	480.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					29	Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina	167.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Recuperación y Reparación Fachadas Exteriores Edificio Alsina	167.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					30	Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P.	1.500.000	500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción Data Center (Sala de Servidores) Complejo M.E.y P.	1.500.000	500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					31	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.100.000	1.100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.100.000	1.100.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				26		Administración Financiera							
				1		Remodelación para la Unidad Informática(1)	0	160.683	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación para la Unidad Informática(1)	0	160.683	0	0,00	s/i	s/i	
606						INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
				16		Investigación Fundamental e Innovación Tecnológica I.F.I.T							
					3	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	259.998	162.998	0	62,81	5,00	0,00	0,00
					0	Parques de Innovación Tecnológicos PITS	159.998	159.998	0				
					86	Ampliación Laboratorios de Alta complejidad PITS	100.000	3.000	0	62,81	5,00	0,00	0,00
					8	Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación Etapa III	2.500.000	130.900	130.819	94,00	6,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Laboratorio Instituto de Biotecnología	1.500.000	128.900	130.819	94,00	6,00	0,00	0,00
					55	Remodelación Alojamiento Institutos Microbiología y Zoología Agrícola	1.000.000	2.000	0	79,13	20,87	0,00	0,00
					12	Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V	1.500.000	480.000	422.483	86,00	14,00	14,00	1,00
					51	Construcción y Ampliaciones Institutos de Investigación - Etapa V	1.500.000	480.000	422.483	86,00	14,00	14,00	1,00
					17	Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómica	200.000	5.000	0	97,00	3,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Laboratorio Biotecnología Ciencias Veterinarias y Agronómica	200.000	5.000	0	97,00	3,00	0,00	0,00
					18	Construcciones y Ampliaciones en los Centros de Castelar	800.000	2.555.600	632.946	10,00	90,00	18,00	0,20
					51	Construcción Box Bioseguridad en el Centro de Investigaciones	500.000	2.552.600	518.887	13,91	86,09	15,00	0,17
					52	Ampliación Edificio Central del Instituto de Recursos Biológicos	300.000	3.000	114.059	10,18	89,82	20,00	0,22
				17		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnologías AITT							
					4	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior - Etapa I	50.000	402.000	393.755	90,00	10,00	8,00	0,80
					56	Construcción Oficinas AER Río Grande	50.000	402.000	393.755	90,00	10,00	10,00	1,00
					5	Construcción y Ampliaciones Centros del interior -Etapall	1.500.000	157.000	156.217	35,00	65,00	50,00	0,77
					58	Obras en la Estación Agropecuaria C. del Uruguay	1.500.000	157.000	156.217	35,00	65,00	50,00	0,77
					9	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior Etapa III (*****)	1.930.000	858.800	728.636	100,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción Oficinas y Galpón en el Campo Experimental Leales	50.000	181.500	241.354	100,00	0,00	0,00	0,00
					54	Construcción Oficinas, Baños y Sala Reuniones Estación Experimental Ai	70.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					56	Obras en Estación Exposición Agropecuaria Balcarce	1.500.000	501.900	435.857	100,00	0,00	0,00	0,00
					57	Obras en la Estación Exposición Agropecuaria La Ríoja	70.000	3.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00
					61	Ampliación Oficinas Centro Regional Buenos Aires Sur	150.000	134.400	51.425	100,00	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción Laboratorio de Aromas y Fitofarmacia en Estac. Experim. M	90.000	37.000	0	50,52	49,48	s/i	
					13	Construcción y Ampliaciones Centros del Interior -Etapa V	400.000	13.300	5.000	85,00	15,00	15,00	1,00
					51	Obras Varias C.R. Tucumán - Santiago del Estero	70.000	9.300	5.000	45,00	55,00	15,00	0,27

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual	
						52 Obras Varias C.R. Salta - Jujuy (****)	90.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						53 Obras Varias C.R. La Rioja - Catamarca	90.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Obras Varias C.R. Chaco - Formosa	80.000	1.000	0	90,82	9,18	1,00	0,11
						55 Obras Varias C.R. Misiones	70.000	1.000	0	45,05	54,95	0,00	0,00
14						Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapla VI	400.000	420.600	141.806	75,00	25,00	20,00	0,80
						51 Obras Varias C.R. Corrientes (****)	80.000	1.000	0	33,87	0,00	0,00	0,00
						52 Obras Varias C.R. Mendoza - San Juan	80.000	32.000	31.131	90,00	10,00	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. Santa Fé	80.000	180.000	0	76,00	24,00	22,00	0,92
						54 Obras Varias C.R. Córdoba	80.000	159.600	75.277	51,00	49,00	27,00	0,55
						55 Obras Varias C.R. Entre Ríos	80.000	48.000	35.398	90,00	10,00	5,00	0,50
15						Construcciones y Ampliaciones Institutos de Investiación.-Etapla VII	150.000	4.704.000	2.302.725	25,39	50,00	13,00	0,26
						51 Obras Varias C.R. Buenos Aires Norte	150.000	4.704.000	2.302.725	25,39	50,00	13,00	0,26
16						Construcciones y Ampliaciones Centros del Interior -Etapla VIII	420.000	236.000	212.511	47,55	52,45	35,00	0,67
						51 Obras Varias C.R Buenos Aires Sur	150.000	150.000	181.554	30,05	69,95	63,00	0,90
						52 Obras Varias C.R. Patagonia Norte (****)	90.000	1.000	0	58,40	0,00	0,00	0,00
						53 Obras Varias C.R. La Pampa - San Luis	90.000	5.500	5.500	70,78	29,22	20,00	0,68
						54 Obras Varias C.R. Patagonia Sur	90.000	79.500	25.457	85,00	15,00	15,00	1,00
18						Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	1.500.000	2.100	0	0,00	s/i	s/i	
						51 Construcción Edificio Estación Experimental Agrop. Agron. San Juan.	1.500.000	2.100	0	0,00	s/i	s/i	
19						Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.500.000	3.705.000	2.213.807	19,00	81,00	48,00	0,59
						51 Construcción y Ampliación Laboratorio y Oficinas Buenos Aires Norte	1.500.000	3.705.000	2.213.807	19,00	81,00	43,00	0,53
20						Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce	1.500.000	1.601.822	1.404.921	36,00	64,00	35,00	0,55
						51 Construcción Edificio Agropecuario Estación Agropecuaria Balcarce	1.500.000	1.601.822	1.404.921	36,00	64,00	35,00	0,55
21						Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela	2.000.000	215.000	159.490	35,00	65,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Rafaela	2.000.000	215.000	159.490	35,00	65,00	0,00	0,00
22						Construcción y Ampliaciones Centro Regional Salta -Jujuy (****)	80.000	1.000	0	38,00	0,00	0,00	0,00
						52 Edificio para Laboratorio en Campo Experimental Yuto	80.000	1.000	0	35,00	0,00	0,00	0,00
23						Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agroecuaria. Manfredi	1.500.000	705.500	650.242	65,00	35,00	15,00	0,43
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agroecuaria. Manfredi	1.500.000	705.500	650.242	65,00	35,00	15,00	0,43
25						Construcciones y Ampliaciones en los Centros Regionales	3.780.000	2.273.159	1.126.217	52,00	48,00	15,00	0,31
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental	90.000	90.000	0	3,70	96,30	0,00	0,00
						52 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	80.000	207.800	61.430	15,00	85,00	15,00	0,18
						54 Construcción Pabellón Fitomejoramiento Algodón en la Estación	90.000	104.700	94.959	62,50	37,50	0,00	0,00
						55 Construcción Centro de Convivencia Regional Misiones	90.000	90.000	522.164	15,00	85,00	10,00	0,12
						58 Ampliación Laboratorio y Dependencias Agropecuarias E.E.A. Junin	0	160.659	25.184	90,00	10,00	10,00	1,00
						59 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación	200.000	200.000	64.724	97,00	3,00	3,00	1,00
						60 Construcción Torre para Soporte Radar Meteorológico en la Estación	80.000	80.000	64.724	97,00	3,00	0,00	0,00
						61 Restauración Edificio Histórico en la Estación Experimental	50.000	92.000	42.000	0,00	s/i	s/i	
						62 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Esquel (****)	30.000	30.000	0	0,00	0,00	3,00	3,00
						63 Construcción Laboratorios, Oficinas, Depósitos, Talleres y Vestuarios	80.000	80.000	0	0,00	s/i	s/i	
						64 Construcción Salón de Usos Múltiples y Biblioteca en la Estación	80.000	80.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Construcción Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria	50.000	228.000	251.032	30,00	70,00	35,00	0,50
						66 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria (****)	80.000	80.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la Estación (***)	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual	
						68 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria (*****)	80.000	80.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						69 Construcción Laboratorios Semillas en la Estación Experimental (*****)	150.000	150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						70 Ampliación Laboratorios y Oficinas en la Estación Experimental (*****)	1.500.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						71 Construcción Edificio Laboratorio en la Estación Experimental	1.000.000	440.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				26		Construcciones en la E.E.A. Balcarce	2.340.000	9.100.000	8.586.080	33,00	67,00	44,00	0,66
					51	Ampliación Edificio Agronomía en la Estación Experimental Agropecuaria	2.340.000	9.100.000	8.586.080	33,00	67,00	44,00	0,66
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión R	850.000	2.021.000	638.668	37,94	60,06	33,00	0,55
					51	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico (*****)	50.000	5.000	0	8,00	0,00	0,00	0,00
					52	Casa en el Campo Anexo de la Estación Experimental Agropecuaria	50.000	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					53	Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ibarra	50.000	5.000	0	0,00	s/i	s/i	
					54	Remodelación Edificio de la Agencia de Extensión Rural San Martín	40.000	5.000	0	0,00	s/i	s/i	
					55	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güeme	50.000	500.000	193.944	20,00	80,00	30,00	0,38
					56	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural General Güeme	50.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					57	Construcción Sanitarios, Depósito y Salón Usos Múltiples	50.000	50.000	159.457	30,00	70,00	35,00	0,00
					58	Remodelación Edificio Agencia de Extensión Goya	0	30.000	0	0,00	s/i	s/i	
					59	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Lavalle	50.000	6.000	0	0,00	s/i	s/i	
					60	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión San Rafael	0	100.000	12.000	90,00	10,00	3,00	
					61	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Juan	40.000	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					62	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Gálvan	40.000	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					63	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres	40.000	1.000	0	0,00	s/i	s/i	
					64	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	40.000	146.000	0	0,00	s/i	s/i	
					65	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje	60.000	84.000	30.574	0,00	100,00	85,00	0,85
					66	Construcción Cochera y Galpón en la Agencia de Extensión Rural	40.000	40.000	0	30,00	70,00	0,00	0,00
					69	Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Cipolle	40.000	5.000	0	0,00	s/i	s/i	
					70	Ampliación Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa (*****)	40.000	528.000	137.076	5,00	0,00	0,00	0,00
					71	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Concarán	40.000	262.000	37.547	30,00	70,00	15,00	0,21
					72	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis (*****)	40.000	210.000	68.069	47,00	0,00	0,00	0,00
					75	Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché (*****)	40.000	40.000	0	25,00	0,00	0,00	0,00
				28		Construcción Ampliación Centros RegionalesTuc-Sant., Chaco-Form.y Sa	0	814.000	534.143	5,00	15,00	7,00	0,47
					51	Construcción Lab. Agro. Apic., Dep.y Ofic.Estac.Ex.Agro.Famaila	0	642.000	431.177	5,00	95,00	30,00	0,32
					52	Edificio para la Agencia de Extensión Rural Formosa	0	142.000	72.966	0,00	100,00	100,00	100,00
					53	Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa	0	30.000	30.000	0,00	100,00	100,00	100,00
				31		Ampliación Laboratorios y Oficinas EEA Guillermo Covas (6)	0	560.900	294.015	0,00	s/i	s/i	
					51	Ampliación Laboratorio Centro Regional Buenos Aires Norte (6)	0	368.700	119.698	0,00	s/i	s/i	
					52	Ampliación Laboratorio Producción Animal y Oficinas EEA Guillermo Cov	0	192.200	174.317	0,00	s/i	s/i	
				32		Ampliacion Laboratorio en Centro Regional Buenos Aires Norte (6)	0	59.200	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Ampliación Laboratorio en Centro Regional Buenos Aires Norte (6)	0	59.200	0	0,00	s/i	s/i	
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
				16		Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
					1	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	55.049	55.049	19.644	51,53	2,26	0,81	0,36
					52	Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	55.049	55.049	19.644	63,08	4,42	1,58	0,36
					2	Reparación y Mejoras de Sede Central	200.000	200.000	107.620	26,73	18,65	10,03	0,54
					51	Reparación y Mejoras de Sede Central	200.000	200.000	107.620	26,73	18,65	10,03	0,54

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO							
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%				
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.				
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual					
623	17	20			3	Equipamiento Analítico	624.840	624.840	64.488	52,49	16,14	1,67	0,10				
					51	Equipamiento Analítico para Laboratorios	624.840	624.840	64.488	52,49	16,14	1,67	0,10				
					4	Modernización de la Tecnología de la Información	552.288	552.288	421.986	50,38	18,13	13,85	0,76				
					51	Modernización de la Tecnología de la Información	552.288	552.288	421.986	50,38	18,13	13,85	0,76				
					SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA												
					Servicios de Laboratorios												
					14	Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalin	0	20.624.557	1.039.963	15,00	85,00	0,00	0,00				
					51	Reubicación Laboratorio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalin	0	20.624.557	1.039.963	15,00	85,00	0,00	0,00				
					Sanidad Animal												
					15	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (6)	0	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
					51	Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital (6)	0	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
					56	105	1			Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
										COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)							
										Actividades Centrales							
										1	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	690.000	6.080	0,00	7,00	0,03
51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	690.000	6.080						0,00	7,00	0,03	0,00				
2	Modernización Red de Datos CNEA	341.000	671.000	77.696						0,00	4,30	0,11	0,03				
51	Modernización Red de Datos CNEA	341.000	671.000	77.696						0,00	4,30	0,07	0,02				
3	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central	459.000	159.000	1.194						0,00	36,00	0,20	0,01				
51	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Central	459.000	159.000	1.194						0,00	36,00	0,10	0,00				
Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear																	
1	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	9.549.000	8.651.000	1.327.915						91,47	3,50	0,48	0,14				
51	Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	9.549.000	8.651.000	1.327.915						91,47	3,50	0,48	0,14				
2	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	502.650	70.544						98,33	1,67	0,29	0,17				
51	Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	502.650	70.544						98,33	1,67	0,29	0,17				
3	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	3.500.000	2.080.000	726.711						46,87	10,00	4,51	0,45				
51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	3.500.000	2.080.000	726.711	46,87	10,00	4,51	0,45									
4	Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.100.000	1.100.000	85.845	32,25	9,00	0,72	0,08									
51	Laboratorio de Caracterización de Materiales	1.100.000	1.100.000	85.845	32,25	9,00	0,72	0,08									
5	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	1.360.000	821.096	33.030	10,40	40,00	0,89	0,02									
51	Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	1.360.000	821.096	33.030	10,40	40,00	0,89	0,02									
6	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	700.000	630.000	98.157	50,00	14,00	1,97	0,14									
51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	700.000	630.000	98.157	50,00	14,00	1,97	0,14									
7	Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas	700.000	450.000	49.226	0,00	8,00	0,88	0,11									
51	Perforación Yacimientos de Uranio - Las Termas	700.000	450.000	49.226	0,00	8,00	0,88	0,11									
8	Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael	1.124.200	4.924.197	3.828.901	3,20	33,00	27,40	0,83									
51	Remediación de Pasivos del Complejo Minero Fabril San Rafael	1.124.200	4.924.197	3.828.901	3,20	33,00	27,40	0,83									
9	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	700.000	385.000	125.307	7,65	30,00	9,20	0,31									
51	Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	700.000	385.000	125.307	7,65	30,00	9,20	0,31									
10	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	2.800.000	3.158.000	522.585	66,26	33,74	5,10	0,15									
51	Ampliación Laboratorios Centro Atómico Bariloche	2.800.000	3.158.000	522.585	66,26	33,74	7,60	0,23									
11	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	570.000	570.000	96.205	45,63	18,00	0,25	0,01									
51	Ampliación Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche	570.000	570.000	96.205	45,63	18,00	0,25	0,01									

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		30/09/2008	anual	
21				12		Instalación y Puesta en Funcionamiento Reactores de Baja Potencia	23.400.000	23.400.000	2.236.095	0,67	3,00	0,25	0,08
				51		Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2	23.400.000	23.400.000	2.236.095	0,67	3,00	0,25	0,08
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.130.000	1.120.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.130.000	1.120.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				15		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	450.000	450.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				51		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	450.000	450.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
				16		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	4.500.000	1.426.703	60.082	0,00	32,00	0,32	0,01
				51		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	4.500.000	1.426.703	60.082	0,00	32,00	0,32	0,01
				17		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirver	2.000.000	896.363	19.395	0,00	9,00	0,20	0,02
				51		Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio en Laguna Sirver	2.000.000	896.363	19.395	0,00	9,00	0,20	0,02
						Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
				2		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	220.000	265.000	86.634	98,22	1,78	0,29	0,16
				51		Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	220.000	265.000	86.634	98,22	1,78	0,29	0,16
				3		Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza	845.000	510.000	66.512	98,03	1,97	0,07	0,04
				51		Saneamiento del Centro Atómico Ezeiza	845.000	510.000	66.512	98,03	1,97	0,07	0,04
				4		Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza	910.000	910.000	0	31,35	22,00	0,00	0,00
				51		Ampliación de la Red de Gas Centro Atómico Ezeiza	910.000	910.000	0	31,35	22,00	0,00	0,00
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	100.000	100.000	63.568	7,00	6,00	3,80	0,63
				51		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	100.000	100.000	63.568	7,00	6,00	3,80	0,63
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	660.000	510.000	7.925	12,00	31,00	0,36	0,01
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	660.000	510.000	7.925	12,00	31,00	0,36	0,01
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	100.000	100.000	12.679	5,32	8,00	1,29	0,16
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	100.000	100.000	12.679	5,32	8,00	1,29	0,16
			10		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	110.000	680.000	6.603	8,00	8,00	0,53	0,07	
			51		Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	110.000	680.000	6.603	8,00	8,00	0,53	0,07	
22				11		Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucle	215.000	215.000	36.538	2,25	5,00	0,85	0,17
				51		Construcción y Equipar Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucle	215.000	215.000	36.538	2,25	5,00	0,85	0,17
				13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	500.000	265.000	28.450	1,35	22,00	1,25	0,06
				51		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	500.000	265.000	28.450	1,35	22,00	1,25	0,06
				14		Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	5.780.000	5.780.000	1.941.274	5,00	15,00	4,70	0,31
				51		Puesta en marcha Módulo Enriquecimiento de Uranio	5.780.000	5.780.000	1.941.274	5,00	15,00	4,70	0,31
						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
				1		Residuos Radiactivos de Baja Actividad	1.661.000	3.338.000	870.859	74,89	5,00	1,22	0,24
				51		Área Gestión Ezeiza	1.661.000	3.338.000	870.859	74,89	5,00	1,22	0,24
				2		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	5.500.000	1.454.000	251.326	24,34	3,00	2,58	0,86
				51		Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	4.950.000	768.000	230.019	20,44	3,00	0,99	0,33
				52		Repositorio Fase 1	550.000	686.000	21.307	28,27	3,00	0,14	0,05
				3		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	206.000	1.255.500	264.385	73,70	26,30	5,01	0,19
				51		Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	206.000	1.255.500	264.385	73,70	26,30	5,01	0,19
				4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	4.315.520	6.781.020	204.695	29,45	4,36	0,15	0,03
				51		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	3.373.320	5.478.820	133.969	34,78	5,00	0,12	0,02
				52		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	464.000	864.500	32.082	20,46	3,00	0,16	0,05
				53		Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	321.200	321.200	0	9,85	2,00	0,00	0,00
				54		Remodelación Casa Guayra	157.000	116.500	38.645	73,68	17,00	5,15	0,30

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
					5	Laboratorio de Química Analítica	307.700	558.700	267.424	65,95	6,00	5,21	0,87
					51	Laboratorio de Química Analítica	307.700	558.700	267.424	65,95	6,00	5,21	0,87
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	950.500	1.923.204	332.860	9,50	30,00	6,95	0,23
					51	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	950.500	1.923.204	332.860	9,50	30,00	6,95	0,23
						Investigación, Formación de Recursos Humanos y Aplicaciones							
					1	Centro Aceleración de Iones	450.000	450.000	134.859	45,53	2,00	0,61	0,31
					51	Centro Aceleración de Iones	450.000	450.000	134.859	45,53	2,00	0,61	0,31
					2	Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	50.000	50.000	13.039	97,35	2,65	0,60	0,23
					51	Laboratorio Integrado para Elaborar Dispositivos Microelectromecánicos	50.000	50.000	13.039	97,35	2,65	0,60	0,23
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.100.000	1.100.000	399.187	12,00	20,00	7,39	0,37
					51	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	1.100.000	1.100.000	399.187	12,00	20,00	7,39	0,37
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros A	300.000	710.000	202.734	0,00	4,00	2,70	0,68
					51	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica de los Centros A	300.000	710.000	202.734	0,00	4,00	2,70	0,68
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	500.000	380.000	243.040	0,00	3,00	0,57	0,19
					51	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	500.000	380.000	243.040	0,00	3,00	2,43	0,81
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	500.000	500.000	257.585	0,00	10,00	5,15	0,52
					51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	500.000	500.000	257.585	0,00	10,00	5,15	0,52
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	350.000	500.000	328.725	0,00	5,00	4,68	0,94
					51	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	350.000	500.000	328.725	0,00	5,00	4,68	0,94
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	170.000	170.000	134.078	0,00	3,00	2,40	0,80
					51	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	170.000	170.000	134.078	0,00	3,00	2,40	0,80
						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					1	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					61	Mejoramiento Complejo Edificio Ezeiza	100.000	0	0	99,00	1,00	0,00	0,00
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	720.000	370.000	183.483	10,00	25,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Taller de Modelos	100.000	0	0	10,00	25,00	0,00	0,00
					52	Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	120.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento Edificio Nave 6	250.000	250.000	183.483	0,00	25,00	3,00	0,12
					54	Mejoras y Recuperación Banco de Bombas del Laboratorio de Hidráulica	200.000	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
						Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (****)	12.400.000	12.161.000	4.590.748	100,00	0,00	0,00	100,00
					56	Aliviador Cildañez - Etapa II	6.600.000	6.161.000	4.590.748	100,00	0,00	0,00	100,00
					57	Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	6.000.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					9	Canal Cintura Sur Tafi	400.000	270.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Canal Cintura Sur Tafi	400.000	270.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	220.000	689.000	95.377	0,00	100,00	21,82	0,22
					51	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	220.000	689.000	95.377	0,00	100,00	21,82	0,22
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	4.300.000	3.246.000	0	37,56	62,44	0,00	0,00
					51	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	4.300.000	3.246.000	0	37,56	62,44	0,00	0,00
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.000.000	50.000	0,00	s/i	s/i	
					51	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.000.000	50.000	0,00	s/i	s/i	
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	7.545.867	10.515.867	7.568.068	0,00	5,55	4,73	0,85

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
					25	51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	7.545.867	10.515.867	7.568.068	0,00	5,55	4,73	0,85
						Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	7.620.000	7.420.000	2.606.009	45,32	5,00	1,55	0,31
					51	Restauración de Monumentos Históricos	7.620.000	7.420.000	2.606.009	45,32	5,00	1,55	0,31
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	5.000.000	13.384.000	844.120	59,88	12,00	3,69	0,31
					51	Edificios Fiscales	5.000.000	13.384.000	844.120	59,88	12,00	3,69	0,31
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	10.100.000	10.100.000	6.673.937	10,93	38,72	37,75	0,97
					51	CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	10.000.000	10.100.000	6.673.937	10,93	38,72	19,76	0,51
					52	Defensa Costera	100.000	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Basílica Nuestra Señora de Luján (****)	100.000	475.000	214.318	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Basílica Nuestra Señora de Luján	100.000	475.000	214.318	100,00	0,00	0,00	100,00
				12		Protección Cueva de las Manos	530.000	155.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Protección Cueva de las Manos	530.000	155.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				13		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				14		Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					51	Obra Civil - BID 1201- OC/AR Complejo Positrón	100.000	100.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				20		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	8.332.952	16.332.952	8.733.854	97,99	2,01	2,02	1,00
					51	Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	8.332.952	16.332.952	8.733.854	97,99	2,01	2,02	1,00
				21		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	8.000.000	9.017.221	5.439.175	46,08	38,00	27,99	0,74
					51	Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	8.000.000	9.017.221	5.439.175	46,08	38,00	27,99	0,74
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	10.500.000	10.500.000	4.135.148	6,13	8,68	6,29	0,72
					0	Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.925.000	1.925.000	178.844				
					51	Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	8.575.000	8.575.000	3.956.305	6,13	8,68	6,29	0,72
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	2.000.000	9.092.311	4.718.822	12,52	10,00	28,87	2,89
					51	Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	2.000.000	9.092.311	4.718.822	12,52	10,00	28,87	2,89
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	52.600.000	15.600.000	0	0,00	33,78	0,00	0,00
					51	Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	52.600.000	15.600.000	0	0,00	33,78	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
					51	Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	0,96	0,00	0,00
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica	4.000.000	6.247.952	0	0,00	8,47	0,00	0,00
					51	Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica	4.000.000	6.247.952	0	0,00	8,47	0,00	0,00
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	570.000	570.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad Buenos Aires	570.000	570.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				35		Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	100.000	100.000	0	0,00	0,78	0,00	0,00
					51	Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	100.000	100.000	0	0,00	0,78	0,00	0,00
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	2.000.000	0	0	0,00	9,21	0,00	0,00
					51	Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	2.000.000	0	0	0,00	9,21	0,00	0,00
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio (***)	59.278.048	59.278.048	5.083.754	0,00	s/i	0,00	0,00
					0	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	0	11.617.221	5.083.754				
					51	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	59.278.048	47.660.827	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
						51 Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	1.000.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	200.000	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	500.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				30		Prevención Sísmica							
					1	Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas	482.000	482.000	230.169	63,80	4,70	2,90	0,62
					51	Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	482.000	482.000	230.169	63,80	4,70	2,90	0,62
				32		Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera(BID AR-L1026)							
					3	Construcción Huellas Mineras Etapa II	1.000.000	249.500	0	72,00	28,00	6,00	0,21
					0	Construcción Huellas Mineras Etapa II	75.000	24.500	0				
					51	Huellas Varias Misiones	70.000	0	0	79,00	21,00	0,00	0,00
					52	Huellas Mineras NOA	210.000	0	0	71,00	29,00	9,00	0,31
					53	Huellas Mineras Cuyo	420.000	0	0	71,00	29,00	5,00	0,17
					54	Huellas Mineras Comahue	150.000	150.000	0	87,00	13,00	3,00	0,23
					55	Huellas Mineras Patagonia	75.000	75.000	0	56,00	44,00	5,00	0,11
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	567.000.000	777.400.000	17.185.723	0,00	s/i	s/i	
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	567.000.000	777.400.000	17.185.723	0,00	s/i	s/i	
				50		Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
					2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes(1) (**	0	231.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					52	Puente Encarnación - Posadas (1) (****)	0	231.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					13	Escuela Nacional de Náutica	7.217.000	4.817.000	991.458	83,35	16,65	1,43	0,09
					51	Escuela Nacional de Náutica	7.217.000	4.817.000	991.458	83,35	16,65	1,43	0,09
				55		Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (**)							
					2	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744	129.199.000	0	0				
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires - BIRF 4163/AR y BIRF 744	10.840.000	0	0				
					52	Modernización Línea A Subterráneo - Obras Civiles (BIRF 4163)	118.359.000	0	0				
					4	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	97.825.000	0	0				
					0	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	3.525.000	0	0				
					51	Construcción Alteo Terraplén Viaducto Laguna La Picasa (CAF)	94.300.000	0	0				
					5	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmie	50.000.000	0	0				
					0	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmie	2.000.000	0	0				
					51	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Liniers Etapa I	48.000.000	0	0				
					6	Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	60.000.000	0	0				
					0	Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	2.000.000	0	0				
					51	Construcción Corredor Ferroviario Buenos Aires- Rosario- Córdoba	58.000.000	0	0				
				62		Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario (**)							
					2	Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744	0	129.199.000	38.075.984	46,18	53,82	22,00	0,41
					0	Transporte Urbano Buenos Aires-BIRF 4163/AR y BIRF 744	0	12.672.000	8.473.539				
					52	Modernización Línea A del Subterráneo-Obras Civiles.BIRF4163	0	116.527.000	29.602.444	46,18	53,82	22,00	0,41
					4	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	0	97.825.000	83.673.114	48,48	51,52	45,53	0,88
					0	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	0	2.465.000	1.585.306				
					51	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	0	95.360.000	82.087.807	48,48	51,52	45,53	0,88
					5	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmie	0	2.000.000	180.778	0,00	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

							FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado al			Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	Original	30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual
						0 Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito- Moreno ex Línea Sarmie	0	2.000.000	180.778	0,00			
					51	Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Liniers Etapa I	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
				6		Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	2.000.000	97.000	0,00	s/i	s/i	
					0	Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	2.000.000	97.000	0,00			
					51	Construcción Corredor Ferroviario Bs.As.-Rosario-Córdoba	0	0	0	0,00	s/i	s/i	
				89		Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID 1345 y S/N)							
				1		Escuela Nacional Fluvial	4.070.000	15.600.000	11.854.130	27,00	73,00	70,55	0,97
					51	Escuela Nacional Fluvial	4.070.000	15.600.000	11.854.130	27,00	73,00	70,55	0,97
				91		Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
				2		Ampliación Puerto Caleta Paula	10.500.000	38.560.761	33.028.835	41,00	27,00	23,85	0,88
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	10.500.000	38.560.761	33.028.835	41,00	27,00	23,85	0,88
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	887.200	4.000.000	990.917	0,00	95,00	0,00	0,00
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	887.200	4.000.000	990.917	0,00	95,00	0,00	0,00
				4		Puerto Diamante	1.000.000	3.200.000	712.088	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puerto Diamante	1.000.000	3.200.000	712.088	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	2.700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	2.700.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	10.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
					51	Puerto Comodoro Rivadavia	3.000.000	10.000	0	0,00	54,00	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	3.000.000	10.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
					51	Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	3.000.000	10.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	3.000.000	18.657.250	0	0,00	27,00	0,00	0,00
					51	Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	3.000.000	18.657.250	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide (*****)	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras (*****)	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo (*****)	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano (*****)	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa (*****)	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	1.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.100.000	100.000	0	0,00	2,50	0,00	0,00
					51	Puente Pueyrredón	1.100.000	100.000	0	0,00	2,50	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	500.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Dragado Río Uruguay	500.000	10.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Puente Uriburu Etapa II	1.000.000	4.020.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande (*****)	2.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle Histórico Río Grande	2.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia (	3.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	3.000.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Reparación Parque España	2.000.000	27.692.234	10.177.898	0,00	45,00	4,37	0,10

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
						51 Reparación Parque España	2.000.000	27.692.234	10.177.898	0,00	45,00	4,37	0,10
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	2.000.000	9.755	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puerto Rosario Costanera	2.000.000	9.755	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				24		Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	1.000.000	10.000	0	0,00	0,16	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	1.000.000	10.000	0	0,00	0,16	0,00	0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				27		Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Bs.As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs. As.	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	17.200	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	17.200	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				31		Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				32		Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				33		Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico (3)	900.000	0	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico	900.000	0	0	0,00	s/i	s/i	
451				16		DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES							
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios (7)							
				1		Remodelación Fábrica Río Tercero (1) (4)	0	105.000	105.000	99,35	0,65	0,65	1,00
					56	Obras Menores (1)	0	105.000	105.000	94,61	5,39	5,39	1,00
				2		Remodelación Fábrica Azul (1) (4)	0	4.494.740	4.494.740	25,42	74,58	74,58	1,00
					51	Remodelación Fábrica Azul (1) (4)	0	4.494.740	4.494.740	27,52	72,48	72,48	1,00
				3		Remodelación Fábrica Villa María (1) (4)	0	2.502.090	2.502.090	70,41	29,59	29,59	1,00
					51	Remodelación Fábrica Villa María (1) (4)	0	2.502.090	2.502.090	72,29	27,71	27,71	1,00
				4		Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran (1) (4)	0	4.337.257	4.337.257	36,79	63,21	63,21	1,00
					51	Remodelación Fábrica Fray Luis Beltran (1) (4)	0	4.337.257	4.337.257	35,40	64,60	64,60	1,00
				5		Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluente	0	5.898.570	5.898.570	32,42	67,58	67,58	1,00
					51	Infraestructura para Tratamiento de Residuos, Gases, Líquidos y Efluente	0	5.898.570	5.898.570	21,55	78,45	78,45	1,00
				6		Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica	0	5.988.856	5.988.856	40,65	59,36	59,35	1,00
					51	Infraestructura Edilicia y Protección contra Descargas Atmosféricas-Fábrica	0	5.988.856	5.988.856	34,82	65,18	65,18	1,00
				7		Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
				8		Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
				9		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
					51	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i	
				10		Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO		
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		%
												Ejec./Progr.
												anual
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico (6)	0	2.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				11		Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	0	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	0	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				12		Remodelación para Adecuación de Redes (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación para Adecuación de Redes (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				13		Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación para Modernización y Transformación Tecnológica Planta	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				14		Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos (6)	0	1.500.000	0	0,00	s/i	s/i
				15		Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones	0	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones	0	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				16		Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO 140	0	500.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio (6)	0	500.000	0	0,00	s/i	s/i
				17		Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/IRAM 36	0	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río III (6)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
				18		Remodelación para la Modernización de Instalaciones (6)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
						51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones (6)	0	1.000.000	0	0,00	s/i	s/i
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO						
	20					Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento (7)						
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingham.-Morón-Ituzaingo	4.988.443	10.165.001	9.200.552	92,46	7,54	7,39
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham (****)	48.000	48.000	36.850	100,00	0,00	0,00
						53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	4.940.443	10.117.001	9.163.702	77,39	22,61	16,01
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación,Optimización y Sistema de Captación-E	14.113.513	23.983.642	22.887.707	82,73	11,00	9,97
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación,Optimización y Sistema de Captación-E	10.766.080	15.636.209	16.209.546	92,97	7,03	7,96
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	3.347.433	8.347.433	6.678.161	82,53	15,00	11,96
				4		Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. A	73.862	73.862	73.862	100,00	0,00	0,00
						51 Rehabilitación y Ampliación Planta Depuradora Cloacal Bella Vista- Bs. A	73.862	73.862	73.862	100,00	0,00	0,00
				5		Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	10.274.731	20.274.731	16.285.896	90,98	9,02	5,91
						51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago S.Roque-C.Paz-Córdoba	10.274.731	20.274.731	16.285.896	90,98	9,02	5,91
				6		Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut) (****)	136.611	136.611	29.975	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto Trelew-Puerto Madryn (Chubut)	136.611	136.611	29.975	100,00	0,00	0,00
				7		Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	7.030.000	130.000	0	0,00	3,00	0,00
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Bs. As.	7.030.000	130.000	0	0,00	3,00	0,00
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	20.730.471	25.080.491	12.359.793	38,43	14,00	13,38
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	5.690.471	10.040.491	8.052.958	82,75	17,25	16,96
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	15.040.000	15.040.000	4.306.835	4,46	11,00	9,80
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	30.111.000	30.161.448	18.516.208	59,29	27,00	10,99
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Bs. As.	1.066.000	2.536.250	2.436.250	90,61	9,39	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	29.045.000	27.625.198	16.079.958	37,61	46,00	21,98
				10		Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	18.326.341	24.907.873	16.773.303	9,78	72,50	46,15
						51 Construcción de Acueductos para 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	18.266.341	24.847.873	13.342.174	0,00	65,00	0,00
						52 Perforaciones 25 Pozos El Pato Berazategui Bs. As.	60.000	60.000	3.431.129	19,56	80,00	46,15
				11		Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja (****)	113.000	1.613.000	1.304.287	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
					51	Construcción Cloaca Máxima y Planta Depuradora La Ríoja	113.000	1.613.000	1.304.287	100,00	0,00	0,00	100,00
	12					Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús B	7.929.252	7.929.252	4.080.206	22,41	48,00	20,55	0,43
		51				Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús B	7.929.252	7.929.252	4.080.206	22,41	48,00	20,55	0,43
	13					Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	50.000	50.000	47.410	0,00	1,00	0,00	0,00
		51				Construcción del Sistema Cloacal (Cuenca Media Lago San Roque)	50.000	50.000	47.410	0,00	1,00	0,00	0,00
	14					Construcción Acueducto Laguna Laboulaye - Córdoba	19.560.246	19.560.246	18.009.702	0,00	7,00	20,59	2,94
		51				Construcción Acueducto Laguna Laboulaye - Córdoba	19.560.246	19.560.246	18.009.702	0,00	7,00	20,59	2,94
	15					Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües	36.632.359	17.516.834	12.531.896	11,60	49,00	19,71	0,40
		51				Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües	36.632.359	17.516.834	12.531.896	11,60	49,00	19,71	0,40
	16					Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	53.875.560	62.559.802	52.907.685	59,51	40,49	22,29	0,55
		51				Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	17.580.000	22.580.000	16.629.157	39,50	60,50	30,74	0,51
		52				Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa	36.295.560	39.979.802	36.278.527	79,52	20,48	13,97	0,68
	17					Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	18.348.000	13.845.537	11.734.545	20,63	56,00	47,57	0,85
		51				Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	18.348.000	13.845.537	11.734.545	20,63	56,00	47,57	0,85
	18					Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	76.000	76.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
		51				Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	76.000	76.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
	19					Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	18.030.000	5.871.000	1.420.413	0,00	10,00	5,21	0,52
		51				Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	18.030.000	5.871.000	1.420.413	0,00	10,00	5,21	0,52
	20					Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	15.030.000	15.030.000	11.546.974	31,53	60,00	50,73	0,85
		51				Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	15.030.000	15.030.000	11.546.974	31,53	60,00	50,73	0,85
	21					Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta	5.800.170	4.016.942	3.081.531	59,97	43,03	29,36	0,68
		51				Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales Gral. Mosconi -Salta	5.800.170	4.016.942	3.081.531	59,97	43,03	29,36	0,68
	22					Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Jua	17.946.412	30.354.411	29.068.643	51,25	48,75	16,09	0,33
		51				Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Jua	5.555.990	12.963.989	12.373.413	84,47	15,53	15,07	0,97
		52				Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	12.370.422	17.370.422	16.616.690	70,09	29,91	23,54	0,79
		53				Cloaca Máxima y Estación de Bombeo Subsistema Rawson San Juan	20.000	20.000	78.540	s/i	s/i	s/i	
	23					Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	37.182.812	72.177.812	65.854.159	60,73	39,27	35,64	0,91
		51				Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	37.182.812	72.177.812	65.854.159	60,73	39,27	35,64	0,91
	24					Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	19.412.164	17.716.716	14.637.843	25,67	74,33	25,23	0,34
		52				Remodelación Planta Depuradora y Colectores Aguirre Tandil Bs. As.	19.412.164	17.716.716	14.637.843	25,67	74,33	25,23	0,34
	25					Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil (****)	100.000	180.000	15.240	100,00	0,00	0,00	100,00
		51				Construcción de Perforaciones y Cañerías de Impulsión - Tandil	100.000	180.000	15.240	100,00	0,00	0,00	100,00
	27					Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	17.670.000	3.921.079	901.079	0,00	87,00	5,33	0,06
		51				Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	17.670.000	3.921.079	901.079	0,00	87,00	5,33	0,06
	29					Construcción Colectora Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	20.040.000	4.480.348	440.348	0,00	17,00	1,34	0,08
		51				Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As	20.040.000	4.480.348	440.348	0,00	17,00	1,34	0,08
	30					Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	13.476.053	12.074.009	6.297.627	19,88	57,00	32,99	0,58
		51				Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.326.053	4.326.053	1.245.072	10,84	47,00	13,72	0,29
		52				Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	9.150.000	7.747.956	5.052.555	28,81	67,00	29,70	0,44
	31					Obra Cloacas Susques - Jujuy	100.000	100.000	0	s/i	s/i	s/i	
		51				Obra Cloacas Susques - Jujuy	100.000	100.000	0	s/i	s/i	s/i	
	32					Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca	300.000	300.000	0	s/i	s/i	s/i	
		51				Obra Hídrica y Desagües Pluviales - Humahuaca	300.000	300.000	0	s/i	s/i	s/i	
	33					Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
						51 Obra Toma de Agua Ciudad de la Quiaca. Proyecto Yurag	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	5.000.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	5.000.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				35		Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	
						51 Planta Depuradora Líquidos Cloacales. La Quiaca - Jujuy	500.000	500.000	0	s/i	s/i	s/i	
				43		Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones	15.000.000	2.420.000	0	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Misiones	15.000.000	2.420.000	0	s/i	s/i	s/i	
				48		Construcción de Acueducto Sur Salta	5.000.000	31.000.000	26.750.734	68,36	30,00	26,32	0,88
						51 Construcción de Acueducto Sur Salta	5.000.000	31.000.000	26.750.734	68,36	30,00	26,32	0,88
				64		Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales I	5.430.000	2.095.000	1.470.000	0,00	8,00	3,89	0,49
						51 Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales I	5.430.000	2.095.000	1.470.000	0,00	8,00	3,89	0,49
				70		Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires	10.014.896	414.896	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema de Agua Potable Bahía Blanca - Buenos Aires	10.014.896	414.896	0	0,00	3,00	0,00	0,00
				86		Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	5.500.000	100.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubut	5.500.000	100.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				87		Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar.Bs.As.	9.000.000	100.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal y Red de Agua Potable en Pilar.Bs.As.	9.000.000	100.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
				93		Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	17.670.000	15.320.106	11.047.007	0,00	89,00	43,84	0,49
						51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	17.670.000	15.320.106	11.047.007	0,00	89,00	43,84	0,49
				98		Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	4.000.000	700.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
						53 Optimización y Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Miguel d	2.000.000	100.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						58 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Bs. As.	2.000.000	600.000	0	0,00	8,50	0,00	0,00
				99		Construcción del Sistema Cloacal en Localidades varias (BID S/N)	27.531.000	2.571.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						52 Cosntrucción de Planta de Tratamientos de Líquidos Cloacales Necochea	2.000.000	100.000	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fe	10.850.000	590.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
						57 Optimización de sistema de Desagües Cloacales - Santa Fe	50.001	50.001	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						66 Construcción de Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa -	1.000.000	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						67 Construcción de Sistema de DesagÜes Cloacales - Malvinas Argentinas	7.360.999	1.460.999	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						68 Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - José C. Paz	6.270.000	370.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
				1		Actividades Centrales							
					3	Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	1.800.000	1.800.000	0	46,70	37,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio 25	1.800.000	1.800.000	0	46,70	37,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base							
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.569.131	1.419.131	557.128	33,93	3,56	2,24	0,63
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.569.131	1.419.131	557.128	33,93	3,56	2,24	0,63
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
				17		Infraestructura en Concesiones Viales							
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia Bs.As.	5.000.000	7.645.238	7.398.737	94,31	5,69	1,01	0,18
						51 Autovía Cañuelas-M.G.de-RN 3 - Km 87,82- Km 97,561Bs.As.	5.000.000	7.645.238	7.398.737	94,31	5,69	1,01	0,18
					4	Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	21.779.388	1.158	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata-Balcarce II Tramo-R.226- Km 31,7 -	21.779.388	1.158	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					5	Seguridad en Concesiones. Viales en Pcia.de Bs.As. II	2.046.922	3.313.539	2.241.952	51,13	48,87	49,18	1,01
						51 Mejora en Travesía Urbana RN 205 km 67.800-67.300 Cañuelas Bs. As.	0	815.617	764.501	97,53	2,47	8,23	3,33

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
						52 Mejora Intersección e Iluminación RN 5 -Km260 9 de Julio Bs.As.	2.046.922	2.497.922	1.477.451	0,00	100,00	92,12	0,92
6						Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	3.050.067	3.556.405	1.642.616	13,84	36,15	22,18	0,61
						51 Mejora Intersección RN 7 Km 202,16 Chacabuco- Bs.As.	3.050.067	1.067	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Mejora Urbana RN 188 km 155,866-160,146 Junin Bs. As.	0	3.555.338	1.642.616	27,70	72,30	44,36	0,61
7						Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	1.700.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	1.700.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8						Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	47.031.397	41.198.918	27.331.000	29,57	61,37	15,13	0,25
						51 Autopista Luján-Mercedes Sec.I RN 5 Km. 66,10 -Km. 73,40 BA.	13.396.188	10.333.533	4.855.408	2,49	78,00	8,90	0,11
						52 Autopista Luján-Mercedes Sec.III RN 5 Km 85,78 - Km 95,6	33.635.209	30.865.385	22.475.592	55,25	44,75	21,35	0,48
9						Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	20.262.153	36.632.328	20.115.282	66,28	33,72	16,40	0,49
						51 Tamo Campana - Zárate RN 9 E/ Km 72,62- Km 85,20	20.262.153	36.632.328	20.115.282	66,28	33,72	16,40	0,49
10						Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	679.556	6.571.209	4.957.649	77,55	24,45	39,46	1,61
						52 Mejora en Travesía Urbana RN 11 Km 787- Reconquista SantaFe	679.556	6.571.209	4.957.649	77,55	24,45	39,46	1,61
11						Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. VI	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obra Vincul.Ex RN 193Tramo Emp.RN 8-Emp.RP39 Exalt.de la Cruz	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12						Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	7.654.540	1.000	0	0,00	50,00	3,72	0,07
						51 Obra en RN A005-Tramo Emp.RN8-Emp.RP36-Sec.Km0-12 R.Cuarto	7.654.540	1.000	0	0,00	50,00	3,72	0,07
13						Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	4.112.585	7.024.558	4.652.131	3,00	46,64	7,50	0,16
						51 Mejoras en Intersección RN 33 Km.699,95 Venado Tuerto-Santa Fe	2.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Accesos RN.34 Km387 - Ceres - Santa Fe	2.112.585	7.023.558	4.652.131	6,76	93,24	15,00	0,16
14						Seguridad en Corredores Viales I	6.851.340	3.909.611	3.155.853	89,27	2,00	6,28	3,14
						61 Construcción Canal Desagües Pluviales-Aparicio RN3 Km555,9 C.Dorreg	120.000	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						63 Travesía Urbana RN188 Km8,0-112,0C.Salles,Erezcano,Acevedo, Guerri	230.490	673.820	0	91,72	8,28	0,00	0,00
						68 Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RN 205 km 111,45 Bs.As. (*)	0	36.580	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						71 Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	28.817	28.817	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						74 Acceso a Villa Ramallo RN 9 km 207 - Provincia de Bs. As.	0	198.634	198.634	98,88	1,12	0,00	0,00
						76 Mejora Intersección Acceso Hersilia Santa Fe RN 34 Km369,88	1.552.733	2.860.076	2.677.925	11,36	88,64	100,00	1,13
						78 Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	2.524.500	500	279.294	0,00	100,00	40,26	0,40
						79 Mejora Intersección Acceso a San Esteban-Los Cocos- Cba RN38 Km75,	1.300.000	1.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						80 Mejora Acceso a Pinto RN 34 km 496,08 - Pcia. Sgo. del Estero (****)	0	73.184	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						81 Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.094.800	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16						Iluminación y Travesías Urbanas-Provincia de Córdoba	0	65.147	50.808	98,50	1,50	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminacion RN 19 km 278,00-km279,95-Río I Córdoba	0	65.147	50.808	98,50	1,50	0,00	0,00
17						Construccin de Pasarelas Peatonales Provincia de Buenos Aires (****)	10.000	60.004	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						55 Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	10.000	60.004	0	100,00	0,00	0,00	100,00
21						Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	800.000	117.115	0	56,18	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN8 Km 78 - Exalt. de la Cruz Bs. As.(**	70.000	115.115	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	680.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Rotonda RN 3 Km 192,34 - Int. RP 30- Las Flores Bs.As.	50.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	8.121.500	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	8.121.500	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
25						Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Salta II	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
					26	51 Construcción Multitrocha RN34 Km.1129-1135,5-Cab.de Buey-Zorzalito	2.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán I	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Ensanche de Puente RN 9 1287,30-1287,70 S.Cayetano-Tucumán	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					27	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	1.600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	1.600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					28	Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	1.600.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	1.600.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	4.110.898	7.255.259	7.077.311	19,92	80,08	92,38	1,15
						51 Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	4.110.898	7.255.259	7.077.311	19,92	80,08	92,38	1,15
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	15.159.243	11.121.138	6.724.912	47,00	13,26	20,27	1,53
						51 Rotonda en IntersecciónRN3 km448,7-RP75 González Chavez-Bs.As.	2.290.487	1.093.024	1.090.623	82,62	17,38	9,40	0,54
						52 Mejora de Acceso RN 5 Km 443 Trenque Lauquen - Bs. As.	2.295.154	2.611.994	2.557.087	63,20	36,80	40,81	1,11
						53 Mejoras Acceso e Iluminación RN 7 C. de Areco km139,24-S. A. Giles krr	0	2.186.443	2.163.471	70,33	29,67	36,44	1,23
						54 Mejora Intersección. RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fe	2.185.727	1.000	0	0,00	50,00	20,26	0,41
						56 Mejora de Acceso RN12 km1056 Paso de la Patria Corrientes	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						57 Mejora en Intersección RN12 Km 1361 Candelaria Misiones	400.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Readecuación de Acceso RN12 Km1398 San Ignacio Misiones	1.500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Readecuación de Acceso RN12 Km 1416 Santo Pipa Misiones	1.400.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Readecuación de Acceso RN12 Km 1445 Puerto Leoni Misiones	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Rotonda e Iluminación en RN3 Inters. con Av. Piazza Azul Bs. As.	4.286.875	5.223.677	913.731	0,00	100,00	30,72	0,31
					31	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones I	6.192.000	2.626.000	2.625.213	53,71	30,00	19,78	0,66
						51 Construcción de Terceras Trochas RN12 Km1370-1399 Arroyo San Juan	6.192.000	2.626.000	2.625.213	53,71	30,00	19,78	0,66
					32	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones II	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
						51 Construcción 3°Trocha RN12 Km1399-1436 S.Ignacio-Jardín América Mi:	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
					33	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones III	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
						51 Construcción 3°Trocha RN12 Km 1442-1470 Jardín América-Pto. Rico Mi	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
					34	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Misiones IV	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
						51 Construcción 3°Trocha RN12 Km 1472,06-Km 1540,33-Pto. Rico-Misione	6.192.000	1.000	0	53,71	30,00	19,78	0,66
					35	Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	6.192.000	19.606.382	18.743.221	53,71	30,00	19,78	0,66
						51 Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	6.192.000	19.606.382	18.743.221	53,71	30,00	19,78	0,66
					37	Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	0	1.549.672	1.109.859	97,80	2,20	0,00	0,00
						51 Readecuación Acceso Planta Urbana RN 5 km 605,03-km 606,65 Santa F	0	1.549.672	1.109.859	97,80	2,20	0,00	0,00
					38	Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	0	21.275.000	17.759.124	82,55	17,45	14,18	0,81
						51 Doble Via Sta Rosa-Gral. San Martin RN 7 km 965,51-998,80 Mendoza	0	21.275.000	17.759.124	82,55	17,45	14,18	0,81
					39	Autopista Luján - Mercedes Etapa I, Seccion II, Jaúregui	2.000.000	2.088.583	0	97,44	2,56	2,56	1,00
						51 Autopista Luján-Mercedes EtapaI, Seccion II RN5 Km 72,42	2.000.000	2.088.583	0	97,44	2,56	2,56	1,00
					40	Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I (****)	0	549.538	549.537	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Ensanche Puente s/Río Dulce RN 9, Termas de Río Hondo	0	549.538	549.537	100,00	0,00	0,00	100,00
					48	Contrucción Pasarelas Peatonales en Provincia de Santa Fé (6)	0	79.000	78.003	0,00	s/i	s/i	
						52 Construcción Pasarela RN 33 km 713 -Chabas-Cañada de Gomez-Santa	0	79.000	78.003	0,00	s/i	s/i	
					63	Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As. (	0	163.321	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Iluminación Intersección RN 9 km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs. As.	0	163.321	0	100,00	0,00	0,00	100,00
					65	Construcción de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	2.881.389	130.900	130.817	19,53	5,47	0,20	0,04
						51 RN9 Km54 L.Verde Escobar,RN9-RP6-Campana,RN8-RP51 Arrecifes	695.000	0	46.899	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		30/09/2008	anual	
						52 RN205 y RP51 Saladillo,RN205 y 226 Bolivar,RN3 y RP86 B.Juarez	865.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 RN22 Km714 Medanos,RN222 Km769 Algarrobo-Punta Alta	705.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 RN188,Km398 Banderale,RN33 entre RP65 Guamini,RN33	520.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Edificio Cpo.de Apoyo a los Serv. Viales-Km31 Autop.BsAs-La Plata	96.389	130.900	83.918	91,29	8,71	0,76	0,09
67						Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	0	580.173	580.172	99,99	0,01	0,00	0,00
						51 Pavimento Calle Colectora, Iluminación y Construcción Pasarela Peatona	0	580.173	580.172	99,99	0,01	0,00	0,00
68						Iluminación Autopista Rosario Armstrong Santa Fe (****)	200.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						51 Iluminación Distrib.Funes-Autop.Roario.-Armstrong Inters.RP34-Funes	200.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
69						Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fe	2.451.635	4.008.664	3.439.080	78,69	21,31	16,88	0,79
						51 Intersección Canalizada RN188-ConstrucciónBicisenda Ameghino-Pcia. c	1.558.529	3.625.558	3.093.850	37,24	62,76	39,72	0,63
						53 Mejora Travesía Urbana RN 8 Venado Tuerto Santa Fe (****)	893.106	383.106	345.230	100,00	0,00	0,00	100,00
70						Construcción Pasarela Peaonal. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN11Km.1005,70 Bo.Toba Resistencia (	40.000	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
71						Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	301.000	38.589	0	47,33	2,67	0,00	0,00
						51 Rama Salida Descendente km 21 Autopista Ricchieri-Pcia. Bs.As.	0	37.589	0	94,66	5,34	0,00	0,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72						Mejora en Corredor Vial 29	8.000.000	2.700	1.840	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejora en Corredor Vial 29	8.000.000	2.700	1.840	0,00	50,00	0,00	0,00
73						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. II	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Obras de Iluminación en S. Miguel del Monte y P. Alta RN3	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
74						Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	8.000.000	10.166.386	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	8.000.000	10.166.386	0	0,00	50,00	0,00	0,00
75						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Córdoba	3.616.165	4.662.226	3.546.992	27,51	16,03	15,67	0,98
						51 Puente Sobre el A° El Ajó RN 7 Km 600 - Córdoba	2.566.165	4.660.226	3.546.992	51,91	48,09	47,01	0,98
						52 Colocación de Barandas Flex Beam en RN 9- Córdoba	600.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Travesías Urbanas RN 19 Km 149-203 Córdoba	450.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
76						Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.090.000	3.438.520	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Obras de Protección contra Erosión en RN 34 y RN 9 Salta	1.090.000	3.438.520	0	0,00	50,00	0,00	0,00
78						Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Entre Ríos	9.916.667	18.405.147	9.993.907	7,15	92,85	65,50	0,71
						51 Acceso a Gualaguaychú RN14 Entre Ríos	9.916.667	18.405.147	9.993.907	7,15	92,85	65,50	0,71
80						Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	575.082	1.082	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	575.082	1.082	0	0,00	50,00	0,00	0,00
81						Obras de Seguridad Vial en Provincia. de Bs. As. III	7.756.371	9.356.061	751.388	0,61	7,72	3,36	0,44
						52 Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.118.696	5.387.775	750.335	11,04	88,96	8,85	0,10
						53 Construcción Tercer Puente La Niña RN 252 Bs. As.	726.675	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Rotonda en Intersección RN 3- RN 252 El Triángulo Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Rotonda de Acceso a Grumberg RN 3 Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Acceso Canalizado Dorrego	500.000	3.953.286	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Rotonda de Acceso a Av. Caseros y San Martín -Tres Arroyos	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Iluminación Rotondas RN 205-RP 65 y RP 30 y RN 226 Bs. As.	100.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 Mejora de Intersección e Iluminación Base Área Tandil	2.000.000	1.000	1.053	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Obras de Alcantarillado en Bolívar- Bs. As.	300.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						61 Iluminación en Puente Cruce RN 226 - Pehuajó	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 Provisión y Colocación de Barandas B.Beam RN5 Km 305-307 Carlos Ca	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fe	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						66 Enlace RN 9 y Acceso a Villa Constitución- Córdoba	251.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						67 Mejora de Intersección y Bicisenda en Arias- Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						68 Iluminación Acceso a Zárate RN 3- Bs. As.	301.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
82						Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	7.260.000	1.619.395	1.092.936	9,54	2,96	2,89	0,98
						51 Ramas en Distribuidor y Pavimentación en San Jerónimo-Santa Fe	280.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						52 Iluminación de Empalme de Acceso a RP 26- Santa Fe	300.000	44.190	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						53 Iluminación Ingreso Arroyo Seco RN 9 - Santa Fe	300.000	79.244	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 Mejora de Intersecciones y Obras en Hughes-Santa Fe	5.400.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 Iluminación, Pavimentación y Acceso a Villa Ocampo-Santa Fe	350.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Intersección Canalizada RN8 y RP 94 Santa Isabel-Santa Fe	460.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						58 Travesías Urbanas en RN 11	170.000	1.092.961	1.092.936	76,31	23,69	23,13	0,98
83						Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco	300.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Acceso Puerto Tirol RN16- Provincia de Chaco	300.000	1.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
84						Travesía Urbana en Capióvi RN 12- Misiones	298.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Travesía Urbana en Capióvi RN 12- Misiones	298.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85						Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guaaleguaychú-Provincia Entre f	64.190.611	45.610.520	41.321.365	8,88	80,00	20,00	0,25
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Guaaleguaychú-Provincia Entre f	64.190.611	45.610.520	41.321.365	8,88	80,00	20,00	0,25
86						Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos. Aire:	2.500.000	2.759.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy- Provincia de Buenos. Aire:	2.500.000	2.759.140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87						Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires (7)	7.710.000	2.801.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						0 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires (6)	0	2.800.000	0				
						51 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.710.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
88						Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	0	4.710.417	3.893.331	3,24	96,76	89,42	0,92
						51 Mejoras Acceso a Aeropuerto RN 11 km 464,61 Sauce Viejo	0	4.710.417	3.893.331	3,24	96,76	89,42	0,92
89						Ruta Nacional N36 Tramo - Rio IV	12.001.000	2.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejora RN N36 Sección Variante Perilago Almafuerte	11.000.000	1.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						52 Mejora RP N36 Sección Variable Despeñaderos	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
91						Variante San Miguel del Monte RN N 3 San Miguel del Monte	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Variante San Miguel del Monte RN N 3 San Miguel del Monte	1.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
92						Tercer Carril RN N°9 Tramo A012-RN N° 188-Villa Constitución	748.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Tercer Carril RN N°9 Tramo A012-RN N° 188-Villa Constitución	748.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
93						Tercer carril RN N°9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Tercer carril RN N°9 Tramo A008-A012-Rosario-Villa G. Galvez	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
94						Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas	775.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Gabriela Mistral entre Pujol y San Martín 14 Cuadras Malvinas	775.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
95						Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Mejoras en Saladillo Provincia de Buenos Aires	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
96						Pavimentación Urbana y Repavimentación RNN° 22 Río Negro	501.000	3.951.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Pavimentación Urbana RNN°22 KM 1212.40 Cipolletti-Río Negro	501.000	3.951.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
98						Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Provincia de Bu	0	3.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Provincia de Bu	0	3.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007		30/09/2008	anual	
18						Infraestructura en Áreas Urbanas (7)							
				1		Infraestructura en Áreas Urbanas	320.000	1.401.000	0	0,00	25,00	12,50	0,50
				53		Rotonda en Intersección R.N. Nº 15 y Av. Monseñor Rosch	320.000	1.401.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				2		Seguridad en Areas Concesionadas II (****)	0	26.712	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Repavimentación RP 42,Secc RP51, Acceso a Rawson-Provincia Chubut	0	26.712	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				3		Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	1.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires (****)	0	849.649	849.648	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Pavimentación Urbana en Magdalena y Atalaya-Provincia de Buenos Aire	0	849.649	849.648	100,00	0,00	0,00	100,00
				5		Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florenc	12.797.914	22.131.767	18.004.821	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Vinculación y Remodelación R.P. 36 - Rotonda Gutiérrez y R.P. 2 Florenc	12.797.914	22.131.767	18.004.821	100,00	0,00	0,00	100,00
				6		Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				51		Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acceso Esc. 67 La Plata	500.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs.	600.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				51		Repavimentación y Ensanche Ex Ruta 8 Calle Uruguay a Guido-Pilar Bs.	600.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	100,00
				9		Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	3.254.313	17.871.563	15.195.621	18,33	81,67	76,58	0,94
				51		Mejoras en Accesos Sur - RN 14 Km.252,60 Concordia - Entre Ríos	3.254.313	17.871.563	15.195.621	18,33	81,67	76,58	0,94
				11		Obras Menores en Areas Urbanas	0	1.415.621	462.921	90,96	9,04	1,78	0,20
				51		Pavimentación Urbana Localidad de Lima-Zarate (Provincia Bs. As.)	0	1.415.621	462.921	90,96	9,04	1,78	0,20
				12		Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.966.205	252.751	165.573	96,59	3,41	0,00	0,00
				51		Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.966.205	252.751	165.573	96,59	3,41	0,00	0,00
				13		Repavimentación e Iluminación Camino al Centro Atómico Ezeiza	0	1.763.012	1.727.986	70,83	29,17	29,71	1,02
				51		Repav e Ilumin Camino al Ctro Atomico Ezeiza-Pcia Bs As	0	1.763.012	1.727.986	70,83	29,17	29,71	1,02
				14		Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As.	16.934.432	23.375.823	13.452.995	2,98	97,02	46,82	0,48
				51		Rehabilitación y Mejora R.P. Nº 25-Tramo:Pilar-Acceso Oeste- Bs. As.	16.934.432	23.375.823	13.452.995	2,98	97,02	46,82	0,48
				15		Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.511.603	4.193.649	3.303.776	41,24	58,76	56,10	0,95
				51		Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.511.603	4.193.649	3.303.776	41,24	58,76	56,10	0,95
				16		Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Ric	9.600.000	4.500.334	0	0,00	10,00	12,00	1,20
				51		Vinculación Acceso Puerto Yerua RN14 Km242,36 Provincia de Entre Ric	9.600.000	4.500.334	0	0,00	10,00	12,00	1,20
				17		Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				18		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				19		Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Berisso: Vinculación Rotacional y Pavimentación Ubana-Beriso	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				20		Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Autovía RP Nº 215 tramo RP 29 Brandsen-RP Nº 6 La Plata-Bransen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				21		Mejoras en Areas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires	6.003.002	3.002	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Repavimentación y Ensanche RP Nº 21 Nº Tramo: RP Nº 7	2.001.002	1.002	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				52		Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				53		Pavimentación Calle Salguero Tramo Hipólito Yrigoyen	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				22		Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				51		Variante Variante RP Nº 4 Sección 3 (RP Nº 201-Buen Ayre)-Morón	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				23		Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri)	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
						51 Variante PR Nº4 Sección Nº 1 (Avenida Don Bosco-Au Ricchieri)	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				24		Mejoras en Áreas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Rehabilitación y Ensanche ex RN Nº 8 Tramo General Paz-RP 4-3	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				25		Mejoras en Áreas no Concesionadas Provincia de Buenos Aires	6.003.000	6.845.160	2.418.949	0,00	s/i	10,53	0,00
						51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	2.001.000	6.843.160	2.418.949	0,00	s/i	31,53	0,00
						52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	2.001.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				26		Acceso a Ciudad Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs.	0	3.200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Acceso a Ciudad Ezeiza. Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs.	0	3.200.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (7)							
				1		Obras Mejorativas en C.V.2-Año II-I Etapa	1.500.000	8.948.637	8.031.305	98,11	1,89	4,98	2,63
						52 Obra Mejorativa N221 C.V.2-RN7 Km259-276	1.500.000	1.000	0	99,77	0,23	0,23	1,00
						53 Obra Mejorativa 208 RN 7 km 457-492-Provincia de Córdoba (****)	0	2.833.757	2.435.071	100,00	0,00	0,00	100,00
						55 Obra Mejorativa 221 RN 7 km 399-406,424-457	0	6.113.880	5.596.234	92,58	7,42	19,92	2,68
				2		Corredor Vial 3	8.080.367	32.347.511	18.922.665	47,10	52,90	15,36	0,29
						51 Obra Mejorativa N214 C.V.3-RN9 Km 157-206	7.080.367	23.801.253	14.379.932	81,65	18,35	40,86	2,23
						52 Obra Mejorativa N 201 C.V.3-RN9 Km 96-106	1.000.000	8.546.258	4.542.732	12,54	87,46	12,34	0,14
				3		Obras Mejorativas en C.V.4-Año II-I Etapa	1.601.598	2.348.465	2.253.296	98,16	1,84	0,00	0,00
						51 Obra Mejorativa N205 C.V.4 RN8 Km 661-695- Provincia de Córdoba (***)	1.601.598	2.348.465	2.253.296	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Obra Mejorativa RN33 Km 586-616/Km 673-676-Provincia de Santa Fe		19.730.557	17.103.288	96,31	3,69	0,00	0,00
				5		Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa	4.422.499	893.256	94.092	82,06	17,94	18,09	1,01
						0 Obras Mejorativas en C.V.5-Año II-I Etapa	1.524.256	2.840.141	2.140.419				
						51 Obra Mejorativa N217 C.V.5 RN9 Km1215-1225 Km1315-1325 (****)	1.000.000	311.155	0	100,00	0,00	0,00	100,00
						52 Obra Mejorativa 203 RN 34 km 584-612,km 646-651-Provincia Santiago c	0	15.686.005	14.868.778	99,38	0,62	0,00	0,00
						54 Obra Mejorativa N218 C.V.5 RN34 Km 66,00-86,00	1.898.243	2.000	0	29,47	70,53	72,35	1,03
				6		Obras de Mejoras en Corredores Viales 1 Año II - II Etapa	3.459.333	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 236 C.V. 1 RN 3 y RN 252 - Km 669-677/RN 252 Km 0-6.80	2.423.333	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 241 C.V. 1 RN 3 Acceso Barrow - Acceso Tres Arroyos Buenos Aire	1.036.000	5.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				7		Obras de Mejoras en Corredores Viales 2 Año II - II Etapa	10.903.030	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 209 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 10 Acceso a Washington	2.465.384	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 222 C.V. 2 RN 7 Límite San Luis/Mendoza - Acceso La Dormida	2.500.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 224 C.V. 2 RN 7 Empalme RP 6-RP 41 Km 63-103	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra 234 C.V. 2 RN 5 Acc. Carlos Casares - Acceso San Bernardo	1.632.814	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra 240 C.V. 2 RN 5 Límite Buenos Aires / La Pampa- Acceso Uriburu	2.304.832	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				8		Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	30.124.466	6.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra 202 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Acceso a San Pedro	2.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 215 C.V. 3 RN 9 Río Areco - Río Tala	2.000.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 216 C.V. 3 RN 9 Río Tala - RP 51	2.718.486	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V. 3 RN 11 Arosena - Santo Tobrae - Santa Fe	19.169.421	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						55 Obra 223b C.V. 3 RN 11 Santo Tobrae - Santa Fe	1.966.479	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						56 Obra 232 C.V. 3 RN 188 Empalme RP 1 Empalme RP 35 - La Pampa	1.970.080	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				9		Obra de Mejora en Corredor Vial 4 Año II - II Etapa	1.077.985	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 239 C.V. 4 RN 36 Almafuerte Acceso Los Molinos - Córdoba	1.077.985	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
				10		Obra de Mejora en Corredor Vial 5 Año II - II Etapa	5.103.000	3.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
							30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
664	16					51 Obra 210 C.V. 5 RN 9 Río Juramento Empalme RN 34- Salta	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						52 Obra 219 C.V. 5 RN 34 Acceso Cañada Rosquín Empalme RN 62 Santa	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						53 Obra 220 C.V. 5 RN 34 Límite Santa Fe / Santiago del Estero Km 39	1.701.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					11	Obra de Mejora en Corredor Vial 1 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 1 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					12	Obra de Mejora en Corredor Vial 2 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 2 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					13	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 3 III Etapa	1.300.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					14	Obra de Mejora en Corredor Vial 4 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 4 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					15	Obra de Mejora en Corredor Vial 5 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 5 III Etapa	1.400.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
					16	Obra de Mejora en Corredor Vial 6 III Etapa	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						51 Obra en Corredor Vial 6 III Etapa	501.000	1.000	0	0,00	s/i	0,00	0,00
						ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS							
						Control del Sistema Nacional de Aeropuertos							
						12 Reacondicionamiento de Plataforma, Pistas y Calles de Rodaje Aeropuer	4.725.000	1.711.275	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Reparación de Pista y Calle de Rodaje - Aeropuerto de Junín	4.725.000	1.711.275	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						14 Reacondicionamiento de Pavimento y Balizamiento - Aeropuerto de Sauc	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista, Calle de Rodaje	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						15 Reacondicionamiento de Pavimento - Aeropuerto de Bahía Blanca	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Bacheo y Reparación de Estado Superficial de Pista en Aeropuerto	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						16 Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Villa Gesell	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje	2.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						17 Reparación de Pista - Aeropuerto de Rosario	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51 Ensanche y Reparación de Estado Superficial de Pista en el Aeropuerto	3.000.000	3.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00		
				18 Reparación de Pista y Rodaje - Aeropuerto de Tartagal	2.900.000	2.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00		
				51 Bacheo, Reparación de Estado Superficial de Pista y Calle de Rodaje	2.900.000	2.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00		
				19 Reacondic. Pavimento y Balizamiento Aeropuerto Paso de Los Libres	1.120.000	1.120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00		
				51 Bacheo y Reparación de Estado Superficial Pista Aeropuerto de Paso de	1.120.000	1.120.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00		
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
				336		MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA							
					43	Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Técnica							
					2	Acondicionamiento del Edificio Central	760.000	510.000	185.587	0,00	100,00	80,40	0,80
					51	Implementación de Sistemas de Seguridad	690.000	440.000	25.085	0,00	100,00	0,00	0,00
					52	Tendido de Red	70.000	70.000	160.502	0,00	100,00	100,00	1,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
				350		MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
					1	Actividades Centrales (7)							
					2	Remodelación de Edificio de Av. Callao N° 114	760.000	1.760.000	1.156.202	0,00	100,00	34,12	0,34
					51	Remodelación de Edificio de Av. Callao N° 114	760.000	1.760.000	1.156.202	0,00	100,00	34,12	0,34
				3		Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.150.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.150.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

								FINANCIERO			FISICO			
								Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	Original	30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual	
80	310	1	22	6	5	Reparación Edificio Callao N° 114	1.490.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao N° 114	1.490.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						Regularización del Trabajo (7)								
					51	Construcción de Agencias Territoriales	2.590.000	90.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Construcción de Agencias Territoriales	2.590.000	90.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						Ministerio de Salud								
						MINISTERIO DE SALUD								
						Actividades Centrales								
					1	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.450.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	
					52	Refuncionalización Edilicia Sede Central y Zonas Periféricas	1.450.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00	
						Planificación Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud (7)								
					1	Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salt	400.000	0	0	0,00	36,00	0,00	0,00	
					51	Reconstrucción Unidades Sanitarias Federales Varias - Ministerio de Salt	400.000	0	0	0,00	36,00	0,00	0,00	
						Cobertura de Emergencias Sanitarias (7)								
					1	Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	520.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización	520.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL								
					52	Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción (7)								
					2	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	600.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación Edificio Servicio de Internación en Crisis	600.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER								
					53	Atención a Enfermos (7)								
					6	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	575.000	0	0	32,05	67,95	0,00	0,00	
					53	Remodelación del Pabellón N° 4	150.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					55	Refacción Integral de Pabellones N° 3, 5 y 8 Hospital Nacion	425.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					7	Reparación y Mantenimiento en Hospital (****)	350.000	430.000	76.553	100,00	0,00	0,00	100,00	
					52	Reparación de Usina	350.000	430.000	76.553	100,00	0,00	0,00	100,00	
					10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldo	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldo	1.500.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					13	Construcción de Quirófanos (****)	0	270.000	268.046	100,00	0,00	0,00	100,00	
					51	Construcción de Quirófanos	0	270.000	268.046	100,00	0,00	0,00	100,00	
					15	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Somn	500.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Reparación Integral Red Eléctrica Hospital Nacional Dr. Baldomero Somn	500.000	350.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					16	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1)	0	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Refuncionalización del Pabellón de Clínicas (1)	0	500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					17	Refuncionalización de Farmacia (6)	0	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
					51	Refuncionalización de Farmacia (6)	0	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	
906	56	3				ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN								
						Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud (7)								
						Puesta en Valor y Adecuación de Distintas Áreas del Edificio Central de A	3.957.735	1.357.735	0	0,00	35,00	0,00	0,00	
					52	Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.600.000	1.000.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00	
					54	Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	107.735	107.735	0	0,00	80,00	0,00	0,00	
					55	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas del Departamento de	250.000	250.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Desarrollo y Producción de Biológicos (7)								

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
							Original	Vigente al	Devengado al	Acumulado al	anual vigente	30/09/2008	Ejec./Progr.
								30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007			anual
					4	Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos (****)	850.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Planta Piloto de Producción de Biológicos	850.000	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacteriológicas, Micóticas, Paras y Virales							
				2		Remodelación de Laboratorios del Departamento Virologia(1) (****)	0	155.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos (1)	0	155.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Investigación, Desarrollo y Servicios en Enfermedades Parasitarias							
				1		Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Líquidos	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Cuarto para Almacenamiento de Residuos Líquidos	40.000	40.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				4		Investigación, Desarrollo y Servicios en Virosis Humanas. Producción de Vacunas c/ FHA							
				6		Remodelación Planta de Producción del INEVH	400.000	400.000	282.455	0,00	100,00	38,00	0,38
					51	Remodelación Planta de Producción del INEVH	400.000	400.000	282.455	0,00	100,00	38,00	0,38
				5		Control de Calidad de Biológicos							
					3	Adecuación de Laboratorios a Condiciones de Bioseguridad(****)	0	20.900	20.900	100,00	0,00	0,00	0,00
					51	Adecuación de Laboratorios del Primer Piso	0	20.900	20.900	100,00	0,00	0,00	0,00
				8		Capacidad y Servicio Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias (7)							
				3		Mejoramiento Edificio INE "DR. Juan H. Jara" Fase III (7) (****)	100.000	100.000	0	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Edificio Interno	100.000	100.000	0	15,00	0,00	0,00	0,00
				4		Mejoramiento Edificio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.572.265	872.265	565.079	0,00	30,00	62,00	2,07
					51	Mejoramiento Edificio Externo	1.572.265	872.265	565.079	0,00	30,00	62,00	2,07
				5		Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes	370.000	470.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Laboratorio y Área de Atención de Pacientes	370.000	470.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
				59		Atención de Pacientes							
				4		Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6 (7)	2.800.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	2.800.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				5		Refacción Integral Pabellón 8	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Pabellón 8	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Refacción Lavadero Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Lavadero Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Refacción Integral de Cocina Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Refacción Integral Cocina Central	450.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE							
				60		Atención a Discapacitados Psico físicos							
				1		Contrucción Natatorio (7)	540.000	675.360	0	72,65	27,35	0,00	0,00
					51	Construcción Natatorio	540.000	675.360	0	72,65	27,35	0,00	0,00
912						SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION							
				62		Prevención y Control de las Discapacidades							
				6		Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización	210.000	210.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Nuevo Ingreso Peatonal, Baños y Parquización	210.000	210.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social							
				311		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
				17		Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
				7		Construcción Instalaciones (7)	11.033.000	10.033.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	3.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 30/09/2008

							FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programación	Ejecutado al	%
								Vigente al	Devengado al	Acumulado al			Ejec./Progr.
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob.	Descripción	Original	30/09/2008	30/09/2008	31/12/2007	anual vigente	30/09/2008	anual
						54 Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	4.510.000	4.510.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						58 Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	1.545.000	545.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	1.500.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
						52 Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	1.500.000	0	0,00	34,00	0,00	0,00
Total (sin Dirección Nacional Vialidad)							2.831.352.128	3.021.753.708	1.231.343.046				

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) En el Servicio Administrativo 354, el Programa 55 pasó al Programa 62.

(***) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra que no superen el 20%

(*****) Proyecto suspendido

(1) **Proyectos y Obras que iniciaron en el segundo trimestre del ejercicio 2008.**

(2) En el proyecto Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires, el devengado corresponde a trabajos previos a la realización de la obra, alquiler de andamios, honorarios profesionales, seguros de obra, pago al Ejército Argentino, encargado de la demolición de los de los edificios en donde se realizará la obra.

(3) La obra Construcción Defensas Margen Derecha Río Perico, no pertenece al programa Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables , según lo informado por la Jurisdicción.

(4) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(5) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007, se pidió la reapertura en el 2º trimestre de 2008, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

Proyectos y obras sin crédito igualmente informadas por el Organismo porque iniciaron la ejecución física. Tendrán crédito en el próximo trimestre.

(6) **Proyectos y Obras que iniciaron en el tercer trimestre del ejercicio 2008.**

(7) Proyectos y obras con aumento, disminución o redistribución de crédito con respecto al trimestre anterior

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs	
MANTENIMIENTO																				
Mantenimiento por Administración																				
16	1	1	51	PAIS	Varias	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/08	31/12/08	87.191	35.542	111.193	93.989	25,0%	66,7%	6	B	
16	1	2	51	PAIS	Varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/08	31/12/08	15.226	5.000	23.846	17.146	25,0%	66,7%	6	B	
Total Mantenimiento por Administración												102.417	40.542	135.038	111.135					
Mantenimiento por Contrato																				
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte. c/SanJuan/S. Martín-Mendoza/André-Empalme R.20	Varias	11	194,7	22/08/95	28/02/07	15.251	2.600	135	134	0,0%	77,5%	7		
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Emp. R11 - Villa Gral Güemes	km 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488	11	403,4	29/04/97	31/07/04	3.616	2.600	0	0	0,0%	100,0%	8		
16	2	18	51	NEUQUEN	237	Arroyo La Teresa - Confluencia		11	146,0	03/09/95	31/03/97	1.500	0	167	0	0,0%	0,0%	7		
Total Mantenimiento por Contrato												20.367	5.200	302	134					
Mantenimiento por Convenio con Provincias																				
16	3	24	51	LA PAMPA	143,151,152	TFO La Pampa Convenio 10		11	633,3	01/01/06	25/12/07	10.346	0	0	0	0,0%	89,8%	7		
16	3	24	51	LA PAMPA	43,151,152	TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/08	31/12/09	5.032	4.100	10.326	4.326	13,2%	30,7%	6	A	
16	3	25	51	NEUQUEN	242 - 40(S)	TFO Neuquén - Convenio 10	Catan Lil - Lte. Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/06	31/12/07	7.998	0	0	0	0,0%	98,4%	7		
16	3	25	51	NEUQUEN	242 - 40	TFO Neuquén - Convenio 11	Catan Lil - Lte. Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	31/12/09	9.982	3.600	3.123	2.825	12,7%	20,8%	6	F	
16	3	26	51	RIO NEGRO	23-1S40-3-251-250	TFO Río Negro - Convenio 10	Valcheta - Jacobacci	11	1.136,5	01/01/06	31/12/07	8.482	0	0	0	0,0%	94,1%	7		
16	3	26	51	RIO NEGRO	23 - 250	TFO Río Negro - Convenio 11		11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	15.088	4.100	758	758	8,4%	22,3%	6	A-D	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288-193	TFO Santa Cruz - Convenio 9 (3)		11	1.714,9	01/01/06	31/12/06	23.944	0	0	0	0,0%	100,0%	7		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-288	TFO - Santa Cruz - Convenio 10	I - II : Prog. 2,13 - Prog. 126,5	11	2.207,3	01/01/07	31/12/08	50.000	15.000	16.181	13.964	7,6%	89,8%	6	A-H	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3com a,b,m,i	TFO Tierra del Fuego Convenio 9		11	520,5	01/01/06	31/12/07	12.320	0	0	0	0,0%	77,1%	7		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	3 - Comp. A,b,i,l	TFO Tierra del Fuego Convenio 10		11	350,3	01/01/08	25/12/09	12.000	4.800	732	732	12,5%	33,3%	6	A-D	
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio 10	Varias	11	392,8	01/01/06	31/12/07	3.675	0	0	0	0,0%	91,0%	7		
16	3	30	51	JUJUY	52-40 (Ex Rp 16)	TFO Jujuy - Convenio 11		11	392,8	01/01/08	31/12/09	4.000	2.700	1.124	1.124	12,8%	34,0%	6	A-D	
16	3	31	51	SALTA	40-1V40-51	TFO Salta - Convenio 11	Payogasta - Viaducto La Polvorilla	11	480,6	01/01/07	31/12/07	3.570	3.690	2.614	2.614	0,0%	95,8%	7		
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 8	V. Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	236,0	01/01/06	31/12/07	5.625	0	0	0	0,0%	100,0%	8		
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	V. Gral. Güemes - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	236,0	01/01/08	30/12/09	6.000	2.200	2.056	2.056	12,5%	33,3%	6	A-D	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	Fortín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	126,0	04/05/07	31/05/09	2.048	1.300	721	626	14,1%	66,9%	6	H	
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/12/06	4.895	2.600	0	0	0,0%	100,0%	7		
16	3	36	51	CHUBUT	S140 - 26 - 260 - 40	TFO Chubut - Convenio 8	Tramos Varios	11	537,2	01/01/04	31/12/07	5.873	1.900	1.173	792	0,0%	93,9%	7		
16	3	37	51	LA RIOJA	40 - 76- 78 - 79	TFO La Rioja - Convenio 8		11	379,6	01/01/08	30/12/08	5.000	2.000	2.112	2.112	12,6%	33,6%	6	A-D	
16	3	38	51	CHACO	P13	TFO Chaco - Convenio 2	Emp. RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01/01/06	31/12/07	1.864	0	0	0	0,0%	99,9%	7		
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. RNN°11 - Cote Lai	11	163,4	01/01/08	29/12/09	2.386	2.200	206	206	12,0%	30,6%	6	F	
16	3	39	51	TUCUMAN	9-38	TFO Tucumán Convenio 6	Emp. RNN°38 - Villa Mariano Moreno	11	67,4	01/01/06	31/12/07	2.558	0	0	0	0,0%	35,4%	7		
16	3	39	51	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucuman Convenio 7		11	67,4	01/01/08	25/12/09	3.000	1.450	260	260	12,5%	33,3%	6	A-D	
16	3	40	51	CATAMARCA	40	TFO - Convenio 8	km 798,82- km 986,82	11	188,0			2.632	2.719	0	0	0,0%	0,0%	12		
16	3	41	51	MISIONES	14	TFO - Convenio 2	km 1056,32 - km 1116,96	11	60,6			0	2.571	0	0	0,0%	0,0%	12		
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												208.318	56.930	41.386	32.394					
Señalalamiento Horizontal																				
16	4	1	51	PAIS	Varias	Señalamiento Horizontal - Nacional		12		01/01/08	31/12/08	38.242	31.500	60.236	49.543	25,0%	66,7%	6	B	
Obras de Emergencia																				
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores		14	48,0	01/01/08	31/12/08	21.395	22.050	30.771	21.950	25,0%	66,7%	6	B	
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes		14		01/01/08	31/12/08	9.860	5.000	13.360	10.942	25,0%	66,6%	6	B	
16	5	3	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR		14		01/01/08	31/12/08	0	850	0	0	100,0%	100,0%	6	B	
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras Menores de Seguridad Vial		14		01/01/08	31/12/08	5.410	5.000	8.635	6.104	25,0%	66,5%	6	B	
Total Obras de Emergencia												36.665	32.900	52.766	38.996					
Mantenimiento por Sistema Modular																				
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	km 1324,22 - km 1578,4	11	254,2	19/07/04	31/07/08	6.076	2.300	1.369	1.318	1,2%	96,4%	7		
16	6	3	51	CHACO	16	Emp. Ruta Nacional N° 95 - Límite Chaco/Salta	km 177,21 - km 504,73	11	327,5	03/12/04	30/12/08	8.647	2.400	0	0	0,1%	79,4%	6	A	
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp. Ruta Nacional 40 (S)	km 313,74 - km 591,38	11	277,6	03/05/04	30/11/07	10.314	6.000	274	274	0,0%	67,3%	7		
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Emp. RNN°25 - Emp. RPN°56 (Río Senguer)	km 1547,76 - km 1836,82 -	11	289,1	07/09/04	30/11/07	9.742	2.600	1.518	1.518	0,0%	98,0%	7		
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Emp. RPN°22 - Lte. c/Chubut/ Santa Cruz / Emp. RNN°40- Lte. c/Chile	km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	20/01/09	7.855	3.030	2.726	2.400	18,8%	82,7%	6		
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Emp. RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / San Martín - Mendoza	km 35 - km 112,5 / km 3,27- km 80,83 / km 997,4- km 1041,8	11	199,5	01/01/07	31/12/08	11.888	5.000	6.265	3.852	2,5%	68,1%	6		
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	km 121,26 - km 350,90	11	229,6	17/03/05	31/03/09	15.532	4.000	2.013	1.654	2,9%	79,9%	6	A	
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RNN°11 - A Nivel RNN°11- Calle J/Garay	km 0 - km 7,23 / km 0 - km 4,59 / km 0- km 2,58	11	14,4	21/07/05	30/09/08	9.899	2.500	3.902	902	11,0%	99,8%	6	A	
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Emp. Rutas Nacionales 9-34	km 502,92 - km 707,32	11	204,4	14/07/04	30/07/09	19.619	3.200	3.338	1.989	9,6%	63,4%	6	A	

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTotal	Est	Obs
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Emp. RN N° 50 - Lte con Bolivia / Pluma de Pato - Emp. RN N° 34	km 1329,12 - km 1488,40 / km 1763,6- km 1863,30	11	249,3	15/04/04	30/11/07	7.792	4.100	162	162	0,0%	100,0%	8	
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 18,90 - km 61,87	11	43,0	01/11/08	30/10/10	7.037	2.793	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01/11/08	31/10/09	6.000	2.200	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	21	51	MISIONES	12	Sist. Modular Acc. Aerop. Gral. San Martin - Emp. RNN°105	km 1336 - km 1349	11	13,2	01/11/08	31/10/09	1.500	3.204	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	22	51	SALTA	40	Seclantas - Emp. RNN°51	km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/08	28/02/10	7.625	3.397	3.573	1.565	18,9%	41,3%	6	
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Lte. con Chile / San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	km 26,39 - km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/09	10.852	2.678	5.157	5.157	18,5%	66,1%	6	
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Emp RNN°40 (Tecka)	km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	13.385	2.755	4.094	3.433	7,6%	41,1%	6	
16	6	25	51	CHUBUT	40	Emp. RNN°25 - Emp. RPN°56 (tamarisco)	km 1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	22.435	2.693	2.405	0	6,7%	12,1%	6	A
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Emp. (Ex) RNN°26 - Emp. RNN°40	km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	17.524	2.831	3.283	3.011	4,9%	29,0%	6	
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mant.Vigilancia y Seg. Integral - Ptes. Accesos a Ciudad Autónoma de Bs. As.	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda	11		06/06/07	30/06/09	40.218	3.271	16.673	12.112	10,7%	56,8%	6	
16	6	28	51	JUJUY	Pte	Pte. s/ Río Grande - Bajo la Viña		8		01/11/08	31/10/10	15.000	2.813	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	29	51	MENDOZA	40 - 145	Lte. Neuquén - Malargüe y Bardas Blancas - km 51		11	257,4	01/11/08	31/10/10	30.124	2.931	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		8	68,0	01/11/08	31/12/09	10.000	2.708	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	32	51	FORMOSA	81	Ls Lomitas - Lte. c/Salta		8	215,0	01/11/08	31/10/10	11.000	2.860	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	6	33	51	ENTRE RIOS	S/N	Camino Botte a RNN°12 Bovril Entre Ríos		8		01/11/08	31/10/10	1.400	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total Sistema Modular												301.464	73.264	56.752	39.346				
Obras de Seguridad Vial																			
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/08	31/10/10	15.000	3.613	250	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01/11/08	03/03/09	11.000	3.513	250	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01/11/08	30/09/09	8.292	3.529	183	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/11/08	30/03/09	2.300	2.644	115	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/11/08	30/03/09	2.000	2.688	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Int. C/R,P.N° 6, R.P.N° 2 y Acc. A Bovril	Inter. RNN°127 - RPN°2 - Acceso a Bovril	17	5,5	16/04/07	31/10/08	15.318	6.917	5.322	3.299	4,5%	69,8%	6	
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/08	31/10/09	2.000	4.125	1.125	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN°251-Tratamiento de la circulación nocturna		17	1,0	01/11/08	30/04/09	11.488	4.718	574	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la circulación nocturna		17	1,0	01/10/08	31/03/09	300	4.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/11/08	30/04/09	600	3.575	60	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	5,4	01/11/08	31/05/09	1.200	4.416	590	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/11/08	31/05/09	600	3.825	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6)		8	1,0	01/11/08	31/05/09	500	3.825	100	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	10/03/09	6.271	4.225	300	590	11,5%	11,5%	6	
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con RN°95 y RPN°2		17	1,0	01/11/08	30/05/09	1.800	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/RNN°81	(Prog. Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	01/11/08	31/07/09	3.000	4.188	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Emp.RPN°116-Intersección en T sucesiva en Emp.c/RNN°116		17	1,0	01/11/08	31/05/09	450	3.938	2.236	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Int. RNN°20 y RNN°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	30/11/08	4.071	4.889	741	0	23,6%	23,6%	6	
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN°60 (Alto Nivel Emp. RNN°9)	17	1,0	07/11/06	07/05/08	11.770	2.600	2.600	5.316	0,0%	99,2%	7	C
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I Int. RPN°7 - Int. RPN°60	8	12,2	01/09/08	30/09/08	10.000	4.975	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II Int. RPN°60 - Int. RPN°2	8	4,0	01/09/08	30/09/08	3.500	3.800	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	13	51	CORRIENTES	14	RPN°40 - Gdor. Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/11/08	31/07/09	7.000	3.938	350	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	4.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	6.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San German - Límite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.909	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RPN°7	Intersección con RNN°127	17	1,0	01/11/08	31/03/09	2.500	4.013	250	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	18	51	RIO NEGRO	151	Intersección RNN°151 - RPN°69		17	1,0	01/11/08	31/05/09	5.000	3.952	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	19	51	RIO NEGRO	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	4.409	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Emp. RPN°406 - Choele Choe	km 994,2 -km 995,7	17	1,5	01/11/08	31/05/09	3.000	3.750	200	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junín de Los Andes	17	1,6	01/11/08	31/05/09	10.000	4.125	500	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Emp. RPN°90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN°90	Acceso a Margarita Belén	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Emp. RPN 90	Emp. RPN°90	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	25	51	CHACO	11	Emp. RPN°90 - Lte. Chaco/Formosa	Acceso a La Leonesa	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.709	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Lugones		17	1,8	01/11/08	31/03/09	2.500	3.638	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/08	02/04/09	3.000	3.875	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01/11/08	31/03/09	3.000	4.575	0	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Emp. RPN°5 - Pozo Hondo	Emp. RPN°5	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	4.059	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte. con Chaco - Quimilí	Emp. RPN°92	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	4.209	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	31	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.769	167	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	32	51																

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTotal	Est	Obs	
16	7	38	51	CHACO	95	Intersección con Acceso Norte a Villa Angela		17	1,0	01/09/08	28/02/09	2.000	4.366	133	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	39	51	MISIONES	14	Travesía por Salto Encantado	Prog. 936 - Prog. 938	17	2,0	12/09/07	30/12/07	951	4.767	0	0	0,0%	99,8%	7		
16	7	40	51	MISIONES	14	Intersección Cruce Karavin y Accesos a Guaraní y Campo Viera		17	1,0	01/11/08	31/10/09	10.000	3.977	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	41	51	SALTA	9-34	Paso por Metan		17	1,0	01/11/08	31/07/09	20.000	3.750	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	42	51	CORDOBA	60	Emp. RNN°9 - Lte. con Catamarca	Paso por Dean Funes km 822,700 - km 826,600	17	3,9	27/05/08	25/11/08	8.909	5.563	0	0	44,3%	44,3%	6		
16	7	43	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chamical	17	2,0	01/11/08	31/05/09	2.500	2.909	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	44	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Emp. RNN°74	Emp. RNN°150 - Emp. RNN°74	17	1,0	01/11/08	31/07/09	5.000	4.510	247	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	45	51	LA RIOJA	76	Villa Unión - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	2.859	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.759	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamical	Acceso a Olta	17	1,0	01/11/08	31/05/09	2.500	3.859	167	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía Urbana por Funes		8	2,0	01/11/08	31/10/09	10.000	4.402	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda (Formosa)		8	1,5	11/11/08	10/11/10	4.500	4.688	0	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	50	51	JUJUY	9	RNN° 9 Mejoramiento de Accesos y Circunvalacion Vial Humahuaca		8	1,0	01/11/08	31/10/10	2.000	500	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Obras de Seguridad Vial												331.620	235.228	18.898	9.205					
Total Mantenimiento												1.039.093	475.564	365.378	280.754					
CONSTRUCCIONES																				
Corredores Viales I																				
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. c/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana R° Pereyra II	8	6,4	21/02/01	30/08/05	12.589	3.700	12.579	12.579	0,0%	100,0%	8		
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués	8	33,0	03/02/97	30/04/04	9.362	3.700	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marqués - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	30/04/04	13.596	3.700	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	31/08/05	17.646	3.700	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIº: Río Cacheuta - Emp. RNN°7	8	9,8	21/02/01	30/01/10	33.805	3.700	3.634	2.324	5,2%	96,4%	6	A	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	31/08/05	22.243	3.700	0	0	0,0%	100,0%	8		
Total Corredores Viales I												109.241	22.200	16.212	14.902					
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																				
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	30/04/08	93.906	17.276	27.059	26.965	0,0%	99,8%	7		
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/Santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01/11/08	31/05/10	60.000	8.500	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	30/06/09	52.801	26.693	19.152	12.184	7,5%	47,7%	6		
22	2	13	51	MENDOZA	40S	Emp. RNN°144 - El Sosneado	km 260 - km 278,69	8				0	3.804	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog.502 - prog.520)	8	18,0	04/01/05	28/02/07	15.226	3.898	18	0	0,0%	99,4%	8		
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. RNN°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 11	8	11,0	01/11/08	31/10/09	13.000	4.875	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/08	30/11/10	60.000	6.060	2.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	15/12/08	49.394	11.796	28.002	20.463	8,3%	68,0%	6		
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Emp. RNN°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/08	30/11/09	26.400	4.297	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	31/03/09	154.373	38.254	43.065	35.049	11,1%	47,7%	6		
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	30/05/09	31.635	5.850	897	0	11,1%	14,4%	6	A	
22	2	40	51	MENDOZA	7	Luján de Cuyo - Potrerillos	10/01/94	5		30/06/94		15.267	0	0	0	0,0%	86,9%	7		
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/08	30/11/09	18.000	4.125	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrerillos - Lte. c/ Chile		5	70,0	01/11/08	30/11/09	46.000	6.278	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog. 520 - prog. 538)	8	18,0	04/01/05	03/06/06	12.835	4.600	20	0	0,0%	100,0%	8		
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/08	31/10/10	68.244	6.172	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/08	30/04/10	40.000	4.750	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/02	12/05/05	32.003	100	810	0	0,0%	97,7%	7		
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	30/12/05	33.502	100	100	0	0,0%	97,5%	7		
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Emp.RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01/11/08	30/11/09	57.152	5.833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersección Emp. RPN°16 - Intersecc. Emp. RPN°20	8	18,2	16/11/05	31/10/08	70.878	16.433	192.764	27.895	5,8%	91,8%	6		
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°20 - Emp. RP°J" (Colonia Elía)	8	27,7	26/11/06	31/05/09	114.425	34.853	34.853	16.329	6,5%	34,2%	6		
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP°J" (Colonia Elía) - A°Colman	8	34,8	21/09/07	31/05/09	187.536	57.149	46.774	19.053	0,2%	14,6%	6		
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Colman - Emp. RPN°29	8	33,3	28/06/07	31/05/10	249.633	76.136	61.136	43.260	8,2%	27,7%	6		
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	31/12/10	279.001	84.979	1.979	42.241	5,5%	24,6%	6		
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	208.380	63.466	50.916	45.182	2,2%	31,8%	6		
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°18 - A°Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	246.047	75.104	57.362	34.558	6,1%	25,3%	6		
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29/06/07	30/05/10	204.380	62.330	57.419	53.343	8,0%	38,6%	6		
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Mandisoví Grande - Río Mocoretá	8	35,9	01/06/07	30/05/10	225.650	68.693	54.954	32.017	5,6%	23,7%	6		
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A°Curupicay	8	33,6	21/09/07	30/09/10	165.270	55.090	44.090	15.668	5,4%	17,0%	6		
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A°Curupicay - Emp RNN°127	8	29,3	21/09/07	30/09/10	139.932	46.644	27.144	20.728	3,8%	20,3%	6		
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°127 - Establecimiento San Agustín	8	32,4	01/10/07	30/10/10	169.127	56.376	45.101	28.321	3,7%	18,6%	6		
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Estab. San Agustín - Emp. RPN°126	8	30,4	21/09/07	31/05/10	165.845	55.281	44.225	25.151	5,2%	23,0%	6		
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RPN°126 - Emp. RNN°117	8	27,6	21/09/07	30/09/10	140.673	42.734	20.734	29.624	4,9%	22,9%	6		
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Emp. RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	62.722	28.040	28.040	9.490	4,3%	18,8%	6		
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo Acc													

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO					
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs		
Obras por Convenio con Provincias																					
22	3	1	51	PAIS	Varias	Convenios con Provincias y Municipios	Nacional	14	1.030,1	01/01/08	31/12/08	3.347	17.000	3.385	3.347	24,9%	66,4%	6	B		
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A:Vinchina-A. Jague y B: Acceso a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	08/11/08	80.469	3.600	14.186	13.104	1,5%	66,6%	6	A		
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/99	15/07/09	42.386	3.600	4.765	705	1,5%	64,0%	6			
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulas Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	12/01/10	101.301	27.789	30.279	30.239	1,8%	85,1%	6			
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	4.600	7.323	7.323	0,0%	83,6%	8			
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	01/09/08	65.351	25.086	4.013	4.013	1,1%	34,3%	6	A		
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	11/11/08	241.392	50.419	19	0	0,0%	0,1%	14			
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - RNN°75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	31/05/07	45.524	3.560	1.901	1.901	0,0%	93,6%	7			
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/99	31/12/06	27.530	3.560	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	01/05/92	31/01/05	32.610	4.350	812	812	0,0%	88,2%	7			
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	30/04/08	21.460	12.004	15.394	12.394	0,0%	100,0%	8			
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	8	40,0	19/02/01	31/10/05	28.524	100	100	0	0,0%	99,2%	7			
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	2.600	1.160	1.160	0,0%	99,2%	7			
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Emp 52/Perico-Jujuy/Emp. 9-Lte c/Chile	8	267,0	08/09/00	31/10/05	209.057	100	100	0	0,0%	96,8%	7			
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km.25 - Campanas (Acceso a Ssnto Domingo)	5	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	3.433	33	0	0,0%	87,6%	7			
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (RNN°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	30/11/08	98.654	3.350	3.000	0	0,8%	95,9%	6	A-C		
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	08/04/06	12.688	4.350	0	0	0,0%	91,1%	7			
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acceso a Cajón Grande	8	22,9	20/11/00	31/03/06	11.890	3.350	814	814	0,0%	99,5%	7			
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.RNN°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	31/08/00	15.305	0	224	224	0,0%	94,8%	7			
22	3	25	51	SANTA FE	95	Emp. RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/09/08	106.412	25.300	42.028	29.667	0,4%	98,8%	6	A		
22	3	26	51	SANTA FE	95	Emp. RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	30/04/08	58.650	3.660	13.104	13.104	0,0%	100,0%	8			
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Río Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	km 10,125 - km 20,846	5	10,7	01/11/08	31/10/09	37.564	4.185	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunvalación de Rosario (Colectoras)	km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/09/08	31/08/10	30.000	4.185	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	km 0 - km 32,05 -	8	32,1	24/09/01	28/02/07	76.922	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km 123,43	5	46,4	04/10/04	28/02/06	18.036	3.660	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/03	28/02/07	83.843	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/12/07	27.575	4.350	31.619	2.190	0,0%	100,0%	7			
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	31/03/06	31/03/08	38.892	2.560	2.560	16.442	0,0%	99,8%	7			
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	30/11/08	42.324	6.928	6.928	10.408	6,3%	91,3%	6			
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	30/05/08	29.484	2.666	2.666	12.170	0,0%	92,4%	7			
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	30/11/08	28.390	4.600	4.600	10.434	0,0%	98,2%	14	C		
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - km 269	8	43,8	01/02/07	28/01/09	68.931	30.579	20.579	18.903	4,3%	84,2%	6			
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - km 340	8	72,0	23/03/06	31/03/09	90.999	28.513	28.513	26.604	11,6%	92,3%	6			
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	01/11/08	31/10/09	120.000	7.727	7.727	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu km 410 - km 537	8	126,7	01/11/08	02/05/11	110.000	10.750	10.750	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. RNN°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,0	01/11/08	01/09/10	12.300	6.038	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo S. Julián	km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/01/09	108.048	30.569	31.343	30.649	0,4%	16,3%	6	A		
22	3	89	51	SANTA CRUZ	P15	RPN°11 - Paso Zamora		8	58,0	01/11/08	31/10/09	116.000	4.493	35	0	0,0%	0,0%	0			
Total Obras por Convenio con Provincias												2.333.498	353.814	290.159	246.608						
Mejoramiento y Reposición de Rutas																					
22	4	1	51	PAIS	Varias	Rehabilitaciones Menores		14	201,8	01/01/08	31/12/08	24.421	13.252	29.361	28.212	25,0%	66,7%	6	B		
22	4	2	52	LA RIOJA	40(N)	La Tucumanesa - Sañogasta	Secciones I - Ila y IIB (km 485 - km 522)	8	51,1	08/01/07	31/12/08	52.755	24.680	7.274	3.274	11,0%	39,1%	6			
22	4	3	51	RIO NEGRO	258	Variante desde RNN°237	Variante Paso por Bariloche	8	14,7	14/10/99	11/04/08	17.633	4.560	277	0	0,0%	97,1%	7			
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog 0 - Prog 41.530	8	42,1	01/11/08	30/11/09	131.544	5.785	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	4	8	51	SALTA	34	Emp. RNN°81 - General Mosconi	km 1398 - km 1431	5	33,0	14/11/95	01/07/97	1.281	0	63	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	11	51	NEUQUEN	40	Bajada del Agrio - Chos Malal	Pte. s/ Río Salado	8	6,7	22/10/96	03/12/04	3.045	2.558	0	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	22	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Río Milna - Rancho Hambre	km 2988,48 - km 3000,00 (Paso Garibaldi)	8	11,5	01/02/99	31/01/05	16.289	100	9.999	9.899	0,0%	99,0%	7			
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/05	30/10/08	58.689	2.660	74.184	1.347	0,1%	96,2%	6	A		
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección II	km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/05	28/02/09	255.286	1.357	1.357	43.074	3,3%	88,7%	6			
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Sección III	km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/05	30/06/08	130.547	2.617	2.617	18.167	0,0%	98,5%	7			
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	30/09/08	35.624	2.760	12.128	7.867	4,2%	89,3%	6	A-C		
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	km 1845 - km 1867	8	22,3	01/11/08	30/11/09	56.000	4.743	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	31																			

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs	
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	3.752	0	0	0,0%	94,6%	7		
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	08/10/04	7.038	3.713	0	0	0,0%	91,6%	7		
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	31/01/06	13.654	1.430	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María-James Craik; James Craik- Oncativo;Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	30/05/09	337.039	100	2.516	2.516	0,2%	69,0%	6	A	
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	31/12/07	499.836	100	11.852	11.852	0,0%	99,9%	7		
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN°127	km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09/09/03	31/10/04	7.653	3.126	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	30/08/06	10.479	6.130	0	0	0,0%	99,6%	7		
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Traful	8	25,9	08/10/04	08/04/09	56.333	3.303	7.740	219	0,0%	10,9%	6		
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Inter. Norte RNN°3 - Inter. Sur RNN°3	8	7,0	28/09/06	30/09/09	179.938	40.363	17.574	14.599	3,3%	29,4%	6	A	
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	km 54,6	8	54,6	20/01/04	27/08/06	13.954	2.136	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/04	31/07/05	1.291	2.151	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación Cruce por la Ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/03/07	25.022	9.900	0	0	0,0%	94,1%	7		
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Limite c/Chubut - Caleta Olivia	km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	30/04/04	4.717	100	100	0	0,0%	95,4%	8		
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	15/12/04	15.758	3.166	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	57	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/Río Corrientes)	km 714,00 - Paso Santa Rosa - Río Corrientes	8	0,5	01/11/08	31/01/10	2.782	0	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupí-Bzo. Guayquiraró-R. Guayquiraró-A° Carumbé - km 646/km 648	8	1,0	01/06/07	30/03/09	12.488	3.979	3.369	2.711	8,0%	41,0%	6		
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapa I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	17/01/09	33.192	3.760	9.306	9.299	4,2%	85,9%	6		
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	28/02/08	61.051	600	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	31/05/08	71.684	100	5.294	5.294	0,0%	84,0%	7		
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN°29	Acceso Salvador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas	5	1,9	20/07/04	31/10/05	3.497	100	100	0	0,0%	92,2%	7		
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuntos	8	3,5	01/01/03	30/12/03	6.541	3.163	0	0	0,0%	87,1%	7		
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	km 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14/10/04	31/01/07	23.840	100	13.369	11.897	0,0%	99,8%	7		
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a Pozo del Mortero	8	25,0	14/10/04	30/04/06	34.499	100	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	30/11/07	38.033	100	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/04	31/07/07	40.501	100	80	0	0,0%	97,7%	7		
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ingeniero Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	30/03/08	48.581	100	80	0	0,0%	93,3%	7		
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ingeniero Juárez - Lte. c/Salta	Sección I: Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	07/01/08	53.363	10.000	8.000	0	0,0%	98,8%	7		
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	km 25,5 - Limite con Salta	8	27,0	10/10/06	31/12/07	41.991	18.878	15.102	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Lte.c/Formosa - Los Blancos - Sección VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	100	80	0	0,0%	99,9%	7		
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Sección V	8	30,0	07/06/05	31/08/07	27.008	2.500	2.000	0	0,0%	91,1%	7		
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Sección IV	8	31,1	12/07/05	31/07/07	29.153	100	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	30/03/07	13.666	100	80	0	0,0%	99,1%	7		
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.091	100	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	31/05/07	21.541	100	80	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Sección I	Emp. RPN°436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. RPN°12 (Pachaco-Pte.s/Río San Juan)	8	16,0	05/05/04	30/10/05	5.454	2.203	0	0	0,0%	99,0%	7		
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	30/07/06	48.775	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	31/03/07	37.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	31/12/04	9.402	100	100	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/03	30/11/08	43.296	100	100	0	0,0%	56,3%	6	S/D	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	28/02/09	86.828	100	6.177	6.177	0,9%	88,2%	6	A	
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	31/07/07	76.152	100	100	0	0,0%	88,9%	7		
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	27/05/07	70.028	100	3.361	3.361	0,0%	96,0%	7		
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección III: km 86 - Emp. RPN°11	8	42,3	27/05/04	28/02/08	59.913	100	100	0	0,0%	97,5%	7		
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	30/11/08	32.190	100	100	0	0,0%	88,4%	6	S/D	
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. RPN° 11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Emp. RPN°11	8	28,4	07/02/03	30/06/05	37.081	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera	km 40,3	8	40,3	27/10/00	31/12/04	66.317	100	100	0	0,0%	80,4%	7		
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/00	31/10/04	28.335	100	100	0	0,0%	96,1%	7		
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. S/Río Turbio	km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/08/01	30/12/05	19.050	100	100	0	0,0%	100,0%	7		
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/06	31/07/07	67.012	3.366	20	0	0,0%	100,0%	8		
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp. RPN°2 (V. María) - V. María - Oncativo	8	91,0	17/04/06	30/11/									

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO					
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs		
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/08	30/10/13	193.000	8.406	6	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/08	31/10/09	4.400	3.435	35	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (Sección I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	30/11/04	21.266	1.302	0	0	0,0%	79,9%	7			
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	km 217 - km 225	5	8,0	03/08/05	31/08/08	56.337	99	19.894	13.665	8,4%	92,3%	7			
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	01/11/08	31/10/11	70.400	3.755	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	15/12/08	86.759	1.355	17.279	12.366	0,0%	94,3%	6	S/D		
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Cmdte. Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/05	30/11/08	142.562	3.366	0	0	0,2%	78,6%	6	A-C		
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	01/12/08	117.357	19.854	0	0	0,8%	74,3%	6	A		
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	31/05/09	96.967	26.810	19.019	19.019	0,8%	33,4%	6	A		
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (RPN°39) - Río Olñie	8	28,3	01/03/07	30/10/09	55.200	18.309	29.049	13.777	1,4%	51,2%	6	A-C		
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olñie - Las Horquetas - Sec. I - II	8	72,9	07/11/06	31/03/10	110.626	24.425	14.420	7.192	0,7%	14,1%	6	A		
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Puente s/Río Chico	8	55,4	15/09/06	15/03/09	84.533	26.737	737	35.014	0,5%	79,2%	6	A		
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acceso Pte. s/Río Chico - Gobernador Gregores - Secciones I- II sobre RPN°25	8	66,5	01/11/08	31/10/10	65.000	4.717	4.717	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Secciones I - II sobre RPN°29	8	57,0	01/11/08	31/10/10	55.000	4.193	4.193	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II-III y Acceso Tres Lagos por RNN°288 -km 2411,37 - km 2526	8	116,8	01/11/08	31/10/11	115.000	2.867	2.867	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	30/01/09	123.783	28.350	20.743	23.986	0,7%	39,7%	6	A		
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Emp. RPN°25 - Pico Truncado	Emp. RPN°25 - km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/04	30/11/08	102.677	25.875	3.243	0	0,0%	93,1%	6	S/D		
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavimentación en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	30/11/08	37.742	2.255	2.467	1.800	0,8%	73,9%	6	A-C		
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	27/11/08	69.532	18.429	9.810	8.046	0,9%	45,4%	6	A		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												8.406.345	961.432	1.006.605	843.011						
Obras por Concesión sin Peaje COT																					
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	222.530	14.527	57.376	53.456	1,8%	71,5%	6			
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. RNN°5	13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	15.064	55.273	50.471	3,1%	70,3%	6			
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												456.896	29.591	112.649	103.928						
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes																					
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,0	01/11/08	31/10/09	3.300	3.392	140	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0	01/11/08	30/04/09	1.500	1.321	67	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01/11/08	30/11/08	6.700	1.589	267	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	31/10/04	6.344	3.317	0	0	0,0%	99,5%	7			
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	31/10/04	8.112	3.600	0	0	0,0%	100,0%	8			
22	6	8	51	SAN JUAN	P510	Pte. s/Río del Valle		8	80,0	01/11/08	30/11/08	1.175	1.326	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	15/12/03	12.406	100	100	0	0,0%	67,0%	8			
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike-Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	30/11/08	18.824	1.399	2.800	2.800	0,0%	94,5%	6	S/D		
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.700	1.613	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.200	1.321	67	0	0,0%	0,0%	2			
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	01/11/08	31/10/09	1.300	1.272	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/08	30/01/09	1.250	1.289	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	31/12/08	13.225	1.549	7.117	6.251	17,5%	63,4%	6	A		
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	01/11/08	31/10/09	1.470	1.298	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/08	31/10/09	1.140	1.249	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/08	31/10/09	1.460	1.262	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.170	1.253	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.500	1.267	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp.RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte.s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.500	1.267	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/08	31/01/09	2.100	1.313	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Prog. 1,00 (Pte. s/ Río Alumine)	8	30,0	01/11/08	31/10/10	18.487	3.598	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/08	31/10/09	1.900	1.104	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/11/08	31/10/09	3.000	2.385	0	0	0,0%	0,0%	2			
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Callegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	10/09/08	17.820	7.103	3.478	2.628	9,2%	68,1%	6			
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/08	31/10/09	3.700	1.321	67	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/08	31/05/10	3.300	1.347	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.300	1.254	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	36	51	BUENOS AIRES	12	Puente Zárate - Brazo Largo	Reparación de obenques	5	1.200,0	01/09/04	31/10/08	69.497	2.660	5.623	1.491	1,2%	84,2%	6	A-C		
22	6	37	51	SANTA CRUZ	3	Puente s/Río Coyle - Refuerzo de fundaciones		5	20,0	29/08/03	30/06/04	10.687	100	100	0	0,0%	98,5%	7			
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acceso a Santo Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/11/08	31/10/09	1.400	1.283	0	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/07	28/03/09	28.779	14.362	13.134	12.060	12,1%	64,6%				

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/08	31/10/09	1.500	1.313	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente nuevo y accesos	8	70,0	27/06/06	30/10/08	18.111	1.350	3.564	3.535	0,8%	87,2%	6	A-C
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/11/08	31/10/09	3.800	1.394	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/11/08	31/10/09	2.500	1.324	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FFCC Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/11/08	31/10/09	50.000	1.931	556	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/11/08	31/10/09	30.000	1.833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	01/11/08	31/10/09	25.260	1.900	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	km 97,77	8	30,0	01/11/08	31/05/10	13.600	378	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/11/08	31/10/09	4.000	28	28	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo. del Estero	Puente s/ Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	31/12/09	28.250	521	21	0	10,6%	10,6%	6	
22	6	58	51	CORRIENTES	P 114	RPN°40 - RNN°14	Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza)	8		01/11/08	31/05/10	17.951	345	0	0	0,0%	0,0%	4	
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes												454.948	89.024	37.434	28.763				
Obras en Corredores Viales Concesionados																			
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N°8 - Emp. RNN°3 - Acceso a Espigas	km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	28/02/05	8.823	100	100	0	0,0%	97,6%	7	
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N°10A - Emp. RPN°6 - Acceso Videla Dorna	km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	04/02/05	6.855	100	100	0	0,0%	96,6%	7	
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N°10B - Acceso Videla Dorna - Emp. RPN°61Dorna	km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	31/12/06	15.332	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN°4 y FFCC Gral. San Martín- Emp. RPN°10	km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	30/08/05	12.738	100	275	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN°1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	30/11/06	17.420	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N°13 - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°35	km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	30/06/05	13.317	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	31/07/06	15.086	100	731	244	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N°2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	31/12/06	46.473	100	100	468	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N°12 - Puerto Reconquista - Emp RNN°11	km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	31/07/06	10.418	100	99	31	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Emp. RNN° 9 (Salida Córdoba)	km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	30/04/05	6.704	100	100	417	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N°15 - Emp. RNN°168 - Emp. RPN°39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	30/09/06	7.637	750		0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N°16A - Emp. RPN°38 - Emp. RPN°98	km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	31/12/04	2.566	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N°16B - Emp. RNN°98 - Emp. RPN°40	km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	31/10/06	24.037	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N°17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	31/05/05	20.732	100	0	384	0,0%	100,0%	8	
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N°18 - Emp. RPN°66 - Emp. RPN°101	km315-km323/ km337-km364/ km382-km384/ km415-	5	63,0	05/08/04	30/06/05	16.386	100	0	0	0,0%	99,9%	7	
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N°3 - Rufino - Emp. RNN°8	km420/ km450-km471	5	95,5	23/11/04	30/11/05	17.560	100	24.100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N°4 - Emp. RPN°6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	km 535,55 - km 631	5	78,0	28/07/04	30/06/05	18.721	100	100	835	0,0%	100,0%	8	
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N°29 - Emp.RNN°9 - Emp. RNN°8	km 676 - 754	5	31,7	19/12/05	30/12/08	30.957	100	100	17.596	4,1%	99,1%	6	A
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8- Emp.RNN°36	km596-km606,30/ km631,60-km640/ km646- km649,5/ km666-km673/ km717-km719/ km728- km732/ km754-km761	5	42,0	19/05/05	30/04/07	30.444	100	3.100	4.254	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°5A - Emp. RPN°64 - Rafaela	km 151 - km 225	5	74,0	20/07/04	31/07/05	24.083	100	614	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°5B - Rafaela - Emp. RPN°13	km 225 - km 247	5	22,0	14/07/04	31/12/04	1.626	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°6A - Emp. RPN°80 (S) - Emp. RPN°33	km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	31/12/06	14.444	100	100	758	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°6B - Emp. RPN°23 - Lte. c/ Sgo. del Estero	km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	31/12/04	2.742	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°20 - Emp. 2° Circunv. de Rosario - RPN°65	km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	30/04/06	29.468	100	100	356	0,0%	100,0%	8	
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N°25 - Emp.RNP°65 - Emp. RNP°66	km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	30/11/05	22.829	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N°9 - Makalle - Emp. RNN°95	km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	31/05/05	13.346	100	100	0	0,0%	98,4%	8	
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N°23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	31/05/08	18.257	100	7.870	7.870	0,0%	100,0%	8	
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	km 866 - km 871 (Lte. San Luis/Mendoza - Acceso a La Paz)	5	5,0	06/04/06	30/11/06	1.775	750	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N°21 - San Francisco - Emp. RPN°81-A (S)	km 128,18 - km 131,50/ km 230-km 243/ km 245 - km 247	5	32,0	24/04/06	31/08/07	16.339	556	1.106	1.337	0,0%	100,0%	8	
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N°207 - La Francia - Río Primero	km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/06	31/01/08	29.345	463	231	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Emp. RNN°188 - Emp. RPN°6 (S)	km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	17/01/09	37.940	225	23.197	12.197	9,4%	72,3%	6	A
22	7	11	54	SAN LUIS	8	CVN°4 - km304-km306-km442-km468/km475-km480/km595- km600/km695-km723	km 442-km 468 / km 475 - km 480/ km 595- km 600/ km 695- km 723	5	64,0	08/05/06	25/08/07	37.455	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	12	51	CORDOBA	9	CVN°5 - Desvío Tránsito Pesado Villa María	km 555 - km 561,700	5	7,0	06/02/07	30/11/08	13.208	100	17.334	4.845	0,0%	89,2%	14	C
22	7	12	52	SGO DEL ESTERO	9	CVN° 5 - Obra 24A - Emp. RPN°208 - Emp. RPN°347	km 1168 - 1178 / km 1206 - km 1215 / km 1225 - 1250	5	44,0	23/01/06	30/06/08	38.530	100	100	10.038	0,1%	96,8%	7	
22	7	13	51	SANTA FE	11	CVN°6 - Emp. RPN°100 (S) - Emp. RNN°16	km 998 - km 939 / km 984 - km 1008	5	65,0	08/02/06	30/06/08	33.729	225	14.059	9.059	1,8%	100,0%	7	
22	7	13	54	CORRIENTES	12	CVN°6 - Obra N°27 - Emp. RNN°123 - Emp. RPN°19	km 881 - km 890 / km 892 - km 897	5	14,0	01/03/05	15/10/05	4.363	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	51	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Emp. RPN°61 - Acceso a Parish	km 199 - km 217 / km 244 - km 252	5	26,0	01/01/06	30/04/07	11.515	100	692	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	52	BUENOS AIRES	3	CVN°1 - Obra 238 - Emp. RP - Acceso a Azul	km 252 - km 296	5	41,0	01/06/06	25/02/07	17.046	337	337	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	14	56	BUENOS AIRES	205	CVN°1 - Emp. RPN°61 - Emp. RPN°65	km 260 - km 276	5	16,0	07/04/06	31/05/07	12.105	2.466	2.466	0	0,0%	100,0%	8	

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	7	14	57	BUENOS AIRES	226	CVN°1 - km 129 - km 135	km 0 - km 4 / km 129 - km 135	5	10,0	17/01/07	16/01/08	12.704	100	100	3.394	0,0%	97,1%	7	
22	7	16	59	SANTA FE	11	CVN°3 - Obra N° 233 - San Justo - Gobernador Crespo	km 564 - km 600	5	36,0	01/03/06	31/03/07	26.478	225	18.409	1.787	0,0%	100,0%	8	
22	7	16	60	SANTA FE	11	CVN°3 - San Justo - Gomez Cello	km 607 - km 635	5	28,0	14/03/06	30/04/08	26.613	470	470	10.092	0,0%	98,8%	7	
22	7	17	52	CORDOBA	8	CVN°4 - Obra N° 204 - Emp. RNN°36 - Acceso a Suco	km 600 - km 604 y km 635 - km 657	5	4,0	06/04/06	25/04/07	17.910	2.466	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	17	58	SANTA FE	33	CVN°4 - Obra N° 28 - Acceso Amenabar - Cruce FFCC G.B. Mitre	km 631 - km 673	5	42,0	30/12/04	30/10/05	11.807	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	7	19	51	CORRIENTES	12	CVN°6 - Acceso a Itati - Emp. RPN°13	km 1130 - km 1170	5	40,0	26/06/06	31/08/07	25.855	2.171	13.015	2.005	0,0%	98,3%	7	
22	7	19	52	MISIONES	12	CVN°6 - Obra N° 230 - Emp. RPN°34 - Posadas	km 1326 - km 1336	5	10,0	04/04/06	31/08/07	8.798	224	224	590	0,0%	89,7%	7	
22	7	19	53	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 213 - Emp. RPN°11 - Presidencia de la Plaza	km 68 - km 89	5	21,0	24/04/06	30/12/08	29.388	224	224	4.869	3,6%	88,7%	6	
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Emp. RPN°3 - Emp. RNN°148	km 442 - km 468/ km 475 - km 480/ km 595 - km 600 / km 695 - km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	100	100	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226 - Emp. RPN°79 (S) - Calchaquí	km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	30/09/08	21.351	100	0	0	5,4%	97,6%	6	A
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231 Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/06	30/12/07	18.111	5.683	0	0	0,0%	94,3%	8	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												938.202	20.736	131.270	93.427				

Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2	01/11/08	31/10/09	9.000	994	34	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO	-----	Corredor de los Lagos		8	51,5	26/11/07	30/11/09	35.000	287	5.011	4.704	3,2%	8,7%	6	B
Total Obras en Circuitos Turísticos												44.000	1.282	5.045	4.704				

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/11/08	31/10/10	25.000	1.417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. c/ Salta - Emp. RNN° 52	Secciones I y II	8	97,5	01/11/08	30/10/10	100.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN° 143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/08	31/10/10	7.000	417	17	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Emp. RNN°226 - Emp. RNN°3	8	40,0	23/11/07	30/11/09	82.218	1.713	5.311	1.508	2,6%	13,5%	6	A
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	220,0	01/11/08	30/10/11	47.800	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	01/11/08	30/10/09	7.500	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/10/08	30/09/09	10.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	01/10/08	30/09/11	73.000	1.666	1.333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/08	30/10/09	120.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/08	31/10/10	120.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/08	31/10/09	48.000	417	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - Sección IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/08	30/10/09	90.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	01/11/08	31/10/10	100.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Estancia Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	15/11/08	13/11/13	100.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/ Mendoza-Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/08	30/10/13	100.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex RPN°319		8	100,0	01/11/08	31/10/10	40.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN°14 - Empalme RPN°4		8	0,5	01/11/08	31/05/09	3.000	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. RPN°63 - Emp. RNN°11	8	7,3	18/10/06	16/10/08	65.362	20.407	18.653	15.093	7,6%	60,9%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Emp. Av. Sarmiento - Emp. RNN°11	8	5,4	18/10/06	18/10/08	41.085	9.043	4.043	0	7,4%	54,8%	6	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	30/07/09	46.083	958	7.246	3.927	13,0%	39,4%	6	
22	9	19	51	CHACO	P7	San Martín - Plaza		8	77,0	01/11/08	30/09/09	40.000	1.139	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	21	51	CHACO	P13	Villa Angela - General Pinedo		8	50,0	01/11/08	31/10/10	150.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/11/08	31/01/10	80.000	1.405	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	23	51	TUCUMAN		Ruta Parque Nacional Calchaquí	Entre San Pedro de Colalao y Colalao del Valle	8	80,0	01/11/08	30/10/09	50.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	01/11/08	30/08/09	80.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/11/08	31/10/09	8.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (Sección I)	Emp. RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	01/11/08	30/10/09	80.000	833	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (Sección II)	Cementerio - Autódromo y Accesos	8	10,6	01/11/08	31/10/10	50.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Emp. RNN°89 - Acc. Margarita Belén (Sección III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso Margarita Belén	8	14,7	01/11/08	31/10/09	70.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	27	51	CHACO	P12	Obras Empalme Ruta Provincial 12		8		01/11/08	31/08/09	17.000	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/08	31/10/12	200.000	4.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai	Sección I	8	47,0	01/11/08	31/10/12	5.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección II)	Sección II	8	46,9	01/11/08	31/10/12	150.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección III)	Sección III	8	44,6	01/11/08	31/10/12	210.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección IV)	Sección IV	8	55,3	01/11/08	31/10/12	150.000	1.979	1.583	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección V)	Sección V	8	42,4	01/11/08	31/10/12	180.000	1.770	1.416	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección VI)	Sección VI	8	45,1	01/11/08	31/10/12	210.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección VII)	Sección VII	8	45,0	01/11/08	31/10/12	180.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (Sección VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/11/08	31/10/12	180.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX - km 621,12 - 667,81	8	46,7	01/11/08	31/10/10	85.000	1.771	1.417	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/08	31/10/10	80.000	1.666	1.333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Río Bermejo	5	0,1	01/11/08	31/10/09	4.400	125	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	31	51	CHACO		Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/08	31/10/09	6.000	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	32	51	INTERPROVINCIAL		Puente Tres Pozos - Integración Chaco - Formosa		8	0,2	01/11/08	31/10/09	8.000	167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp RNN°258 (Emp RNN°40) - Cholíia	km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	31/05/09	36.995	422	6.624	4.328	4,1%	50,6%	6	A
22	9	34	51	CHUBUT	1S40-P70-S/N°	El Matén - Emp. RNN°40 (ex258-Epuén)-Acceso a Bs As Chico	km 6,074 - km 18,175 (1S40) - km 0,00 -km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	30/12/08	37.931	733	8.847	5.849	3,2%	88,0%	6	A
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1era. Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	30/12/08	44.170	3.267	16.508	11.967	1,0%	79,3%	6	A
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelin - Esquel	km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	30/03/09	17.550	663	11.830	9.321	5,1%	89,3%	6	A
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Limite c/Catamarca km 154		8	100,0	01/11/08	31/10/10	70.000	323	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01/11/08	31/10/11	300.000	6.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	01/11/08	31/10/10	50.000	2.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	40	51	CORDOBA	35	Arroyo El Gato - Emp.RNN°8	km 702 - km 704 - A° Corralito	8	2,0	27/01/06	31/12/06	2.649	225	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	42	51	ENTRE RIOS		Obra de Estabilización y Contención de Barrancas - Santa Elena		17		01/11/08	31/10/09	10.000	417	17	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras Reasfaltados de los Accesos Norte y Sur a la Ciudad de Villaguay		5		30/11/08	30/04/09	5.000	1.479	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	30/11/08	30/04/09	40.000	417	17	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS		Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/08	31/10/10	26.000	604	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	48	51	INTERPROVINCIAL		Puente San Juan, Rosario Santa Fe- Damas Patricias en General Roca		8	0,2	01/11/08	31/10/10	7.000	479	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	50	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en el Cruce de la RPN°69 y RNN°151 - Acceso Manzano		8	0,5	17/06/08	31/01/10	6.320	333	0	0	21,1%	21,1%	6	A
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Rotonda en 30 km RNN°151 Barda del Medio		8	0,5	01/11/08	31/05/09	4.450	336	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	31/03/10	225.760	1.563	22.175	22.175	0,3%	16,7%	6	A
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	31/05/10	139.214	556	40.627	32.577	0,6%	45,3%	6	A
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/río Chico	8	14,0	02/08/07	31/07/09	92.906	0	0	0	0,0%	6,0%	6	S/D
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Emp. RNN°60	Sección I km 752,08 - 753,66 y II Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	29/01/08	23.597	556	3.171	3.171	0,0%	92,5%	7	
22	9	57	51	MISIONES	101	Piñalito - Deseado - Emp. RPN°19	Piñalito - Deseado - Emp. RPN°19	8	31,0	22/03/06	22/03/09	92.326	13.000	13.134	13.134	0,1%	92,2%	6	A
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/08	30/10/08	3.554	513	1.359	673	45,6%	83,8%	6	A
22	9	59	51	BUENOS AIRES	Av.63	Autopista La Plata- Río de la Plata		8	6,0	01/11/08	31/10/09	20.000	743	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	30/11/08	60.088	12.557	22.343	15.343	3,8%	94,4%	6	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/06	31/07/08	16.021	723	7.507	3.337	6,0%	95,4%	7	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	30/08/08	45.428	704	10.168	10.065	3,6%	98,6%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	28/02/07	25.238	712	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	28/02/09	50.430	15.885	13.260	12.047	9,0%	56,5%	6	A
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección II	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/08	31/10/09	6.000	227	227	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección III	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	31/08/08	31/03/09	50.000	333	333	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - Sección IV	RPN°33, Puente s/Río del Valle - Puentes/Río	8	4,7	01/11/08	31/03/09	13.000	208	208	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas	8	6,0	14/01/08	30/09/08	4.147	583	2.283	1.369	24,3%	79,4%	6	
22	9	66	51	CHACO	P12	Charata - Emp. RPN°6		8	86,0	01/11/08	31/10/10	200.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01/11/08	31/10/11	36.000	1.500	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/08	31/10/10	4.000	208	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	01/02/09	41.350	11.884	9.083	9.021	0,4%	49,3%	6	
22	9	71	52	CHUBUT	P12	Emp. RPN°14 (Gualjaina)- Emp. RNN°40- Sección II	km 27 - km 62	8	35,0	01/11/08	30/09/09	45.000	917	917	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sección I - km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24 - km 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/10	61.361	21.979	6.498	6.719	0,1%	23,7%	6	
22	9	72	52	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado - Sección II	km 26,28 - km 62	5	35,7	01/11/08	31/10/10	40.000	867	740	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01/02/08	30/01/10	44.694	750	7.710	7.200	3,8%	13,9%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguer - Emp. RPN°20	km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	30/11/08	28.365	10.000	7.784	4.838	0,4%	52,9%	6	A
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/11/08	31/10/09	25.000	625	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Emp. RNN°7 - Emp. RNN°8	Puente s/A° El Gato (km 669,87)	8	0,1	27/12/05	27/04/06	228	856	0	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río san Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/10	4.628	250	1.679	1.679	3,2%	79,5%	6	A
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	01/11/08	31/10/12	530.000	2.760	13.000	8.652	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Emp. RNN°81	km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/06	30/05/08	14.819	100	8.642	8.298	0,0%	100,0%	7	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/08	30/11/09	32.762	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	88	51	FORMOSA	86	Mision Tacaagle - RNN°95	Emp. RNN°22 - Emp.RNN°95 y Acceso a Villa Gral. Güemes	8				0	20.000	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/07	30/05/09	88.366	1.538	76.343	24.975	8,7%	52,4%	6	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección II	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/07	08/08/09	100.466	1.736	1.736	7.309	9,7%	33,7%	6	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección III	III - San Martín N°2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	25/11/09	70.886	1.257	1.257	18.099	6,9%	16,5%	6	A
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - Sección IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07									

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Emp. RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/05	30/11/08	54.654	427	32.663	32.663	0,0%	99,9%	6	S/D
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J.M. Gorriti - Emp. RNN°9	8	8,0	07/08/06	30/04/09	133.458	2.500	60.173	29.858	12,0%	82,6%	6	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	30/06/07	701	369	0	0	0,0%	98,6%	7	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Emp. RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	465	17.300	17.300	0,0%	83,4%	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog 22.900 - Acceso a Cajón Grande	8	20,9	01/11/08	30/05/09	25.427	1.028	822	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	30/12/08	73.923	28.500	16.226	11.133	0,1%	22,2%	6	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Seccion III - a	Acceso a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/07	31/01/09	64.170	35.143	39.388	27.817	0,1%	58,8%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												6.918.225	300.396	537.710	398.687				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																			
22	10	1	51	MENDOZA	-----	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/08	31/10/09	25.000	903	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISIONES	----	Puente Internacional Encarnacion - Posadas		17	1,0	01/11/08	30/10/10	10.000	271	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/08	31/10/09	1.500	233	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado, R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	31/08/07	2.309	392	2	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalacion Villa La Angostura		8	6,0	01/11/08	31/10/10	36.000	325	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martin de Los Andes - Emp. RN N°231	Sección IV: Acceso Villa Traful - Emp. RNN°231	8	20,6	21/02/06	30/10/08	75.759	20.694	30.668	20.568	1,0%	64,2%	6	C
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chinchinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	30/05/09	127.458	2.021	11.415	6.519	7,3%	15,1%	6	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes	8	21,0	01/11/08	31/10/10	98.000	2.042	42	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales- Cipolletti	Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/11/08	31/10/10	100.000	2.083	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	01/11/08	31/10/10	100.000	2.083	2.083	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/10/08	30/09/10	43.000	896	896	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. RNN°237	Secciones I y II	8	65,0	01/10/08	30/09/10	86.400	2.076	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	10	51	RIO NEGRO	40	Emp. RNN°23 - Norquingo	Pte. s/A° Las Bayas - km 1272,39	8	0,1	01/02/06	30/11/06	797	225	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acceso a Bariloche por Calle Monseñor Esandi		8	3,0	01/11/08	31/10/09	18.580	146	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	12	51	SALTA	9	CVN°5. Obra 24-B-1.Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1448 - km 1462	5	14,0	18/12/06	30/11/08	20.548	100	14.637	13.723	0,0%	89,6%	6	S/D
22	10	12	52	SALTA	34	CVN°5. Obra 24-B-2. Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1462 - km 1478	5	16,0	07/04/06	30/12/08	40.798	100	100	0	4,2%	81,6%	6	
22	10	12	53	SALTA	9	CVN°5. Obra 24-B-3. Emp. RPN°3- Emp RNN°34	km 1478 - km 1500	5	22,0	12/04/06	31/10/07	38.180	100	100	0	0,0%	99,8%	7	
22	10	13	51	SALTA	16	Lie. c/Chaco - Emp. RNN°34	El Quebrachal - J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/08	31/05/10	20.000	271	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	14	51	SALTA	40	Payogasta - Emp. RNN°51	Prog 1220,3 - Prog 1339,19	8	118,9	01/11/08	30/10/10	68.000	921	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Emp. RNN°40	8	24,8	01/10/08	30/09/09	90.000	1.111	33.951	27.651	0,0%	0,0%	0	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	(Sección II - a 2) km 131 - km 143	8	12,0	01/10/08	30/09/09	235.425	1.111	1.111	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	Caballo Anca - Río Bermejo (Sección IIB)	8	12,2	24/06/08	30/06/10	46.200	781	781	4.620	3,7%	3,7%	6	A
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto- RNN°40	R. Bermejo - Emp. RNN°40 (Sección III)	8	36,4	21/08/07	30/08/09	125.874	1.413	1.413	0	14,9%	44,1%	6	
22	10	16	51	SAN JUAN	RP12	Pachaco- Calingasta	km 91 - km 100 - Emp. RPN°414 - Emp. RPN°12	8	0,1	26/10/05	25/08/08	17.933	225	0	0	0,0%	52,6%	7	
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente s/ Río Santa Cruz	5	0,2	01/11/08	31/10/09	5.000	166	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		8	9,0	31/07/07	30/11/10	155.922	29.820	37.379	25.825	10,1%	42,9%	6	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	8	3,5	01/11/08	08/02/10	140.269	451	51	0	0,0%	0,0%	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. RNN°33 - Villa Eloisa	km 115,76 - km 146	8	31,0	01/09/08	30/08/09	90.000	2.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. RNN°34	203-233	8	30,0	01/11/08	31/10/09	20.000	2.167	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/07	30/04/07	400	225	0	0	0,0%	100,0%	7	
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Paraná - Autopista Rosario - Córdoba (Av. Pellegrini)	Río Paraná - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/02/06	30/09/08	65.265	225	5.119	4.480	0,5%	86,5%	6	
22	10	28	51	SANTA FE		Municipalidad de Arroyo Seco	Acceso Alternativo Tránsito Pesado desde RNN°9	8	4,0	01/11/08	31/10/09	2.000	108	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	29	51	SANTA FE		Municipalidad de Ceres	Pavimentación Urbana- 34 Arterias Urbanas	8	3,4	01/11/08	30/10/09	1.948	391	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	30	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Portada Parque Nacional - Bahía Lapataia		8	16,0			0	363	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	19,9	01/10/08	30/09/09	130.000	2.708	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	09/03/09	116.069	2.190	29.932	29.412	8,3%	64,8%	6	A
22	10	33	51	BUENOS AIRES	S/N	Intersección Avda. General Paz y Camino Negro		8	1,0	01/11/08	31/10/09	50.000	433	33	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	127-P6-P2-12-131-P32-18	Intersecciones Rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones Varias	11	1,0	01/11/08	31/10/10	6.500	352	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección RNN°A015 y Calle Rósch	Conexión Acceso a Salto Grande y RNN°14	8	1,0	01/11/08	02/05/09	653	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01/11/08	31/10/11	30.000	870	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/10/08	30/04/09	2.500	3.565	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquén - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	01/11/08	31/05/09	2.500	4.506	1	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Emp. RPN°13	8	5,1	01/09/08	30/08/10	21.687	1.175	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Puente s/ Desvío Ferroviario	8	2,4	14/11/06	25/07/08	34.560	2.907	5.040	5.040	1,5%	82,8%	7	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av. H.Irigoyen/L.N.Alem-Portal Acceso Parque Nacional Tierra del Fuego -Bahía Lapataia-Acceso Cascada Río Pipo	8	22,0	01/11/08	31/05/10	60.000	567	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Rotonda Polivalente de Arte - Emp. Vte. RNN°3		8	5,0	01/11/08	31/05/10	10.000	567	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante Paso por Pergamino	km 64,50 - km 72,00	8	7,5	01/11/08	31/10/09	30.000	1.011	0	0	0,0%	0,0%	0	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/11/08	31/10/10	170.000	1.300	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Límite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/10/08	30/09/10	130.000	1.679	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante Paso por Palmira		8	30,0	01/11/08	31/10/11	100.000	2.166	1.766	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	50	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección I Emp. RNN°34 - Emp. RPN°20	8	32,0			0	5.692	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	10	51	51	SANTA FE	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección II Emp. RPN°20 - Lte. c/Córdoba	8	22,0			0	4.875	0	0	0,0%	0,0%	12		
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Seccion III Lte. c/ Santa Fe - RNN°158	8	6,2	01/11/08	31/07/10	51.987	3.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	54	51	CORRIENTES	117	COTECAR - Construcción Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/06	30/12/08	43.664	10.620	9.995	4.654	1,2%	57,9%	6	A	
22	10	55	51	LA RIOJA	79	La Antigua - Emp.RNN°60	km 333 - km 374,50 (Sección II)	8	33,5	19/05/06	31/03/08	26.316	226	11.449	11.449	0,0%	99,1%	8		
22	10	57	51	INTERPROVINCIAL	20	Va. Dolores-Límite Córdoba/San Luis-Quines	km 198,65- km 266,4	11	67,8	20/12/07	20/10/08	25.577	722	11.771	3.985	38,0%	84,0%	6		
22	10	58	51	CHACO	P13	Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. Sección I	Prog 0,00 - 22,05	8	22,0	01/11/08	31/10/10	80.000	1.027	722	722	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	59	51	CHACO	P13	Emp. RNN°11 (L. Palmares)- Cote - Lai - Prog. Sección II	Prog 22,05 - 43,28	8	22,0	01/11/08	31/10/10	80.000	903	722	722	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	60	51	CHACO	P13	Cotte-Lai - Emp. RPN°7 (Charadai) - Prog. 43,28 - 75,80	Prog 43,28 - 75,80	8	30,0	01/11/08	31/10/11	100.000	1.914	542	542	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	61	51	CHACO	P13	Emp. RPN°7 (Charadai) - Emp. RPN°4	Prog 81,28 - 135,18	8	53,9	01/11/08	30/11/10	70.000	993	794	794	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	62	51	CHACO	P13	Samuhu Emp. RPN°4 - Emp. RNN°95 (Villa Angela)		8	36,0	01/11/08	31/10/11	120.000	677	542	542	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RPN°20 (Gramado) - Emp. RPN°17 (1° Sección)	Prog 1056,00- 1090,00	8	34,6	01/09/08	30/08/10	140.000	2.166	1.766	1.766	0	0,0%	0,0%	0	
							Prog 1090 - 1117- Piñalito - Emp. RPN°17	8	21,4	01/11/08	31/08/10	170.000	1.897	1.518	1.518	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. RPN°20 - Emp. RPN°17 (2° Sección) (Dos Hermanas)		8	21,4	01/11/08	31/08/10	170.000	1.897	1.518	1.518	0	0,0%	0,0%	2	
22	10	65	51	CORDOBA	S/N	Circunvalación Noroeste (Obra Faltante)		8	8,0	01/10/08	30/09/09	200.000	5.417	17	17	0	0,0%	0,0%	0	
							RNN°293 -Tr. Emp. RNN°40 - Paso Fronterizo	8	75,0	01/08/06	30/07/09	155.167	37.800	51.473	2.319	0,4%	19,4%	6	A	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Güer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	Laurita	8	50,0	22/03/07	31/03/10	203.656	2.458	2.458	7.931	0,1%	10,2%	6	A	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - Sección II	El Zurdo - Ea. Bella Vista	8	50,0	22/03/07	31/03/10	203.656	2.458	2.458	7.931	0,1%	10,2%	6	A	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/07	30/10/09	120.273	1.319	1.319	47.776	0,5%	21,7%	6	A	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Güer Aike - Sección IV	Ea. Buitreras- Güer Aike	8	42,0	09/04/07	30/10/09	118.995	2.777	2.777	0	0,5%	32,1%	6	A	
22	10	68	51	SANTA CRUZ	40	Chimen Aike - Cabo Virgenes		8	130,0	01/11/08	31/10/11	300.000	0	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	69	51	MENDOZA	P 52	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	Calle San Martín - Acceso Planta Cementera	8	9,5	29/06/06	30/11/08	5.888	1.963	311	311	5,1%	87,6%	6	A-C	
							Planta Industrial Villavicencio - Monumento Canota	8	9,8	01/11/08	31/10/09	6.000	167	0	0	0,0%	0,0%	3		
22	10	69	52	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sección III)		8	8,2	01/11/08	31/10/09	6.000	354	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	69	53	MENDOZA	P52	Calle San Martín - Hotel Villavicencio (Sección V)	Fin Pavimento - Acceso Hotel Villavicencio	8	8,2	01/11/08	31/10/09	6.000	354	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	72	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián - (Dos Secciones)	km 2184,79 - 2284,79	5	100,0	20/12/05	30/11/08	148.562	100	43.385	29.381	2,0%	37,9%	6	A-C	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km. 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/06	30/07/09	120.420	22.424	22.424	20.586	0,5%	65,8%	6	A	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2164,79 - km 2184,79	8	20,0	01/11/08	31/10/10	100.000	500	500	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/07	30/11/08	43.103	802	802	18.811	0,7%	85,6%	6	A-C	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2088- 2164,79	8	76,8	01/11/08	30/10/09	80.000	1.667	1.667	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. RNN°38 - Lte. c/Catamarca		8	30,0	01/10/08	30/10/09	100.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	74	51	TUCUMAN	65(EX 365)	Concepción - Itico	Puente s/Río Chirimayo	8	0,0	27/07/06	31/10/07	1.333	465	500	435	0,0%	100,0%	8		
							Autopista Pilar - Villa María - Ciudad de Oliva	8	3,0	31/08/07	30/04/09	9.946	253	5.455	5.455	30,4%	80,3%	6		
22	10	75	51	CORDOBA	S/N	Autopista Pilar - Villa María - Acceso a Diferentes Localidades desde la Autopista		8	3,0	31/08/07	30/04/09	9.946	253	5.455	5.455	30,4%	80,3%	6		
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/11/08	31/10/10	35.550	542	42	0	0,0%	0,0%	2		
22	10	77	51	JUJUY	P73	Santa Ana - Valle Colorado		8	15,0	01/11/08	31/05/10	20.000	204	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	78	51	BUENOS AIRES	S/N	Camino de Circunvalación de la Laguna de Chascomús	Camping Monte Brown - Avenida Escribano	8	15,0	21/08/07	31/10/08	5.017	146	1.332	1.045	9,0%	42,8%	6	A	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquin - 2 Puentes		8	1,0	05/05/07	02/11/08	34.362	1.141	16.282	8.282	12,3%	63,5%	6		
							Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/08	31/05/09	1.600	87	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección RNN°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota		8	8,0	31/08/08	01/03/10	40.000	1.556	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - Emp. RPN°63- Acceso Puerto Tirol		8	8,0	31/08/08	01/03/10	40.000	1.556	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	82	51	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81 - Emp. RNN°86	Emp. RNN°81 - Riacho Monte Lindo Grande	8	43,9	18/10/07	30/10/09	152.151	2.356	0	0	3,7%	10,2%	6		
							Riacho Monte Lindo Grande - Estero Pigho Chico	8	37,6	18/10/07	30/10/12	130.364	0	0	0	5,5%	13,5%	6		
22	10	82	52	FORMOSA	P3	Emp. RNN°81- Emp. RNN°86	Emp. RNN°81- Emp. RNN°86	8	34,6	18/10/07	30/10/12	129.376	0	0	0	2,8%	7,8%	6		
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección I	8	15,0	01/11/08	31/10/10	60.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/08	31/10/10	70.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/10/08	30/09/10	60.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/10/08	30/09/10	60.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	85	51	SGO DEL ESTERO	34	Límite con Santiago del Estero - Gobernador Garmendia	km 857,52 - km 883,38	5	25,0	28/06/06	28/02/07	1.281	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
22	10	86	51	SANTA CRUZ		Velódromo y Autódromo - Caleta Olivia		8	4,0	01/11/08	30/10/09	16.000	867	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/07	01/05/10	208.911	3.000	16.353	11.099	8,1%	16,9%	6		
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	01/11/08	02/05/11	109.297	2.000	2.000	0	0,0%	0,0%	3		
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/11/08	30/06/09	20.625	139	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	10	92	51	BUENOS AIRES		Acceso a Campo Universitario Tandil		8	1,0	01/11										

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs	
22	11	9	51	SALTA	S/N	Tolombon - Hualinchay		8	40,0	01/11/08	31/10/10	15.000	1.667	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	11	51	CORRIENTES	123	Empalme RNN°12 - Mercedes		8	73,0	01/11/08	30/10/09	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01/11/08	31/10/09	6.000	233	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/10/08	30/09/11	230.600	3.203	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/10/08	30/09/11		2.233	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/10/08	30/09/11	187.350	2.602	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/10/08	30/09/11	216.800	3.011	11	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. RPN°6	8	36,6	01/10/08	30/09/11	183.100	2.542	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. RPN°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/10/08	30/09/11	146.050	2.028	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/ Río Chucul	8	39,7	01/10/08	30/09/11	198.550	2.758	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/ Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/10/08	30/09/11	106.150	1.474	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8	0,5	01/11/08	31/10/09	3.000	530	30	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/ Jujuy		8	40,0	01/11/08	31/10/12	200.000	627	240	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	20	51	CORDOBA	P14	La Paz - Lte. c/ San Luis	La Paz - Lte. c/San Luis	8	18,0	17/08/07	30/11/08	10.712	0	0	0	7,0%	70,0%	6	A	
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	31/07/08	2.192	282	0	0	11,2%	97,9%	7		
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Emp. RNN°9 (N) - Emp. RNN°9 (S)	8	7,5	01/02/08	31/01/10	49.396	722	6.911	5.481	3,3%	15,6%	6		
22	11	30	51	ENTRE RIOS	40	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Emp. RNN°12 - Emp. RPN°26	8	3,8	13/06/07	13/03/08	8.670	605	4.896	4.791	0,0%	96,6%	7		
22	11	31	51	MISIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	01/11/08	31/10/10	40.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	4		
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/08	31/10/10	54.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Emp. Acceso a Dique Ballester		8		01/11/08	31/10/09	4.000	813	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Empalme RPN°69		8		01/11/08	31/10/09	3.000	650	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. RN°66 - Emp. RN°34	8	13,0	01/11/08	31/10/10	60.000	1.250	1.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. RN°66 - Emp. RN°34	8	12,4	01/11/08	31/10/09	50.000	1.250	1.000	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/08	31/10/09	150.000	35.666	4.333	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	52	JUJUY	34	Acceso San Pedro de Jujuy-Libertador Gral. San Martín		8	57,0	01/11/08	30/10/14	400.000	60.111	4.889	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (Sección IV)	Sección IV 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	31/10/09	38.736	625	17.578	12.101	14,6%	65,5%	6		
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambalá y Fiambalá - Lte. con Chile		8		25/06/04	24/12/05	42.846	100	0	0	0,0%	0,0%	7		
22	11	43	51	SANTA CRUZ		Desvío Tránsito Pesado por Av. Asturias		8	10,0	01/11/08	31/10/10	60.000	550	50	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Empalme Autopista RNN°38		8	8,0	15/11/08	30/05/10	21.000	343	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acceso a San Benito - Av. Almafuerie (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/11/08	31/10/09	15.000	937	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	48	51	SAN JUAN	P511	San Agustín del Valle Fértil - San Ramón		8	50,0	01/11/08	31/10/10	70.000	889	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	49	51	ENTRE RIOS	P20	I - RPN°39 - Las Moscas	Sección I	8	30,6	01/11/08	31/10/10	50.000	903	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	50	51	ENTRE RIOS	P20	II - Las Moscas - Villaguay	Sección II	8	24,4	01/11/08	31/10/11	50.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	51	51	ENTRE RIOS	P51	I - Larroque - Estación Parera	Sección I	8	27,4	01/11/08	30/10/09	40.000	758	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	52	51	ENTRE RIOS	P51	II - Estación Parera - Urdinarrain	Sección II	8	14,2	01/11/08	31/10/10	40.000	794	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (Sección I)	I - Prog 48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	31/10/09	53.081	879	1.562	0	5,1%	8,1%	6		
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (Sección II)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	23/01/09	45.758	896	12.523	12.523	18,8%	73,5%	6		
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (Sección III)	Sección III 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	31/10/09	44.254	958	17.677	14.485	12,8%	62,6%	6		
22	11	56	51	CORDOBA	PE86	Achiras - Sampacho		8	36,8	01/11/08	31/10/10	60.000	389	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	57	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo	Cura Brochero	8	6,2	15/11/06	30/10/08	5.064	1.327	0	0	0,0%	99,6%	6	S/D	
22	11	58	51	CORDOBA	PS 358	La Palestina - Arroyo Cabral - Departamento General San Martín	La Palestina - Arroyo Cabral	8	15,2	28/02/07	31/12/09	14.362	0	0	0	16,7%	57,7%	6	A	
22	11	59	51	CORDOBA	P23	Alpa Corral - El Esquinazo	Alpa Corral - El Esquinazo	8	38,9	16/08/07	31/03/09	28.049	0	0	0	5,9%	88,1%	6		
22	11	60	51	CORDOBA	PE 79	Tancacha - Villa Ascasubi	Tancacha - Villa Ascasubi	8	13,3	31/05/07	31/05/09	17.392	0	0	0	5,3%	54,9%	6	A	
22	11	62	51	CORDOBA	P 32	La Posta - Las Arrias	La Posta - Las Arrias	8	24,8	10/07/07	10/07/10	21.721	0	0	0	3,7%	21,7%	6	A	
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Emp. RNN°13 - km 17		8	6,0	01/11/08	31/10/09	8.000	271	8.490	4.490	0,0%	0,0%	0		
22	11	64	51	RIO NEGRO		Circuito Turístico Tronador - Cascada Los Alerces		8	67,0	01/11/08	31/10/09	3.000	722	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	65	51	CORDOBA	RP N° 34	Puesto Bustos - Giulio Cesare	Intersección Acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito y Camino de Acceso	8		01/11/08	31/10/09	5.000	206	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	66	51	SANTA CRUZ	RP N° 63	Emp. RNN°3 - Parque Nacional Monte Leon (Costa)	Acceso Parque Nacional Monte Leon	8	30,0	01/11/08	31/10/10	50.000	127	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	67	51	TUCUMAN	RP N° 330	Alpachiri - Río Jaya	Acceso Parque Nacional Campo de los Alisos	8	12,7	01/11/08	31/10/09	10.000	81	0	0	0,0%	0,0%	2		
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	460	5.009	4.886	0,6%	98,2%	6	A	
22	11	69	51	CHACO		Capitán Solari - Parque Nacional Chaco	Acceso a Parque Nacional Chaco	8	5,2	01/11/08	31/10/09	5.000	1.083	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/11/08	31/10/09	20.000	903	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	71	51	SAN JUAN		Chigua de abajo - Quebrada Alcaparrosa	Acceso Parque Nacional San Guillermo	8	60,0	01/11/08	31/10/09	20.000	614	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	72	51	JUJUY	Ex RN N° 40	Límite con Salta - Abra Pampa	Sección I	8	40,0	01/11/08	31/10/10	50.000	659	0	0	0,0%	0,0%			

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	11	85	51	TUCUMAN	P325	Emp. RNN°38 (Monteros) - Emp. RNN°157 (Simoca)		8	18,0	26/02/08	24/02/09	12.814	584	0	0	4,7%	26,4%	6	A
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN°281 a Puerto Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/11/07	31/10/09	79.292	50	19.793	13.146	0,8%	34,1%	6	A
22	11	87	51	SALTA		Mejoramiento y Ampliación de la pista del Aeropuerto General Mosconi		8		01/11/08	31/10/10	22.000	87	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8		01/11/08	31/10/10	14.000	111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	89	51	LA RIOJA	12	Pista de Aterizaje y Acceso al Aeropuerto de Chimalcal		8		01/11/08	31/10/10	3.229	108	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	90	51	ENTRE RIOS	EX RPN° 11	Oro Verde - Paraná		5		01/11/08	30/10/10	4.105	645	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	91	51	ENTRE RIOS	Acc.	Acceso a Parque Nacional el Palmar		8		01/11/08	31/10/09	4.000	813	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. RNN°34 - Valle Colorado		8	28,0	01/11/08	31/10/10	23.820	813	5.558	5.558	0,0%	0,0%	0	
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Sección II - Pr 45,350 - Pr 75,450	8	30,1	24/07/07	25/11/08	7.526	0	0	0	22,7%	59,1%	6	
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Emp. RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr 84,200 - Pr 96,500	8	12,3	25/07/07	31/12/08	8.335	0	0	0	10,3%	41,8%	6	A
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp. RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	30/12/08	3.415	0	0	0	0,0%	13,6%	6	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F.Kennedy-Rda. Limache, El Aybal/ RNN°68 y 51 Distr. Rda. Limache		8		01/11/08	31/10/10	30.000	81	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Emp. RNN°40- Pte. s/Río Korich	8		01/11/08	31/10/10	30.000	1.259	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8		01/11/08	31/10/09	3.000	542	42	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	308.303	2.792	0	0	4,4%	7,9%	6	
22	11	97	51	TUCUMAN	P308	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	38,0	01/11/08	01/12/09	20.000	361	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	98	51	TUCUMAN	P321	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	2,0	01/11/08	02/05/09	1.000	975	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	11	99	51	TUCUMAN	P329	Emp. RNN°38 - Emp. RNN°157		8	37,0	01/11/08	31/10/09	20.000	521	21	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV												4.342.274	163.886	111.704	77.461				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																			
22	12	1	51	PAIS	Varias	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/08	31/12/08	0	1.042	0	0	100,0%	100,0%	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. RPN°357 (Acceso a Quimes)	Secciones I y II	8	20,0	01/11/08	31/10/10	40.163	831	0	0	0,0%	0,0%	1	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación Colectora e Iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/11/08	31/01/10	2.000	2.031	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	4	51	TUCUMAN	ex RNN° 34	Gobernador Garmendia - Las Cejas		8	42,0	01/11/08	31/10/09	23.000	632	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	5	51	CORDOBA	P32	Obispo Trejo - La Posta	Prog 0,00 - Prog 25,70	8	22,0	02/05/06	01/03/09	23.430	417	17	0	0,1%	79,3%	6	A-C
22	12	6	51	CATAMARCA	P S/N°	Emp. RPN°46 - Tucumanao y Acceso a Tucumanao		8	35,0	01/11/08	31/01/10	35.000	2.163	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	8	51	CHUBUT	P1	Comodoro Rivadavia - Camarones		8	115,0	01/11/08	30/10/12	200.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	9	51	ENTRE RIOS	P 19	Emp. RNN°12 - Emp. RPN°20 (Puente Vasallo s/ Río Gualeguay)		8		01/11/08	31/10/09	8.000	1.806	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	10	51	LA PAMPA	P1	General Pico - RNN°5		8	93,0	01/11/08	02/05/10	47.000	95	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	11	51	LA PAMPA	P1	RNN°5 - RNN°35		8	35,0	01/09/08	31/08/10	30.000	126	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	RNN°127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acceso a Conscripto Bernardi		8	7,0	01/11/08	02/05/10	25.800	1.959	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hostería Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/08	02/05/10	7.000	361	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Intersección c/ RNN°188 - Cruce FFCC Gral. San Martín	13	27,4	17/09/07	17/09/08	67.237	1.611	16.006	0	6,5%	82,1%	6	
22	12	15	51	RIO NEGRO	Acc.	Acceso a Parque Nacional Nahuel Huapi		8	10,0	01/11/08	02/05/10	10.000	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	16	51	ENTRE RIOS	12	Emp. RNN° 127 - La Paz		8	113,0	01/11/08	31/10/11	60.000	948	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	17	51	NEUQUEN	40	Acceso a Barrancas		8	1,0	01/11/08	02/05/09	1.000	2.844	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Vinculación RNN°3 Sur y RNN°3 Norte por el Acceso al Puerto de Bahía Blanca		8	7,0	01/11/08	31/10/10	70.000	1.463	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8		01/09/08	30/01/09	35.000	6.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/09/08	31/08/09	10.000	417	17	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN°3 - Pto. Santa Cruz		8	30,0	01/09/08	31/08/10	70.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	22	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola		8				0	2.519	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8		01/09/08	31/10/10	10.000	510	10	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8		01/09/08	31/08/10	32.500	677	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8		01/09/08	31/08/10	23.400	488	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	12/12/08	29.625	458	58	0	2,0%	20,1%	6	A
22	12	27	51	SANTA CRUZ		Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes Río Fitz Roy		11	5,8	20/12/06	20/10/08	20.801	833	0	0	2,9%	93,0%	6	A
22	12	28	51	SANTA CRUZ	281	Emp. RNN°3 - Pto. Deseado	Emp. RNN°3 - km 65 / Acceso Puerto Deseado	8	67,6	25/04/07	30/04/09	108.252	2.792	0	0	0,6%	56,5%	6	A
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN°9 - Lte. con Formosa		8		01/09/08	31/08/10	50.000	1.042	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	15/11/08	14/11/10	28.000	583	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	31	51	TIERRA DEL FUEGO	P 30	Camino del Atlántico Ushuaia - Pto. Brown		8		01/09/08	31/08/10	150.000	3.125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	32	51	CHACO	Acc.	Acceso a Fontana 25 de Mayo - Empalme RNN°11		8		01/09/08	31/08/10	19.500	406	6	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	33	51	MENDOZA	60	Revestimiento Colector y Obra de Pavimentación Calle Maza		8		01/09/08	31/08/10	2.042	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	34	51	MENDOZA	Calles	Obra de Pavimentación Ciudad de Las Heras		8		01/09/08	31/08/10	3.478	65	65	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	35	51	MENDOZA	Calles	Obra de Pavimentación Dto. Lavalle (calle Dorrego, Quiroga)		8		01/09/08	31/08/10	6.300	131	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	36	51	CORDOBA	Calles	Obra Costanera Ciudad Villa Nueva		8		01/11/08	31/10/10	3.500	73	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	37	51	MENDOZA	86	Nueva Traza Tupungato		8		01/09/08	31/08/10	39.000	813	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	38	51	SANTA FE	P90	Enlace Autopista RNN°9 - RPN°21		8		01/11/08	31/10/09	10.000	271	0	0	0,0%	0,0%	0	

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Avda. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	km 1,310 - km 29,395	8	29,0	01/11/08	31/10/11	584.700	4.167	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. RPN°65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 Y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	01/11/08	30/10/10	79.505	1.250	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. RPN°65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/08	30/10/10	100.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. RPN°65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección III km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	01/11/08	30/10/10	92.260	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. RPN°65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Seccion IV km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/08	30/10/10	85.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	41	51	BUENOS AIRES	S/N	Avda. de Circunvalación - Rama Sur - Prolongación	km 0,00 - km 5,95	8	6,0	01/11/08	31/10/09	6.000	250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante Paso por Resistencia	km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/08	31/12/09	100.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 - A010	Arroyo Verde - Emp. RNN°A 010 / Emp. RNN°3 - Pto. Pirámides	Emp. RNN°3 - Emp. RPN°1	8	87,3	01/11/08	31/12/09	134.301	2.798	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/08	31/10/09	30.000	1.250	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. RPN°4 - Emp. RPN°6	km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	14/05/09	60.489	1.879	2.254	2.254	8,5%	12,2%	6	
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/08	31/12/09	40.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta		8	250,0	01/11/08	30/10/13	250.000	2.083	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	48	51	LA RIOJA	P27	Lte. con San Juan - San Ramón		8	28,0	01/11/08	31/10/10	15.064	314	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de Paso por Rafaela	km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/10/08	31/12/09	70.000	1.458	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	50	51	SGO DEL ESTERO	P 4	Nueva Esperanza - Santo Domingo	Prog 0,00 - Prog 25000	8	25,0	01/11/08	31/10/10	28.659	710	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	51	51	SGO DEL ESTERO	P 13	Sumampa - Pinto (RNN°34)	Prog 58 - Prog 88,673	8	30,7	01/11/08	31/10/10	52.104	1.199	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante Paso por Villaguay		8	5,0	01/11/08	31/05/10	20.000	417	17	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	53	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	km 2284,79 - km 2303,40	8				0	1.716	0	0	0,0%	0,0%	12	
22	12	54	51	SANTA CRUZ	P 39	Emp. RPN°43 - Bajo Caracoles	km 0,00 - km 184	8	184,0	13/04/07	11/04/10	223.277	46.888	0	0	0,3%	43,7%	6	A
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Emp. RPN°39 - Emp. RNN°3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	2.229	0	0	0,5%	22,1%	6	A
22	12	56	51	SANTA CRUZ	P 2	Condor Cliff - La Esperanza		8	85,0	01/11/07	30/10/10	94.426	1.646	0	0	0,6%	41,2%	6	A
22	12	57	51	SANTA CRUZ	P 9	Emp. RNN°3 - Emp. RNN°40	Emp. RNN°3 - Emp. RNN°40	8	192,0	06/03/07	30/10/09	238.248	4.964	0	0	0,3%	27,7%	6	A
22	12	58	51	SANTA CRUZ	S/N	Accesos a Puerto Deseado desde RNN°281		8	22,0	01/11/08	31/10/10	47.000	979	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	59	51	CHACO	RP N 4	Quitilipi - Pampa del Indio	Pampa Verde - Cancha Larga	8	25,0	25/06/08	24/12/09	42.142	833	0	0	5,1%	5,1%	6	A
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106	Emp. RNN°152 - Chelfloro	Sección I	8	37,0	01/10/08	30/09/11	100.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. RNN°152 - Chelfloro	Sección II	8	37,0	01/10/08	30/09/11	100.000	1.389	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. RNN°152 - Chelfloro	Sección III	8	42,0	01/11/08	31/10/11	80.000	1.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Rosario - Emp. RNN°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,6	01/11/08	31/07/09	20.000	556	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	64	51	TIERRA DEL FUEGO	RP 23	Río San Pablo - Río Lainez - Río Ríogoyen		8	42,0	01/11/08	31/10/09	4.924	137	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	65	51	TIERRA DEL FUEGO	RPN 9	Emp. RNN°3 - Acceso Estancia El Roble		8	25,5	01/11/08	31/10/09	896	402	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	66	51	TIERRA DEL FUEGO	RPN 5	Acceso Estancia Los Flamencos - Estancia El Salvador		8	32,0	01/11/08	31/10/09	894	402	2	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. RPN°56	Prog 159,300 - Prog 166,500	8	7,0	01/11/08	31/07/09	6.449	403	3	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	68	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 1 - Emp. RNN°123 - Puesto Ciro	Prog 0,00 - Prog 34,00	8	34,0	01/11/08	31/10/10	92.112	1.280	0	0	0,0%	0,0%	4	
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. RPN°114	Prog 34,00 - Prog 75,241	8	41,2	01/11/08	30/05/10	118.499	2.040	0	0	0,0%	0,0%	3	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	01/11/08	30/10/09	64.500	1.063	0	0	0,0%	0,0%	2	
22	12	71	51	BUENOS AIRES	9	Rehabilitación Antigua Traza e/A° Escobar y Calle Don Bosco		8		15/11/08	16/07/09	7.000	438	38	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	72	51	CATAMARCA	P2	Emp. RPN°42 (La Cumbre) - Emp. RNN°157 (San Antonio de la Paz)	Ancasti Prog 595,24 - 12800	8	12,2	18/02/08	18/08/09	7.008	254	0	0	3,4%	12,5%	6	
22	12	73	51	CHUBUT	P71	Portada Norte Parque Nacional Los Alerces - Villa Futalaufquen	km 47,336 - km 81,96	8		01/10/08	31/05/13	141.736	1.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	74	51	LA PAMPA	P1	RNN°188- RPN°102	km 78,80 - km 81,96	8	3,2	01/10/08	01/04/09	238	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	75	51	LA PAMPA	P7	Metileo - RNN°5	km 88,12 - km 132,58 y Acceso a Mirasol	8	49,5	15/11/08	16/07/09	3.719	125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	76	51	LA PAMPA	P11	RPN°102 - RPN°110	km 0,154 - km 24,763	8	24,8	11/11/08	12/07/09	1.862	116	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	77	51	LA PAMPA	P102	RPN°1 - Luan Toro	km 0,00 - km 7,575; km 84,89 - km 116,85; km 129,44 - Acceso a Rucanelo	8	55,6	15/11/08	14/11/09	4.178	174	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	78	51	LA RIOJA	P5	La Rioja - Paraje San Juan	RNN°38 - Acceso a Aeropuerto (4518-07)	8	5,0	15/12/07	31/11/08	7.749	492	0	0	14,2%	55,6%	6	C
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Avenida General Paz - Cañuelas	km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	181.472	29.063	5.705	0	6,7%	9,9%	6	
22	12	80	51	SGO DEL ESTERO	P4	Nueva Esperanza - Sto Domingo	Prog 25000 - Prog 49900	8	24,9	15/11/08	14/11/10	30.956	645	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	81	51	SGO DEL ESTERO	P13	Sumampa-Pinto	Prog 0,0 - Prog 28500,00	8	30,0	01/11/08	31/10/10	38.928	811	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	82	51	SGO DEL ESTERO	P3	Sumampa-Pinto	Prog 28500 - Prog 58000	8	30,0	01/11/08	31/10/10	54.000	1.125	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	83	51	TUCUMAN	EX365	RN°65 (EX365) Emp.RN°38 Lte. c/Catamarca	RN°38 - Alpachiri	8	18,0	15/11/08	14/11/09	20.000	833	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez	Emp. RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	278	10.354	10.354	0,0%	96,2%	7	
22	12	85	51	SGO DEL ESTERO	P6	Pampa de los Guanacos - Sachayoj	km 0,00 - km 48,60	8	48,6	01/11/08	31/08/14	72.000	1.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza-Los Menucos	km 56,00-km 62.634	8	6,6	07/12/07	30/10/08	9.993	416	16	0	14,8%	54,1%	6	A
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V												5.002.075	174.056	34.721	12.609				
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																			
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. RNN°111 / Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	38.045	0	0	0	17,4%	26,6%	6	
Total Construcciones												39.251.918	3.396.610	3.611.376	2.675.054				
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog 1.909,89 - Prog 1913,01 - Prog1971,77	13	111,4	26/05/97	30/05/05	14.043	465	65	0	0,0%	100,0%	7	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Pr 1971,77- Pr 1996,82 - Puerto Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	30/12/04	13.515	465	65	0	0,0%	99,7%	7		
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Emp. RNN°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	25/07/04	9.733	465	65	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Emp. RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	30/06/04	11.169	465	626	626	0,0%	97,7%	8		
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Emp. RPN°307 - San Carlos / Emp. RNN°40N - Río Conchas (Pte.)	13	142,3	04/06/97	30/10/08	22.861	465	1.456	1.456	1,5%	97,8%	6		
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte.) - Río Ancho (Pte.)	13	114,8	30/04/97	30/09/08	23.725	566	1.070	1.070	1,5%	93,5%	6		
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén/Aimogasta - Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RNN°60	13	226,3	04/07/97	30/09/04	17.762	365	26	0	0,0%	97,7%	7		
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte.)/Emp. R9-Emp. R 34/Emp. R66-R34	13	148,9	05/04/97	14/10/04	12.938	225	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	31/07/06	23.197	850	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Santiago del Estero	Yuchán - Emp. RNN°34	13	79,7	10/04/97	31/08/06	19.845	337	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Emp. RNN°117- Emp. RPN°155- km 139,00- Emp. RNN°14-Emp. RNN°14-Yapeyú	13	144,7	07/07/97	31/10/06	27.283	224	282	282	0,0%	85,8%	7		
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. RNN°127-Lte. c/Corrientes - Emp. RNN°12- Emp. RPN°32-Emp. RNN°12- Hasenkamp	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	259	4.849	3.153	0,0%	98,2%	7		
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Emp. RNN°14 - Emp. RNN°123 - Emp. RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/97	05/04/04	20.456	224	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	08/04/09	23.409	300	1.747	1.497	1,8%	92,3%	6	A	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	12/09/04	15.340	101	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Emp. RPN°20	13	272,6	14/10/97	15/10/04	20.028	101	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Emp. RNN°50 / Emp. RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	30/11/04	16.672	101	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	13	286,8	15/08/97	15/08/03	16.006	850	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. RNN° 74 - Lte. c/Catamarca / La Rioja - Aminga	13	231,6	02/08/97	31/12/02	6.378	221	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	23	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308 - La Rioja - San Juan	Emp. RNN°150 - Vinchina / Patquia - Ischigualasto	13	292,0	13/01/98	26/01/04	10.860	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	24	51	LA RIOJA	38-40N-74	Malla 309 - La Rioja	Chamical - Emp. RNN°74 / Emp. RNN°74 - Emp. RNN°60 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	327,8	30/09/97	30/06/04	17.876	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - km 1817,55	13	124,5	11/11/97	31/10/08	22.317	223	2.173	1.419	1,7%	97,5%	6		
26	1	26	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Emp. RNN°281- Gran Bajo de San Julián	13	308,0	25/11/97	24/04/05	20.207	112	0	0	0,0%	89,6%	7		
26	1	28	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A - Corrientes	Emp. RNN°12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	13/01/98	11/03/09	21.661	835	84	84	0,7%	98,8%	6	A-C	
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/ Emp. RNN°3- Emp. RNN°229/ Emp. RNN°3-Pte. s/ RíoColorado	13	167,1	17/07/97	30/04/09	29.309	405	731	292	2,3%	84,3%	6		
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	30/12/05	26.066	224	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte. c/ Río Negro -Emp. RNN°40S-Emp. RN°258- Emp. RNN°25 Emp. RNN°40S Trevelin	13	201,2	01/12/97	28/12/08	34.892	1.688	2.640	1.657	2,6%	94,2%	6		
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN°25 - Prog 1512,60- Rawson- Pte.s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	25/02/08	21.472	100	0	0	0,0%	99,8%	7		
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN°11 - Acceso a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	06/10/04	17.069	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche- Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/12/08	26.693	1.700	5.811	5.285	2,0%	79,7%	6		
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	10/05/04	13.993	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp. RNN°7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	15/04/04	13.402	436	290	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María-Lte. Santiago del Estero- Emp. RNN°9- Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	31/05/05	15.095	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Emp. RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	245,6	20/06/97	28/02/04	14.250	228	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22	13	136,8	23/06/97	30/09/04	18.091	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. RPN°86 - Emp. RNN°3	13	139,9	04/03/98	31/12/08	29.260	212	3.063	2.469	3,5%	91,4%	6		
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN°40S / Pte. s/Río Diamante - Emp. RNN°143	13	223,3	13/08/97	04/02/04	15.295	100	0	0	0,0%	100,0%	7		
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. R.N.N° 14 - Emp. R.N.N° 14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	20/02/09	28.724	480	724	668	1,0%	44,9%	6	A	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J. del Morro - Lte. c/Córdoba / Lte. c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolores - Acceso a Quines	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	100	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. RNN°12 - Emp. RNN°14 Y 119	13	259,2	03/10/97	31/07/09	43.759	290	3.764	2.296	8,8%	78,9%	6	C	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Emp. RPEx RNN°3	13	258,3	05/11/97	31/12/08	31.544	740	2.299	1.091	2,9%	96,4%	6		
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Emp. RNN°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	27/06/03	14.887	224	0	0	0,0%	100,0%	8		
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Emp. RNN°152	13	221,6	31/07/97	19/09/04	17.642	100	0	0	0,0%	98,6%	7		
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	25/07/04	9.896	224	9	9	0,0%	100,0%	8		
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237- Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	31/01/05	17.348	100	0	0	0,0%	90,1%	7		
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	31/12/02	6.976	101	0	0	0,0%	100,0%	8		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/09	30.858	267	4.274	3.344	2,0%	93,7%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	09/10/04	14.367	556	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Emp. RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,8	13/11/97	05/05/04	13.412	100	794	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Emp. RNN°22 - Emp. RNN°250	13	118,7	25/07/97	30/04/04	14.994	126	0	0	0,0%	98,5%	7	
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog 1817,55- Lte. c/Santa Cruz- Emp. RNN°3- Emp. RPN°20	13	140,7	23/06/97	30/11/07	20.403	1.933	611	611	0,0%	100,0%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendi - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	30/06/06	14.584	112	806	806	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	14/11/04	20.165	112	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	30/11/03	21.313	100	0	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguaté Porá - Emp. RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	14/11/08	19.861	112	112	97	0,8%	96,4%	6	A
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. ExRNN°3 - Emp. RNN°251	13	185,2	23/02/98	21/12/08	32.235	2.000	7.100	5.168	1,8%	91,6%	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I

1.101.962 21.690 45.537 33.381

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	29/11/09	46.074	2.570	1.168	742	0,7%	87,7%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp. RNN°95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	52.138	1.400	4.654	3.998	1,0%	98,4%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	29/11/09	46.302	1.388	2.361	1.467	0,9%	95,1%	6	
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequeñtín (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	31/10/07	19.509	1.970	214	214	0,0%	96,6%	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Sal.) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	900	2.476	1.071	0,5%	71,9%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. RPN°1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	49.953	687	1.520	1.464	0,7%	94,2%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. RPN°10	13	111,3	01/05/05	29/04/10	66.138	1.073	20.119	15.452	14,2%	80,2%	6	A
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Emp. c/Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	31/01/07	38.487	146	270	270	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	31/05/08	32.892	337	7.006	6.945	0,0%	98,5%	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte. c/ Córdoba - Emp. RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	31/01/10	36.957	1.100	2.399	679	0,9%	99,4%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. RNN°38 - Aimagasta	13	166,7	03/12/04	01/12/09	59.945	1.500	5.715	4.326	0,6%	94,3%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.RNN°157 - Emp.RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.200	2.312	1.670	0,8%	94,8%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Emp. RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	16/11/08	25.284	1.531	912	430	0,6%	96,4%	6	A-C
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Emp. RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	30/04/07	26.806	4.650	272	272	0,0%	97,6%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. RNN°5 - Estancia El Recreo	13	69,2	01/03/05	02/03/10	42.472	1.000	1.760	698	0,6%	96,3%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	1.000	1.760	525	0,5%	97,2%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN°35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	42.039	910	3.193	1.641	1,3%	93,2%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. RNN°7	13	71,9	01/03/05	27/02/10	40.405	1.048	1.772	534	0,5%	96,9%	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

782.699 24.410 59.883 42.398

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fé	Emp. RP Secundaria N°286 - Lte. con Santa Fe/Chaco	13	79,0	01/11/08	30/11/12	43.116	1.916	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	2	51	ENTRE RIOS	12 - 136	Malla 509 - Entre Ríos	Emp. RNN°14 - Galarza - Emp. RPN°20 - Lte. c/Rep. Oriental del Uruguay	13	151,8	01/01/05	30/12/09	45.290	1.498	3.135	1.383	1,4%	98,0%	6	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Ríos	Emp. RPN°32 - Emp. RPN°20	13	90,3	01/01/05	30/12/09	42.140	1.720	3.026	1.042	0,9%	94,9%	6	
26	3	4	51	CHUBUT	3 - A010	Malla 606 - Chubut	Paraje A° Verde - Alto Nivel RNN° 25 / Emp. RNN° 3 - Pto. Mineralero	13	159,7	01/10/05	31/01/07	26.392	5.156	1.032	159	0,0%	100,0%	10	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103 - Río Negro	Allen - Acceso a Cipolletti / Acceso a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,8	15/01/05	30/11/09	49.305	3.000	3.544	774	0,7%	94,2%	6	A
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte. c/Río Negro - Emp. RNN°259	13	149,2	01/11/08	31/08/12	116.881	4.326	1.120	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301 - San Luis	Emp. RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	253,8	01/02/05	31/01/10	61.802	1.200	2.280	808	0,7%	67,8%	6	
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequén - Emp. RPN°3	13	129,4	01/09/05	30/08/10	42.548	500	1.536	804	0,8%	93,2%	6	
26	3	9	51	SANTA FE	178 - 177	Malla 205 - Santa Fé - Buenos Aires	Pergamino - Emp. RPN°65 / Emp. RPN°21 - Alto Nivel RNN°9	13	173,2	01/07/08	29/06/13	184.047	8.985	0	0	2,7%	2,7%	6	A
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	30/04/12	105.775	28.699	43.497	19.753	6,1%	60,4%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Accesos Sur/ Norte/ Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/05	02/10/10	64.262	1.600	6.551	4.683	0,6%	96,3%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.142	6.242	6.195	938	0,6%	93,4%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros- Lte.c/ Jujuy/ Lte. c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-Emp. R34	13	148,9	01/10/05	30/09/10	47.337	1.000	3.579	2.078	1,6%	95,9%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Santiago del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Emp. RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/08/10	52.920	1.217	2.611	1.046	1,0%	84,8%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Santiago del Estero	Acceso a Frías - Emp. RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.324	1.000	3.109	1.735	0,9%	89,6%	6	A
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	km 333,49 - Emp. RPN°32 / Emp RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	31/03/10	46.073	1.000	2.391	1.058	1,1%	93,8%	6	

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTotal	Est	Obs	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Pr 1970,32 - Pr 2026 / Puerto Deseado - Emp. RNN°3	13	180,1	01/11/08	31/10/12	81.023	3.601	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Emp. RNN° 25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	29/11/09	47.004	6.658	6.421	1.201	0,8%	64,3%	6		
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	31/01/10	58.836	3.905	23.969	21.079	0,9%	68,9%	6		
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	30/12/10	37.385	6.068	10.733	1.243	1,1%	89,7%	6		
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	28/04/10	52.668	1.473	2.549	791	0,9%	88,0%	6		
26	3	22	51	NEUQUEN	231 - 237 - 40S	Malla 109 - Neuquén	Emp. RNN°40S- Lte. c/Chile / A° La Teresa- Emp.RNN°40S / Emp.RNN°237- Lte.c/Río Negro	13	291,2	01/02/05	31/01/10	48.487	4.888	7.179	1.611	2,0%	88,3%	6		
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. RPN°31- Esperanza de Los Cerrillos	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	2.606	4.183	2.096	0,9%	85,3%	6		
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. RNN°20	13	286,1	01/06/05	30/11/10	49.000	4.806	6.021	2.030	1,3%	81,7%	6		
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/ San Rafael-Emp. RNN°40S/ Pte.s/R.Diamante- Emp. RNN°143	13	223,3	01/03/05	27/02/10	38.971	600	2.058	1.291	1,3%	92,2%	6		
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	30/08/10	44.867	3.264	3.374	730	0,8%	91,4%	6		
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. RNN°14 - km 139	13	108,2	30/04/08	30/05/13	68.613	2.171	11.687	5.839	5,0%	11,0%	6	A	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	01/11/08	31/10/13	35.536	2.471	0	0	0,0%	0,0%	11		
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Emp. RNN°3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	31/08/12	68.181	3.030	33.486	24.903	2,2%	54,2%	6	A	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Emp. RNN°40 - Pichi Trafal y Pte. s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	30/09/12	53.908	1.953	10.917	9.355	0,9%	30,5%	6		
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. RPN°2 - Emp. RPN°286 / Prog 123 - Tostado	13	126,2	01/11/08	30/10/13	39.722	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Emp. RNN°8	13	203,3	01/10/08	30/10/12	91.463	4.065	3.252	0	0,0%	0,0%	1		
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/10/08	30/10/12	57.227	2.375	1.900	0	0,0%	0,0%	1		
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Santiago del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	30/03/12	102.757	3.859	41.008	34.205	13,8%	74,9%	6		
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - San MiguelTucumán	13	145,7	01/05/06	30/11/11	100.045	15.979	38.825	24.005	9,9%	59,7%	6	A	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	31/12/12	80.381	3.572	8.259	6.101	14,0%	24,3%	6		
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. RNN°123	13	109,3	01/11/08	30/10/13	49.194	2.889	2.311	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	01/09/12	117.388	4.662	34.813	26.139	1,3%	27,9%	6		
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plotier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	31/10/12	96.034	3.604	10.901	8.567	2,5%	13,9%	6		
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog 1817,55	13	129,5	01/11/08	31/10/12	69.179	2.666	2.166	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Emp. RNN°251-Chimpay / km 258,84-Emp. RNN°22	13	192,1	01/11/08	31/10/10	112.363	4.309	3.447	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/08	31/10/12	50.784	4.444	44	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. RNN°33	13	104,9	01/11/08	31/10/12	47.183	4.222	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN°3 B° Mirasol-P.Alta / Emp. RNN°3-Emp. RNN°229	13	167,8	01/11/08	31/10/12	120.189	4.000	3.200	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp RNN°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,2	01/08/07	30/11/13	62.922	2.246	38.683	28.041	5,1%	78,3%	6		
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	01/11/08	31/10/12	99.838	4.000	0	0	0,0%	0,0%	2		
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	31/10/12	117.804	4.688	21.756	8.189	6,4%	17,2%	6	A	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. RPN°20	13	134,7	01/05/08	30/04/13	104.969	2.694	0	0	5,7%	7,4%	6	A	
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/08	30/04/13	83.931	2.621	15.878	6.780	13,2%	19,0%	6	A	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												3.368.646	196.559	432.627	250.454					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																				
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/11/08	31/10/12	60.183	2.675	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°143	13	114,1	01/11/08	31/10/12	69.000	3.555	0	0	0,0%	0,0%	1		
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01/11/08	31/10/12	99.900	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	31/03/13	47.890	21.639	10.801	801	12,6%	24,9%	6		
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	43.479	5.234	21.658	18.867	6,6%	68,2%	6	A	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/08	31/10/12	44.100	1.960	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Emp. RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/07	30/06/12	90.882	3.732	44.528	34.084	18,4%	71,6%	6		
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	30/06/12	76.776	3.151	34.685	24.978	10,7%	56,2%	6	A	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/07	31/10/12	88.892	3.951	31.589	27.773	1,0%	36,5%	6		
26	4	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Emp RPN°116 - Emp RNN°34	13	140,7	01/11/08	31/10/12	39.758	1.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyú	Emp. RNN°117- Emp. RPN°155- km 139,00-Emp. RNN°14-Emp.RNN°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/06	30/07/12	47.315	5.670	22.896	13.896	14,9%	64,3%	6	A	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Ríos	Emp. RNN°12 - Emp. RNN°14 y 19	13	259,2	01/11/08	31/10/13	116.618	5.183	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte. c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/11/08	31/10/12	32.670	1.778	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. RNN°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/07	30/11/12	107.197	4.764	27.631	17.065	13,5%	39,2%	6		
26	4	15	51	CATAMARCA	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucumán	Río Las Cuevas - Limite con Salta	13	139,2	31/08/08	30/10/11	62.618	2.783	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte. c/Chile	13	236,1	01/11/08	31/10/12	106.245	4.722	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. RNN°11 - Emp. RNN°22 / Emp. RNN°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/08	30/11/13	30.689	3.420	0	0	0,0%	0,0%	0		
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte. c/Entre Ríos - Acceso a Maruchas	13	254,9	31/08/08	31/10/12	114.700	5.098	0	0	0,0%	0,0%	0		

CUADRO D
PROYECTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD AL 30/09/2008

DATOS DE OBRA											AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTot al	Est	Obs
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. Chubut - Pr 1909,89 / Pr 1913,01 - Pr 1971,77	13	115,3	01/11/08	30/11/09	50.117	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog 1818 - Lte. c/ Santa Cruz / Emp. RNN°3 - Emp. RPN°20	13	135,5	01/11/07	30/06/12	101.525	4.388	34.139	24.533	3,0%	36,6%	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/11/08	31/10/12	60.633	2.695	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. RPEx RNN°3 - Lte. con Río Negro/Emp. RNN°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	01/11/08	30/10/12	80.000	4.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	24	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Córdoba	Jesús María - Lte. con Santiago del Estero	13	157,4	01/02/07	31/01/13	70.023	23.942	2.632	2.389	3,1%	13,8%	6	A
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/11/08	30/08/10	116.959	3.678	0	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fé	Emp. RNN°11 - Prog 123	13	123,4	01/11/08	31/10/12	55.544	3.111	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/08	30/10/12	125.100	5.560	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/08	30/01/12	51.503	2.289	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309 - La Rioja	Chamical - Emp. RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	30/06/12	68.138	5.516	24.942	16.152	6,1%	52,1%	6	
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp RNN°40N - Talapampa	13	146,3	01/11/08	30/11/13	65.849	2.926	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. RPN°13 (Chaco) - km 386 (Santiago del Estero)	13	122,8	01/11/08	29/10/12	144.614	4.445	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/10/12	130.000	4.860	2.257	0	0,7%	7,0%	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Ríos	Emp. RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	30/10/12	142.998	4.000	14.000	2.460	4,1%	10,4%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N°	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/ Emp. RNN° 14 - Emp. RNN°12/ Acceso a Yacretá	13	194,5	01/11/08	30/10/13	87.512	4.445	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Ríos	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	01/11/08	29/10/12	77.859	3.467	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. RPN°86 - Emp. RNN°3	13	139,6	01/11/08	30/10/12	62.829	2.792	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. RNN°16- Emp RPN°13	13	88,4	01/04/08	29/10/12	99.951	4.442	14.785	1.785	17,3%	26,9%	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537- I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/08	30/10/12	54.000	2.400	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	01/11/08	30/10/12	98.433	4.375	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Emp. RNN°62 - km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/11/08	30/10/12	74.430	3.308	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/08	30/11/12	69.354	3.082	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	01/08/11	56.292	5.188	18.885	15.762	11,6%	92,3%	6	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/08	29/10/12	56.174	2.408	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. RNN°20	13	78,0	01/11/08	29/10/12	70.038	3.113	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/08	29/10/12	42.319	3.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Emp. RNN° 251- Pasaje A° Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	01/11/08	29/10/12	114.291	3.556	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Emp. RNN°95 - Lte. c/ Santiago del Estero	13	143,0	01/11/08	29/10/12	64.278	2.857	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. RPN°20	13	79,0	01/11/08	29/10/12	92.309	4.103	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Emp. RNN°12 Sur - Pje. Iguatú Porá	13	84,3	01/11/08	29/10/12	37.930	1.778	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguatú Porá - Emp. RNN°12 Norte	13	113,5	01/11/08	29/10/12	51.053	2.311	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	01/11/08	29/10/12	61.542	2.735	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. RPN°31 - Emp. RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	30/10/13	93.496	4.155	21.268	13.832	7,2%	29,9%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40(N) - 60 - 75	Malla 403	Emp. RNN°60 - Río Agua Clara - Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	01/11/08	29/10/12	108.972	4.843	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Emp. RNN°150 - Vinchina - Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/11/08	29/10/12	138.038	6.135	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Olleros	13	114,0	01/11/08	29/10/12	51.282	2.279	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Ríos	RPN° 6 A° Altamirano - Gral. Galarza/ RPN°39 Nogoyá - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	47.346	6.004	16.524	8.524	0,7%	89,5%	6	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Olleros - Emp. RNN°9 y N°34	13	90,0	01/11/08	29/11/12	40.698	1.809	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	28/06/12	118.194	4.432	32.172	22.168	0,4%	30,2%	6	
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	188,0	01/11/08	29/10/12	65.388	3.754	0	0	0,0%	0,0%	4	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/08	29/10/12	76.500	3.000	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/11/08	29/10/12	62.312	2.769	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Emp. RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	01/11/08	29/10/13	100.000	3.230	0	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/08	29/10/12	40.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339 Huaco - Lte. c/La Rioja/ Emp. RNN°40 -Arrequeintín	km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/08	29/10/12	40.000	2.667	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Emp. Ex RPN°20 - Emp. RNN°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/11/08	29/10/12	52.581	2.337	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. RPN°14	13	119,8	01/11/08	29/10/12	78.000	3.467	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Emp. Ex RNN°3	13	124,7	30/11/07	29/11/12	103.686	4.608	28.008	17.032	13,9%	34,6%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/11/08	30/10/13	80.000	4.444	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251 - 3	Malla 139	Emp. RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	01/10/08	31/12/13	120.000	5.333	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Emp. RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13		01/10/08	30/09/13	50.000	2.222	0	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/11/08	31/10/13	80.000	3.556	0	0	0,0%	0,0%	0	

DATOS DE OBRA												AVANCE FINANCIERO (en miles de \$)				AVANCE FISICO				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Créd.Vigente 30/09	Devengado 30/09	Avance 3° Trim	AvanceTotal	Est	Obs	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avda. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/08	31/10/13	60.000	2.666	0	0	0,0%	0,0%	0		
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												5.419.002	296.796	403.400	262.100					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												10.672.309	539.455	941.446	588.333					
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad												50.963.320	4.411.629	4.918.201	3.544.140					

N°	Estado
0	A Licitar
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias.

- A Certificación demorada. Valor estimado
- B Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
- C Modificación de Obra en trámite
- D Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
- E Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
- F Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
- H Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
- I Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
- J Reinicio de obra en estudio
- K Certificación de Pago Diferido
- S/D Sin datos

Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 30/09/2008
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.636.637.057	1.953.331.362	576.558.364	407.813.618	8,1%
Provincia de Buenos Aires	914.819.552	1.039.037.002	502.854.788	457.430.749	9,1%
Provincia de Catamarca	84.882.487	68.502.201	62.151.011	62.096.412	1,2%
Provincia de Córdoba	270.110.153	236.053.983	165.209.888	159.646.091	3,2%
Provincia de Corrientes	158.544.599	205.251.556	86.892.409	86.859.975	1,7%
Provincia del Chaco	130.287.521	120.050.425	93.746.270	93.089.023	1,8%
Provincia del Chubut	200.069.859	225.939.445	144.388.551	143.837.819	2,9%
Provincia de Entre Ríos	192.105.686	257.112.630	215.308.755	215.304.233	4,3%
Provincia de Formosa	223.783.912	341.591.691	254.510.332	254.471.372	5,0%
Provincia de Jujuy	156.305.857	115.686.842	60.315.406	60.270.757	1,2%
Provincia de La Pampa	67.604.943	64.910.004	45.827.049	44.992.030	0,9%
Provincia de La Rioja	183.562.219	126.336.410	90.038.667	90.038.667	1,8%
Provincia de Mendoza	148.855.016	149.215.003	114.761.138	109.291.342	2,2%
Provincia de Misiones	121.918.364	72.856.411	50.292.290	50.292.262	1,0%
Provincia del Neuquén	84.274.845	92.377.214	67.546.811	66.800.703	1,3%
Provincia de Río Negro	315.818.758	282.850.947	195.482.673	189.441.130	3,8%
Provincia de Salta	151.425.567	149.808.587	110.016.401	98.044.761	1,9%
Provincia de San Juan	68.853.654	83.445.059	74.046.201	73.954.487	1,5%
Provincia de San Luis	17.143.635	52.650.304	35.944.452	35.340.212	0,7%
Provincia de Santa Cruz	208.893.658	193.173.230	168.922.058	168.914.276	3,4%
Provincia de Santa Fe	400.764.619	477.294.139	337.657.523	335.724.447	6,7%
Provincia de Santiago del Estero	111.472.093	176.451.293	127.689.544	127.689.544	2,5%
Provincia de Tucumán	55.831.817	128.821.429	103.336.690	102.551.265	2,0%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	27.516.050	15.436.080	5.649.429	4.822.434	0,1%
Interprovincial	1.354.689.564	1.255.599.785	823.246.607	820.103.117	16,3%
Nacional	653.538.406	772.545.204	605.512.396	597.306.414	11,8%
Binacional	110.192.000	99.628.320	74.272.477	74.272.477	1,5%
No Clasificado	85.254.335	137.821.091	125.750.420	111.018.970	2,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	8.135.156.226	8.893.777.647	5.317.928.600	5.041.418.587	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 30/09/2008
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	19.729.000	33.717.000	13.988.000	70,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.078.000	43.105.916	42.027.916	3898,7%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	2.599.000	17.502.400	14.903.400	573,4%
Ministerio de Economía y Producción	30.233.750	45.931.823	15.698.073	51,9%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	7.320.945.530	9.823.685.607	2.502.740.077	34,2%
Ministerio de Educación	351.920.392	378.638.862	26.718.470	7,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	18.006.000	19.786.000	1.780.000	9,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	73.050.000	85.750.000	12.700.000	17,4%
Ministerio de Salud	71.260.423	103.933.692	32.673.269	45,9%
Ministerio de Desarrollo Social	4.031.000	7.383.740	3.352.740	83,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.802.344.000	3.223.659.504	1.421.315.504	78,9%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	13.784.094.544	4.088.197.449	42,2%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	19.729.000	33.717.000	19.029.244	18.834.699	55,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	1.078.000	43.105.916	3.426.802	3.426.802	7,9%
Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	2.599.000	17.502.400	2.378.147	2.378.147	13,6%
Ministerio de Economía y Producción	30.233.750	45.931.823	22.612.449	22.612.449	49,2%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	7.320.945.530	9.823.685.607	6.249.412.574	6.222.822.596	63,3%
Ministerio de Educación	351.920.392	378.638.862	206.422.522	206.422.522	54,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	18.006.000	19.786.000	19.754.115	19.754.115	99,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	73.050.000	85.750.000	30.091.382	29.423.626	34,3%
Ministerio de Salud	71.260.423	103.933.692	78.609.241	56.778.424	54,6%
Ministerio de Desarrollo Social	4.031.000	7.383.740	2.037.800	1.987.800	26,9%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	1.802.344.000	3.223.659.504	846.522.314	846.522.314	26,3%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	13.784.094.544	7.480.996.590	7.431.663.494	53,9%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	2.827.670.733	5.166.982.987	2.140.283.448	2.137.098.061	28,8%
Provincia de Buenos Aires	1.394.734.946	2.145.432.423	1.067.577.905	1.048.775.099	14,1%
Provincia de Catamarca	189.577.286	162.444.575	35.949.428	35.922.050	0,5%
Provincia de Córdoba	393.746.439	629.032.507	273.186.421	270.642.997	3,6%
Provincia de Corrientes	124.738.468	177.209.648	76.705.336	76.603.300	1,0%
Provincia del Chaco	224.161.046	308.270.301	222.103.222	217.408.062	2,9%
Provincia del Chubut	230.273.973	216.428.269	215.634.191	214.924.988	2,9%
Provincia de Entre Ríos	177.078.304	161.322.232	90.652.494	88.972.837	1,2%
Provincia de Formosa	93.689.212	155.437.160	128.673.819	127.836.309	1,7%
Provincia de Jujuy	189.721.058	217.522.279	158.459.870	157.870.547	2,1%
Provincia de La Pampa	147.786.912	190.661.720	129.864.961	129.265.418	1,7%
Provincia de La Rioja	171.301.902	170.930.653	134.145.856	133.594.666	1,8%
Provincia de Mendoza	189.146.496	188.844.624	112.128.521	110.504.949	1,5%
Provincia de Misiones	145.748.686	91.750.876	135.289.796	133.681.858	1,8%
Provincia del Neuquén	136.630.349	123.065.074	58.220.539	57.447.845	0,8%
Provincia de Río Negro	148.696.847	65.763.437	70.829.116	70.030.895	0,9%
Provincia de Salta	164.912.299	204.039.522	121.829.750	121.689.802	1,6%
Provincia de San Juan	206.317.391	365.582.325	305.109.764	304.144.962	4,1%
Provincia de San Luis	152.444.589	64.858.302	12.684.942	12.129.512	0,2%
Provincia de Santa Cruz	479.032.796	495.520.823	973.973.657	973.300.200	13,1%
Provincia de Santa Fe	360.477.763	324.043.411	182.421.568	180.146.170	2,4%
Provincia de Santiago del Estero	166.419.942	190.186.712	152.301.370	152.170.631	2,0%
Provincia de Tucumán	264.990.336	276.616.720	377.241.618	372.292.512	5,0%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	86.698.604	105.446.244	30.141.528	29.622.354	0,4%
Interprovincial	1.004.244.483	1.158.669.079	272.709.323	272.709.323	3,7%
Nacional	23.162.235	332.360.241	0	0	0,0%
Binacional	0	93.000.000	0	0	0,0%
No Clasificado	2.494.000	2.672.400	2.878.147	2.878.147	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.695.897.095	13.784.094.544	7.480.996.590	7.431.663.494	100,0%

CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 30/09/2008
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Instit.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	2.271.023	0	2.271.023	0	0	0
Judicial	36.351.903	0	36.351.903	347.025	0	347.025
Dirección Superior Ejecutiva	11.968.297	3.731.232	15.699.529	0	0	0
Relaciones Exteriores	7.232.952	700.000	7.932.952	0	0	0
Relaciones Interiores	4.840.766	6.210.504	11.051.270	2.676.933	0	2.676.933
Administración Fiscal	3.438.417	0	3.438.417	51.230	0	51.230
Control de la Gestión Pública	4.718.822	0	4.718.822	555.107	0	555.107
Información y Estadística Básicas	954.817	0	954.817	0	0	0
Subtotal	71.776.997	10.641.736	82.418.733	3.630.295	0	3.630.295
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	34.137.649	0	34.137.649	0	0	0
Seguridad Interior	89.558.665	2.378.147	91.936.812	0	0	0
Sistema Penal	13.764.757	0	13.764.757	0	0	0
Inteligencia	7.521	0	7.521	0	0	0
Subtotal	137.468.592	2.378.147	139.846.739	0	0	0
Servicios Sociales						
Salud	17.419.222	83.443.531	100.862.753	6.560.340	0	6.560.340
Promoción y Asistencia Social	2.541.276	401.613.665	404.154.941	647.013	1.931.800	2.578.813
Seguridad Social	261.525	0	261.525	25.030.953	0	25.030.953
Educación y Cultura	33.995.781	607.409.423	641.405.204	2.525.275	1.224.724	3.749.999
Ciencia y Técnica	31.096.965	9.651	31.106.616	170.523.064	30.459.651	200.982.715
Trabajo	8.646.818	29.423.625	38.070.443	225.695	0	225.695
Vivienda y Urbanismo	39.962	2.378.748.616	2.378.788.578	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	12.500.064	487.339.207	499.839.271	369.294.248	151.952.235	521.246.483
Subtotal	106.501.613	3.987.987.718	4.094.489.331	574.806.588	185.568.410	760.374.998
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	17.204.545	2.074.060.714	2.091.265.259	3.642.786	0	3.642.786
Comunicaciones	0	49.625.000	49.625.000	3.100.577	0	3.100.577
Transporte	193.896.885	348.117.063	542.013.948	3.848.636.295	751.230.251	4.599.866.546
Ecología y Medio Ambiente	18.288.249	3.426.802	21.715.051	8.465.048	0	8.465.048
Agricultura	1.958.693	0	1.958.693	6.736.529	0	6.736.529
Industria	98.082	10.276.912	10.374.994	30.035.298	0	30.035.298
Comercio, Turismo y Otros Servicios	13.925.019	8.350.741	22.275.760	122.122	0	122.122
Seguros y Finanzas	0	0	0	1.124.374	0	1.124.374
Subtotal	245.371.473	2.493.857.232	2.739.228.705	3.901.863.029	751.230.251	4.653.093.280
TOTAL	561.118.675	6.494.864.833	7.055.983.508	4.480.299.912	936.798.661	5.417.098.573

RESUMEN	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Dir. %	Transf. %
-Administración Central	561.118.675	6.494.864.833	7.055.983.508	11,13%	87,39%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social	4.480.299.912	936.798.661	5.417.098.573	88,87%	12,61%
TOTAL	5.041.418.587	7.431.663.494	12.473.082.081	100,00%	100,00%
