

INVERSION PUBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Primer Trimestre Año 2009


INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2009</u>	3
1- Según Nivel Institucional	3
2- Según Fuente de Financiamiento	3
3- Según Ubicación Geográfica	4
<u>II- EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION</u>	5
CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2009</u>	8
1- Según Nivel Institucional	8
2- Según Fuente de Financiamiento	8
3- Según Ubicación Geográfica	9
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/03/2009	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/03/2009	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/03/2009	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/03/2009	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/03/2009	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/03/2009	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/03/2009	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/03/2009	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/03/2009	


INTRODUCCION

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones incluidas en el presupuesto nacional destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital.


La IRD abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional. En 2009 su Crédito Inicial (CI) ascendió a \$11.760,8 millones y el Crédito Vigente al 31 de marzo alcanzó \$11.657,3 millones (baja de \$103,5 millones, 0,9%), con un devengado de \$1.748,0 millones (ver Gráfico N° 1):

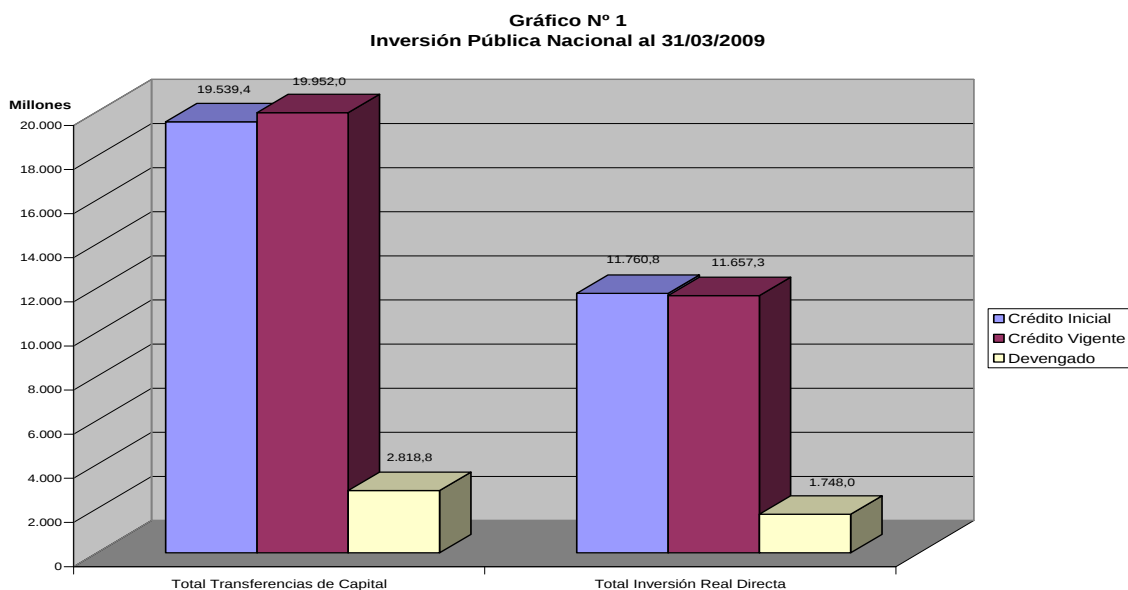

La IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con un CV al 31/03/09 de \$9.763,9 millones y una ejecución \$1.602,3 millones) y en **maquinaria, equipos, y otros conceptos** (CV de \$1.893,4 millones y gasto de \$145,7 millones) (ver Gráfico N°2):

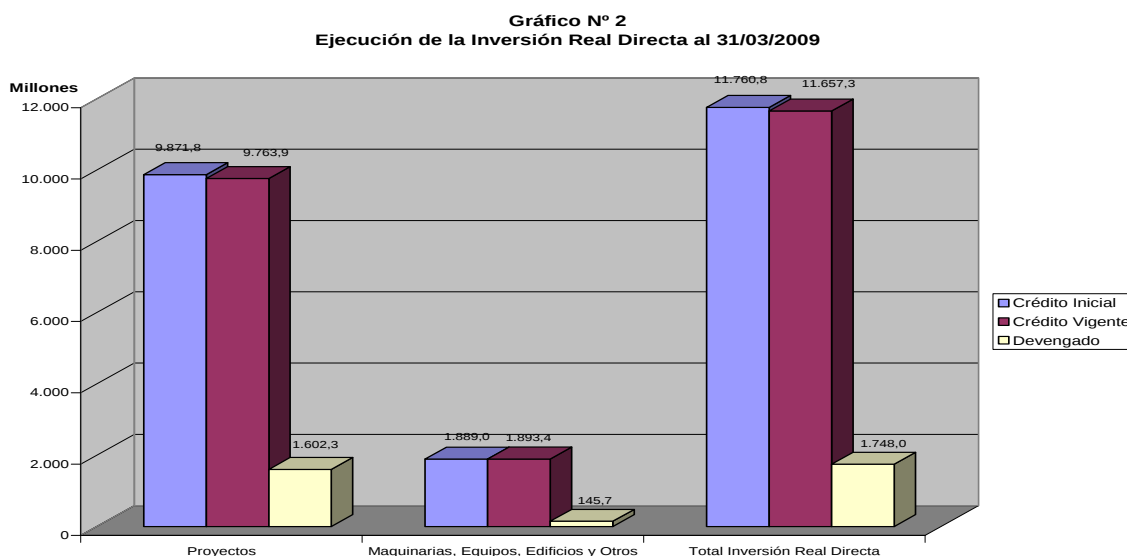

Adicionalmente la Administración Nacional transfiere recursos para gastos de capital que implican un incremento del activo del Estado (Nacional, Provincial o Municipal). Al 31/03/09, sobre un CV de \$19.952,0 millones, las transferencias de capital ascendieron a \$2.818,8 millones (ver Gráfico N° 3):

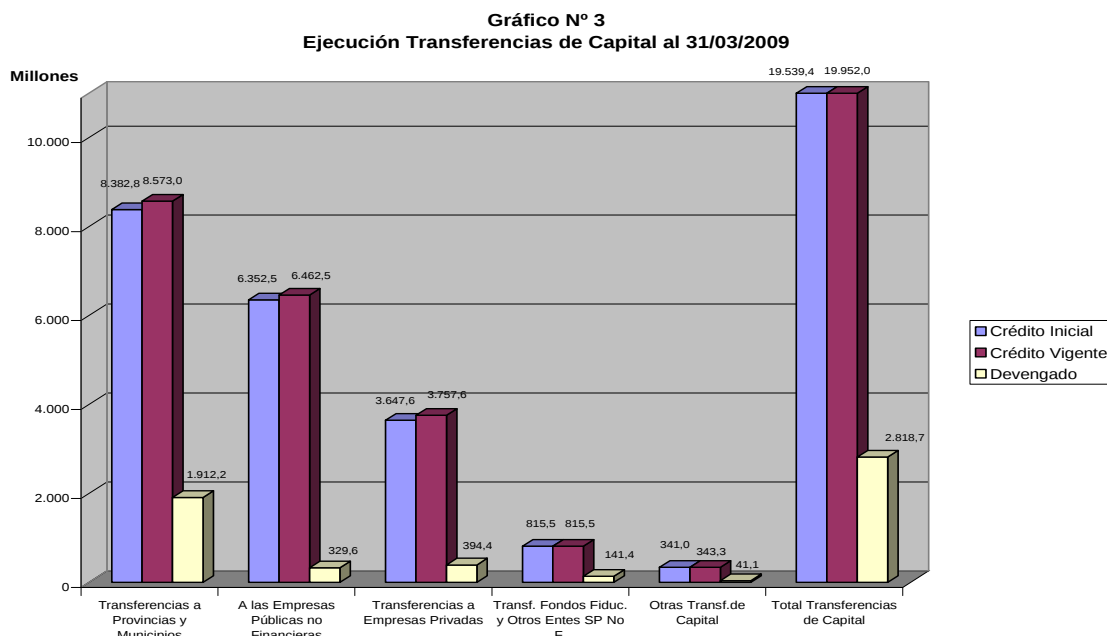

Al 31/03/09, de la ejecución de las transferencias de capital, \$1.912,2 millones (67,8%) correspondieron a provincias y municipios, \$394,4 millones (14,0%) a empresas privadas, \$329,6 millones (11,7%) a empresas públicas no financieras, \$141,4 millones (5,0%) a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional No Financiero y \$41,1 millones (1,5%) a otros tipos.

El siguiente cuadro muestra el CI, el CV y la ejecución de la Inversión Pública Nacional durante el período de referencia, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N° 1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/03/09 (en pesos)				
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% Ejecución
Inversión Real Directa	11.760.849.969	11.657.357.648	1.748.093.897	15,0%
Proyectos	9.871.804.575	9.763.936.364	1.602.347.971	16,4%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	1.889.045.394	1.893.421.284	145.745.926	7,7%
Transferencias de Capital	19.539.395.284	19.951.980.422	2.818.762.005	14,1%
Inversión Total	31.300.245.253	31.609.338.070	4.566.855.902	14,4%


Se observa que los proyectos de inversión registraron un mayor nivel de ejecución financiera sobre el resto de los conceptos enunciados. Sin embargo los proyectos registraron una disminución de su nivel de crédito inicial por \$107,9 millones (1,1%), mientras que los créditos para las transferencias de capital y la adquisición de bienes de uso se incrementaron en \$412,6 millones (2,1%) y \$4,4 millones (0,2%) respectivamente.

CAPITULO I: INVERSION REAL DIRECTA

I- EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2009

La ejecución de la Inversión Real Directa alcanzó a \$1.748,1 millones al 31/03/09, con una tasa de crecimiento anual acumulativa que alcanzó el 52,8% para el período 2004/2009:

Gráfico N° 4
Inversión Real Directa - Devengado al 31/03

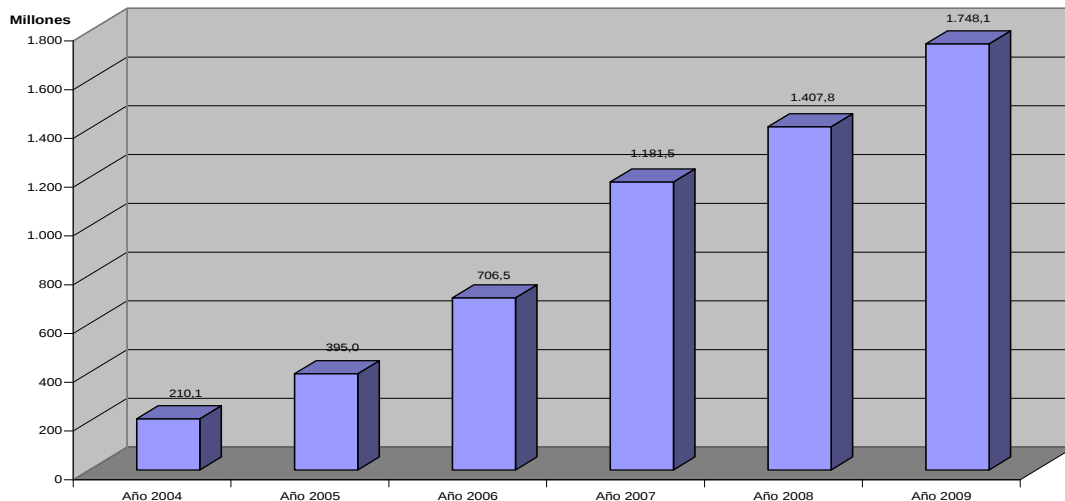

1- Según Nivel Institucional

Al 31/03/09 el Crédito Inicial destinado al financiamiento de la IRD disminuyó en \$103,5 millones (0,9%), de acuerdo al siguiente detalle por nivel institucional:

Cuadro N° 2. Ejecución de la Inversión Real Directa por Nivel Institucional al 31/03/09 (en pesos)				
Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	2.952.162.402	2.998.460.129	208.233.115	6,9%
Organismos Descentralizados	8.681.482.567	8.531.692.519	1.524.774.515	17,9%
Instituciones de Seguridad Social	127.205.000	127.205.000	15.086.268	11,9%
Total	11.760.849.969	11.657.357.648	1.748.093.897	15,0%


La ejecución de la IRD del primer trimestre del 2009 creció 24,2% con respecto al mismo período del año anterior. A continuación se expone una tabla que muestra los organismos con mayor monto ejecutado al 31/03/09 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 1. Ejecución Inversión Real Directa Comparada. Primer Trimestre 2008/2009 (en millones de pesos)			
Organismo	Ejecución 2008	Ejecución 2009	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	1.013,0	1.227,9	21,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	128,1	134,7	5,2%
Órgano de Control de Concesiones Viales	118,1	91,3	-22,7%
Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	49,4	70,5	42,8%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	0,7	46,9	6.745,0%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	30,6	32,6	6,5%
SubTotal	1.339,8	1.603,9	19,7%
Otros	68,0	144,1	112,0
Total IRD	1.407,8	1.748,0	24,2%

2- Según Fuente de Financiamiento

Alrededor del 78,2% del gasto de inversión al 31/03/09 se financió con Tesoro Nacional. A continuación se expone un gráfico relativo al porcentaje de ejecución de la inversión real directa considerando las distintas fuentes de financiamiento:

Gráfico N° 5
Inversión Real Directa- Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito Vigente al 31/03/2009

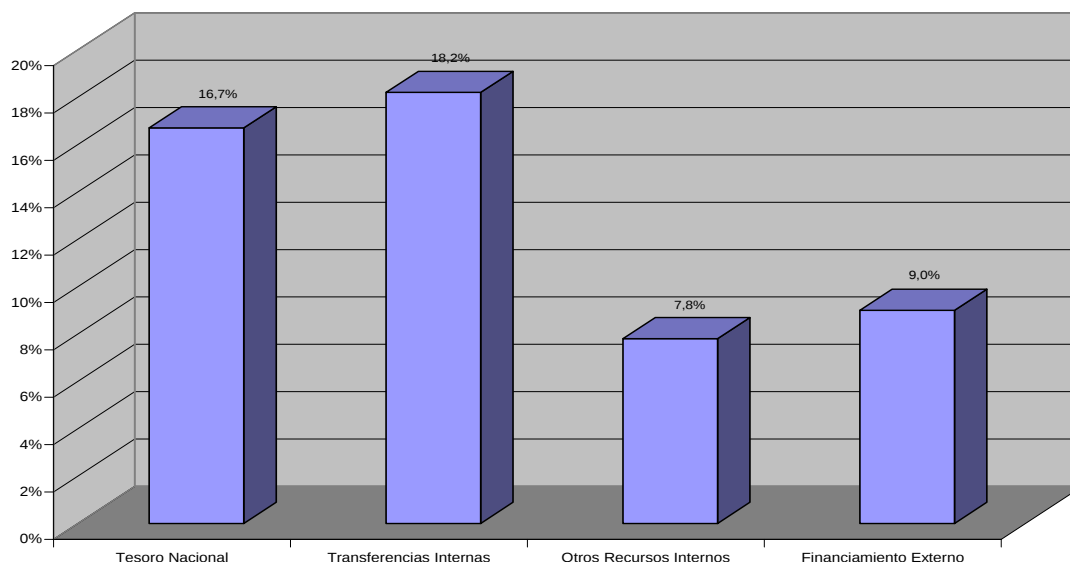

En relación al primer trimestre del año anterior, el gasto se incrementó en \$178,1 millones (15,0%) en la fuente Tesoro Nacional, en \$117,8 millones (243,5%) en Financiamiento Externo, en \$36,8 millones (139,2%) en otros recursos internos y \$7,5 millones (5,3%) en Transferencias Internas.

Cuadro N° 3. Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/03/09 (en pesos)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	8.286.890.564	8.175.297.182	1.367.682.526	16,7%
Transferencias Internas	809.232.547	808.646.731	150.887.799	18,7%
Otros Recursos Internos	828.141.000	828.141.000	63.300.640	7,6%
Financiamiento Externo	1.836.585.858	1.845.272.735	166.222.932	9,0%
Total	11.760.849.969	11.657.357.648	1.748.093.897	15,0%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$751,5 millones para la construcción y el mantenimiento de rutas, \$225,8 millones para el mantenimiento de mallas viales, \$134,7 millones en agua y saneamiento y \$71,5 millones en infraestructura en concesiones viales en áreas urbanas. Con **Transferencias Internas** se financiaron \$130,0 millones de obras en rutas y con **Financiamiento Externo** sobresalieron inversiones de \$114,2 millones en construcciones y mantenimiento de rutas y mallas viales realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD se concentró en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Córdoba que reunieron un 27% del gasto total. En la **provincia de Buenos Aires** se ejecutaron \$187,7 millones incluyendo, principalmente, obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$74,9 millones), obras hídricas de saneamiento (\$45,8 millones) y proyectos del Órgano de Control de Concesiones Viales (\$41,3 millones).

En la **provincia de Río Negro** se devengaron \$97,9 millones sobresaliendo las obras en la Ruta Nacional N° 23 Valcheta-Pilcaniyeu (\$32,7 millones), Ruta Nacional N° 22 Chichinales-Cipolletti (\$14,7 millones), Ruta Nacional N° 250 (\$12,7 millones), las Misiones Satelitales (\$10,1 millones) y la construcción del acueducto Villa Regina (\$5,8 millones). En la **provincia de Santa Fe** se ejecutaron \$92,4 millones destacándose las construcciones viales (\$62,3 millones) así como la Ruta N° 8 Avenida de Circunvalación Rosario (\$29,1 millones) y la Ruta Nacional N° 78 (\$18,4 millones). En la provincia de **Córdoba** se devengaron \$85,8 millones, principalmente para la construcción del Acueducto La Laguna Laboulaye (\$20,2 millones), la optimización de la Planta Tratamiento de Desagües en la Ciudad de Córdoba (\$16,3 millones) y obras en la Ruta Nacional N° 158 (\$33,6 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En este apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión al 31/03/09, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 73,8% del costo total de los proyectos en cartera y el 79,3% del gasto trimestral:

Cuadro N° 4. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Acumulado al 31/12/08	Devengado 01/01 al 31/03/09	% Dev. Acumulado al 31/03/09/ CT
DNV	Construcción de Rutas	41.598.947.125	12.647.229.952	797.347.108	32,3
DNV	Proyectos C.Re.Ma.	11.163.583.745	3.947.145.739	284.654.663	37,9
Sec. de Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	529.084.544	0	18.981.265	3,6
DNV	Mantenimiento de Rutas	2.136.117.310	650.209.928	138.843.580	36,9
CONAE	Misiones Satelitales	937.772.912	422.894.688	27.012.223	48,0
ENOHSA	Optimización y Rehabilitación Planta Tratamiento	74.062.583	32.448.562	16.279.705	65,8
ENOHSA	Desagües Córdoba Capital	66.175.162	35.269.201	20.154.605	83,8
ENOHSA	Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye-Córdoba	54.373.660	14.047.870	14.039.642	51,7
Sec. de Transporte	Reparación Parque España	165.219.027	143.601.195	10.146.234	93,1
ENOHSA	Sistema de Distribución de Agua Potable, Formosa	30.046.886	18.658.240	11.388.646	100,0
OCCOVI	Rehabilitación y Mejora RP N°25 Tramo Ramal Pilar del Acceso Oeste Provincia de Buenos Aires	139.827.069	120.035.698	18.407.973	99,0
Sec. de Transporte	Puerto Caleta Paula, Santa Cruz	147.863.033	134.346.141	13.516.892	100,0
OCCOVI	Doble Vía Santa Rosa-Gral. San Martín RN 7, Mendoza	94.024.723	46.081.268	15.311.935	65,3
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	57.121.929.024	18.211.968.482	1.386.084.471	34,3
Subtotal		77.349.260.100	21.668.022.492	1.748.093.897	30,3
Total I.R.D.					

(*) Costo Total de IRD según Formulación Presupuesto 2009

A continuación se describen los proyectos de inversión ordenados por Organismo:


Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 38.920 kilómetros de la red vial nacional y, durante el primer trimestre de 2009, realizó intervenciones en 3.810 kilómetros de rutas provinciales.

Construcción de Rutas: Al 31/03/09 la ejecución financiera acumuló el 32,3% del costo total de los proyectos vigentes. En el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se encontraban en ejecución 599 kilómetros. En **Obras por Convenio con Provincias** se encontraban en ejecución 486 kilómetros, concluyéndose el tramo Valcheta-Pilcaniyeu-Los Menucos de la R.N.N°23 y las secciones III Teniente Maza-Ramos Mexía (44 Km.) y V Talcahuala-Sierra Colorada (23,9 Km.) en Río Negro y los tramos Los Cajones-Anguinan de la R.N.N°73 (27,9 Km.) y Punta del Agua-Pircas Negras en la R.N.N°76 (30 Km.) en La Rioja.

En **Obras en Corredores Viales Concesionados** se encontraban en ejecución 121 kilómetros, terminándose los tramos R.N.Nº193 CVNº4-Obra Nº29 Empalme R.N.Nº9-Empalme R.N.Nº8 (31,6 Km.) y R.N.Nº8 CVNº4 Obra 19 A Empalme R.N.Nº188-Empalme R.P.Nº6 (61 Km.), en Buenos Aires. Por el sistema **Construir, Operar y Transferir** se mantuvieron 626 kilómetros y en **Mejoramiento y Reposición de Rutas** se encontraban en ejecución 4.312 kilómetros, concluyéndose 284 kilómetros en las provincias de San Luis (67,8 Km.), Jujuy (30,1 Km.), Formosa (29,6 Km.), Santiago del Estero (22 Km.), Buenos Aires (7,2 Km.) y rehabilitaciones menores en rutas nacionales (127 Km.). Asimismo se finalizaron las obras de reparación de obenques en estructuras sobre el Río Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas del puente Zárate-Brazo Largo (1.200 metros) y se encontraban en obra 2.592 metros en pasaderos. Seguidamente se presenta la evolución de la construcción de rutas en el primer trimestre de los últimos 9 ejercicios:

Gráfico N°6
DNV Kilómetros en construcción al 31/03 (Programa Construcciones)

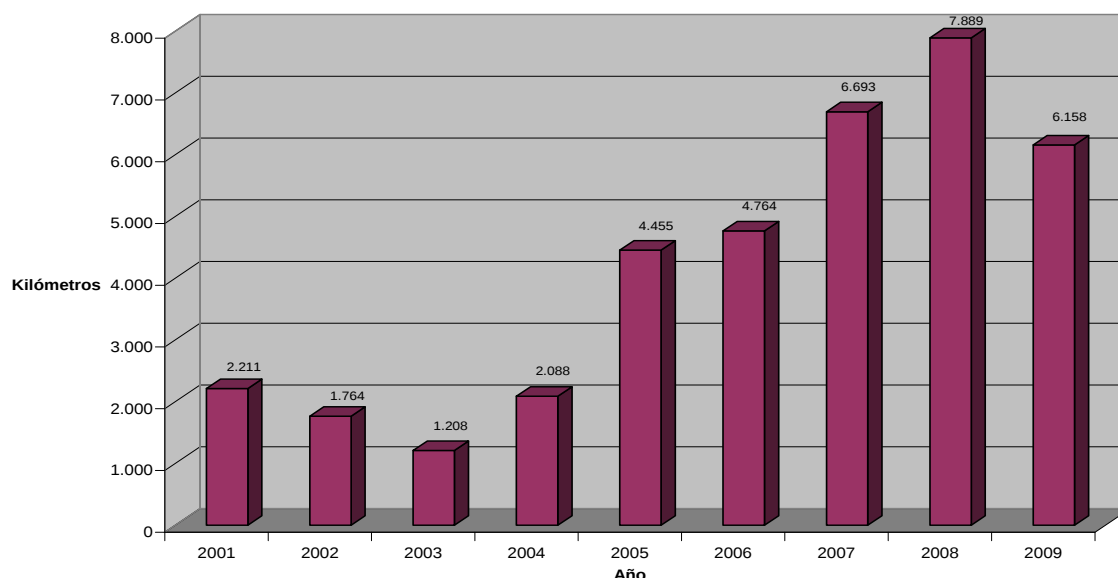

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/03/09 las mallas en ejecución ascendían a 2.264 kilómetros para C.Re.Ma I, a 1.685 Km. para C.Re.Ma II, a 5.702 Km. para C.Re.Ma III y a 2.999 Km. para C.Re.Ma IV.

Mantenimiento de Rutas: Al 31/13/09 se efectuó el mantenimiento directo de caminos en 5.921 kilómetros (con equipos y mano de obra propios) e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios, renovándose previa aprobación de la certificación correspondiente) en 6.341 kilómetros:

Cuadro N° 5. Mantenimiento de la Red Vial (Kilómetros)	
Sistema	Longitud
Directo	5.921,0
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.341,0
Total	12.262,0

Durante el primer trimestre las obras del **Sistema Modular** incluyeron trabajos en 2.295 kilómetros en las provincias de Chubut (843 Km.), Salta (694 Km.), Chaco (328 Km.), Mendoza (429 Km.) y Buenos Aires (1 Km.).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 31/03/09 en el marco del Plan Espacial 2007/14 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6. Misiones Satelitales en Curso		
Satélite	Misión	Socios
SAOCOM 1A/1B	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3	Observación de la tierra	Brasil
SAC D Aquarius	Observación de la tierra	NASA, Italia, Brasil, Francia y Dinamarca

En la obra **Misión SAOCOM** se realizó la compra de componentes electrónicos de vuelo y en la **Misión CESAR (SAC-D)** se continuó con la integración del modelo de vuelo del satélite, en San Carlos de Bariloche. Participaron la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento:

Proyectos Cloacales y de Saneamiento: Al 31/03/09 continuó la ejecución de la Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson (provincia de San Juan), de la Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa, el Acueducto Centro Oeste Santa Fe y los Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI):

Infraestructura y Mejoras Viales: A continuación se detallan los proyectos que constituyen la cartera del OCCOVI:

Cuadro N° 7. Programas y Proyectos de Inversión del OCCOVI					
Programas	CV Proyectos (en miles \$)	Devengado Proyectos (en miles \$)	Q Proy. 2009	Q Proy. c/devengado al 31/03/09	Q Proy. con ejecución física 31/03/09
17 - Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Buenos Aires	497.985	55.372	46	21	25
18 - Infraestructura en Áreas Urbanas	177.417	28.824	25	8	10
19 - Obras Mejorativas en Corredores Viales 2-Año II	115.710	7.115	5	3	3
20 - Obras de Seguridad en Corredor Vial 1	646.411	0	18	-	-
Totales	1.437.524	91.310	94	32	38

Sobresalen la Construcción 3° Trocha R.N.N°12 Km 1370-1594 en la provincia de Misiones, el Aumento de Capacidad en Corredores Viales en la provincia de Mendoza (obra doble Vía Santa Rosa-General San Martín R.N.N° 7) y la Rehabilitación y Mejora R.P.N° 25 Tramo Ramal Pilar del Acceso Oeste, provincia de Buenos Aires.

Secretaría de Transporte:

Alteo Terraplén Viaducto Ferroviario Laguna La Picasa: El proyecto (en la provincia de Santa Fe) restablece el corredor bioceánico central, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la República de Chile. Al 31/03/09 el proyecto estaba finalizado y en uso por el

concesionario. El gasto devengado durante el primer trimestre correspondió a certificaciones de redeterminación de precios.

Ampliación Puerto Caleta Paula: Se ubica próximo a la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz y atañe la ampliación del recinto portuario y la construcción de una obra de control de deriva litoral. Al 31/03/09 la ejecución física resultó del 5,4%, con un acumulado del 85,3%.

Recursos Hídricos:

Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional: El proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional abarca la instalación del instrumental de nuevas estaciones de medición y mantenimiento y la sistematización de la base de datos hidrometeorológicos y de calidad de agua. La ejecución física al 31/03/09 ascendió al 8,6%.

CAPITULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2009

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8. Ejecución de las Transferencias de Capital por Nivel Institucional al 31/03/2009 (en pesos)				
Nivel Institucional	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Administración Central	18.328.453.756	18.640.434.094	2.487.256.398	13,3%
Organismos Descentralizados	1.210.941.528	1.311.546.328	331.505.606	25,3%
TOTAL	19.539.395.284	19.951.980.422	2.818.762.005	14,1%

En cuanto al comportamiento interanual de las transferencias de capital se registra un aumento de \$443,5 millones respecto a 2008 (18,7%) y de \$1.000,1 millones (55%) respecto a 2007. A continuación se expone una tabla que muestra los **Organismos con mayor ejecución** en 2009 y la variación interanual respecto a 2008:

Tabla N° 2. Ejecución Transferencias de Capital. Comparada Primer Trimestre 2007/2008 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2007	Ejecución 2009	Variación
Administración Central Ministerio de Planificación Federal,			
Inversión Pública y Servicios	1.502,6	1.910,6	27,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	211,2	329,5	56,0%
Dirección Nacional de Vialidad	520,0	277,5	-46,6%
Ministerio de Educación	54,2	175,2	223,2%
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento	45,8	42,5	-7,2%
SubTotal	2.333,8	2.735,3	17,2%
Otros	41,4	83,4	101,4%
Total Transferencias de Capital	2.375,2	2.818,8	18,7%

La Administración Central del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, principal organismo ejecutor, realizó transferencias para **infraestructura habitacional, políticas energética, ferroviaria y de obras públicas**. Las transferencias a empresas públicas del sector energía y minería alcanzaron a \$154,2 millones mientras que las transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) fueron de \$106,9 millones. Las transferencias de la


Dirección Nacional de Vialidad se dirigieron a financiar la **construcción de rutas** por \$277,5 millones.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 9. Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente de Financiamiento. Al 31/03/2009 (en pesos)				
Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	% de ejecución
Tesoro Nacional	13.363.953.676	13.775.904.014	2.351.915.704	17,1%
Recursos con Afectación Específica	351.158.168	351.458.168	60.277.949	17,2%
Otros Recursos Internos	44.228.000	44.562.800	5.241.262	11,8%
Financiamiento Externo	5.780.055.440	5.780.055.440	401.327.089	6,9%
Total	19.539.395.284	19.951.980.422	2.818.762.005	14,1%

El **Tesoro Nacional** concentró el 83,4% de las transferencias, sobresaliendo las destinadas al Desarrollo Habitacional “Techo Digno” (\$671,3 millones), a la construcción de rutas por convenio con provincias (\$277,5 millones), al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$141,4 millones), a provincias y municipios para obras públicas (\$113,4 millones), a mejoramiento habitacional (\$89,2 millones), al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$74,0 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$71,3 millones), a empresas privadas para la Línea de Alta Tensión NEA-NOA (\$71,1 millones) y a infraestructura urbana en municipios (\$55,7 millones). Asimismo se realizaron transferencias a AySA S.A. (\$106,9 millones), a empresas privadas de transporte ferroviario (\$135,7 millones) y al Ente Binacional Yacypetá (\$93,0 millones). Los **Recursos Afectados** correspondieron, fundamentalmente, al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$57,8 millones) y el **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, a empresas privadas para la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$185,0 millones), a provincias para infraestructura y equipamiento realizadas por el Ministerio de Educación (\$69,2 millones), a acciones para el desarrollo de la infraestructura social (\$44,3 millones) y a “Más Escuelas, Mejor Educación” (\$40,1 millones).

Gráfico N° 7
Transferencias de Capital - Porcentaje de Ejecución respecto al Crédito al 31/03/2009

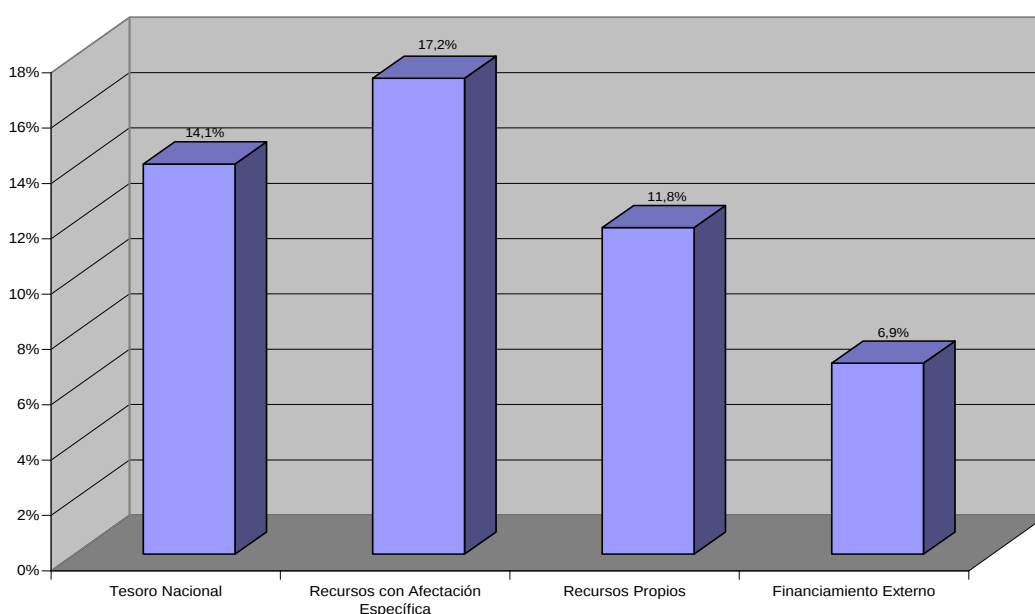

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tucumán (51,2% del monto global). En la **provincia de Buenos Aires** (20,1%) se destacaron, entre otros, los fondos destinados al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$209,1 millones), a la urbanización de asentamientos precarios (\$66,8 millones) y a infraestructura urbana en municipios (\$42,4 millones).

En la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (19,2%) se destacaron, entre otros, los fondos transferidos al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (\$141,4 millones), a AySA S.A. (\$106,9 millones), a TBA S.A. (\$57,7 millones), a Ferrocarril S.A. (\$23,6 millones), a Empresa Argentina para Soluciones Satelitales S.A. (\$21,0 millones) y a NASA S.A. (\$14,3 millones). Los gastos se imputan en la jurisdicción por encontrarse el domicilio legal de las firmas beneficiarias, no implicando necesariamente el ámbito geográfico de las obras.

En la provincia de **Santa Cruz** (8,0% del total) sobresalieron las obras viales por convenio (\$153,1 millones) y los fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (\$30,2 millones) y en la provincia de **Tucumán** (3,9%) se incluyeron transferencias al desarrollo habitacional “Techo Digno” (\$28,8 millones), al mejoramiento habitacional e infraestructura básica (\$20,4 millones) y al Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (\$17,2 millones).

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	67.431.633	19.599.425	41,0%
Presidencia de la Nación	26.578.000	27.316.163	738.163	2,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	161.060.413	10.000.000	6,6%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	293.317.858	291.137.858	-2.180.000	-0,7%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	144.175.990	39.560	0,0%
Ministerio de Defensa	174.715.184	174.115.552	-599.632	-0,3%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	39.359.532	0	0,0%
Ministerio de Producción	112.093.822	116.390.258	4.296.436	3,8%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	8.772.101.852	8.631.051.886	-141.049.966	-1,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	35.729.276	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	45.500.000	850.000	1,9%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	15.925.000	-2.525.000	-13,7%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.763.936.364	-107.868.211	-1,1%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	30.454.476	2.192.917	7,8%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	169.977.024	-32.522.976	-16,1%
Ministerio Público	17.185.000	17.685.000	500.000	2,9%
Presidencia de la Nación	93.534.220	94.005.720	471.500	0,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	27.342.209	-15.162.000	-35,7%
Ministerio del Interior	65.302.000	65.502.000	200.000	0,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	21.698.205	23.878.205	2.180.000	10,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	425.063.117	272.275	0,1%
Ministerio de Defensa	176.694.332	178.049.232	1.354.900	0,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	52.478.013	180.649	0,3%
Ministerio de Producción	91.384.840	96.289.796	4.904.956	5,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	336.344.346	366.028.286	29.683.940	8,8%
Ministerio de Educación	9.350.562	12.845.534	3.494.972	37,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	46.898.724	-270.000	-0,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	145.350.280	-850.000	-0,6%
Ministerio de Salud	115.787.911	121.007.668	5.219.757	4,5%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	14.566.000	2.525.000	21,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	6.000.000	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.893.421.284	4.375.890	0,2%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.657.357.648	-103.492.321	-0,9%

CUADRO B
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA AL 31/03/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Judicial de la Nación	47.832.208	67.431.633	19.895.896	6.813.271	10,1%
Presidencia de la Nación	26.578.000	27.316.163	12.017.314	552.927	2,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	151.060.413	161.060.413	2.851.338	2.851.338	1,8%
Ministerio del Interior	800.000	800.000	0	0	0,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	293.317.858	291.137.858	47.533.618	37.602.302	12,9%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	144.136.430	144.175.990	61.410.823	10.260.494	7,1%
Ministerio de Defensa	174.715.184	174.115.552	10.454.339	8.657.129	5,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	39.359.532	39.359.532	160.683	0	0,0%
Ministerio de Producción	112.093.822	116.390.258	9.790.896	3.901.272	3,4%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	8.772.101.852	8.631.051.886	1.601.506.689	1.530.988.230	17,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	35.729.276	35.729.276	62.600	0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	44.650.000	45.500.000	39.844	39.790	0,1%
Ministerio de Desarrollo Social	18.450.000	15.925.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN PROYECTOS	9.871.804.575	9.763.936.364	1.767.468.129	1.602.347.971	16,4%
Poder Legislativo Nacional	28.261.559	30.454.476	5.534.922	3.198.512	10,5%
Poder Judicial de la Nación	202.500.000	169.977.024	30.208.519	17.124.664	10,1%
Ministerio Público	17.185.000	17.685.000	1.150.499	321.698	1,8%
Presidencia de la Nación	93.534.220	94.005.720	2.981.224	1.455.013	1,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	42.504.209	27.342.209	1.918.284	1.190.228	4,4%
Ministerio del Interior	65.302.000	65.502.000	228.894	228.894	0,3%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	21.698.205	23.878.205	5.445.567	3.980.151	16,7%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	424.790.842	425.063.117	64.356.696	41.083.625	9,7%
Ministerio de Defensa	176.694.332	178.049.232	5.133.822	2.653.442	1,5%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	52.297.364	52.478.013	4.756.331	1.840.217	3,5%
Ministerio de Producción	91.384.840	96.289.796	11.909.063	6.303.749	6,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	336.344.346	366.028.286	18.481.417	14.138.379	3,9%
Ministerio de Educación	9.350.562	12.845.534	1.594.741	1.168.728	9,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	47.168.724	46.898.724	10.560.595	6.163.208	13,1%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	146.200.280	145.350.280	17.798.076	17.585.391	12,1%
Ministerio de Salud	115.787.911	121.007.668	44.455.012	27.154.405	22,4%
Ministerio de Desarrollo Social	12.041.000	14.566.000	1.507.329	155.625	1,1%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.000.000	6.000.000	0	0	0,0%
TOTAL INVERSION REAL EN ACTIVIDADES	1.889.045.394	1.893.421.284	228.020.991	145.745.926	7,7%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.657.357.648	1.995.489.120	1.748.093.897	15,0%

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
5	320					Poder Judicial de la Nación							
		22				CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (*)							
			0			Justicia de Casación Penal							
				1		Justicia de Casación Penal							
						Adecuación y Remodelación Sede Judicial	230.000	652.250	590.751	81,00	s/i	s/i	s/i
						51 Construcción de Archivo, Intendencia y Ampliación Alcaldía	100.000	652.250	590.751	95,00	2,00	s/i	s/i
						52 Adecuación Edificio Comodoro Py 2002 - Capital Federal	130.000	0	0	100,00	45,00	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Capital Federal							
			2			Fuero Civil							
				1		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	40.000	2.000.000	0	61,00	s/i	0,00	
						53 Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal	40.000	2.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						3 Refacciones y Acondicionamiento Data Center Lavalle 1240	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Integral Data Center Lavalle 1240	0	14.367.175	0	0,00	100,00	0,00	0,00
		24				Justicia Federal							
			3			Fuero Contencioso Administrativo Federal							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	4.000.000	4.856.960	933.843	93,00	29,00	s/i	s/i
						51 Edificio Paraguay 923/27 - Instalación de Seis Juzgados	4.000.000	4.856.960	933.843	93,00	29,00	s/i	s/i
			7			Área Cámara de la Plata							
				1		Adecuación y Ampliación Sede Judicial	532.500	0	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en funcionamiento	327.500	0	0	0,00	14,00	0,00	0,00
						52 Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio	205.000	0	0	0,00	8,00	0,00	0,00
		10				Área Cámara Mendoza							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	1.200.000	0	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Edificio La Rioja esquina Mitre - San Juan Adecuación Sector	1.200.000	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						2 Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Intendencia para Cámara Edificio España 483 Mendoza	202.500	0	0	0,00	40,00	0,00	0,00
		11				Área Cámara Rosario							
				1		Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales	805.000	3.000.000	0	0,00	s/i	0,00	
						51 Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi	402.500	3.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						52 Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fé	402.500	0	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		12				Área Cámara General Roca							
				1		Remodelación y Ampliación Sede Judicial	1.000.000	1.891.360	865.225	48,00	s/i	s/i	s/i
						52 Juzgado Federal Bariloche - Remodelación y Reparaciones Generales	1.000.000	1.891.360	865.225	96,00	33,00	s/i	s/i
		15				Área Cámara Resistencia							
				2		Remodelación y Adecuación de Sede Judicial	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00
						51 Remodelación y Reparaciones en Juzgado de Roque Saenz Peña	350.000	0	0	100,00	25,00	0,00	0,00
		16				Área Cámara de Córdoba							
				1		Ampliación y Remodelación Sede Judicial	140.000	322.860	286.062	47,00	19,00	s/i	s/i
						51 Reparación edificio Ocupado por el Tribunal Oral Penal N° 2	140.000	322.860	286.062	47,00	19,00	s/i	s/i
		17				Área Cámara San Martín							
				1		Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	750.000	2.058.820	839.412	96,00	s/i	s/i	s/i
						52 Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento	700.000	0	0	0,00	28,00	0,00	0,00
						53 Edificio Crisólogo Larralde 673 Morón - Adecuación Edificio	50.000	2.058.820	839.412	77,00	2,00	s/i	s/i
						2 Remodelación Archivo para Sede Juzgado.Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aire	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
				18		51 Remodelación Archivo para Sede Juzgado. Edificio Abel Costa 422, Morón, Buenos Aire	200.000	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						Área Cámara Tucumán							
					1	Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00
						52 Juzgado Federal Catamarca - Ampliación y Remodelación en Edificio	100.000	0	0	93,00	3,00	0,00	0,00
335						CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)							
		4				Mandamientos y Notificaciones							
				1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial	2.800.000	2.800.000	2.054.614	13,00	24,00	s/i	s/i
						51 Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	2.800.000	2.800.000	2.054.614	13,00	24,00	s/i	s/i
		5				Pericias Judiciales							
				1		Construcción Edificio para la Morgue Judicial	6.800.836	2.500.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio para la Morgue Judicial	6.800.836	2.500.836	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				2		Refacciones en Sedes Periciales Etapa II	201.500	301.500	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Construcciones Depósitos Edificio Junín 760	201.500	301.500	0	0,00	33,00	0,00	0,00
		6				Biblioteca y Jurisprudencia							
				1		Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	4.092.060	4.092.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Adecuación Integral Edificio para Traslado Biblioteca	4.092.060	4.092.060	0	0,00	33,00	0,00	0,00
		7				Archivo General							
				3		Refacciones Varias	2.650.000	2.650.000	331.681	52,28	s/i	s/i	s/i
						61 Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	2.650.000	2.650.000	331.681	2,28	28,00	s/i	s/i
21						Justicia de Máxima Instancia							
				1		Refacciones en el Palacio de Justicia	1.513.850	1.606.850	0	20,03	s/i	0,00	
						51 Reciclado de Fachadas y Patios interiores	32.500	125.500	0	83,25	1,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	1.211.600	1.211.600	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						72 Reparación Sala de Audiencia, Palacio Justicia - Ciudad de Buenos Aires	269.750	269.750	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				2		Refacciones en Sedes Periciales	65.000	720.000	718.334	92,20	s/i	s/i	s/i
						56 Refacciones y Acondicionamiento - Bartolomé Mitre 718 - Maipú	65.000	720.000	718.334	90,00	1,00	s/i	s/i
				3		Refacciones Varias	0	200.000	0	66,26	s/i	0,00	
						76 Reformas Edificio Lavalle 1250	0	200.000	0	65,57	s/i	0,00	
				4		Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	155.346	76,00	10,00	s/i	s/i
						51 Reforma Instalación Eléctrica Palacio de Justicia-Talcahuano	735.828	767.828	155.346	76,00	10,00	s/i	s/i
				5		Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1429	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00
						51 Readecuación y Refuncionalización - Edificio Lavalle 1430	13.000	13.000	0	78,00	4,00	0,00	0,00
				6		Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia	693.776	2.493.776	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	1.926.542	3.346.542	38.004	31,00	s/i	s/i	s/i
						51 Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	16.250	16.250	0	99,00	5,00	0,00	0,00
						52 Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia Nº1 al Nº12 -	1.910.292	3.330.292	38.004	0,00	33,00	s/i	s/i
				9		Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	17.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia - Ciudad de Buenos Aires	17.267	17.267	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				10		Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Refacción Etapa III Fachadas Patios Interiores Palacio de Justicia	2.036.026	2.036.026	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				11		Recambio Calderas del Palacio de Justicia	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00
						51 Recambio Calderas del Palacio de Justicia	285.169	285.169	0	0,00	33,00	0,00	0,00
				12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA	3.386.178	3.386.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

						FINANCIERO			FISICO									
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%					
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.					
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual					
20	116	25				51 Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la UBA	3.386.178	3.386.178	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						13 Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						51 Reciclado de Fachada Calle Lavalle	1.366.526	1.366.526	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						14 Refacciones en el Palacio de Justicia Etapa II	9.698.650	9.698.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						51 Pintura Palacio de Justicia	2.694.250	2.694.250	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						52 Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia	403.650	403.650	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						53 Restauración Integral de Pisos	1.345.500	1.345.500	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						54 Reparación Terraza	5.255.250	5.255.250	0	0,00	33,00	0,00	0,00					
						Presidencia de la Nación												
						BIBLIOTECA NACIONAL												
						Servicios de la Biblioteca Nacional												
	301	1					1 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	4.820.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00				
							51 Construcción Edificio Las Heras - Museo del Libro - Ciudad de Buenos Aires	4.820.000	4.820.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00				
							SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION											
							Actividades Centrales											
							2 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00					
							51 Remodelación y Equipamiento en Quinta de Olivos	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00					
							3 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	18.050.000	252.860	85,99	14,01	1,10	7,85				
							51 Remodelación Casa de Gobierno Etapa - II	18.050.000	18.050.000	252.860	85,99	14,01	1,10	7,85				
							4 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	41.955	100,00	0,00	0,00					
							51 Restauración y Puesta en Valor de la Cochera Presidencial	1.100.000	1.100.000	41.955	100,00	0,00	0,00					
							337	36					SECRETARIA DE CULTURA					
	Difusión de la Música y Danza																	
	1 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12							0,00	0,00				
	51 Mejoras en el Edificio de la Calle Austria	2.000	2.000	0	97,20	1,12							0,00	0,00				
	Preservación y Exhibición Artística - Cultural																	
	1 Mejoras en Museos	392.000	392.000	0	80,85	19,15							0,00	0,00				
	51 Mejoras en el Museo Ricardo Rojas	100.000	100.000	0	85,40	14,60							0,00	0,00				
	52 Mejoras en el Museo Nac. del Cabildo y la Revolución de Mayo	10.000	10.000	0	0,00	12,50							0,00	0,00				
	54 Mejoras en el Museo Mitre	42.000	42.000	0	0,00	4,40							0,00	0,00				
	56 Mejora en el Museo Yrurtia	40.000	40.000	0	0,00	100,00							0,00	0,00				
	57 Mejoras en el Museo Histórico del Norte	40.000	40.000	0	0,00	100,00							0,00	0,00				
		37					58 Mejoras en el Museo Casa Histórica de la Independencia	50.000	50.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							59 Mejoras en el Museo de la Historia del Traje	30.000	30.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							60 Mejoras en el Museo del Grabado	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							61 Mejoras en la Escuela de Museología	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							62 Mejoras en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							63 Mejoras en la Casa Acuerdo de San Nicolás	20.000	20.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00				
							Desarrollo y Promoción Cultural											
							5 Remodelación de Edificios Culturales - Etapa 1	164.000	164.000	0	85,02	10,00	0,00	0,00				
							51 Obra en el Edificio de la Avenida Alvear	50.000	50.000	0	70,00	30,00	0,00	0,00				
							52 Obra en el Edificio de la Calle Rodríguez Peña	40.000	40.000	0	0,00	72,00	0,00	0,00				
							53 Obra en el Edificio de la Calle Alsina	35.000	35.000	0	0,00	24,00	0,00	0,00				
	54 Mejoras en el Edificio de la Calle México	14.000	14.000	0	24,70	8,92	0,00	0,00										

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
25	317	31	42			56 Mejoras en el Departamento de la Calle Tres Sargentos	25.000	25.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						6 Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario	0	1.041.000	258.111	100,00	0,00	0,00	
						51 Remodelacion Edificio Festejo Bicentenario	0	1.041.000	258.111	100,00	0,00	0,00	
						Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes							
						1 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	2.000.000	1.697.163	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	2.000.000	1.697.163	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						Jefatura de Gabinete de Ministros							
						SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE							
						Coordinación de Políticas Ambientales							
						1 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	633.397	633.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Jujuy (BIRF 7362)	633.397	633.397	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						2 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza (BIRF 7362)	607.806	607.806	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						3 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	255.918	255.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Juan (BIRF 7362)	255.918	255.918	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						4 Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	319.898	319.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción Accesorio Relleno Sanitario San Juan (BIRF 736)	319.898	319.898	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						5 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Saneamiento de Micro Basurales Córdoba (BIRF 7362)	1.887.396	1.887.396	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						7 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	2.331.414	2.331.414	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Construcción y Puesta en Marcha Planta de Compostaje Rosario	2.331.414	2.331.414	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						9 Refacción Planta de Transferecia Rosario	767.754	767.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00
						51 Refacción Planta de Transferecia Rosario	767.754	767.754	0	0,00	85,00	0,00	0,00
						11 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	2.186.292	2.186.292	2.622	0,00	85,00	s/i	
						51 Construcción Relleno Sanitario General Alvear, Mendoza	2.186.292	2.186.292	2.622	0,00	85,00	s/i	
						12 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	1.510.662	1.510.662	2.622	0,00	90,00	s/i	
						51 Construcción Relleno Sanitario Malargüe, Mendoza	1.510.662	1.510.662	2.622	0,00	90,00	s/i	
						13 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	3.198.976	3.198.976	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						51 Construcción Planta Tratamiento Las Flores y San Martín	3.198.976	3.198.976	0	0,00	65,00	0,00	0,00
						14 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Bs.As.	2.516.532	2.516.532	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio de la Costa, Bs.As.	2.516.532	2.516.532	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						15 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	16.634.677	16.634.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón	16.634.677	16.634.677	0	0,00	98,00	0,00	0,00
						16 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.731.926	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Chubut	12.731.926	12.731.926	0	0,00	95,00	0,00	0,00
						17 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	2.650.125	2.650.125	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario San Antonio de Areco	2.650.125	2.650.125	0	0,00	19,00	0,00	0,00
						18 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.977.846	1.977.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Tornquist	1.977.846	1.977.846	0	0,00	22,00	0,00	0,00
						19 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	6.756.227	6.756.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Pinamar - Villa Gesell	6.756.227	6.756.227	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						20 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	4.478.567	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Construcción Relleno Sanitario Mendoza Metropolitana	4.478.567	4.478.567	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
		39				Gestión Ambiental Matanza - Riachuelo BID 1059/OC - AR							
				1		Saneamiento y Acondicionamiento Cuenca Matanza Riachuelo	89.615.000	99.615.000	2.846.094	23,00	62,00	2,00	3,23
					51	Redes Secundarias y Colectoras en La Matanza	11.740.540	13.740.540	2	0,00	62,00	0,00	0,00
					52	Ampliación Planta Depuradora Sudoeste en La Matanza	61.793.260	68.793.260	2.553.699	9,00	57,00	5,00	8,77
					53	Colector Troncal - Ruta 21 en La Matanza	13.750.000	14.750.000	292.394	47,00	44,00	1,00	2,27
					55	Relleno Sanitario Cuenca Alta	2.331.200	2.331.200	0	0,00	83,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior							
	201					DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES							
		16				Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio							
				6		Construcción Entrepiso Edificio III	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Entrepiso Edificio III	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional							
	106					COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES							
		1				Actividades Centrales							
				3		Remodelación de la Sede Central de la CONAE	13.000	13.000	0	97,73	2,27	0,00	0,00
				51		Remodelación del Edificio de la Sede Central de la CNAE	13.000	13.000	0	97,73	2,27	0,00	0,00
				4		Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	3.750.000	467.564	15,00	42,60	10,00	23,47
					51	Remodelación del Edificio de la Sede Central de CONAE - Fase II	2.000.000	3.750.000	467.564	15,00	42,60	10,00	23,47
				5		Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	2.500.000	0	2,00	27,80	0,00	0,00
					51	Remodelación de las Instalaciones del Centro Espacial Teófilo Tabanera	2.500.000	2.500.000	0	2,00	27,80	0,00	0,00
	16					Generación de Ciclos de Información Espacial Completos							
		1				Infraestructura Terrestre	12.551.544	12.936.544	445.155	46,70	14,10	0,60	4,26
				0		Infraestructura Terrestre	250.000	250.000	0				
				51		Construcción del Laboratorio de Integración y Ensayos	1.543.935	1.923.935	362.928	91,50	8,50	1,50	17,65
				52		Construcción del Instituto Gulich	1.000.000	1.000.000	0	14,00	24,40	0,00	0,00
				55		Construcción Antena Multipropósito N° 3	3.747.609	3.747.609	0	14,00	83,30	0,00	0,00
				56		Construcción Antena Multipropósito N° 4	4.495.000	4.495.000	0	0,00	99,90	0,00	0,00
				57		Automatización de la Estación Terrena Córdoba	5.000	5.000	0	83,00	0,10	0,00	0,00
				58		Construcción de Antenas Educativas	5.000	10.000	37.253	6,82	0,10	0,00	0,00
				59		Construcción e Instalación de Antenas Regionales	5.000	5.000	0	0,08	0,10	0,00	0,00
				60		Construcción e Instalación de Arrays Planos	1.500.000	1.500.000	44.974	7,50	13,40	0,40	2,99
				2		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	177.857.742	171.292.742	27.012.223	62,04	16,50	1,50	9,09
				0		Misiones Satelitales (BID 1777-PROSAT)	1.821.900	2.321.900	504.313				
				52		Misión SAOCOM	119.012.508	111.947.508	16.200.924	51,00	12,10	1,70	14,05
				53		Misión SABIA	19.419.386	19.419.386	754.337	28,29	33,60	1,30	3,87
				54		Misión CESAR	37.603.948	37.603.948	9.552.649	90,00	5,30	1,30	24,53
				4		Infraestructura terrestre Etapa II	4.310.000	4.310.000	49.924	0,00	47,90	0,60	1,25
					51	Antena Multipropósito N° 5	4.290.000	4.290.000	49.924	0,00	95,30	1,10	1,15
					52	Antena Multipropósito N° 6	20.000	20.000	0	0,00	0,40	0,00	0,00
				5		Subsistemas de propulsión de satélites	1.710.000	1.710.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Subsistema de Propulsión de Satélites	1.710.000	1.710.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
				6		Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	2.986.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00
					51	Construcción Satélite "SARE - 1"	2.986.800	2.986.800	0	0,00	66,40	0,00	0,00
	17					Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
					1	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	25.903.000	28.153.000	2.949.404	11,44	24,00	2,70	11,25
					0	Construcción de Inyector Satelital p/Cargas Utiles Livianas	103.000	103.000	0				
					51	Facilidades de Apoyo y Suministros Especiales	800.000	3.050.000	522.380	38,72	12,90	3,20	24,81
					52	Configuración de Vehículo Espacial	25.000.000	25.000.000	2.427.024	10,20	25,70	2,50	9,73
		18				Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen							
				1		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	10.000	10.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
				0		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	6.000	6.000	0				
				51		Reconversión Planta Industrial Falda del Carmen	4.000	4.000	0	0,00	0,10	0,00	0,00
307						MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO							
		1				Actividades Centrales							
				16		Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Archivo - Ministerio Relaciones Exteriores	7.868.695	7.868.695	0	0,00	9,00	0,00	0,00
				17		Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.500.000	99.234	0,00	26,00	5,00	19,23
				51		Remodelación Edificio Juncal - Ministerio Relaciones Exteriores	1.500.000	1.500.000	99.234	0,00	26,00	5,00	19,23
		16				Acciones Diplomáticas de Política Exterior							
				6		Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	22.433.655	4.084.668	40,00	60,00	14,00	23,33
				0		Construcción de la Embajada en Brasilia	0	1.000.000	117.193				
				51		Construcción de la Embajada en Brasilia	22.433.655	21.433.655	3.967.475	40,00	60,00	14,00	23,33
				9		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	0	61,00	9,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Embajada y Residencia en La Paz	1.689.103	1.689.103	0	61,00	9,00	0,00	0,00
				11		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.266.316	19.778	5,00	95,00	9,00	9,47
				51		Remodelación Embajada y Residencia en Washington	15.266.316	15.266.316	19.778	5,00	95,00	9,00	9,47
				12		Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	0	0,00	85,00	0,00	0,00
				51		Remodelación de la Embajada de Francia	6.574.821	6.574.821	0	0,00	85,00	0,00	0,00
				15		Remodelación Residencia y Embajada en Paises Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Residencia y Embajada en Paises Bajos	100.000	100.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
				16		Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Residencia en Berlín, Alemania	100.000	100.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				19		Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	1.616.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Lima, Perú	1.616.542	1.616.542	0	0,00	52,00	0,00	0,00
		20				Remodelación Museo San Martín - Francia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Museo San Martín - Francia	100.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				21		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Embajada en Santiago de Chile	250.000	250.000	0	0,00	78,00	0,00	0,00
				22		Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Embajada, Residencia y Consulado en Colombia	250.000	250.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00
				23		Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización	250.000	250.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00
				51		Proyecto Remodelación Oficinas de la Misión ante la Organización	250.000	250.000	0	0,00	63,00	0,00	0,00
				24		Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Casa Historica ex-jardinero - Paises Bajos	250.000	250.000	4.219	0,00	100,00	0,00	0,00
20						Desarrollo del Plan Antártico							
				15		Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
				51		Remodelación Edificio de la Dirección Nacional del Antártico	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
				16		Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.470.133	69,00	31,00	10,00	32,26

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
40						51 Remodelación Módulo Habitacional y Laboratorio Base Científica Jubany	5.126.640	5.126.640	2.470.133	69,00	31,00	10,00	32,26
	326					Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos							
		21				POLICIA FEDERAL ARGENTINA							
						Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes							
				22		Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Delegación Campana	156.000	156.000	0	90,00	10,00	0,00	0,00
				33		Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Edificio Moreno 1423/41 para la Superintendencia	500.000	500.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
				34		Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex Comisaria 9)	1.105.000	1.105.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				40		Construcción Área para la División Laboratorio Químico	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción Área para la División Laboratorio Químico	1.900.000	1.900.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				43		Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Casino y Construcción de Oficina - Superintendente	87.000	87.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				48		Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Viviendas para Uso del Personal en Actividad	682.500	682.500	0	0,00	35,00	0,00	0,00
				52		Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
						51 Construcción Nuevo Panteón Policial - Cementerio de la Chacarita	2.000.000	2.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
		22				Asistencia Médica Sanitaria al Personal Policial y su Familia							
				4		Construcción Consultorios Externos para Ginecología	300.000	300.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00
						51 Construcción Consultorios Externos para Ginecología	300.000	300.000	0	0,00	47,00	0,00	0,00
	332					MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS							
		1				Actividades Centrales							
				4		Reparaciones Varias y Equipamiento de Diversas Dependencias	600.000	600.000	11.228	0,00	100,00	s/i	
						51 Reparaciones Varias	200.000	200.000	8.228	0,00	100,00	s/i	
				52		Equipamientos Varios	200.000	200.000	0	0,00	100,00	s/i	
						53 Mejoras Edilicias Referidas a Seguridad e Higiene y Riesgos	200.000	200.000	3.000	0,00	100,00	s/i	
		18				Política e Infraestructura Penitenciaria							
				10		Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	29.851.738	0	0,00	2,00	0,00	
						51 Construcción Complejo Federal de Condenados - Mercedes B.A.	38.375.000	29.851.738	0	0,00	2,00	0,00	
				11		Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	47.920.360	8.154.324	27,35	34,00	s/i	
						51 Construcción Centro Federal del Noroeste - Güemes - Salta	40.975.000	47.920.360	8.154.324	27,35	34,00	s/i	
				12		Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	10.006.600	0	0,00	3,00	0,00	
						51 Construcción Centro Federal del Litoral - Coronda - Santa Fé	10.000.000	10.006.600	0	0,00	3,00	0,00	
				15		Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	4.807.096	1.383.221	14,87	85,13	s/i	
						51 Ampliación Centro Federal de Detención Mujeres Unidad 31 - Ezeiza	4.680.000	4.807.096	1.383.221	14,87	85,13	s/i	
				16		Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	9.648.766	711.721	5,57	94,43	s/i	
						51 Ampliación Instituto Correccional de Mujeres Unidad 3 - Ezeiza	8.165.000	9.648.766	711.721	5,57	94,43	s/i	
				18		Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	3.500.000	0	0,00	25,00	0,00	
						51 Construcción Cárcel Federal de Jujuy - Unidad 8 - II Etapa	3.500.000	3.500.000	0	0,00	25,00	0,00	
				19		Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	
						51 Construcción Cárcel Federal Salta - Unidad 16 - II Etapa	10.000.000	10.000.000	0	0,00	10,00	0,00	
				23		Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	
						51 Construcción Salidas de Emergencia Complejo Penitenciario Federal de CABA	1.500.000	1.500.000	0	0,00	50,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
					29	Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad							
					1	Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní	580.000	580.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Prefectura y Vivienda de Servicios - Chana Miní	580.000	580.000	0	0,00	100,00	0,00	
					2	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	1.632.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Centro de Control de Tráfico de Buques - Rosario	1.632.000	1.632.000	0	0,00	100,00	0,00	
					3	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Centro de Control de Tráfico de Buques - Mar del Plata	800.000	800.000	0	0,00	100,00	0,00	
					4	Construcción Campus Universitario PNA	2.080.000	2.080.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Campus Universitario PNA	2.080.000	2.080.000	0	0,00	100,00	0,00	
					5	Construcción Alojamiento San Fernando	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Alojamiento San Fernando	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	
					8	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	
					51	Construcción Muelles Taller General Reparaciones Navales	1.000.000	1.000.000	0	0,00	50,00	0,00	
					12	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Prefectura Zona Norte Argentino	1.400.000	1.400.000	0	0,00	100,00	0,00	
					16	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón Nº 28	159.000	159.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en Las Leñas - Escuadrón Nº 28	159.000	159.000	0	0,00	100,00	0,00	
					17	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón Nº 34	194.000	194.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Bolsón - Escuadrón Nº 34	194.000	194.000	0	0,00	100,00	0,00	
					18	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	
					51	Construcción Edificio Jefatura - Escuadrón 54 - Pocitos	400.000	400.000	0	25,00	10,00	0,00	
					19	Mejoramiento de la Infraestructura de la Gendarmería Nacional - Etapa II	595.000	595.000	0	0,00	100,00	0,00	
					53	Construcción Grupo "Barra Bonita" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	
					54	Construcción Grupo "Alicia" - Escuadrón Nº 9 - Oberá	110.000	110.000	0	0,00	100,00	0,00	
					55	Ampliación Grupo "Federación" - Escuadrón Nº 4 - Concordia	375.000	375.000	0	0,00	100,00	0,00	
					27	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	430.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Sección Ceibas - Escuadrón Nº 56 - Gualeguaychú	430.000	430.000	0	0,00	100,00	0,00	
					28	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Barilloc	2.700.000	2.700.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Ampliación Centro Capacitación de Montaña Cerro Catedral - Escuadrón Nº 38 - Barilloc	2.700.000	2.700.000	0	0,00	100,00	0,00	
					29	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil	2.092.753	2.092.753	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Edificio Alojamiento Personal y Sección Motorizada - Destacamento Móvil	2.092.753	2.092.753	0	0,00	100,00	0,00	
					30	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Escuadrón Seguridad Vial Corrientes	200.000	200.000	0	0,00	100,00	0,00	
					31	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Gimnasio Cubierto Destacamento Móvil - Campo de Mayo	1.800.000	1.800.000	0	0,00	100,00	0,00	
					32	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	1.932.177	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción Edificio de Alojamiento Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Cuello	1.932.177	1.932.177	0	0,00	100,00	0,00	
					33	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	136.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Vivienda de Huésped en El Calafate - Escuadrón Nº 42	136.000	136.000	0	0,00	100,00	0,00	
					34	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	216.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Vivienda de Huesped en Cerro Catedral - Escuadrón Nº 34	216.000	216.000	0	0,00	100,00	0,00	
					35	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	264.000	0	0,00	100,00	0,00	
					51	Construcción de Vivienda de Huésped Salta - Agrupación VII	264.000	264.000	0	0,00	100,00	0,00	

Ministerio de Defensa

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
370		18				MINISTERIO DE DEFENSA							
					1	Gestión Logística Integrada							
					51	Fabricación e Instalación de Radares Monopulso (RSMA)	6.800.000	6.800.000	2.090.419	28,00	s/i	s/i	
371		20				RSMA - Fabricación e Instalación de Radares	6.800.000	6.800.000	2.090.419	28,00	s/i	s/i	
						ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A.							
						Sosten Logistico Antártico							
					2	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	572.550	90.620	93,00	7,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización Helicópteros Augusta Sea King	572.550	572.550	90.620	93,00	7,00	0,00	0,00
					3	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	11.870.000	0	30,00	30,00	0,00	0,00
					51	Mantenimiento y Modernización de Helicópteros Super Puma AS	11.870.000	11.870.000	0	30,00	30,00	0,00	0,00
372		17				INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A							
						Desarrollo Tecnológico para la Defensa							
					2	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	0	47,00	53,00	0,00	0,00
					51	Modernización de Instalaciones del Instituto de Investigación	322.771	553.561	0	47,00	53,00	0,00	0,00
					4	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	20.224	19,00	30,00	0,00	0,00
					51	Desarrollo de un Sistema Estabilizado Visión Todo Tiempo	1.262.500	1.455.078	20.224	19,00	30,00	0,00	0,00
					5	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	660.000	660.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Laboratorio para Ensayos de Vibraciones	660.000	660.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					6	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga	1.121.600	1.121.600	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					51	Construcción de un Vector Prototipo para Transporte de Carga	1.121.600	1.121.600	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					7	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones	1.693.317	1.693.317	0	0,00	25,00	0,00	0,00
					51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones	1.693.317	1.693.317	0	0,00	25,00	0,00	0,00
374		16				ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO							
						Capacidad Operacional y Apoyo							
					58	Reemplazo y Provisión de Caldera	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Reemplazo y Provisión de Caldera 2º Etapa	2.600.000	2.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					76	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Parque Automotor Resistencia Chaco	1.100.000	1.100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					77	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes	1.600.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Hangar Curuzú Cuatiá, Corrientes	1.600.000	1.600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					78	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción Polvorín Tipo M-8, Pigüé, Provincia Buenos Aires	1.875.800	1.875.800	0	0,00	100,00	0,00	0,00
379		16				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA							
						Capacidad Operacional de la Armada							
					6	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval-Etapa II	1.800.000	1.800.000	0	33,00	67,00	0,00	0,00
					51	Construcción Compuerta Corrediza Dique Carena 2 - Arsenal Naval	1.800.000	1.800.000	0	33,00	67,00	0,00	0,00
					7	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.119.946	82.119.946	0	0,00	0,00	0,00	
					51	Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar	82.119.946	82.119.946	0	0,00	0,00	0,00	
					8	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	7.500.000	7.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Seco	7.500.000	7.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
		18				Formación y Capacitación							
					1	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	9.000.001	504.417	96,00	4,00	0,40	10,00
					51	Construcción Escuela de Suboficiales de la Armada	9.000.001	9.000.001	504.417	96,00	4,00	0,40	10,00
					3	Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	2.633.698	2.198.032	52,25	5,00	5,00	100,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
50	381	16			4	51 Construcción de Alojamiento para Personal Militar	2.633.698	2.633.698	2.198.032	52,25	5,00	5,00	100,00
						Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	9.000.001	3.572.416	58,00	42,00	12,00	28,57
						51 Construcción del Centro de Investigación Educación Naval	9.000.001	9.000.001	3.572.416	58,00	42,00	12,00	28,57
						7 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Liceo Naval	12.000.000	12.000.000	0	5,00	50,00	0,00	0,00
						ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA							
						Capacidad Operacional de la Fuerza Aérea							
						3 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	0	71,64	28,36	0,00	0,00
						51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Resistencia	2.890.000	2.890.000	0	71,64	28,36	0,00	0,00
						9 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	11.700.000	11.700.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						51 Estructura de Apoyo Base Aérea Militar Posadas	11.700.000	11.700.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea							
						2 Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	0	49,65	50,35	0,00	0,00
						51 Mejoramiento Infraestructura Liceo Aeronáutico Militar	40.000	40.000	0	49,65	50,35	0,00	0,00
						INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR							
						Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional							
						3 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	181.000	89,16	10,84	3,90	35,98
						51 Datos Espaciales de la República Argentina IDERA Etapa I	920.000	620.000	181.000	89,16	10,84	3,90	35,98
						4 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	940.000	0	35,90	17,00	0,00	0,00
						51 Elaboración de Sistema de Información Geográfica de la República Argentina	1.240.000	940.000	0	35,90	17,00	0,00	0,00
						7 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	490.000	390.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Validación de los Nombres Geográficos de la República Argentina	490.000	390.000	0	0,00	46,00	0,00	0,00
						8 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.903.000	1.580.000	0	0,00	36,20	0,00	0,00
						51 Desarrollo Base Cartográfica Oficial	1.903.000	1.580.000	0	0,00	36,20	0,00	0,00
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
						Ministerio de Economía y Finanzas Públicas							
						Actividades Centrales							
50	357	1			6	Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentina	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Reciclaje Edificio Ex Aerolíneas Argentinas	127.210	127.210	0	100,00	0,00	0,00	
						13 Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Núcleos Sanitarios Sede M.E.C.y P.	97.724	97.724	0	100,00	0,00	0,00	
						14 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Terminación Piso 3 y Sala de Servidores - Julio Argentino Roca	4.109.940	4.109.940	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						15 Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Restauración Integral del Patio Principal 1piso - P.A.H.A.C.	28.814	28.814	0	100,00	0,00	0,00	
						17 Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Sala Servidores Centro de Cómputos Balcarce 186 7P	1.358.737	1.358.737	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						18 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Recuperación Fachadas Edificios Paseo Colón 922/982	2.594.303	2.594.303	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						19 Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Refacción Centro Cómputos de Respaldo de U. Informática Sec. Hac.	3.599.000	3.599.000	0	0,00	0,00	0,00	
						20 Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 651	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Recuperación y Fijación Revestimiento Granítico en Fachada Ed.J.A..Roca 652	212.400	212.400	0	0,00	0,00	0,00	
						21 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Desarrollo e Implementación Nueva Red Privada Telecomunicaciones	324.760	324.760	0	0,00	0,00	0,00	
				22		Refacción Edificio Alsina 470 - Capital Federal Etapa I	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Refacción Núcleos Sanitarios 2° SS al 6° Piso Inclusive	1.191.805	1.191.805	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				23		Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Pesca-Etapa I	175.348	175.348	0	0,00	0,00	0,00	
				24		Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación S.A.G.P.y A. - Anexo Ex-Lavandería-Etapa I	163.312	163.312	0	0,00	0,00	0,00	
				25		Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Instalación Termomecánica Integral - Edificio J.A. Roca 651 -	359.299	359.299	0	0,00	0,00	0,00	
				26		Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación Edificio J.A. Roca 651 - 1º piso -Obra Civil-Electricidad	1.385.320	1.385.320	0	0,00	0,00	0,00	
				27		Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación S.A.G.P.y A. - Paseo Colón 922 - 1º piso - Obra Civil	722.160	722.160	0	0,00	0,00	0,00	
				28		Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Renovación Integral Sanitarios y Office-Cocina Edificio J.A. Roca	2.832.000	2.832.000	0	0,00	0,00	0,00	
				30		Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Data Center (Sala de Servidores)	1.180.000	1.180.000	0	0,00	0,00	0,00	
				31		Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Restauración de Fachadas del Edificio del Archivo de la Contaduría	1.298.000	1.298.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				32		Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría	507.400	507.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reparación y Modernización Integral Edificio Archivo de la Contaduría	507.400	507.400	0	0,00	100,00	0,00	0,00
			26			Administración Financiera							
				2		Constucción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hac	17.092.000	17.092.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Constucción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hac	17.092.000	17.092.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
51						Ministerio de Producción							
	107					ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES							
				17		Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas							
					4	Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa	0	820.850	199.241	54,00	46,00	11,00	23,91
					51 Mejoras e Infraestructura Varias en Parques - 2da Etapa		0	820.850	199.241	54,00	46,00	11,00	23,91
					5	Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques	4.000.000	2.566.380	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructuras Varias en Parques		4.000.000	2.566.380	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				20		Áreas Protegidas y Conservacion de Corredores-BIRF 7520/AR							
					1	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua	2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Calilegua		2.000.000	2.000.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya	1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Talampaya		1.000.000	1.000.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					4	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas	750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Sierras las Quijadas		750.000	750.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					5	Refacción Edificio APN Sede Ancón	120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51 Refacción Edificio APN Sede Ancón		120.000	120.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					6	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego	500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Tierra del Fuego		500.000	500.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					7	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces	500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51 Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campo de los Alerces		500.000	500.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
					8	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Río Pilcomayo	240.000	240.000	0	0,00	16,00	0,00	0,00
					9	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Campos del Tuyú	223.000	223.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					10	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Cardones	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
				22		Mejora de la Competitividad del Sector Turismo BID 1648 /OC-							
					1	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	4.880.342	586.814	59,00	20,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lanín (BID 1648/OC)	4.880.342	4.880.342	586.814	59,00	20,00	0,00	0,00
					2	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.631.400	408.040	50,00	10,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 1648/OC)	6.084.400	5.631.400	408.040	50,00	10,00	0,00	0,00
					3	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	589.342	175.851	74,00	10,00	12,00	120,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Los Alerces (BID 1648/OC)	136.342	589.342	175.851	74,00	10,00	12,00	120,00
					4	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	934.986	291.512	14,00	50,00	39,00	78,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Lago Puelo (BID 1648/OC)	934.986	934.986	291.512	14,00	50,00	39,00	78,00
					5	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)	2.053.930	2.053.930	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Iguazú (BID 1648/OC)	2.053.930	2.053.930	0	0,00	100,00	0,00	0,00
606						INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA							
				1		Actividades Centrales							
					2	Construcción Edificio Central en la Ciudad de Buenos Aires	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Central	2.800.000	2.800.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					3	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria E	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Depósito, Vivienda y Taller en la Estación Experimental Agropecuaria E	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					4	Construcción Edificio Auditorio en el C.I.C.V.y A. - BID-ARL Nº 10	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Auditorio en el Centro de Investigación	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					5	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Sala de Conferencias en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					6	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Sala de Exposiciones en el Centro de Investigación	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					7	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					51	Construcción Box de Bioseguridad NBS3A en el Centro de Investigación	500.000	500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					8	Ampliación y Construcción Edificio C.R.N. y C.I.C.V.y A.	1.300.000	1.300.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Jardín Botánico	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Construcción S.U.M.(Salón de Usos Múltiples)	246.000	246.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Ampliación Banco de Germoplasma	170.000	170.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Ampliación Oficinas y Biblioteca	560.000	560.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					55	Construcción Edificio Biotecnología Molecular	224.000	224.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					9	Construcción y Ampliación en los Centro Regionales	2.843.200	2.843.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Edificio Central de la Estación Experimental Agropecuaria	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					52	Construcción Planta de Tratamiento Termot. Caña de Azúcar	150.000	150.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					53	Ampliación y Remodelación Laboratorios Lácteos en EEA Leales	110.000	110.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					54	Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Leales	310.000	310.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					55	Construcción Laboratorio Fitopatología de la Estación Experimental Salta	235.200	235.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
					57	Ampliación Laboratorio Central de Agroalimentos en la Estación Experimental salta	300.000	300.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						58 Construcción Laboratorio de Suelo y Agua y Red de Gas en EEA SALta	350.000	350.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						59 Construcción Invernáculo de 180 m2 en la Estación Experimental Salta	240.000	240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						60 Construcción Sistemática y Armado Estructura Campo EEA Salta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						61 Construcción Biblioteca y Salón de Usos Múltiples en la EEA Yuto	154.000	154.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						62 Construcción Residencia de Pasantes en la Estación Experimental Yuto	322.000	322.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				10		Construcción y Ampliación en la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca-Chaco	2.121.320	2.121.320	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Estación Experimental Catamarca	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Construcción Depósito de Agroquímicos en la Estación Experimental Catamarca	98.000	98.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculos en la Estación Experimental Agropecuaria catamarca	65.000	65.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Edificio Producción Vegetal en la Estación Experimental Saenz Peña	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Saenz Peña	112.000	112.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						57 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas	314.720	314.720	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						58 Construcción de Laboratorio en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benitez	162.400	162.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						59 Construcción Edificio de Nutrición en la Estación Experimental Colonia Benitez	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						60 Construcción Comedor-Cocina en la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benit	81.200	81.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						61 Construcción y Remodelación Tinglado en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						62 Construcción de Red de Agua Potable en la Estación Experimental El Colorado	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				11		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Misiones-Corrientes-Mendoza-Sa	1.132.480	1.132.480	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sala de Necropsia en la Estación Experimental Cerro Azul	184.800	184.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Laboratorio de Patología Animal y Vegetal en EEA Cerro Azul	5.000	5.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Suelo y Agua en la Estación Experimental Corrientes	200.680	200.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Depósitos en la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes	106.400	106.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Construcción Comedor en la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista	127.680	127.680	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción Obras de Infraestructura Eléctrica en la Estación Experimental Bella Vista	267.120	267.120	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						57 Ampliación Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta	240.800	240.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				12		Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Agronomía Area Administración y Aulas en la EEA San Juan	350.000	350.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				13		Construcciones en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	497.000	497.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Laboratorio y Oficinas en la Estación Experimental	336.000	336.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						52 Construcción de Invernadero en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela	161.000	161.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
				14		Construcción y Ampliación en las Estaciones Experimentales Agropecuarias Oliveros y I	1.470.498	1.470.498	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Ampliación de Laboratorio de Entomología en la Estación Experimental Oliveros	392.000	392.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Ampliación del Centro de Capacitación - Etapa II en la Estación Experimental Oliveros	308.000	308.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción de Laboratorio de Semillas en la Estación Experimental	313.600	313.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Construcción de Laboratorio de Investigación y Producción Ganadera en la EEA Recon	126.784	126.784	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Galpón de Producción Agrícola y Cámara de Secado en la EEA Reconquis	77.650	77.650	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción de Depósito para Agroquímicos en la Estación Experimental Reconquista	129.864	129.864	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						57 Construcción Comedor, Sanitarios y Oficinas en la Estación Experimental Reconquista	117.600	117.600	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						58 Construcción Salón Auditorio para 250 personas en la Estación Experimental Reconquis	5.000	5.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				15		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Córdoba-Entre Ríos--Bs.As.Norte	1.913.532	1.913.532	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Construcción Galpón Secadero en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juare	196.000	196.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Construcción Edificio Central Sótano en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná	488.982	488.982	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción Galpón Exposición Avicultura en la Estación Experimental C.del Uruguay	82.230	82.230	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria C.del Uruguay	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						55 Ampliación Oficinas y Laboratorio - Etapa II y Conexiones Agua en la EEA Concordia	420.000	420.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción Invernadero a Prueba Insectos en la Estación Experimental Concordia	50.400	50.400	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						57 Construcción Depósito Plaguicidas en la Estación Experimental Concordia	93.520	93.520	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						58 Construcción Invernáculos Climatizados Crecimiento Cultivos en la EEA Pergamino	128.800	128.800	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						59 Construcción Planta de Molienda en la Estación Experimental General Villegas	67.200	67.200	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						60 Construcción Tablestacado Costero en la Estación Experimental Delta	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				16		Construcción y Ampliación en el Centro Regional Buenos Aires Sur	3.030.970	3.030.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Ampliación Galpón de Metabolismo en la Estación Experimental Balcarce	160.970	160.970	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						52 Construcción Red Externa de Gas Natural en la Estación Experimental Balcarce	2.240.000	2.240.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo para Fitopatología en la Estación Experimental Bordenave	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Construcción Invernáculo para Protección Aromática en la Estación Experimental Borde	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Laboratorio Común a todos los Sectores	280.000	280.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Construcción Depósito en Entrepiso Edificio Central de la Estación Experimental Bordenave	40.000	40.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				17		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales La Pampa-San Luis- y Patagonia	807.000	807.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sanitarios y Red Cloacal en la Estación Experimental G.Covas	5.000	5.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
						52 Construcción Cámara de Enfriamiento y Congelado de Carnes en EEA G.Covas	62.000	62.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						53 Construcción Invernáculo en la Estación Experimental Agropecuaria Bariloche	100.000	100.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						54 Ampliación Oficinas y Laboratorio en la Estación Experimental Bariloche	336.000	336.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						55 Ampliación Oficinas en la Estación Experimental Agropecuaria	210.000	210.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						56 Ampliación Biblioteca y Auditorio en la Estación Experimental Alto Valle	94.000	94.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
				18		Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agrop	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Remodelación Edificio Histórico "Leloir" en el Centro Nacional de Investigaciones Agrop	224.000	224.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
16						Investigación Fundamental e Innovac.Tecnológicas I.F.I.T.							
				3		Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	
						0 Parques de Innovación Tecnológicos PITS	359.998	359.998	0	62,81	0,00	0,00	
				19		Construcción en el Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronomicas	1.200.000	350.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio para Becarios y Pasantes en el Instituto	500.000	100.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						52 Construcción Invernadero de Policarbonato de 387 m ²	150.000	150.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						53 Construcción Edificio Animalario en el CICVyA	550.000	100.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
17						Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías AITT							
				23		Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	860.000	180.000	100,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Laboratorios y Oficinas Estación Agropecuaria Manfredi	500.000	860.000	180.000	100,00	0,00	0,00	
				27		Construcciones y Ampliaciones de Edificios para Agencias de Extensión Rural	2.131.000	1.186.000	0	55,00	45,00	3,00	6,67
						51 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Perico	415.000	470.000	0	8,00	92,00	0,00	0,00
						55 Construcción Edificio Agencia de Extensión Rural General Pinedo	0	0	0	80,00	20,00	10,00	50,00
						62 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Galván	720.000	220.000	0	0,00	100,00	s/i	
						63 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Ceres	10.500	10.500	0	100,00	0,00	0,00	
						64 Ampliación Edificio de la Agencia de Extensión Rural Carlos	175.000	175.000	0	0,00	100,00	s/i	
						72 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural San Luis	245.000	245.000	0	100,00	0,00	0,00	
						75 Construcción Edificio para la Agencia de Extensión Rural Guatraché	565.500	65.500	0	25,00	75,00		0,00
				28		Construcción Ampliación Centros Regionales Tuc-Sant., Chaco-Form.y Salta-Jujuy	956.000	256.000	0	20,00	15,00	0,00	0,00
						53 Edificio Central Campo de Experimentación Adaptativa Abra Pampa	956.000	256.000	0	100,00	0,00	0,00	
				29		Construcción y Ampliación en los Centros Regionales TucumánSgo.del Estero-Corriente	4.296.000	3.754.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio para la Unidad de Extensión y Experimentación	320.000	120.000	0	0,00	100,00	s/i	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						52 Ampliación Edificio Estación Experimental Agropecuaria Famai	400.000	200.000	0	0,00	100,00	s/i	
						53 Construcción Centro de Capacitación Integral en la Estación EA Faimailla	460.000	460.000	0	0,00	100,00	s/i	
						54 Construcción Laboratorio de Forrajes y Suelos en la Estación EA Sgo.del Estero	600.000	100.000	0	0,00	60,00	s/i	
						55 Construcción Centro Capacitación Integral en la E.E.A. Bella Vista	370.000	70.000	0	0,00	100,00	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Fitopatología, Hort. y Biotecnología en la EEA Bella Vista	700.000	1.300.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						57 Construcción Laboratorio de Biotecnología Reproductiva en la EEA Mercedes	262.000	262.000	0	0,00	100,00	s/i	
						58 Construcción Centro de Capacitación Integral en la E.E.A. Mercedes	5.000	5.000	0	0,00	1,00	s/i	
						59 Construcción Laboratorio Biotecnología Mendoza	600.000	600.000	0	0,00	75,00	s/i	
						61 Construcción Pabellones de Sanitarios en la E.E.A. Oliveros	22.000	80.000	0	0,00	100,00	s/i	
						62 Construcción Galpón Almacén y Proc. Muestras en la E.E.A. Manfredi	80.000	80.000	0	0,00	100,00	s/i	
						63 Construcción Invernáculo de Bioseguridad en la E.E.A. Manfredi	300.000	300.000	0	0,00	100,00	s/i	
						64 Construcción Galpón para Insumos Forestales en la E.E.A. Concordia	177.000	177.000	0	0,00	100,00	s/i	
					30	Construcción y Ampliación en los Centros Regionales Buenos Aires-La Pampa-San Luis	3.926.603	2.926.603	842.428	0,00	0,00	0,00	
						51 Ampliación Laboratorios y Oficinas en el Centro Regional Buenos Aires	2.360.000	1.360.000	842.428	0,00	50,00	s/i	
						52 Construcción Invernáculo Climatizado en la E.E.A. Balcarce	200.000	200.000	0	0,00	100,00	s/i	
						53 Construcción Laboratorio Biotecnología en la E.E.A. Bordenave	110.000	110.000	0	0,00	100,00	s/i	
						54 Construcción Laboratorio Horticultura en la E.E.A. Ascasubi	126.603	126.603	0	0,00	100,00	s/i	
						55 Construcción Laboratorio de Producción Vegetal - Oficinas en EEA G.Covas	350.000	350.000	0	0,00	100,00	s/i	
						56 Construcción Laboratorio de Producción Animal Oficinas en EEA G.Covas	400.000	400.000	0	0,00	100,00	s/i	
						57 Ampliación Laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria San Luis	100.000	100.000	0	0,00	100,00	s/i	
						58 Construcción Salón de Usos Múltiples y Dependencias en la E.E.A.Santa Cruz	280.000	280.000	0	0,00	35,00	s/i	
609						INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA							
			16			Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola							
				1		Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	0	52,34	16,60	0,00	0,00
						52 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Laboratorio Central	404.561	404.561	0	64,65	32,50	0,00	0,00
				2		Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	64.100	38,42	54,62	5,98	10,95
						51 Reparación y Mejoras de Sede Central	585.929	585.929	64.100	38,42	54,62	5,98	10,95
				3		Equipamiento Analítico	614.731	614.731	202.524	64,64	15,87	5,23	32,96
						51 Equipamiento Analítico para Laboratorios	614.731	614.731	202.524	64,64	15,87	5,23	32,96
				4		Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	500.000	35.074	67,27	16,42	1,15	7,00
						51 Modernización de la Tecnología de la Información	500.000	500.000	35.074	67,27	16,42	1,15	7,00
622						INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI)							
			18			Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial							
				1		Refacción Integral Edificio Sede INPI	836.000	836.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						51 Refacción Integral Edificio Sede INPI	836.000	836.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
623						SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA							
			17			Servicios de Laboratorios							
				14		Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	915.688	28,00	72,00	20,00	27,78
						51 Reubicación de los Laboratorios del SENASA	10.000.000	18.586.206	915.688	28,00	72,00	20,00	27,78
				16		Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	37.160.000	37.160.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorio Diagnóstico Enfermedades Animales	37.160.000	37.160.000	0	0,00	80,00	0,00	0,00
			20			Sanidad Animal							
				15		Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	3.200.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00
						51 Construcción Redes de Infraestructura Lazareto Capital	3.200.000	3.200.000	0	0,00	70,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
56						Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios							
	105					COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA							
		1				Actividades Centrales							
				1		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.200.000	235.009	2,03	15,00	2,35	15,67
				51		Reacondicionamiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central	1.200.000	1.200.000	235.009	2,03	15,00	2,35	15,67
				2		Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.110.000	122.781	1,77	30,00	1,20	4,00
				51		Modernización Red de Datos C.N.E.A.	3.200.000	3.110.000	122.781	1,77	30,00	1,20	4,00
				4		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	1.800.000	1.800.000	220.000	92,66	5,03	0,60	11,93
				51		Construcción de Reactores de Baja Potencia CAREM Fase 1	1.800.000	1.800.000	220.000	92,66	5,03	0,60	11,93
				5		Construcción de Reactor de Baja Potencia	57.450.000	57.450.000	1.006.864	1,72	15,00	0,26	1,73
				51		Construcción de Reactor de Baja Potencia	57.450.000	57.450.000	1.006.864	1,72	15,00	0,26	1,73
				6		Planta Marcha y Optimización Módulos	13.950.000	13.950.000	1.959.480	12,70	24,00	3,35	13,96
				51		Planta Marcha y Optimización Módulos	13.950.000	13.950.000	1.959.480	12,70	24,00	3,35	13,96
		20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear							
				2		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	330.775	31.828	99,20	0,80	0,05	6,25
				51		Ampliación Capacidad Académica del Reactor RA-6	400.000	330.775	31.828	99,20	0,80	0,05	6,25
				4		Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	900.000	113.923	36,87	10,00	1,25	12,50
				51		Ampliación Laboratorio de Caracterización de Materiales	900.000	900.000	113.923	36,87	10,00	1,25	12,50
				5		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.097.889	48.537	19,69	17,00	0,70	4,12
				51		Adecuación Reactores para Investigación RA-0, RA-1 y RA-4	893.000	1.097.889	48.537	19,69	17,00	0,70	4,12
				6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	600.000	0	58,70	14,00	0,00	0,00
				51		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	600.000	600.000	0	58,70	14,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	31.993	24,22	20,00	1,40	7,00
				51		Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles	450.000	450.000	31.993	24,22	20,00	1,40	7,00
				10		Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	4.350.000	951.805	82,66	13,74	2,80	20,38
				51		Ampliación Laboratorios CAB	4.480.000	4.350.000	951.805	82,66	13,74	2,80	20,38
				11		Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	860.000	0	62,63	20,00	0,00	0,00
				51		Ampliación Capacidad Experimental CAB	860.000	860.000	0	62,63	20,00	0,00	0,00
				13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	720.000	77.353	13,00	28,00	1,90	6,79
				51		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base	1.000.000	720.000	77.353	13,00	28,00	1,90	6,79
				15		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	720.000	0	25,00	45,00	0,00	0,00
				51		Ampliación del Edificio de la Biblioteca del Centro Atómico	720.000	720.000	0	25,00	45,00	0,00	0,00
		21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear							
				3		Saneamiento del CAE	550.000	530.000	45.472	98,30	0,47	0,14	29,79
				51		Saneamiento del CAE	550.000	530.000	45.472	98,30	0,47	0,14	29,79
				4		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	540.000	0	33,10	46,65	0,00	0,00
				51		Ampliación de la Red de Gas CAE	100.000	540.000	0	33,10	46,65	0,00	0,00
				5		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.900.000	0	12,70	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción del Laboratorio de Metrología de Radioisótopos	1.200.000	1.900.000	0	12,70	30,00	0,00	0,00
				6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	105.000	0	12,96	20,00	0,00	0,00
				51		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	1.100.000	105.000	0	12,96	20,00	0,00	0,00
				7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	2.848	9,65	27,00	0,05	0,19
				51		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	360.000	350.000	2.848	9,65	27,00	0,05	0,19
				8		Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	1.400.000	69.157	5,00	90,00	4,50	5,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Ampliación Ciclotrón de Producción	1.400.000	1.400.000	69.157	5,00	90,00	4,50	5,00
					9	Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	400.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
						51 Desarrollo de Fuentes de Cesio 137	400.000	400.000	0	0,00	30,00	0,00	0,00
					10	Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	765.000	236.420	12,19	35,00	10,80	30,86
						51 Desarrollo de Tomógrafo por Emisión de Positrones (PET)	780.000	765.000	236.420	12,19	35,00	10,80	30,86
					13	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	117.942	72.100	3,00	15,00	3,60	24,00
						51 Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza Fase 1	310.000	117.942	72.100	3,00	15,00	3,60	24,00
					16	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos	1.100.000	1.100.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
						51 Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos	1.100.000	1.100.000	0	0,00	35,00	0,00	0,00
					17	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	500.000	480.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Empresas	500.000	480.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
22						Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental							
					1	Residuos Radiactivos de Baja Actividad	3.365.000	5.209.952	1.012.604	78,89	5,00	1,35	27,00
						51 Área Gestión Ezeiza	3.365.000	5.209.952	1.012.604	78,89	5,00	1,35	27,00
					2	Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	7.066.800	3.163.848	7.848	26,42	12,41	0,01	0,08
						51 Facilidad de Tratamiento y Acondicionamiento	6.269.800	2.373.848	1.747	23,13	20,00	0,01	0,05
						52 Repositorio Fase 1	797.000	790.000	6.101	30,50	3,00	0,02	0,67
					3	Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.191.000	907	92,06	7,94	0,00	0,00
						51 Almacenamiento Elementos Combustibles MTR	140.000	1.191.000	907	92,06	7,94	0,00	0,00
					4	Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)	15.739.300	16.739.300	1.161.979	31,18	7,46	0,78	10,46
						51 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	15.429.100	15.593.600	1.061.952	36,78	10,00	0,95	9,50
						52 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	196.500	958.000	99.369	22,08	2,00	0,70	35,00
						53 Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	93.700	155.700	658	9,85	1,00	0,00	0,00
						54 Remodelación Casa Guayra	20.000	32.000	0	82,43	1,50	0,00	0,00
					5	Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	1.000.000	11.022	71,93	9,00	0,10	1,11
						51 Laboratorio de Química Analítica	1.000.000	1.000.000	11.022	71,93	9,00	0,10	1,11
					7	Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.226.026	204.028	29,35	20,00	3,45	17,25
						51 Infraestructura Centro Atómico Constituyentes Fase 3	1.200.000	1.226.026	204.028	29,35	20,00	3,45	17,25
					8	Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Mejoras Edificio Hemeroteca del Cento Atómico Constituyentes	700.000	691.674	0	0,00	50,00	0,00	0,00
23						Investigación y Aplicaciones no Nucleares							
					1	Centro Aceleración de Iones	520.000	500.000	999	47,50	3,00	0,00	0,00
						51 Centro Aceleración de Iones	520.000	500.000	999	47,50	3,00	0,00	0,00
					3	Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.220.000	2.288	30,84	25,00	0,03	0,12
						51 Desarrollo en Nanociencia y Nanotecnología	2.200.000	2.220.000	2.288	30,84	25,00	0,03	0,12
					4	Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.184.000	154.097	4,90	18,00	2,60	14,44
						51 Modernización de las Plantas de Producción Criogénica	950.000	1.184.000	154.097	4,90	18,00	2,60	14,44
					5	Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	310.000	0	2,98	3,00	0,00	0,00
						51 Modernización de los Laboratorios de Microscopía Electrónica	327.000	310.000	0	2,98	3,00	0,00	0,00
					6	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.360.000	6.950	9,38	30,00	0,15	0,50
						51 Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica	1.400.000	1.360.000	6.950	9,38	30,00	0,15	0,50
					7	Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	1.701.000	5.351	8,13	21,00	0,05	0,24
						51 Construcción de Laboratorio Integrado para el Diseño y Fabricación	1.400.000	1.701.000	5.351	8,13	21,00	0,05	0,24
					8	Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	0	2,85	6,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Modernización de Laboratorios del Centro Atómico Constituyentes	403.000	400.000	0	2,85	6,00	0,00	0,00
					9	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	2.000.000	1.357.300	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						51 Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	2.000.000	1.357.300	0	0,00	18,00	0,00	0,00
						Suminitros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear							
					1	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	28.844.000	28.842.456	642.754	55,28	18,00	0,45	2,50
						51 Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	28.844.000	28.842.456	642.754	55,28	18,00	0,45	2,50
					2	Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	800.000	760.000	115.038	1,70	10,00	1,30	13,00
						51 Perforación Yacimiento de Uranio - Las Termas	800.000	760.000	115.038	1,70	10,00	1,30	13,00
					3	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	2.000.000	2.000.000	77.885	0,65	18,00	0,60	3,33
						51 Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio	2.000.000	2.000.000	77.885	0,65	18,00	0,60	3,33
					4	Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio	1.554.000	1.554.000	351.584	2,65	12,00	2,85	23,75
						51 Exploración y Explotación de los Yacimientos de Uranio	1.554.000	1.554.000	351.584	2,65	12,00	2,85	23,75
					5	Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro	400.000	400.000	0	1,90	30,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obras de Infraestructura en la Regional Centro	400.000	400.000	0	1,90	30,00	0,00	0,00
					6	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael	9.790.000	9.790.000	0	35,50	64,50	0,00	0,00
						51 Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael	9.790.000	9.790.000	0	35,50	64,50	0,00	0,00
					7	Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	252.000	252.000	0	98,83	0,40	0,00	0,00
						51 Laboratorio de Ensayos Post Irradiación (LAPEP)	252.000	252.000	0	98,83	0,40	0,00	0,00
					8	Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales	565.500	565.500	0	6,59	12,00	0,00	0,00
						51 Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales	565.500	565.500	0	6,59	12,00	0,00	0,00
					9	Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad	1.548.000	1.500.000	2.482	8,53	35,00	0,05	0,14
						51 Construcción Planta Combustibles de muy Alta Densidad	1.548.000	1.500.000	2.482	8,53	35,00	0,05	0,14
					10	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo	2.334.500	2.334.500	2.995	0,00	40,00	0,05	0,13
						51 Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo	2.334.500	2.334.500	2.995	0,00	40,00	0,05	0,13
						INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA							
						Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua							
					2	Mejoramiento Edificio Nave para Grandes Modelos	663.000	663.000	0	13,00	20,00	0,00	0,00
						52 Infraestructura para Ensayos Marítimos - Etapa 1	170.000	170.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						53 Mejoramiento Edificio Nave 6	493.000	493.000	0	3,00	20,00	0,00	0,00
						MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS							
						Recursos Hídricos							
					2	Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal	5.850.000	5.850.000	0	100,00	0,00	0,00	
						56 Aliviador Cildañez - Etapa II	50.000	50.000	0	100,00	0,00	0,00	
						57 Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa II	5.800.000	5.800.000	0	100,00	0,00	0,00	
					9	Canal Cintura Sur Taí	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Canal Cintura Sur Taí	266.997	266.997	0	100,00	0,00	0,00	
					17	Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	340.000	105.291	69,64	30,36	20,00	65,88
						51 Reconstrucción de la Biblioteca de los Recursos Hídricos	340.000	340.000	105.291	69,64	30,36	20,00	65,88
					18	Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	100.000	0	s/i	s/i	s/i	
						51 Construcción del Canal de Desagües Pluviales en Metán	100.000	100.000	0	s/i	s/i	s/i	
					19	Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00
						51 Aprovechamiento Múltiple "Los Monos" (Santa Cruz - Chubut)	1.100.000	1.100.000	0	0,00	99,00	0,00	0,00
					44	Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	21.189.338	1.883.116	7,11	11,73	1,50	12,79
						51 Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional	22.310.870	21.189.338	1.883.116	7,11	11,73	1,50	12,79

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
		25				Ejecución de Obras de Arquitectura							
				1		Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	11.500.000	102.599	46,87	8,50	0,52	6,12
				51		Restauración de Monumentos Históricos	12.000.000	11.500.000	102.599	46,87	8,50	0,52	6,12
				2		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.413.023	10.913.023	2.192.518	69,54	13,48	4,35	32,27
				51		Edificios Fiscales	11.413.023	10.913.023	2.192.518	69,54	13,48	4,35	32,27
				7		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	3.201.900	1.366.185	71,64	14,00	10,12	72,29
				51		CERIDE - Obras Complementarias Etapa II	3.201.900	3.201.900	1.366.185	71,64	14,00	10,12	72,29
				13		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Refacción Institutos Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				20		Hospital Interzonal el Cruce, Florencio Varela	0	950.000	57.959	100,00	0,00	0,00	
				51		Hospital Interzonal El Cruce, Florencio Varela	0	950.000	57.959	100,00	0,00	0,00	
				21		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	1.349.064	786.303	80,69	19,31	8,76	45,37
				51		Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján	1.349.064	1.349.064	786.303	80,69	19,31	8,76	45,37
				23		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	25.423.000	25.423.000	567.486	14,68	6,21	1,31	21,10
				0		Refacciones Varias en Corredores Turísticos BID 1648/OC - AR	1.927.500	1.927.500	22.321				
				51		Refacciones Varias en Corredor Lagos y Misiones	23.495.500	23.495.500	545.165	14,68	6,21	1,31	21,10
				24		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	76.006	44,15	55,85	0,47	0,84
				51		Refacción Edificio Auditoría General de la Nación - Etapa II	11.668.908	11.668.908	76.006	44,15	55,85	0,47	0,84
				25		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				51		Hospitales Cabeceras - Provincia Jujuy	100.000	100.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				30		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				51		Refuncionalización Hospital Dr. Alejandro Posadas	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				31		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Refacción y Refuncionalización del Edificio de la Estación Once	100.000	100.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				33		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	15.467.005	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				51		Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores Basílica de Luján	14.317.005	15.467.005	0	0,00	27,00	0,00	0,00
				34		Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales	11.392.000	11.392.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				51		Edificios Fiscales "Etapa II" - Ciudad de Buenos Aires	11.392.000	11.392.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
				35		Restauración de Fachadas Ex Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				51		Fachadas Ex Edificio del Ministerio de Obras Públicas	4.000.000	4.000.000	0	0,00	19,00	0,00	0,00
				36		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	19.000.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
				51		Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina	19.000.000	19.000.000	0	0,00	87,00	0,00	0,00
				37		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	114.211.004	112.836.510	1.149.253	0,00	11,34	0,00	0,00
				0		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	9.211.004	7.836.510	1.149.253				
				51		Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio	105.000.000	105.000.000	0	0,00	11,34	0,00	0,00
				38		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				51		Obra Terminal de Omnibus - La Quiaca - Provincia de Jujuy	100.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				39		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	50.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				51		Obra Pasarela Urbana sobre Río Grande - H. Yrigoyen	100.000	50.000	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				40		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				51		Obra Terminal de Cargas (COTECAR) - La Quiaca	100.000	50.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				41		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				51		Mejoras Conjunto Edificio, Trama Urbana del Area y Estructura Hospital Mataderos	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				42		Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan	1.000.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Ampliación y Refuncionalización Hospital Pediatría Profesor Juan P. Garrahan	1.000.000	50.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					44	Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Mejoras en el Museo de la Memoria ex ESMA	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
					45	Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Restauración y Conservación Museo Histórico Nacional	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				30		Prevención Sísmica							
					1	Ampliación Red Nacionalde Estaciones Sismológicas	0	350.000	35.173	67,10	3,40	0,35	10,29
						51 Monitoreo de Actividad Sísmica, Respuesta de Suelos y Estructuras	0	350.000	35.173	67,10	3,40	0,35	10,29
				32		Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera (BID N° 1865)							
					4	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	3.573.133	s/i	s/i	s/i	
					51	Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio	516.400.000	516.400.000	3.573.133	s/i	s/i	s/i	
				50		Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas							
					2	Obras Viales, Construcción Concesión y Explotación de Accesos y Puentes	4.648.000	4.648.000	0	100,00	0,00	0,00	
						52 Puente Encarnación - Posadas	4.648.000	4.648.000	0	100,00	0,00	0,00	
				13		Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	79.452	84,78	15,22	13,00	85,41
					51	Escuela Nacional de Náutica	3.000.000	3.000.000	79.452	84,78	15,22	13,00	85,41
				62		Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario							
					3	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 744	356.495.000	356.495.000	18.981.265	0,00		4,51	
					0	Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III BIRF 4163/AR y BIRF 745	32.295.000	32.295.000	5.037.415	0,00			
					67	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Florencio Varela	8.000.000	8.000.000	5.424.889	0,00		34,00	
					68	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Malvinas Argentinas	27.000.000	27.000.000	1.031.905	0,00		11,00	
					69	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tres de Febrero	26.000.000	26.000.000	0	0,00	62,00		0,00
					70	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Berazategui	15.000.000	15.000.000	4.627.068	0,00	50,00	12,00	24,00
					71	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Esteban Echeverría	18.000.000	18.000.000	0	0,00	47,00		0,00
					72	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Hurlingham	18.000.000	18.000.000	0	0,00	47,00		0,00
					73	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de La Matanza	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00		0,00
					74	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Tigre	25.000.000	25.000.000	0	0,00	71,00		0,00
					75	Paso a Diferente Nivel Municipalidad de Lomas de Zamora	23.000.000	23.000.000	2.071.066	0,00	72,00		0,00
					76	Mejoras en los Entornos a las Estaciones - Municipalidad de Florencio Varela	7.000.000	7.000.000	788.921	0,00	70,00	34,00	48,57
					77	Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 1 (Sur)	30.000.000	30.000.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00
					78	Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 2 (Sudoeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	85,00	0,00	0,00
					79	Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 3 (Oeste)	33.600.000	33.600.000	0	0,00	43,00		0,00
					80	Mejoras en los Entornos a las Estaciones Zona 4 (Norte)	33.000.000	33.000.000	0	0,00	47,00		0,00
				4		Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3192	11.680.200	11.680.200	315.920	100,00	0,00	0,00	
					0	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3193	1.480.200	2.580.200	315.920				
					51	Construcción Alteo Terraplen Viaducto Laguna La Picasa CAF N3194	10.200.000	9.100.000	0	100,00	0,00	0,00	
				91		Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables							
					2	Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	18.407.973	79,95	20,05	5,40	26,93
					51	Ampliación Puerto Caleta Paula	43.000.000	29.450.000	18.407.973	79,95	20,05	5,40	26,93
				3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.627.801	27,23	72,77	28,99	39,84
					51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos Puerto Concepción	1.000.000	4.100.000	1.627.801	27,23	72,77	28,99	39,84
				4		Puerto Diamante	1.000.000	2.000.000	1.679.657	52,68	47,32	41,63	87,98
					51	Puerto Diamante	1.000.000	2.000.000	1.679.657	52,68	47,32	41,63	87,98
				5		Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Reparación Estructura Fundación Muelle Alte. Storni Puerto Madryn	2.000.000	14.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				7		Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	4.582.637	0,00	79,00	0,00	0,00
						51 Puerto Comodoro Rivadavia	6.000.000	23.500.000	4.582.637	0,00	79,00	0,00	0,00
				8		Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova	4.000.000	4.000.000	0	0,00	15,00		0,00
				9		Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	5.000.000	0	0,00	31,00		0,00
						51 Dársena Turística-Deportiva en Cercanías de Punta Cuevas	5.000.000	5.000.000	0	0,00	31,00		0,00
				10		Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	500.000	0	0,00	5,00		0,00
						51 Embarcadero Turístico Puerto Pirámide	500.000	500.000	0	0,00	5,00		0,00
				11		Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Sistema Defensas Puerto Barranqueras	500.000	500.000	0	0,00	15,00		0,00
				12		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Pilcomayo	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				13		Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Embarcadero de Pasajeros y Vehículos Puerto Colonia Cano	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				14		Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa	2.500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				15		Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Puente Pueyrredón	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
						51 Dragado Río Uruguay	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
				17		Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Puente Uriburu Etapa II	500.000	4.050.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				19		Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	5,00		0,00
						51 Ampliación Muelle Histórico Río Grande	1.000.000	1.000	0	0,00	5,00		0,00
				20		Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	5,00		0,00
						51 Ampliación Complejo Portuario Bahía Ushuaia	1.000.000	1.000	0	0,00	5,00		0,00
				22		Reparación Parque España	11.500.000	40.326.000	14.039.642	12,74	87,26	30,26	34,68
						51 Reparación Parque España	11.500.000	40.326.000	14.039.642	12,74	87,26	30,26	34,68
				23		Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Reparación Puerto Rosario Costanera	1.000.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				24		Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Reparación Puente Victorino De La Plaza - Etapa II	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				25		Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
						51 Reparación Muelle en Delegación Río Uruguay de la DNVN	2.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
				26		Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Reparación Estructura Vértice Sur Puerto La Plata-Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				27		Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Dragado Canal de Acceso Puerto Mar del Plata-Provincia de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				28		Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Dragado Ampliación del Canal de Acceso Puerto Bahía Blanca-Bs.As.	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				29		Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Alte Storni-Pcia.de Chubut	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
				30		Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	70,00		0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Remoción Cascos Hundidos Puerto Quequén-Pcia. Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	70,00		0,00
					31	Acertamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
					32	Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
						51 Mejoras Frente de Atraque Puerto Quequén-Pcia. de Buenos Aires	500.000	1.000	0	0,00	15,00		0,00
					34	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena 2º Etapa, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					35	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					36	Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Ampliación de la Recuperación de Tierras en la Restinga Sur Puerto Nuevo, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					37	Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Ampliación Dársena Pesquera y Deportiva en Puerto Lobos, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					38	Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Ampliación Muelle para Cruceros Turísticos en Bahía Camarones, Chubut	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					39	Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
						51 Terminación Muelle Isla Puerto Ibicuy, Entre Ríos	500.000	1.000	0	0,00	0,00		
					40	Reparación Puente Uriburu, Etapa III	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
						51 Reparación Puente Uriburu, Etapa III	1.000.000	1.000	0	0,00	100,00		0,00
451						DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES							
						Producción y Comercialización de Bienes y Servicios							
					7	Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	3.227.250	3.227.250	1.300.000	0,00		27,88	
						51 Remodelación para la Automatización Planta Pólvora y Explosivos	3.200.000	3.200.000	1.300.000	0,00		30,76	
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00		25,00	
					8	Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.227.250	3.227.250	500.000	9,18	90,82	16,50	18,17
						51 Remodelación, Modernización Instrumental Planta Armas y Municiones	3.200.000	3.200.000	500.000	9,18	90,82	8,00	8,81
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	25,00	25,00
					9	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	2.227.250	2.227.250	700.000	45,82	54,18	12,57	23,20
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Amoníaco	2.200.000	2.200.000	700.000	45,82	54,18	0,14	0,26
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	25,00	25,00
					10	Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.227.250	3.227.250	810.000	81,81	18,19	65,80	361,74
						51 Remodelación para Actualización Tecnológica Planta Acido Nítrico	3.200.000	3.200.000	810.000	81,81	18,19	81,60	448,60
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	50,00	50,00
					11	Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.727.250	2.727.250	0	23,51	76,49	5,02	6,56
						51 Remodelación para Actualización Planta Nitrato Amonio y Acido Sulfúrico	2.700.000	2.700.000	0	23,51	76,49	5,02	6,56
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	5,02	5,02
					12	Remodelación para Adecuación de Redes	2.227.250	2.227.250	280.000	16,37	83,63	8,20	9,81
						51 Remodelación para Adecuación de Redes	2.200.000	2.200.000	280.000	16,37	83,63	8,20	9,81
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	8,20	8,20
					13	Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.227.250	2.227.250	180.000	26,53	73,47	11,35	15,45
						51 Remodelación para Modernización y Transferencia Tecnológica Planta Mecánica	2.200.000	2.200.000	180.000	26,53	73,47	11,35	15,45
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	11,35	11,35
					14	Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.227.250	2.227.250	2.003.590	1,00	99,00	51,58	52,10
						51 Remodelación para Adecuación de Servicios Productivos	2.200.000	2.200.000	2.003.590	1,00	99,00	51,58	52,10

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	25,00	25,00
				15		Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.727.250	2.727.250	480.000	0,00	100,00	12,12	12,12
						51 Remodelación Infraestructura y Equipamiento para Mitigación Emisiones Gaseosas	2.700.000	2.700.000	480.000	0,00	100,00	12,12	12,12
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	12,12	12,12
				16		Remodelaciones Varias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/ISO14000	1.227.250	1.227.250	120.000	3,44	96,56	7,06	7,31
						51 Remodelación Depósito de Nitrato de Amonio	734.000	734.000	0	3,44	96,56	0,00	0,00
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	70.000	0,00	100,00	28,33	28,33
						53 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	50.000	0,00	100,00	8,75	8,75
						55 Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				17		Remodelaciones vVrias, Adecuación Estructural y Tecnológica s/IRAM 3800	1.727.250	1.727.250	310.000	6,04	93,96	32,74	34,84
						51 Remodelación de la Fábrica Militar de Río Tercero	1.234.000	1.234.000	80.000	6,04	93,96	31,86	33,91
						52 Remodelación de la Fábrica Militar de Villa María	234.000	234.000	40.000	0,00	100,00	24,16	24,16
						54 Remodelación de la Fábrica Militar Fray Luis Beltran	234.000	234.000	190.000	0,00	100,00	46,04	46,04
						55 Remodelación en Obras Menores	25.250	25.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				18		Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.727.250	1.727.250	0	1,00	99,00	0,00	0,00
						51 Remodelación para la Modernización de Instalaciones	1.700.000	1.700.000	0	1,00	99,00	0,27	0,27
						52 Remodelación en Obras Menores	27.250	27.250	0	0,00	100,00	0,00	0,00
613						ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO							
				20		Asistencia Técnico - Financiera para Saneamiento							
				2		Construcción Planta Depuradora Cloacal Hurlingh.-Morón-Ituzaingo	11.820.924	7.820.924	92.620	88,50	11,50	0,00	0,00
						52 1° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Hurlingham	9.916.621	5.916.621	15.400	100,00	0,00	0,00	
						53 2° Tramo Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Morón	1.904.303	1.904.303	77.220	94,00	6,00	0,00	0,00
				3		Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	2.956.801	2.956.801	58.740	97,50	2,50	0,00	0,00
						51 Planta Potabilizadora, Ampliación, Optimización y Sistema de Captación	1.702.983	1.702.983	24.860	98,00	2,00	0,00	0,00
						52 Optimización de los Servicios de Agua Potable, Centros de Distribución	1.253.818	1.253.818	33.880	97,00	3,00	0,00	0,00
				4		Rehabilitacion y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284				
						51 Rehabilitacion y Ampliación Planta Depuradora Cloacal-Bella Vista	0	1.092.285	1.092.284				
				5		Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.887.972	0	96,00	4,00	0,00	0,00
						51 Colector Cloacal y Planta Depuradora Lago San Roque-Carlos Paz-Córdoba	3.887.972	3.887.972	0	96,00	4,00	0,00	0,00
				7		Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	12.160.000	8.890.733	5,00	5,00	0,00	0,00
						51 Construcción Emisario Submarino Mar del Plata - Buenos Aires	6.160.000	12.160.000	8.890.733	0,00	5,00	0,00	0,00
				8		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	26.414.369	26.414.369	15.311.935	59,50	21,50	7,30	33,95
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Moreno Bs. As.	6.667.768	6.667.768	2.512.489	92,00	8,00	0,00	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno Bs. As.	19.746.601	19.746.601	12.799.446	27,00	35,00	14,55	41,57
				9		Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Bs. As.	23.374.605	23.374.605	6.516.884	80,50	19,50	3,73	19,13
						51 Construcción Planta Depuradora Cloacal Merlo Buenos Aires	3.221.795	3.221.795	22.110	93,00	7,00	0,00	0,00
						52 Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Merlo Buenos Aires.	20.152.810	20.152.810	6.494.774	68,00	32,00	7,46	23,31
				10		Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	5.000.000	2.706.119				
						51 Construcción de Acueducto para 25 Pozos, El Pato, Berazategui	0	5.000.000	2.706.119				
				12		Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	6.827.015	2.693.351	79,00	21,00	14,91	71,00
						51 Construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Chascomús Buenos Aires	3.827.015	6.827.015	2.693.351	79,00	21,00	14,91	71,00
				14		Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	31.150.000	20.154.605	20,00	30,00	22,48	74,93
						51 Construcción Acueducto La Laguna Laboulaye - Córdoba	31.150.000	31.150.000	20.154.605	20,00	30,00	22,48	74,93
				15		Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	30.685.407	16.279.705	46,00	41,00	9,65	23,54

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Optimización y Rehabilitación Planta de Tratamiento de Desagües Córdoba Capital	30.685.407	30.685.407	16.279.705	46,00	41,00	9,65	23,54
				16		Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	32.021.789	32.021.789	10.146.234	92,50	7,50	1,00	13,33
						51 Optimización de Sistema de Distribución de Agua Potable Formosa	7.865.270	7.865.270	2.374.051	85,00	15,00	2,10	14,00
						52 Optimización de Sistema de Provisión de Agua Potable Formosa	24.156.519	24.156.519	7.772.183	100,00	0,00	0,00	
				17		Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	7.198.978	7.157.363	85,00	15,00	13,00	86,67
						51 Sistema Cloacal Localidad Eduardo Castex - La Pampa	4.198.978	7.198.978	7.157.363	85,00	15,00	13,00	86,67
				18		Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Obra Distribución de Agua Potable Desierto Lavallino - Mendoza	500.000	500.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				19		Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	15.000.000	4.809.991	21,00	46,00	0,00	0,00
						51 Obra Sistema Agua Potable y Red de Cloacas Iguazú - Misiones	15.000.000	15.000.000	4.809.991	21,00	46,00	0,00	0,00
				20		Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	9.973.965	5.820.753	65,00	35,00	16,69	47,69
						51 Construcción Acueducto Villa Regina Río Negro	9.973.965	9.973.965	5.820.753	65,00	35,00	16,69	47,69
				21		Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	6.981.333	770.201	88,00	12,00	1,49	12,42
						51 Construcción Planta Depuradora y Redes Cloacales G. Mosconi Salta	1.981.333	6.981.333	770.201	88,00	12,00	1,49	12,42
				22		Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	9.961.052	9.961.052	2.650.447	89,00	11,00	5,00	45,45
						51 Construcción Planta Tratamiento Cloacales Subsistema Rawson San Juan	5.310.126	5.310.126	292.740	87,00	13,00	0,00	0,00
						52 Construcción Redes Cloacales Subsistema Rawson San Juan	4.650.926	4.650.926	2.357.706	91,00	9,00	10,00	111,11
				23		Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.229.777	89.206	86,00	14,00	3,35	23,93
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Santa Fe	22.229.777	22.229.777	89.206	86,00	14,00	3,35	23,93
				24		Construcción Planta Depuradora, Remodelación y Cañerías Colectoras	8.102.057	8.102.057	1.087.555	82,00	18,00	1,19	6,61
						52 Remodelación Planta Depuradora y Colectores V. Aguirre Tandil Bs. As.	8.102.057	8.102.057	1.087.555	82,00	18,00	1,19	6,61
				26		Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires	5.500.000	5.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Chivilcoy - Buenos Aires	5.500.000	5.500.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				27		Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	14.887.202	3.270.771	38,00	62,00	16,70	26,94
						51 Subacueducto Cisterna Ciudadela Comodoro Rivadavia - Chubut	14.887.202	14.887.202	3.270.771	38,00	62,00	16,70	26,94
				28		Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable - Escobar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				29		Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	19.880.000	4.898.390	29,00	55,00	6,70	12,18
						51 Construcción Colector Cloacal Oeste Tramo 2º - San Isidro - Bs. As.	19.880.000	19.880.000	4.898.390	29,00	55,00	6,70	12,18
				30		Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	6.411.473	6.411.473	1.756.705	69,50	30,50	5,52	18,10
						51 Sistema de Agua Potable - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	4.632.422	4.632.422	648.179	52,00	48,00	5,17	10,77
						52 Sistema de Desagües - Ciudad de Andalgalá - Catamarca	1.779.051	1.779.051	1.108.526	87,00	13,00	5,87	45,15
				33		Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	19.050.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sistema de Agua Potable El Cadillal - Tucumán	19.050.000	19.050.000	0	0,00	43,00	0,00	0,00
				34		Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Acueducto Centro Oeste Chaqueño	16.000.000	16.000.000	0	0,00	4,00	0,00	0,00
				38		Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Mina Clavero - Cura Brochero - Córdoba	9.250.000	3.250.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Desagues Cloacales - Mina Clavero - Cura Brochero - Córdoba	9.250.000	3.250.000	0	0,00	23,00	0,00	0,00
				41		Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	20.500.000	20.500.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Luján - Buenos Aires	20.500.000	20.500.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
				42		Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	13.000.000	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Pirané - Formosa	13.000.000	13.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
				43		Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	2.250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Sistema de Agua Potable en Posadas - Pcia. De Misiones	2.250.000	2.250.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
					44	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales y Provisión de Agua Potable	6.500.000	6.500.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - San Nicolás - Buenos Aires	1.500.000	1.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
					52	Sistema de Provisión de Agua Potable - San Nicolás - Buenos Aires	5.000.000	5.000.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					45	Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Acueducto Regional hasta Bahía Blanca - Buenos Aires	25.500.000	25.500.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					46	Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires	12.000.000	2.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Sistema de Agua Potable - Bahía Blanca - Buenos Aires	12.000.000	2.000.000	0	0,00	7,00	0,00	0,00
					47	Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires	10.000.000	2.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal - Bahía Blanca - Buenos Aires	10.000.000	2.000.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
					48	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	2.120.000	1.635.734	93,00	7,00	1,14	16,29
					51	Construcción de Acueducto Sur Salta	1.120.000	2.120.000	1.635.734	93,00	7,00	1,14	16,29
					50	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Desagües Cloacales Río Grande - Chacra XIII - Tierra del Fuego	1.000.000	1.000.000	0	0,00	6,00	0,00	0,00
					52	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego	8.200.000	5.700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Agua Potable en Tolhuin - Tierra del Fuego	8.200.000	5.700.000	0	0,00	55,00	0,00	0,00
					53	Optimización del Sistema Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui - BA	8.943.170	8.943.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					51	Optimización del Sistema Perf., Acueductos y Reservas Agua Potable Berazategui - BA	8.943.170	8.943.170	0	0,00	20,00	0,00	0,00
					54	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Posadas - Misiones	250.000	250.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					55	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura	12.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales en la Localidad de Villa la Angostura	12.000.000	6.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					56	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	6.000.000	6.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema Cloacal San Martín de los Andes - Neuquén	6.000.000	6.000.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					58	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	8.250.000	3.750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					51	Construcción Acueducto Sur 2º Etapa - Salta	8.250.000	3.750.000	0	0,00	22,00	0,00	0,00
					60	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos	9.000.000	9.000.000	3.309.861	0,00	100,00	8,20	8,20
					51	Sistema de Provisión de Agua Potable Gualeguaychú - Entre Ríos	9.000.000	9.000.000	3.309.861	0,00	100,00	8,20	8,20
					61	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Chimbas - San Juan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
					62	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	2.500.000	2.500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Efluentes Cloacales Campana - Buenos Aires	2.500.000	2.500.000	0	0,00	21,00	0,00	0,00
					63	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción del Sistema de Provisión de Agua Potable - Cañuelas - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					64	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	17.685.000	2.532.230	18,00	60,00	12,00	20,00
					51	Construcción de Planta de Tratamiento y Redes de Desagües Cloacales Miramar	17.685.000	17.685.000	2.532.230	18,00	60,00	12,00	20,00
					65	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Planta Depuradora - Carlos Tejedor - Buenos Aires	500.000	500.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
					66	Ampliación del Sistema de Desagues Cloacales y Planta de Tratamiento - Dolores - Bs.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Sistema de Desagues Cloacales y Planta de Tratamiento - Dolores - Bs.	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
					67	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes	4.000.000	4.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					51	Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Goya - Corrientes	4.000.000	4.000.000	0	0,00	11,00	0,00	0,00
					68	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires	17.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Colectores Cloacales Tres Arroyos - Buenos Aires	17.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					69	Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Tratamiento de Desagües Cloacales Ensenada - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
70						Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos - Hurlingham - Bue	2.500.000	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento para Desacarga de Camiones Atmosféricos - Hurlingham - Bue	2.500.000	2.500.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
72						Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza	28.000.000	28.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00
						56 Optimización Sistema de Desagües Cloacales - Malargue - Mendoza	28.000.000	28.000.000	0	0,00	58,00	0,00	0,00
73						Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires	18.000.000	3.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento Modular Aº El Pinazo - Buenos Aires	18.000.000	3.000.000	0	0,00	60,00	0,00	0,00
74						Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	16.500.000	3.500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00
						51 Optimización Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	16.500.000	3.500.000	0	0,00	83,00	0,00	0,00
75						Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales - Lobos - Buen	1.500.000	1.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento y Expansión de Redes Cloacales - Lobos - Buen	1.500.000	1.500.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00
76						Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Malvinas Argentinas - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
77						Construcción de Toma Única Trelew - Chubut	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Toma Única Trelew - Chubut	1.500.000	1.500.000	0	0,00	8,00	0,00	0,00
79						Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal - Pilar - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
80						Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - José C. Paz - Buenos Ai	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Sistema Integral de Desagües Cloacales Malvinas Argentinas - José C. Paz - Buenos Ai	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
81						Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento Modular Arroyo Claro - Buenos Aires	15.250.000	2.250.000	0	0,00	51,00	0,00	0,00
82						Sistema Abastecimiento Agua Potable Y Reservas Moreno - José C. Paz - M. Argentina	8.000.000	2.000.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
						51 Sistema Abastecimiento Agua Potable Y Reservas Moreno - José C. Paz - M. Argentina	8.000.000	2.000.000	0	0,00	53,00	0,00	0,00
83						Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja	1.500.000	1.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto de los Llanos Riojanos - La Rioja	1.500.000	1.500.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00
84						Construcción Acueducto	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
						51 Construcción Acueducto	40.000.000	40.000.000	0	0,00	12,00	0,00	0,00
85						Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán	2.000.000	2.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Obras de Desagües Cloacales Famailla - Tucumán	2.000.000	2.000.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
86						Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	6.750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta Depuradora en Trelew - Pcia. de Chubu	6.750.000	6.750.000	0	0,00	27,00	0,00	0,00
87						Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales	8.000.000	2.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
88						Construcción del Sistema de Desagües Cloacales y Optimización Sistema de Agua Pot	3.000.000	3.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales Gran Resistencia - Chaco	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						52 Optimización del Sistema de Agua Potable Gran Resistencia - Chaco	2.000.000	2.000.000	0	0,00	3,00	0,00	0,00
89						Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	1.496.000	1.496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Desagües Cloacales San Miguel de Tucumán (1º Etapa)	1.496.000	1.496.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
90						Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires	5.000.000	1.500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales - Zárate - Buenos Aires	5.000.000	1.500.000	0	0,00	29,00	0,00	0,00
91						Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema Cloacal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
92						Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º y 3º Etapa	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
						51 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 3º Etapa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						52 Construcción Colectores Cloacales Córdoba - 2º Etapa	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
				93		Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	9.597.470	9.209.243	65,00	35,00	17,69	50,54
						51 Acueducto Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Chubut	9.597.470	9.597.470	9.209.243	65,00	35,00	17,69	50,54
				94		Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
						51 Construcción Sistema de Evacuación de Efluentes - Córdoba	2.500.000	2.500.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00
				95		Construcción Santiago del Estero	42.850.000	32.350.000	0	0,00	45,00	0,00	0,00
						51 Construcción del Sistema de Agua Potable Los Juries y Tomas	25.500.000	25.500.000	0	0,00		0,00	
						52 Construcción de Tratamiento Integral Desagües Cloacales - Santiago del Estero	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						53 Construcción Acueducto Oeste - Santiago del Estero	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						54 Construcción del Sistema de Agua Potable Gran Santiago - Santiago del Estero	15.350.000	4.850.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00
				96		Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						51 Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales Concepción del Uruguay - Entre Ríos	750.000	750.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				98		Construcción del Sistema de Agua Potable en Localidades Varias	2.000.000	2.000.000	0	0,00	1,50	0,00	0,00
						51 Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú (2º etapa) - Entre Ríos	1.000.000	1.000.000	0	0,00		0,00	
						58 Construcción del Sistema de Agua Potable - La Plata - Buenos Aires	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
				99		Construcción del Sistema Cloacal en Localidades Varias	32.758.641	31.666.356	1.750.111	2,50	22,40	0,00	0,00
						56 Construcción del Sistema Cloacal - Rosario Oeste - Funes - Santa Fé	21.500.000	21.500.000	1.750.111	20,00	46,00	3,90	8,48
						57 Optimización del Sistema de Desagües Cloacales - Santa Fé	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00
						66 Construcción del Sistema Cloacal - Ringuelet - Villa Elisa	500.000	500.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
						67 Construcción del Sistema de Desagües Cloacales - Malvinas Argentinas	1.056.830	1.056.830	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						70 Construcción Acueducto Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,00	0,00	0,00
						71 Construcción Sistema Desagües Cloacales, General Rodríguez - Buenos Aires	250.000	250.000	0	0,00		0,00	
						72 Ampliación Planta Potabilizadora Alto Reyes, San Salvador de Jujuy	4.700.000	3.607.715	0	0,00		0,00	
						73 Construcción del Sistema de Agua Potable General Rodríguez	2.751.811	2.751.811	0	0,00		0,00	
624						SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO							
		1				Actividades Centrales							
						1 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I	389.897	156.900	0	0,00		0,08	
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa I	389.897	156.900	0	0,00		0,08	
				3		Construcción Edificio Sede del Servicio Geológico Minero Argentino	100.000	0	0	62,70	4,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio 25	100.000	0	0	62,70	4,00	0,00	0,00
						4 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.411.603	2.744.600	0	0,00	80,00	0,00	0,00
						51 Construcción Edificio Sede IGRM - Etapa II	2.411.603	2.744.600	0	0,00	80,00	0,00	0,00
				19		Producción de Información Geológica de Base							
					1	Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	96.266	36,84	3,51	0,84	23,93
						51 Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales	1.488.100	1.488.100	96.266	36,84	3,51	0,84	23,93
659						ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES							
				17		Infraestructura en Concesiones Viales							
					1	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Provincia de Bs.As.	1.000	801.000	0	95,32	4,68	0,00	0,00
						51 Autovía Cañuelas-Monte -Sección 4: RN N° 3 - Km 87,82 - Km	1.000	801.000	0	95,32	4,68	0,00	0,00
				4		Aumento de Capacidad en Corredores Viales Pcia. Bs.As.III	54.426.749	32.426.749	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						51 Autovía Mar del Plata - Balcarce 2º tramo RN N° 226 Km 31,7 - Km 64,686Provincia de	54.426.749	32.426.749	0	0,00	25,00	0,00	0,00
				5		Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. II	2.000	602.000	314.677	100,00	0,00		
						51 Mejora en Travesía Urbana RN N° 205 Km 65.800 - Km 67.300 Ca	1.000	281.000	0	100,00	0,00	0,00	
						52 Mejora Intersección e Iluminación: RN N° 5 Km. 262,24 -	1.000	321.000	314.677	100,00	0,00	15,82	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
					6	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Bs.As. III	1.000	2.351.000	1.328.073	36,02	30,00		0,00
					52	Adecuación Urbana RN Nº 188 Km. 155,866 - 160,146 - Junín	1.000	2.351.000	1.328.073	71,36	0,98	0,75	76,53
					7	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					51	Mejora Intersección RN 8 Km 224,9 Pergamino Bs.As.	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					8	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. IV	2.000	33.412.000	2.063.690	46,20	50,00		0,00
					51	Autopista Luján-Mercedes Sección I RN Nº 5 Km 67.479 - Km 73	1.000	7.201.000	2.063.690	11,39	61,58	8,21	13,33
					52	Autopista Luján-Mercedes Sección III RN Nº5 Km 85.78 - Km 96	1.000	26.211.000	0	79,60	19,47	4,71	24,19
					9	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Bs.As. V	3.095.214	49.095.214	5.479.720	83,96	16,04	7,34	45,76
					51	Ampliación Tercer Carril RN Nº9 Km 72.60 - Km 85.20 Campana	3.095.214	49.095.214	5.479.720	83,96	16,04	7,34	45,76
					10	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe I	1.000	351.000	258.430	100,00	0,00	0,00	
					52	Mejoras en Travesía Urbana RN Nº 11- Km 787,23 Reconquista	1.000	351.000	258.430	100,00	0,00	0,00	
					12	Aumento de Capacidad en Concesiones Viales Pcia. Córdoba I	19.653.364	7.653.364	6.429.283	3,72	69,83	23,45	33,58
					51	Adecuación de Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	19.653.364	7.653.364	6.429.283	3,72	69,83	23,45	33,58
					13	Seguridad en Concesiones Viales en Pcia.de Santa Fe II	1.000	2.601.000	595.681	10,50	50,00	7,41	14,82
					52	Mejora de Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras RN	1.000	2.601.000	595.681	21,76	9,88	7,41	75,00
					14	Seguridad en Corredores Viales I	9.328.000	10.549.000	509.450	97,24	2,76		0,00
					61	Construcción de Canal de Desagües PluvialesRN Nº 3 km 555,90	320.000	450.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
					63	Travesías Urbanas RN Nº 188 KM 8,00 - KM 112,00 Campos Salle	1.000	701.000	0	91,72	8,28	0,00	0,00
					68	Mejora Acceso Canalizado Laguna de Lobos RIN Nº 205 km. 111,	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
					71	Construcción de Alcantarilla RN 12 Km 901,60 San Roque Corrientes	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
					74	Acceso a Villa Ramallo RN Nº 9 KM 207,00 Prov. de Buenos Aires	1.000	1.000	0	98,88	1,12	0,00	0,00
					76	Mejora de Intersección de Acceso a Hersilia RN Nº 34 Km. 369	1.000	301.000	0	100,00	0,00	0,60	
					78	Mejora Acceso Canalizado RN 33 Km 743,8 Casilda - Santa Fe	1.000	1.092.000	509.450	52,70	23,51	14,95	63,59
					79	Mejora de Accesos Canalizados: RN Nº 38 Km 67,65 La Cumbre	9.000.000	8.000.000	0	0,00	60,26	0,00	0,00
					80	Mejora de Acceso a Pinto (Sgo. del Estero) RIN Nº 34 km. 496	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
					81	Adecuación Urbana RN34 km 1135,892-1138,886 Güemes Salta	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
					17	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	
					55	Construcción Pasarela Peatonal RN5 Km74,18 Jauregui	1.000	61.000	0	100,00	0,00	0,00	
					21	Obras de Seguridad en Corredores Viales en Pcia. Bs.As.	775.531	925.531	0	56,18	0,00	0,00	
					51	Construcción Pasarela Peatonal RN Nº 8 Km. 78 - Exaltación de la Cruz	1.000	151.000	0	100,00	0,00	0,00	
					52	Construcción Colectora RN 3 Km 109/110 - S. Miguel del Monte Bs. As.	774.531	774.531	0	0,00	0,00	0,00	
					23	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia. de Córdoba II	30.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
					51	Construcción Multitrocha RN8 Sec.Km 606-619 Tramo Río IV-Holmberg	30.000.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
					24	Aumento de Capacidad en Corredores Viales en Pcia.de Salta I	28.843.000	22.843.000	506.752	0,00	83,60	9,77	11,69
					51	Construcción Multitrocha RN9 Km1547-1555 Cabeza de Buey - Salta	28.843.000	22.843.000	506.752	0,00	83,60	9,77	11,69
					27	Seguridad en Corredores Viales en Pcia. de Tucumán II	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					51	Adecuación de Acceso RN9 Km1362 - Trancas - Tucumán	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					28	Construcción Rotonda RN 16 Km. 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	6.000.000	0	0,00	41,67	0,00	0,00
					51	Construcción Rotonda RN 16 Km 157,15 Intersección RP 4 - Chaco	9.000.000	6.000.000	0	0,00	41,67	0,00	0,00
					29	Construcción Bicisenda RN 12 Km. 1.023,87 Riachuelo - Corrientes	1.000	2.201.000	679.390	100,00	0,00	0,58	
					51	Pavimentación de Banquinas RN Nº 12 Tramo: Km 1.017,85 - Km	1.000	2.201.000	679.390	100,00	0,00	0,58	
					30	Obras Menores en Concesiones Viales	2.851.636	7.901.636	2.638.524	74,28	25,72		0,00
					51	Rotonda de Intersección e Iluminación RN Nº 3	1.000	351.000	21.150	92,02	7,98	0,00	0,00
					52	Rotonda e Iluminación en el Ingreso a Trenque Lauquen	1.000	601.000	54.907	100,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						53 Mejoras de Accesos e Iluminación en RN N° 7 Carmen de Areco	1.000	1.000	115.763	100,00	0,00	0,00	
						54 Mejora Intersección RN 11-Calle Sgto.Cabral-San Lorenzo -Santa Fé	2.847.636	2.847.636	869.712	62,13	37,78	20,32	53,79
						61 Rotonda e Iluminación de Acceso por Av. Piazza RN N° 3 Km 29	1.000	4.101.000	1.576.992	66,02	12,85	6,95	54,09
				35		Construcción 3°Trocha RN12 Km1370,038-1594,400 Pcia. de Misiones	33.275.706	33.575.706	9.209.850	79,21	20,79	6,02	28,96
						51 Construcción Terceras Tochas RN N° 12 - Km 1370.038 - Km 15	33.275.706	33.575.706	9.209.850	79,21	20,79	6,02	28,96
				37		Seguridad en Concesiones Viales en Provincia La Pampa I	1.000	1.000	0	97,80	2,20	0,00	0,00
						51 Readecuación del Acceso a la Planta Urbana RN N° 5 Km 605.03	1.000	1.000	0	97,80	2,20	0,00	0,00
				38		Aumento de Capacidad en Corredores Viales-Pcia Mendoza I	4.996.000	4.996.000	13.516.892	96,73	0,00		
						51 Doble Vía Santa Rosa - Gral. San Martín RN N° 7 KM. 965.51 -	4.996.000	4.996.000	13.516.892	96,73	0,00		
				39		Autopista Luján - Mercedes EtapaI, Seccion II, Jaúregui	1.000	2.201.000	542.277	97,44	1,43	0,00	0,00
						51 Autopista Luján - Mercedes Etapa I Sección II Jáuregui	1.000	2.201.000	542.277	97,44	1,43	0,00	0,00
				40		Aumento Capacidad en Corredores Viales-Pcia. Sgo. del Estero I	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Ensanche del Puente sobre el Río Dulce RN N° 9 Termas de Río Hondo	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
				63		Iluminación Intersección RN 9 -km 227,03 c/RN 188-San Nicolas Bs.As.	1.000	181.000	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Iluminación Intersección RN N° 9 (Km 227.03) con RN N° 188	1.000	181.000	0	100,00	0,00	0,00	
				65		Construcción de Destacamentos Policiales Pcia. de Bs.As.	1.000	221.000	125.654	19,63	4,00	0,00	0,00
						55 Edificio Cpo.de Apoyo a los Servicios Viales-Km31 Autop.Bs. As.-La Plata	1.000	221.000	125.654	91,67	8,33	0,00	0,00
				67		Seguridad en Corredores Viales-Tucuman III	1.000	1.000	0	99,99	0,01	0,00	0,00
						51 Pavimentación de Calle Colectora, Iluminación y Construcción	1.000	1.000	0	99,99	0,01	0,00	0,00
				69		Construcción en RN 188 y RN 33 Santa Fé	2.000	1.292.000	0	95,57	4,00	0,00	0,00
						51 Intersección Canalizada RN188-Const.Bicisenda Ameghino-Pcia. de Bs.As.	1.000	1.201.000	0	76,96	21,79	0,00	0,00
						53 Mejoras en Travesías Urbanas Venado Tuerto RN N° 8 Km 365,4	1.000	91.000	0	100,00	0,00	0,00	
				70		Construcción Pasarela Peat. RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Construcción Pasarela Peatonal RN11 Bo.Toba-Resistencia-Chaco	1.000	1.000	0	0,00	0,00	0,00	
				71		Construcción en Autopista Richieri Buenos Aires	50.001.000	52.000	0	47,33	26,00		0,00
						51 Rama Salida Descendente Km 21,00 Autopista Riccheri -Prov. de Bs. As.	1.000	51.000	0	94,66	5,34	5,34	100,00
						52 Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas	50.000.000	1.000	0	0,00	12,50	0,00	0,00
				72		Mejora en Corredor Vial 29	21.353.747	10.353.747	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						51 Variante RN N° 22 y Obras de vVnculación al 3° Puente: Sección RN N° 151 - RP N° 7	21.353.747	10.353.747	0	0,00	33,33	0,00	0,00
				74		Autovía RN226-RP 51 Av. Carlos Pellegrini Olavarría Bs. As.	15.500.000	16.000.000	1.376.458	3,01	66,67	16,68	25,02
						51 Autovia RN N° 226 y Rotonda en Intersección con Calle Rivadavia	15.500.000	16.000.000	1.376.458	3,01	66,67	16,68	25,02
				75		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Córdoba	1.000	651.000	0	43,18	56,82	0,42	0,74
						51 Puente sobre el Arroyo El Aji - Ruta Nacional N° 7 Km 600,00	1.000	651.000	0	99,58	0,42	0,42	100,00
				76		Obras de Protección contra Erosión en Corredores Viales	1.000	3.501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Obras de Protección contra la Erosión Hídrica	1.000	3.501.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				78		Obras de Seguridad Vial en Provincia de Entre Ríos	1.000	12.701.000	2.414.057	99,16	0,84	2,69	320,24
						51 Acceso a Gualaguaychú RN14 Entre Ríos	1.000	12.701.000	2.414.057	99,16	0,84	2,69	320,24
				80		Mejora Intersección RN188 y RN33 G. Villegas - Pcia. de Bs. As.	1.000	5.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00
						51 Mejora Intersección RN N° 188 (Km 360.785) con RN N°33	1.000	5.201.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00
				81		Obras de Seguridad Vial en Pcia. de Bs. As. III	19.001.000	25.501.000	552.177	4,12	20,00		0,00
						52 Mejora Intersección y Colectora RN 5 km 208-211 Bragado-Bs.As.	1.000	5.101.000	552.177	22,68	77,32	27,53	35,61
						56 Mejora de Acceso a Coronel Dorrego - Construcción de Colectora	3.000.000	4.400.000	0	0,00	100,00	30,85	30,85
						63 Mejora en Intersección RN 7 con RP 191- Chacabuco	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00		
						64 Mejora de Intersección RN 7 Av. Elguera R- Chacabuco	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00		

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						65 Pavimentación de Acceso a Av. Damasco Valdés-Santa Fé	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00		
					82	Obras de Seguridad en Provincia de Santa Fe II	1.000	1.000	0	12,43	1,00	0,00	0,00
						58 Mejoras Travesías Urbanas en RN Nº 11 Localidades: Candiotti	1.000	1.000	0	99,44	0,56	0,00	0,00
					85	Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	139.917.000	6.319.575	43,00	25,00	0,00	0,00
						51 Autopista Mesopotámica - Tramo Ceibas-Gualeguaychú-Pcia.Entre Ríos	139.977.000	139.917.000	6.319.575	43,00	25,00	0,00	0,00
					86	Ruta Nacional 5 - Chivilcoy- Provincia de Buenos Aires	2.950.000	3.200.000	249.101	s/i	s/i	25,14	
						51 Autovía Ruta Nacional 5 Mercedes - Chivilcoy-Provincia de Bs.As.	2.950.000	3.200.000	249.101	s/i	s/i	25,14	
					87	Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	7.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Autopista Ribereña-Ciudad de Buenos Aires	7.000.000	7.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					88	Mejoras en Aeropuerto Sauce Viejo-Provincia de Santa Fe	1.000	1.901.000	42.315	94,24	5,76	8,08	140,28
						51 Mejoras en Accesos a Aeropuerto y al Parque Industrial	1.000	1.901.000	42.315	94,24	5,76	8,08	140,28
					89	Ruta Nacional N36 Tramo - Río IV	42.833.328	25.333.328	0	0,00	16,00	0,00	0,00
						51 Mejora RN Nº 36. Sección Variante Perilago Almafuerte	36.833.328	19.333.328	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						52 Mejora RP N36 Seccion Variable Despeñaderos	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					96	Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Río Negro	4.693.695	8.493.695	0	0,00	74,09	0,00	0,00
						51 Pavimentación Urbana y Repavimentación RN Nº 22 Km 1212,40	4.693.695	8.493.695	0	0,00	74,09	0,00	0,00
					97	Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	6.929.100	7.049.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00
						51 Construcción de Rotonda RN Nº 38 Km 120,20 Acceso a Cruz del Eje	6.929.100	7.049.100	0	0,00	87,50	0,00	0,00
					98	Intersección Rotacional RN 205 y Acceso a Roque Perez, Pcia. Bs. As.	5.683.000	4.383.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Intersección Rotacional en RN Nº 205 y Acceso a Roque Pérez	5.683.000	4.383.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
18						Infraestructura en Áreas Urbanas							
					1	Infraestructura en Áreas Urbanas	1.000	2.001.000	186.197	12,50	87,50		0,00
						53 Rotonda en Intersección. RN Nº A-015 y Av. Rösch Concordia	1.000	2.001.000	186.197	0,00	100,00	31,86	31,86
					2	Seguridad en Areas Concesionadas II	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,84	
						51 Repavimenteación de la RP Nº 42 Sección RP 51	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,84	
					3	Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	2.267.290	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Vinculación y Remodelación R.P. Nº 11 entre Diagonal 74	2.267.290	2.267.290	0	0,00	0,00	0,00	
					4	Pavimentación 30 cuadras Magdalena-Provincia de Buenos Aires	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
						51 Pavimentación Urbana en Localidades de Magdalena y Atalaya	1.000	1.000	0	100,00	0,00	0,00	
					5	Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	25.501.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	
						51 Vinculación y remodelación RP 36 - Rotonda Gutiérrez y RP 2 Fcio. Varela Bs.As.	1.000	25.501.000	2.629.349	100,00	0,00	0,00	
					6	Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Remodelación y Pavimentación Av.66 y Calle 11 Acc. Esc. 67 La Plata Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					9	Mejoras en Provincia de Entre Ríos I	1.000	1.051.000	0	100,00	0,00	5,67	
						51 Mejora en Acceso Sur RN Nº 14 Km. 252,60 Concordia	1.000	1.051.000	0	100,00	0,00	5,67	
					11	Obras Menores en Areas Urbanas	1.000	1.001.000	0	92,74	7,26	0,00	0,00
						51 Pavimentación Urbana Localidad de Lima - Zárate Prov.de Bs.As.	1.000	1.001.000	0	92,74	7,26	0,00	0,00
					12	Seguridad en Áreas no Concesionadas	1.000	1.000	0	96,59	3,41	0,00	0,00
						51 Repavimentación y Desagües - Magdalena Buenos Aires	1.000	1.000	0	96,59	3,41	0,00	0,00
					13	Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	51.000	0	100,00	0,00	0,73	
						51 Repavimentación e Iluminación - Camino al Centro Atómico Ezeiza	1.000	51.000	0	100,00	0,00	0,73	
					14	Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	32.801.000	11.388.646	58,70	40,14	14,42	35,92
						51 Rehabilitación y Mejora RP Nº 25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Oeste-Prov.de Bs.As.	1.000	32.801.000	11.388.646	58,70	40,14	14,42	35,92
					15	Acceso a Wheelwright RP9s Provincia de Santa Fe	1.000	3.001.000	190.438	100,00	0,00	18,51	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright RP N° 9 RN N° 8 KM 2	1.000	3.001.000	190.438	100,00	0,00	18,51	
					16	Vinculación Acceso Pto.Yerua RN14 Km242,36 Pcia. de Entre Rios	34.949.806	35.949.806	7.736.793	43,61	56,39	21,20	37,60
						51 Vinculación Acceso a Puerto Yerua desde RN N° 14	34.949.806	35.949.806	7.736.793	43,61	56,39	21,20	37,60
					17	Mejoras en Ruta 201 - Construcción de Viaductos	55.000.000	1.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00
						51 Autovía 201 entre R P N° 4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero. Pcia.de Bs.As	55.000.000	1.000	0	0,00	20,83	0,00	0,00
					18	Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Mejoras en Acceso Sudeste desde el Triángulo de Bernal	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					19	Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Vinculación Rotacional y Pavimentación Urbana-Berisso	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					20	Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Autovía RP N° 215 Tramo RP 29 Brandsen-RP N° 6 La Plata-Bransen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					21	Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	7.500.000	7.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Repavimentación y Ensanche RP N° 21 N° Tramo: RP N° 7	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						52 Repavimentación y Ensanche en Av. Hipólito Yrigoyen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
						53 Pavimentación Calle Salguero Tramo H. Yrigoyen	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
					22	Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	2.500.000	0	s/i	s/i	0,00	
						51 Variante RP N° 4 Sección 3 (RP N° 201-Buen Ayre)-Morón (Bs As)	2.500.000	2.500.000	0			0,00	
					23	Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	2.500.000	0	s/i	s/i	0,00	
						51 Variante PR N°4 Sección N° 1 (Avda. Don Bosco-Au Ricchieri)	2.500.000	2.500.000	0			0,00	
					24	Mejoras en Aéreas no Concecionadas Pcia. Bs. As.	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
						51 Rehabilitación y Ensanche ex RN N° 8 Tramo Gral. Paz-RP 4-3	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
					25	Mejoras en Áreas no Concesionadas Prov. Bs. As.	28.788.338	11.839.338	4.336.141	2,84	86,00		0,00
						51 Pavimentación y Desagües Calle Otto Krause Tramo Planta Nestlé	3.788.338	5.638.338	4.336.141	40,13	23,83	13,18	55,31
						52 Pavimentación y Desagües Calle Constituyentes Tramo Colector	10.000.000	6.200.000	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						53 Pavimentación y Desagües Calle Guayaquil Tramo Calle Estados Unidos	15.000.000	1.000	0	s/i	s/i	0,00	
					26	Acceso a Ciudad Ezeiza Construcción Doble Calzada RN 205, Pcia. Bs. As.	6.100.000	4.300.000	1.101.316	1,43	95,86	29,32	30,59
						51 Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada RN	6.100.000	4.300.000	1.101.316	1,43	95,86	29,32	30,59
					27	Pavimentación RP N° 20. RP N° 11 (Magdalena) - RP N° 36 (Vieytes)	29.500.000	20.000.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00
						51 Pavimentación Ruta Provincial N° 20. Tramo I: RP N° 11	29.500.000	20.000.000	0	0,00	77,78	0,00	0,00
					28	Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela	17.650.000	15.650.000	1.254.698	0,00	100,00		0,00
						51 Obras de Seguridad en los Partidos de Berazategui, Florencio Varela	6.850.000	6.850.000	1.254.698	0,00	100,00	43,53	43,53
						52 Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro (Berazategui)	10.800.000	8.800.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
19						Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales							
					1	Obras Mejorativas en CV2-Ano II-I Etapa	3.000	3.503.000	312.901	100,00	0,00	0,00	
						52 Obra Mejorativa N° 221 Corredor Vial 2- Ruta Nacional N° 7 K	1.000	1.000	312.901	100,00	0,00	0,00	
						53 Obra Mejorativa 208 RN N° 7 Km. 457-492 Provincia de Córdoba	1.000	2.401.000	0	100,00	0,00	0,00	
						55 Obra Mejorativa N° 211 - RN N° 7 Km 399-406 - Km 424-457	1.000	1.101.000	0	100,00	0,00	0,00	
					2	Corredor Vial 3	7.411.984	43.631.984	6.218.904	73,05	26,95		0,00
						51 Obra Mejorativa N° 214 Corredor Vial 3-RN N° 9 Km 157 - 206	7.410.984	34.810.984	6.218.904	100,00	0,00	12,02	
						52 Obra Mejorativa N° 201 Corredor Vial 3 - RN N° 9 Km 96 - 106	1.000	8.821.000	0	81,54	18,46	0,00	0,00
					3	Obras Mejorativas en CV4-Año II-I Etapa	1.000	2.351.000	0	98,16	1,84	0,00	0,00
						51 OM N° 205 Repavimentación con Concreto Asfáltico, Estabilización	1.000	2.351.000	0	100,00	0,00	0,00	
					5	Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	336.802	24.736.802	355.410	100,00	0,00		
						0 Obras Mejorativas en Corredor Vial 5-Año II - I Etapa	333.802	333.802	22.836				

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						51 Obra Mejorativa N° 217 Corredor Vial 5 Ruta Nacional N° 9 Km	1.000	751.000	91.242	100,00	0,00	0,00	
						52 Obra Mejorativa 203 RN N° 34 Km. 584-612 Km. 646-651 Km. 684	1.000	3.251.000	241.332	99,38	0,62	0,00	0,00
						54 Obra Mejorativa N 218 CV5 RN34 Km66,00-86,00	1.000	20.401.000	0	100,00	0,00	5,91	
					8	Obra de Mejora en Corredor Vial 3 Año II - II Etapa	41.087.172	41.487.172	0	0,00	84,00	0,00	0,00
						54 Obra 223a C.V 3 RN 11 Arosena - Santo Tomé - Santa Fé	41.087.172	41.487.172	0	0,00	41,67	0,00	0,00
						Obras en Corredor Vial 1							
					1	Obras de Seguridad en Corredor Vial 1	37.966.598	18.966.598	0	0,00	58,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Colectora en S. Miguel del Monte RN 3 Km 108	1.094.946	1.094.946	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación y Mejora de Accesos, Const. de 2da. Calzada	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						53 Adecuacion Hidráulica Benito Juarez RN 3 Km 379-397	1.252.201	1.252.201	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Escuela Agropecuaria y Adecuacion	1.808.600	1.808.600	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos - Tres Arroyos RN 3 Km 490	4.175.358	4.175.358	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						56 Iluminación Acceso a Oriente y Copetonas RN 3 Km 513,93	805.108	805.108	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Iluminación Distribuidor Punta Alta RN 3 Km 669,74-675 - Const. Colectora y Pasarela	1.221.269	1.221.269	0	0,00	16,67	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso Base Aérea Tandil RN 226 Km 174,25	19.805.632	805.632	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						59 Construcción de Alcantarilla RN 226 Km 404,12	850.194	850.194	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						60 Reconstrucción de Alcantarillas RN 205 Km 155,7-157,7	627.985	627.985	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso del Carril RN 205 Km 156,26	1.989.921	1.989.921	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						62 Mejora Acceso a Cazón RN 205 Km 170,09	1.913.208	1.913.208	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						63 Adecuación de Accesos a Saladillo RN 205 Km 182-188,56	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						64 Iluminación Rotonda, RN 205-RP 65 Bolivar Km 317,41	832.258	832.258	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						65 Obras Complementarias CV I	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						66 Iluminación Distribuidor con RN N° 226 Km 368,46	1.289.918	1.289.918	0	0,00	33,33	0,00	0,00
					2	Obras de Seguridad en Corredor Vial 2	31.793.039	23.793.039	0	0,00	61,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso a Pehuajó RN 5 km 487,51	8.957.417	2.957.417	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						52 Iluminación en Intersección RN N° 5 y RP N° 1 y en RN N	740.726	740.726	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						53 Iluminación en Intersección Acceso a Uriburu RN 5 km 567,6	563.576	563.576	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						54 Adecuación y Mejora Accesos a Lonquimay con Darsenas y Refugios RN 5 km 543-544	1.361.109	1.361.109	0	0,00	16,67	0,00	0,00
						55 Mejora Acceso al Puerto de San Nicolas RN 188 km 08-26	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						56 Mejora de Travesía Urbana Conesa RN 188 km 32,15-33,75	1.288.172	1.288.172	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						57 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Acevedo RN 188 km	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						58 Adecuación de Curva e Iluminación - Peña y Pergamino RN 188	2.052.685	2.052.685	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso - RN N° 8 y RP N° 32 - Pergamino RN 188 km 73,9-74,200	2.052.685	2.052.685	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						60 Mejora de Acceso y Mejora de Travesía Urbana en RN N° 188 e/ Rotonda y Río Rojas K	2.845.963	2.845.963	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						61 Mejora e Iluminación en Cruce con RP N° 30 - Rojas RN 188 KM	1.071.598	1.071.598	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						62 Iluminación General Pinto RN 188 KM 255,08	724.597	724.597	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						63 Iluminación Coronel Granada RN 188 KM 283,5	724.597	724.597	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						64 Adecuación de Acceso y Colectoras, Villegas RN 188 KM 360-362	1.512.210	1.512.210	0	0,00	14,29	0,00	0,00
						65 Iluminación en Cruce con RP N° 101. Acceso a Levalle RN 188	1.071.598	1.071.598	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						66 Obras Complementarias CV II	1.731.567	1.731.567	0	0,00	16,67	0,00	0,00
						67 Adecuación de Travesía Urbana de Junín RN 7 KM 257,64-263,65	3.369.004	1.369.004	0	0,00	14,29	0,00	0,00
					3	Obras de Seguridad en Corredor Vial 3	62.648.880	41.134.880	0	0,00	52,00	0,00	0,00
						51 Iluminación Alto Nivel RNN° 188 Int. RN 7 Km 263,65	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 301,36	2.418.814	2.418.814	0	0,00	33,33	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						53 Adecuación de Acceso a Alem RN N° 7 Km 314	1.625.535	1.625.535	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Alem RN 7 Km 315,5	1.564.514	1.564.514	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a Alberdi RN 7 Km 341	2.022.175	2.022.175	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Intersección con RP N 1 4 Diego de Alvear	1.761.138	1.761.138	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						57 Mejora de Rotonda y Acceso Rufino RN 7 Km 423,32	1.808.600	1.808.600	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a General Levalle int. RP N° 10 Km 540	1.953.525	1.953.525	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a La Cautiva RN 7 Km 557,1	2.479.835	2.479.835	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						60 Iluminación Acceso a Cavanagh RN 8 Km 408,29	813.159	813.159	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						61 Adecuación de Accesos La Carlota RN 8 Km 500	2.329.307	2.329.307	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso y Colectora - Villa Reducción RN 8 Km 557	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						63 Adecuación de Curva RN 8 Km 566	1.015.322	1.015.322	0	0,00	s/i	0,00	
						64 Pasarela Peataonal en Vicuña Mackena RNN° 7 - Km 585	1.207.661	1.207.661	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						65 Construcción de Variante y Adecuación de Acceso a Hughes RN 8 Km 303-306	2.812.063	2.812.063	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						66 Adecuación de Acceso - Int. RN N° 8 y RP N° 94 - Santa Isabel	3.151.070	3.151.070	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						67 Adecuación de Intersección RP N° 90 RN 8 Km 344,27	2.845.963	2.845.963	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						68 Construcción de Variante y Adecuación de Accesos - Venado Tuerto RN 8 Km 360-375	19.372.589	3.858.589	0	0,00	13,33	0,00	0,00
						69 Adecuación Hidráulica sobre Río IV RN 8 Km 562,8	4.157.923	1.157.923	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						71 Adecuación de Accesos y Colectoras RN N° A005	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	
						72 Adecuación de Acceso a Arias - Córdoba RNN° 8 - Km410	2.845.963	2.845.963	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						73 Obras Complementarias CV III	4.638.189	1.638.189	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				4		Obras de Seguridad en Corredor Vial 4	17.784.062	15.784.062	0	0,00	60,00	0,00	0,00
						51 Mejora Travesías Urbanas Localidades: Devoto, La Francia El Tío	1.625.535	1.625.535	0	0,00	33,33	0,00	0,00
						52 Reparación Losas de Aproximación en el Cruce FFCC Belgrano R	161.022	161.022	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						53 Adecuación de Acceso a Totoras por Av. Belgrano y Colón RN 34 Km 55,21-56,85	947.520	947.520	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						54 Mejora de Acceso a Casas RN 34 Km 119,63	161.022	161.022	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Acceso a San Vicente RN 34 Km 168,6	2.296.771	2.296.771	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						56 Iluminación y Señalización Acceso a Susana - Int. RP N° 67 R	483.065	483.065	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						57 Mejora de Acceso a INTI - INTA Rafaela RN 34 Km 227,18	1.625.535	1.625.535	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						58 Adecuación de Acceso a Tacural RN 34 Km 261	2.540.856	2.540.856	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						59 Mejora de Acceso a Aceitera Céres RN 34 KM 390,7	2.215.409	2.215.409	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						60 Construcción de Dársenas y Refugios RN 34 Km 130-357	1.564.514	1.564.514	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						61 Mejora de Acceso a Bialelt Masse e Iluminación	893.279	893.279	0	0,00	25,00	0,00	0,00
						62 Obras Complementarias Corredor Vial IV	3.269.534	1.269.534	0	0,00	16,67	0,00	0,00
				5		Obras de Seguridad en Corredor Vial 5	28.572.544	16.572.544	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Dársenas y Refugios Nelson RN 11 Km 508,5-510	1.108.318	1.108.318	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						52 Mejora de Travesía Urbana y Adecuación Hidráulica - Llambi	895.700	895.700	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						53 Construcción de Dársenas y Refugios Cabal RN 11 Km 528-528,	679.123	679.123	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						54 Mejora de Travesía Urbana, Adecuación Hidráulica y Const. de Colectora - San Justo RI	7.205.525	1.205.525	0	0,00	22,22	0,00	0,00
						55 Mejora de Travesía Urbana Marcelino Escalada RN 11 Km 593-59	749.096	749.096	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						56 Mejora de Travesía Urbana Vera y Pintado RN 11 Km 645	749.096	749.096	0	0,00	66,67	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a Vera RN 11 Km 721,96	1.540.106	1.540.106	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						58 Adecuación Acceso Malabrigo RN 11 Km 747,99	1.858.318	1.858.318	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						59 Ensanche Puente A° del Rey y Pavimentacion Colectoras -Reconquista RN 11 Km 79C	3.700.263	1.700.263	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						60 Adecuación Travesía Urbana y Construcción de Colectora Avellaneda RN 11 Km 790,35	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						61 Adecuación de Acceso a Villa Ocampo RN 11 Km 872,49	5.286.819	1.286.819	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						62 Adecuación Urbana Las Toscas RN 11 Km 889,891	2.220.833	2.220.833	0	0,00	11,11	0,00	0,00
						63 Obras Complementarias Corredor Vial V	2.479.347	2.479.347	0	0,00	16,67	0,00	0,00
					6	Obras de Seguridad en Corredor Vial 6	49.098.243	41.098.243	0	0,00	38,00	0,00	0,00
						51 Adecuación de Acceso, Mejora de Travesía Urbana y Adecuacion Hidráulica San Roque	3.072.408	1.072.408	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						52 Adecuación de Acceso a Empedrado RN 12 Km 974,9	2.296.771	2.296.771	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						53 RN Nº 16 Km 0 Juntas Puente General Belgrano	289.839	289.839	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						54 Adecuación de Acceso a Ita Ibaté RN 12 Km 1183,8	1.454.676	1.454.676	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						55 Adecuación de Accesos a Ituzaingo RN 12 Km 1256,4	1.747.578	1.747.578	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						56 Adecuación de Accesos a Paso de la Patria RN 12 Km 1056,53	2.845.963	2.845.963	0	0,00	20,00	0,00	0,00
						57 Adecuación de Acceso a H. Yrigoyen RN 12 Km 1429,4	2.845.963	2.845.963	0	0,00	28,57	0,00	0,00
						58 Mejora de Travesía Urbana, Const. de Pasarela Peat. y Const. de Colectora Capiovi RN	3.362.611	1.362.611	0	0,00	16,67	0,00	0,00
						59 Adecuación de Acceso a Puerto Rico por Av. 9 de Julio y Acceso a Terminal Nueva RN	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 Iluminación de Acceso a Garupé RN 12 Km 1478,78	801.747	801.747	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						61 Construcción de Pasarela Peatonal y Const. de Dársenas	923.790	923.790	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						62 Adecuación de Acceso a Puerto Esperanza RN 12 Km 1587,47	2.291.223	2.291.223	0	0,00		0,00	
						63 Mejora de Travesía Urbana Puerto Iguazú RM 12 Km 1636,65-163	805.108	805.108	0	0,00		0,00	
						64 Adecuación de Acceso a Candelaria RN 12 Km 1361	2.186.932	2.186.932	0	0,00		0,00	
						65 Adecuación de Accesos y Construcción de Colectora - San Ignacio RN 12 Km 1398	2.784.942	2.784.942	0	0,00		0,00	
						66 Adecuación de Accesos a Santo Pipo RN 12 Km 1414,58	2.337.451	2.337.451	0	0,00		0,00	
						67 Adecuación de Accesos a Puerto Leoni RN 12 Km 1445,9	2.833.759	2.833.759	0	0,00		0,00	
						68 Adecuación de Acceso a Montecarlo RN 12 Km 1519	2.693.410	2.693.410	0	0,00		0,00	
						69 Adecuación de Acceso - Cruce RN Nº 12 Y RP Nº 16 - Pto. Piray RN 12 Km 1531,18	2.699.512	2.699.512	0	0,00		0,00	
						70 Adecuación de Acceso Makalle RN 16 Km 54,68	3.688.058	1.688.058	0	0,00		0,00	
						71 Adecuación de Accceso a Quitlpi RN 16 Km 154,35	1.534.003	1.534.003	0	0,00		0,00	
						72 Adecuación de Acceso en Colonia Benitez RN 16 Km 2,5	1.991.664	1.991.664	0	0,00		0,00	
						73 Obras Complementarias Corredor Vial VI	3.510.835	1.510.835	0	0,00		0,00	
					7	Obras de Seguridad en Corredor Vial 7	14.761.310	7.761.310	0	0,00		0,00	
						51 Mejora de Travesía Urbana - Villa María RN 9 Km 555	1.625.535	1.625.535	0	0,00		0,00	
						52 Acceso a Trancas Km 1360 - 3ra Trocha de ascenso Km 1318 a 1321- Iluminación	3.964.689	1.964.689	0	0,00		0,00	
						53 Construcción de Dársenas y Refugios RN 9-34 Km 404-1553,5	6.202.140	1.202.140	0	0,00		0,00	
						54 Obras Complementarias Corredor Vial VII	2.968.946	2.968.946	0	0,00		0,00	
					8	Obras de Seguridad en Corredor Vial 8	7.322.491	6.021.491	0	0,00		0,00	
						51 Adecuación de Accesos Av. Chapuis RN 33 Km 632,34	3.074.794	1.773.794	0	0,00		0,00	
						52 Adecuación de Accesos Av. Sta. Fe- Venado Tuerto RN 33 Km 633,35	2.845.963	2.845.963	0	0,00		0,00	
						53 Obras Complementarias Corredor Vial VIII	1.401.734	1.401.734	0	0,00		0,00	
					9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 1	41.042.380	41.042.380	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (I-1) RNNº 3 - 400,6-431	8.247.098	8.247.098	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (I-2) RNNº 3 - 480-601	26.149.273	26.149.273	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (I-3) RNNº 3 - 606,3 - 614	1.750.860	1.750.860	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (I-4) RNNº 3 - 647 - 650	743.193	743.193	0	0,00		0,00	
						62 Obra de Refuerzo (I-12) RNNº 252 - 0-6,8	1.922.378	1.922.378	0	0,00		0,00	
						66 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 20-21	421.597	421.597	0	0,00		0,00	
						67 Obra de Refuerzo (I-16) RNNº 226 - 41-44	1.064.788	1.064.788	0	0,00		0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

						FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						68 Obra de Refuerzo (I-18) RNNº 226 - 170-173	743.193	743.193	0	0,00		0,00	
					10	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 2	67.803.174	67.803.174	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 317-340	4.838.210	4.838.210	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (II-2) RNNº 5 - 361-369	1.748.073	1.748.073	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (II-3) RNNº 5 - 424-432	1.748.073	1.748.073	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (II-4) RNNº 5 - 432-445	2.778.119	2.778.119	0	0,00		0,00	
						55 Obra de Refuerzo (II-5) RNNº 5 - 445-449	924.037	924.037	0	0,00		0,00	
						56 Obra de Refuerzo (II-6) RNNº 5 - 453-470	4.477.693	4.477.693	0	0,00		0,00	
						57 Obra de Refuerzo (II-7) RNNº 5 - 481-501	5.250.228	5.250.228	0	0,00		0,00	
						58 Obra de Refuerzo (II-8) RNNº 5 - 504-522	4.735.205	4.735.205	0	0,00		0,00	
						59 Obra de Refuerzo (II-9) RNNº 5 - 527-568	10.657.965	10.657.965	0	0,00		0,00	
						68 Obra de Refuerzo (II-19) RNNº 188 - 0-2,25	795.281	795.281	0	0,00		0,00	
						69 Obra de Refuerzo (II-20) RNNº 188 - 2,5-17	2.340.350	2.340.350	0	0,00		0,00	
						70 Obra de Refuerzo (II-21) RNNº 188 - 17-33	4.220.182	4.220.182	0	0,00		0,00	
						71 Obra de Refuerzo (II-22) RNNº 188 - 53-61	2.160.092	2.160.092	0	0,00		0,00	
						72 Obra de Refuerzo (II-23) RNNº 188 - 63-72	2.417.603	2.417.603	0	0,00		0,00	
						73 Obra de Refuerzo (II-24) RNNº 188 - 74,7-83	2.237.345	2.237.345	0	0,00		0,00	
						74 Obra de Refuerzo (II-25) RNNº 188 - 95-101	1.954.083	1.954.083	0	0,00		0,00	
						76 Obra de Refuerzo (II-27) RNNº 188 - 163-219	14.520.635	14.520.635	0	0,00		0,00	
					11	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 3	74.459.608	74.459.608	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (III-1) RNNº 8 - 294,2-304	2.406.774	2.406.774	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (III-2) RNNº 8 - 306-346	9.515.399	9.515.399	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (III-3) RNNº 8 - 381,1-381,4	362.473	362.473	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (III-4) RNNº 8 - 387,8-389,6	438.955	438.955	0	0,00		0,00	
						55 Obra de Refuerzo (III-5) RNNº 8 - 480-497	2.500.927	2.500.927	0	0,00		0,00	
						56 Obra de Refuerzo (III-6) RNNº 8 - 512-569	13.516.943	13.516.943	0	0,00		0,00	
						57 Obra de Refuerzo (III-7) RNNº 8 - 656,2-656,6	464.467	464.467	0	0,00		0,00	
						58 Obra de Refuerzo (III-8) RNNº 8 - 657-666	2.218.466	2.218.466	0	0,00		0,00	
						73 Obra de Refuerzo (III-23) RNNº 7 - 392,4-423,4	5.937.547	5.937.547	0	0,00		0,00	
						74 Obra de Refuerzo (III-24) RNNº 7 - 457-474	4.101.545	4.101.545	0	0,00		0,00	
						75 Obra de Refuerzo (III-25) RNNº 7 - 492-573	15.352.946	15.352.946	0	0,00		0,00	
						76 Obra de Refuerzo (III-26) RNNº 7 - 603,6-654	11.963.402	11.963.402	0	0,00		0,00	
						77 Obra de Refuerzo (III-27) RNNº 7 - 882-900	2.642.159	2.642.159	0	0,00		0,00	
						78 Obra de Refuerzo (III-28) RNNº 7 - 944,2-965	3.037.605	3.037.605	0	0,00		0,00	
					12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 4	71.678.297	71.678.297	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (IV-1) RNNº 34 - 129-151	5.684.709	5.684.709	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (IV-2) RNNº 34 - 188-217	7.461.661	7.461.661	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (IV-3) RNNº 34 - 274-299	6.446.260	6.446.260	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (IV-4) RNNº 34 - 397-399	607.702	607.702	0	0,00		0,00	
						66 Obra de Refuerzo (IV-17) RNNº 38 - 21,5-22,5	480.776	480.776	0	0,00		0,00	
						67 Obra de Refuerzo (IV-18) RNNº 38 - 93,5-102,6	1.832.530	1.832.530	0	0,00		0,00	
						68 Obra de Refuerzo (IV-19) RNNº 38 - 109,4-112,6	912.322	912.322	0	0,00		0,00	
						76 Obra de Refuerzo (IV-31) RNNº 19 - 0-78,4	24.977.337	24.977.337	0	0,00		0,00	
						77 Obra de Refuerzo (IV-32) RNNº 19 - 78,4-105	10.228.630	10.228.630	0	0,00		0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

						FINANCIERO			FISICO				
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
						78 Obra de Refuerzo (IV-33) RNNº 19 -154-188	13.046.370	13.046.370	0	0,00		0,00	
					13	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 5	46.694.803	46.694.803	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (V-1) RNNº 11 327-336	1.039.738	1.039.738	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (V-2) RNNº 11 337-339,1	736.597	736.597	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (V-3) RNNº 11 340,5-413	18.414.769	18.414.769	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (V-4) RNNº 11 458,8-463,95	880.589	880.589	0	0,00		0,00	
						55 Obra de Refuerzo (V-5) RNNº 11 465,45-470,7	895.746	895.746	0	0,00		0,00	
						56 Obra de Refuerzo (V-6) RNNº 11661-684	8.234.284	8.234.284	0	0,00		0,00	
						57 Obra de Refuerzo (V-7) RNNº 11 723-730	2.221.988	2.221.988	0	0,00		0,00	
						58 Obra de Refuerzo (V-8) RNNº 11 747-787	14.271.092	14.271.092	0	0,00		0,00	
					14	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 6	26.439.772	26.439.772	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (VI-1) RNNº 12 - 880-881	406.739	406.739	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VI-2) RNNº 12 - 889-892	1.020.215	1.020.215	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VI-3) RNNº 12 -1027-1130	15.897.008	15.897.008	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VI-4) RNNº 12 - 1349,5-1350	787.251	787.251	0	0,00		0,00	
						67 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 35-56	3.320.750	3.320.750	0	0,00		0,00	
						68 Obra de Refuerzo (VI-16) RNNº 16 - 89-113	5.007.809	5.007.809	0	0,00		0,00	
					15	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7	75.032.962	75.032.962	0	0,00		0,00	
						51 Obra de Refuerzo (VII-1) RNNº 34 - 398,65-429,6	11.391.133	11.391.133	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VII-2) RNNº 34 - 429,6-436	1.967.872	1.967.872	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VII-3) RNNº 34 - 440-455	4.477.823	4.477.823	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VII-4) RNNº 34 - 507-512	1.194.456	1.194.456	0	0,00		0,00	
						56 Obra de Refuerzo (VII-6) RNNº 34 - 523-530	2.142.984	2.142.984	0	0,00		0,00	
						57 Obra de Refuerzo (VII-7) RNNº 34 - 568,5-584	4.623.750	4.623.750	0	0,00		0,00	
						58 Obra de Refuerzo (VII-8) RNNº 34 -676-679	1.851.130	1.851.130	0	0,00		0,00	
						60 Obra de Refuerzo (VII-10) RNNº 34 - 696-699,9	1.238.235	1.238.235	0	0,00		0,00	
						61 Obra de Refuerzo (VII-11) RNNº 34 - 702,4-710	1.763.573	1.763.573	0	0,00		0,00	
						62 Obra de Refuerzo (VII-12) RNNº 34 - 710-725	5.572.278	5.572.278	0	0,00		0,00	
						63 Obra de Refuerzo (VII-13) RNNº 9 -1280-1285	1.924.093	1.924.093	0	0,00		0,00	
						64 Obra de Refuerzo (VII-14) RNNº 9 1329-1357,7	12.664.350	12.664.350	0	0,00		0,00	
						65 Obra de Refuerzo (VII-15) RNNº 9 1357,7-1366	1.916.797	1.916.797	0	0,00		0,00	
						66 Obra de Refuerzo (VII-16) RNNº 9 1366-1374	3.018.479	3.018.479	0	0,00		0,00	
						67 Obra de Refuerzo (VII-17) RNNº 9 1500-1525	9.220.463	9.220.463	0	0,00		0,00	
						68 Obra de Refuerzo (VII-18) RNNº 34 1130-1132	683.711	683.711	0	0,00		0,00	
						69 Obra de Refuerzo (VII-19) RNNº 34 1136,6-1142	2.070.021	2.070.021	0	0,00		0,00	
						70 Obra de Refuerzo (VII-20) RNNº 34 1148,8-1150,5	596.154	596.154	0	0,00		0,00	
						71 Obra de Refuerzo (VII-21) RNNº 34 1177,4-1180,5	778.563	778.563	0	0,00		0,00	
						72 Obra de Refuerzo (VII-22) RNNº 34 1180,5-1196,5	5.937.097	5.937.097	0	0,00		0,00	
					16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 8	37.355.082	27.355.082	0	0,00		0,00	
						52 Obra de Refuerzo (VIII-2) RNNº 33 563-580	3.269.434	3.269.434	0	0,00		0,00	
						53 Obra de Refuerzo (VIII-3) RNNº 33 636,5-636-8	14.803.046	4.803.046	0	0,00		0,00	
						54 Obra de Refuerzo (VIII-4) RNNº 33 745-769,69	3.552.353	3.552.353	0	0,00		0,00	
						63 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 534-575 Obra 1,1,	4.868.003	4.868.003	0	0,00		0,00	
						64 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 33 km 575-675 Obra 1,2,	2.600.000	2.600.000	0	0,00		0,00	

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION

Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
71	336	1				65 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 327-395 Obra 1,3,	5.236.080	5.236.080	0	0,00		0,00	
						66 Obra de Refuerzo (VIII-8) RNNº 9 km 395-446 Obra 1,4,	3.026.166	3.026.166	0	0,00		0,00	
						21 Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas	28.953.755	28.953.755	0	0,00		0,00	
						51 Obras Mejorativas en Autovia Luján Casares- Luján Mercedes RN Nº 5 Km 65-75 Merce	6.055.537	6.055.537	0	0,00		0,00	
						52 Obras Mejorativas en: "Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto - Cói	22.898.218	22.898.218	0	0,00		0,00	
						22 Obras de Refuerzo de Infraestructura en Corredor Vial 7 (II	15.819.340	15.819.340	0	0,00		0,00	
						57 Obra de Refuerzo (VII-56) RNNº 9 106-157 Descendente	10.212.007	10.212.007	0	0,00		0,00	
						58 Obra de Refuerzo (VII-57) RNNº 9 157-188 Descendente	5.607.333	5.607.333	0	0,00		0,00	
						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva							
						MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA							
75	350	1				Actividades Centrales							
						2 Acondicionamiento del Edificio Central	729.276	729.276	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Implementación de Sistemas de Seguridad	729.276	729.276	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						3 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova	35.000.000	35.000.000	0	0,00	33,50	0,00	0,00
						51 Remodelación y Ampliación Nueva Sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova	35.000.000	35.000.000	0	0,00	33,50	0,00	0,00
						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social							
						MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL							
						Actividades Centrales							
						2 Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 114	0	600.000	0	46,86	53,14	0,00	0,00
						51 Remodelación de Edificio de Avenida Callao Nº 115	0	600.000	0	46,86	53,14	0,00	0,00
80	850	1				3 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Pasajes de Estructura Metálica	1.200.000	3.850.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						5 Reparación Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	39.790	0,00	75,00	0,00	0,00
						51 Reparación Pisos 2, 3 y 4 de Edificio Callao Nº 114	3.900.000	3.900.000	39.790	0,00	75,00	0,00	0,00
						22 Regularización del Trabajo							
						6 Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						51 Construcción de Agencias Territoriales	4.900.000	2.500.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
						ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
						Actividades Centrales							
						6 Construcción y Ampliación UDAI (Etapa II)	7.650.000	7.650.000	0	0,00	44,47	0,00	0,00
80	852	16				52 Construcción UDAI - El Dorado	1.125.000	1.125.000	0	0,00	75,00	0,00	0,00
						53 Construcción UDAI - Orán	1.200.000	1.200.000	0	0,00	40,00	0,00	0,00
						54 Construcción UDAI - Salta	1.875.000	1.875.000	0	0,00	50,00	0,00	0,00
						55 Construcción UDAI - Las Heras	350.000	350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 Construcción UDAI - Puerto Deseado	800.000	800.000	0	0,00	61,54	0,00	0,00
						57 Construcción UDAI - Viedma	800.000	800.000	0	0,00	34,78	0,00	0,00
						58 Construcción y Ampliación UDAI - Jujuy	1.500.000	1.500.000	0	0,00	37,50	0,00	0,00
						7 Construcción Jardin Maternal	0	0	0	15,00	85,00	0,00	0,00
						51 Construcción Jardin Maternal	0	0	0	15,00	85,00	0,00	0,00
						SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO							
80						Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo							
						1 Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00
						51 Adquisición y Adecución de Inmueble para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo	27.000.000	27.000.000	0	0,00	77,00	0,00	0,00
						Ministerio de Salud							

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crédito	%	Programad	Ejecutado	%
							Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
								31/03/2009	al 31/03/2009	31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
310						MINISTERIO DE SALUD							
		26				Cobertura de Emergencias Sanitarias							
				1		Refuncionalización Hangar y Áreas Periféricas de Emergencia	360.000	360.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00
				51		Climatización Edilicia, Red Cloacal y Refuncionalización de Hangar	360.000	360.000	0	0,00	64,00	0,00	0,00
903						HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER							
		53				Atención a Enfermos							
				6		Remodelación y Equipamiento de Pabellones	425.000	750.000	0	32,00	68,00	0,00	0,00
				53		Remodelación de Pabellón N° 4	0	750.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				55		Refacción Integral de Pabellones N° 3, 5 y 8 Hospital Nacional Sommer	425.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
				7		Remodelación y Equipamiento de Pabellones. Etapa II	0	145.100	145.044	100,00	0,00	99,00	
				52		Remodelación de Usina	0	145.100	145.044	100,00	0,00	99,00	
				10		Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Sommer	1.500.000	990.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				16		Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	376.100	64.835	87,00	13,00	17,00	130,77
				51		Refuncionalización del Pabellón de Clínicas	0	376.100	64.835	87,00	13,00	17,00	130,77
				17		Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	59.610	43,00	57,00	42,00	73,68
				51		Refuncionalización de Farmacia	0	141.320	59.610	43,00	57,00	42,00	73,68
906						ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN							
		56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud							
				3		Puesta en Valor y Adecuacuación de Distintas Areas del Edificio Central de ANLIS	3.715.000	5.295.000	12.692	35,00	65,00	0,00	0,00
				52		Refuncionalización para Espacios Académicos de la Torre Tanque	3.665.000	5.225.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				54		Adecuación de los Servicios de Higiene, Seguridad y Arquitectura	50.000	70.000	12.692	100,00	0,00	0,00	
				2		Invest., Docen. y Serv. en Infecc. Bacte.r, Micóticas., Parasitaria y Virología							
				2		Remodelación de Laboratorios del Departamento Virología	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00
				51		Remodelación del Servicio de Cultivo de Tejidos	30.000	126.283	96.283	50,00	50,00	0,00	0,00
				8		Capac. y Serv. Epidemiológicos y de Infecc. Intrahospitalarias							
				4		Mejoramietno Edilicio INE "Dr. Juan H. Jara" Etapa II	1.800.000	2.420.000	0	30,00	70,00	0,00	0,00
				51		Mejoramietno Edilicio Externo	1.800.000	2.420.000	0	30,00	70,00	0,00	0,00
909						COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA							
		59				Atención de Pacientes							
				4		Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	1.400.000	84.657	0,00	100,00	6,05	6,05
				51		Refacción Pabellones 1, 4, 5 y 6	1.400.000	1.400.000	84.657	0,00	100,00	6,05	6,05
				5		Refacción Integral Pabellón 8	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Refacción Integral Pabellón 8	600.000	600.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				6		Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	218.098	13,60	86,40	72,55	83,97
				51		Refacción Lavadero Central	350.000	350.000	218.098	13,60	86,40	72,55	83,97
				7		Refacción Integral de Cocina Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Refacción Integral Cocina Central	400.000	400.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00
910						INST. NAC. DE REHAB. PSICOF. DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE							
		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos							
				1		Construcción Natatorio	0	589.000	0	72,65	27,35	0,00	
				51		Construcción Natatorio	0	589.000	0	72,65	27,35	0,00	
				9		Remodelación Cocina	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00
				51		Remodelación Cocina	400.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00

CUADRO C
INVERSION REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSION
 Al 31/03/2009

							FINANCIERO			FISICO			
							Crédito	Crédito	Crádito	%	Programad	Ejecutado	%
Jur	Serv	Prog	Sprg	Proy	Ob	Descripcion	Original	Vigente al	Devengado	Acumulado al	o DADC	al	Ejec./Progr.
85						Ministerio de Desarrollo Social				31/12/2008	2009	31/03/2009	anual
	311					MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL							
		17				Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento							
				7		Construcción Instalaciones	13.550.000	11.025.000	0	0,00	0,00	0,00	
					51	Reposición Césped Sintético - Ce.N.A.R.D.	3.100.000	3.100.000	0	0,00	0,00	0,00	
					54	Construcción Plaza Acceso y Acreditaciones- Ce.N.A.R.D.	1.878.000	1.878.000	0	0,00	0,00	0,00	
					57	Mejoramiento Instalaciones Generales - Ce.N.A.R.D	6.418.000	3.893.000	0	0,00	0,00	0,00	
					58	Centro de Transformación Media Tensión- Ce.N.A.R.D.	2.154.000	2.154.000	0	0,00	0,00	0,00	
				9		Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	0,00	0,00	
					52	Mejoramiento Asfalto y Construcción de Planta de Tratamiento	4.900.000	4.900.000	0	0,00	0,00	0,00	
Totales sin Vialidad							4.881.415.196	4.788.083.388	384.690.230				
Totales con Vialidad							10.388.205.275	10.280.337.064	1.605.135.289				

(*) La ejecución de los proyectos se informa al cierre del ejercicio.

(**) El devengado corresponde a pago de honorarios y trabajos previos.

(***) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas o adicionales de obra que no superen el 20%

(****) Proyecto suspendido

(1)Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2009

(2) Proyectos y obras con ejecución en años anteriores y se pidió la reapertura.

(3) Este proyecto terminó su ejecución en el ejercicio 2007/2008, se pidió la reapertura, debido a que se contrató un adicional de obra, dentro del marco de la Ley de Obras Públicas.

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs		
MANTENIMIENTO																					
Mantenimiento por Administración																					
16	1	1	51	PAIS	vs	Mantenimiento por Administración	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	69.397	69.397	69.397	28.819	25,0%	25,0%	6			
16	1	2	51	PAIS	varias	Compra de Materiales para Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	18.317	18.317	18.317	12.896	25,0%	25,0%	6			
Total Mantenimiento por Administración														87.713	87.713	41.714					
Mantenimiento por Contrato																					
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martín-Mendoza/André-Emp. R.20	Varias (Sistema Km-Mes)	11	194,7	22/08/95	17/02/07	11.831	1.199	1.199	0	0,0%	100,0%	8			
16	2	10	51	CHACO	86-95	Tres Isletas - Emp. RNN°86 / Emp. RN°11 - Villa Gral Guemes	Km 1167,24-km 1373,73/km 1290,62-km 1488 (km-Mes)	11	403,4	29/04/97	27/03/04	3.616	154	154	0	0,0%	100,0%	8			
Total Mantenimiento por Contrato														1.353	1.353	0					
Mantenimiento por Convenio con Provincias																					
16	3	24	51	LA PAMPA	43,151,152	TFO La Pampa - Convenio 11	TFO La Pampa - Convenio 11	11	633,3	01/01/08	30/12/09	5.032	2.141	2.141	709	17,9%	50,6%	6	A		
16	3	25	51	NEUQUEN	242,40	TFO Neuquen - Convenio 11	Catan Lil - Lte. con Mendoza / Las Lajas - Lte. con Chile	11	528,4	01/01/08	30/12/09	10.944	4.504	4.504	735	4,3%	33,4%	6	F		
16	3	26	51	RIO NEGRO	23 - 250	TFO Río Negro - Convenio 11	TFO Río Negro - Convenio 11	11	1.171,4	01/01/08	30/12/09	15.088	6.356	6.356	1.077	5,9%	37,7%	6	A - D		
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3-40-281-28	TFO - Santa Cruz - Convenio 11		11	2.207,3	01/07/08	30/12/09	40.989	21.305	21.305	0	14,6%	52,6%	6	A - H		
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	- Comp. A,b	TFO Tierra del Fuego Convenio N 10		11	350,3	01/01/08	30/12/09	15.270	5.054	5.054	335	4,2%	23,1%	6	A - F		
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy - Convenio 11	Tramos Varios	11	552,5	01/01/08	30/12/09	7.779	1.681	1.681	0	6,6%	30,6%	6	A - D		
16	3	31	51	SALTA	40 - 51	TFO Salta - Convenio 12		11	480,6				121	2.630	2.628	0,0%	0,0%	12			
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	116,0	01/07/08	30/06/10	10.001	2.528	2.528	0	12,5%	33,4%	6	A - D		
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acceso al Remanso (T.F.O.)	Fortín Pilcomayo - Media Luna - Río Muerto	11	126,0	04/05/07	02/05/09	2.176	868	868	192	13,4%	93,7%	6	H		
16	3	34	51	MENDOZA	40S - 145	TFO Mendoza Convenio 6	Tramos varios	11	266,7	01/04/04	31/03/06	4.895	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
16	3	36	51	CHUBUT	26 - S1 - 40	TFO Chubut - Convenio 9	Tramos varios	11	537,2				2.336	2.336	56	0,0%	0,0%	12			
16	3	37	51	LA RIOJA	40 - 76- 78	TFO La Rioja - Convenio 9	TFO La Rioja - Convenio 9	11	379,6	01/12/08	30/11/09	5.486	2.030	2.030	0	11,5%	11,5%	6	A - D		
16	3	38	51	CHACO	P13- EX.89	TFO Chaco - Convenio 3	Emp. RNN° 11 - Cote Lai	11	208,6	01/01/08	30/12/09	5.006	1.018	1.018	469	8,8%	29,2%	6	F		
16	3	39	51	TUCUMAN	9 - 38	TFO Tucumán - Convenio N 7		11	67,4	01/01/08	30/12/09	3.000	511	511	0	12,5%	58,3%	6	A - D		
16	3	42	51	SAN JUAN	150	TFO San Juan	Arrequeintín Lte. con Chile	11	30,0	01/04/09	30/03/12	6.000	1.557	1.557	0	0,0%	0,0%	0			
16	3		51	SANTA CRUZ	3-40-281-28	TFO - Santa Cruz - Convenio 10	I - II : Prog. 2,13 - Prog. 126,5	11	2.207,3	01/01/07	30/06/08	50.000				0,0%	98,2%	7			
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias														52.130	54.639	6.200					
Señalamiento Horizontal																					
16	4	1	51	PAIS	Vs	Señalamiento Horizontal - Nacional	País	12		01/01/09	31/12/09	21.599	15.789	33.595	32.531	25,0%	25,0%	6			
Obras de Emergencia																					
16	5	1	51	PAIS	Varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/09	31/12/09	12.146	12.146	30.776	22.883	25,0%	25,0%	6			
16	5	2	51	PAIS	Varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	3.448	2.429	7.236	7.123	25,0%	25,0%	6			
16	5	3	51	PAIS	Vs	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	1.700	1.700	0	25,1%	25,1%	6				
16	5	4	51	PAIS	Varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/09	31/12/09	5.000	1.822	5.000	1.117	25,0%	25,0%	6			
Total Obras de Emergencia														18.097	44.712	31.124					
Mantenimiento por Sistema Modular																					
16	6	1	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Límite con Chile	Km 1324,22 - km 1578,4 - Sistema Modular	11	254,2	19/07/04	17/07/08	6.162	341	451	424	0,0%	99,4%	8			
16	6	3	51	CHACO	16	Empalme RNN° 95 - Límite Chaco/Salta	Km 177,21 - km 504,73 - Sistema Modular	11	327,5	03/12/04	01/12/08	8.647	534	534	354	0,0%	84,7%	7			
16	6	4	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme RNN°40 (S)	Km 313,74 - km 591,38 - Sistema Modular	11	277,6	03/05/04	01/11/07	10.021	121	121	0	0,0%	69,3%	7			
16	6	5	51	CHUBUT	40S	Empalme RNN°25 - Emp. RPN°56 (Río Senguer)	Km 1547,76 - km 1836,82 - Sistema Modular	11	289,1	07/09/04	06/11/07	9.342	153	153	0	0,0%	100,0%	8			
16	6	6	51	CHUBUT	40-260	Empalme RPN°22-Lte.c/Chubut/Sta Cruz / Emp.RNN°40-Lte. c/Chile	Km 1936,27 (1937,1) - km 1978,35 (km 1979,15) / km 0 - km 105	11	147,1	22/01/07	20/01/11	26.068	1.246	1.246	14	16,0%	41,1%	6			
16	6	8	51	MENDOZA	142 - 40 - 7	Gustavo Andre - Empalme RNN°20 / Mendoza - Lte. San Juan / S.Martín - M	Km 35-km 112,5 / km 3,27-km 80,83 / km 997,4-km 1041,8	11	199,5	01/01/07	30/12/10	12.906	1.674	2.090	1.908	8,7%	85,1%	6			
16	6	9	51	MENDOZA	40S	Pareditas - Malargüe	Km 121,26 - km 350,90 - Sistema Modular	11	229,6	17/03/05	15/03/09	16.328	1.154	1.154	506	6,7%	93,9%	6			
16	6	10	51	SANTA FE	A007	Av. Blas Parera - A Nivel RNN°11 - A Nivel RNN°11- Calle Juan de Garay	Km 0-km 7,23 / km 0-km 4,59 / km 0-km 2,58 - Sistema Modular	11	14,4	21/07/05	19/07/08	9.899	1.072	1.650	1.650	0,0%	98,8%	7			
16	6	11	51	SALTA	16	Límite con Chaco - Empalme RNN°9-34	Km 502,92 - km 707,32 - Sistema Modular	11	204,4	14/07/04	12/07/09	21.349	1.093	3.094	2.368	8,2%	84,1%	6			
16	6	12	51	SALTA	34 - 81	Empalme RNN°50 - Límite con Bolivia / Pluma de Pato - Empalme RNN°34	Km 1329,12-km 1488,40 / km 1763,6-km 1863,30 - Sistema Modular	11	249,3	15/04/04	13/11/07	7.792	228	228	0	0,0%	100,0%	8	A-C		
16	6	19	51	BUENOS AIRES	3	Emplame RPN°4 - Empalme RPN°6	Km 18,90 - km 61,87 - Sistema Modular	11	43,0	01/11/09	31/10/11	7.037	6.073	6.073	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	20	51	BUENOS AIRES	A001	Acceso Sudeste		11	7,3	01/11/09	31/10/11	6.000	8.502	8.502	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	21	51	MISIONES	12	Acceso Aeropuerto Gral. San Martín - Empalme RNN°105	Km 1336 - km 1349	11	13,2	01/11/09	31/10/10	1.500	177	177	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	22	51	SALTA	40	Secdantas - Empalme RNN°51	Km 4470,52 - km 4630,87	11	160,4	21/02/08	19/02/10	8.161	2.186	2.186	838	16,8%	73,9%	6			
16	6	23	51	SALTA	51 - 40	Campo Quijano - Límite con Chile / San Antonio de los Cobres - Límite con J	Km 26,39 - Km 296,44 / km 4607,03 - 4666,62	11	329,6	01/11/07	30/10/09	11.859	2.147	2.147	1.715	17,4%	96,4%	6			
16	6	24	51	CHUBUT	25	Los Altares - Empalme RNN°40 (Tecka)	Km 313,74 - km 528,67	11	214,9	20/11/07	18/11/09	13.385	4.573	4.573	230	19,7%	62,9%	6			
16	6	25	51	CHUBUT	40	Empalme RNN°25 - Empalme RPN°56 (Tamarisco)	Km 1556,60- km 1815,71	11	272,1	01/05/08	30/04/10	24.571	6.073	6.073	346	13,2%	37,2%	6			
16	6	26	51	CHUBUT	26 - 40	Empalme (Ex) RNN°26 - Empalme RNN°40	Km 102,47 - km 210,17 / km 1366,77 - km 1467,67	11	208,6	21/01/08	19/01/10	19.103	5.830	5.830	2.158	11,4%	46,7%	6			
16	6	27	51	BUENOS AIRES	S/N	Mantenimiento, Vigilancia y Seguridad Integral - Puentes Accesos a Ciudad A	Pte. Nuevo Pueyrredon y Pte. Avellaneda	11	1,0	06/06/07	04/06/10	58.175	6.073	6.073	3.466	13,3%	64,3%	6			
16	6	29	51	MENDOZA	40 - 145	Límite Neuquén - Malargüe y B. Blancas - Acceso C Grande		11	257,4	01/06/09	31/05/11	30.124	6.395	6.395	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	31	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar		8	68,0	01/06/09	31/05/11	10.000	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0			
16	6	32	51	FORMOSA	81	Ls Lomitas - Lte. c/Salta		8	215,0	01/06/09	31/05/11	11.000	4.251	4.251	0	0,0%	0,0%	0			

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado a 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs	
16	6	33	51	ENTRE RIOS	S/N	Camino Gotte a RNN°12 Bovril Entre Ríos		8		01/06/09	31/05/11	1.400	208	208	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	34	51	SAN JUAN	40-150	Lte. c/ La Rioja - Huaco/San Roque - Arrequintin		8	140,0	01/11/09	31/10/11	6.000	2.336	2.336	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	35	51	BUENOS AIRES		Puente s/ El Riachuelo Nicolás Avellaneda y Accesos	Nuevo Pte. Pueyrredon y Accesos	8	1,0	27/06/09	26/06/11	45.000	4.858	4.858	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	37	51	CATAMARCA	40,60	Empalme RNN°60 - Belen; Empalme RNN°40 - Tinogasta	Km 4000,78 - km 4073,63; km 4077,00 - km 4088,62; km 4091,72 - km 410	11	160,7	01/11/09	31/10/11	20.000	6.073	6.073	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	38	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Lte. c/Chile	Km 1324,22 - km 1578,40	11	254,2	01/11/09	31/10/11	30.000	9.109	9.109	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	40	51	CHUBUT	40-260	Emp. RPN°26 - Lte. /Chubut/ Santa Cruz	Km 1936,27 - km 1978,35; km 0,00 - km 105,00	8	147,1	22/04/09	21/04/11	8.000	2.922	2.922	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	41	51	MENDOZA	40	Pareditas - Malargüe	Km 121,27 - km 350,91	8	229,6	01/11/09	31/10/11	22.000	4.858	4.858	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	42	51	MENDOZA	142-40-7	G. Andre - Emp. RNN°20/ Mendoza - Lte. c/San Juan	Km 35 - km 112,5; km 3,27 - km 80,83; km 997,4 - km 1037	8	194,7	01/04/09	31/03/11	15.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	43	51	SALTA	40-51	San Antonio de los Cobres - Lte. c/ Jujuy	Km 4607,03 - km 4666,62; km 26,39 - km 296,44	8	329,6	01/11/09	31/10/11	12.000	2.429	2.429	0	0,0%	0,0%	0	A - C	
16	6	45	51	SALTA	16	Lte. c/ Chaco - Emp. RNN°9/34	Km 502,92 - km 707,32 Sistema Modular	11	204,4	01/11/09	31/10/11	25.000	7.287	7.287	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	46	51	SANTA FE	A007	Av. B. Parera - A Nivel RNN°11	Km 0,00 - km 7,23	8	9,8	01/11/09	31/10/11	15.000	4.858	4.858	0	0,0%	0,0%	0		
16	6	47	51	SGO DEL ESTERO		Empalme RNN°95 - Lte. c/ Chaco y Salta	Km 176,33 - km 502,92	8	326,6	01/04/09	31/03/11	10.000	3.401	3.401	0	0,0%	0,0%	0		
Total Sistema Modular													114.004	117.108	15.976					
Obras de Seguridad Vial																				
16	7	1	51	FORMOSA	11	Corredor 1 (200 km)		17	200,0	01/11/09	31/10/11	15.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	2	51	LA PAMPA	35	Corredor 2 (200 km)		17	200,0	01/11/09	02/05/10	11.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	4	51	CORRIENTES	14	Corredor 4 (30 km)		17	30,0	01/11/09	01/09/10	8.292	332	332	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	53	BUENOS AIRES	33	Acceso a Carhue (I) y Espartillador (D)		17	1,0	01/11/09	02/03/10	2.300	208	208	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	5	54	BUENOS AIRES	33	Acceso a 30 de Agosto		17	1,0	01/11/09	02/03/10	2.000	272	272	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	6	53	ENTRE RIOS	127	Readecuación Intersección c/RPN°6, RPN°2 y Acceso a Bovril	Intersección RNN°127 - RPN°2 - Acceso Bovril	17	5,5	16/04/07	15/05/09	15.645	2.186	2.186	813	6,1%	79,6%	6		
16	7	6	55	ENTRE RIOS	127	Cruce Urbano en San Jaime de la Frontera		17	1,0	01/11/09	01/10/10	2.000	213	213	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	51	RIO NEGRO	3	Cruce con RNN°251-Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex Ilum)		17	1,0	01/11/09	02/04/10	11.488	1.040	1.040	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	7	52	RIO NEGRO	3	Tratamiento de la Circulación Nocturna (Ex iluminación)		17	1,0	01/11/09	02/04/10	300	34	34	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	8	52	NEUQUEN	237	Piedra del Aguila (Prog Inic. 1444,38) - Travesía Urbana		17	1,0	01/11/09	02/04/10	600	109	109	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	51	CHACO	95	Acceso Norte a Villa Angela (Prog. Inic. 1018,83)		17	5,4	01/11/09	02/05/10	1.200	1.698	1.698	1.403	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	52	CHACO	95	Acceso a Saenz Peña (Prog. Inic. 1112,88)		5	1,0	01/11/09	02/05/10	600	486	486	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	53	CHACO	95	Empalme RPN°6 (Prog. Inic. 1054,6)		5	1,0	17/10/08	17/04/09	1.790	486	486	261	64,0%	93,5%	6		
16	7	9	54	SANTA FE	98	Tostado - Villa Minetti	Km 155,79 - km 155,87	17	1,0	10/06/08	10/03/09	6.752	1.362	1.362	1.919	42,3%	84,5%	6		
16	7	9	55	CORRIENTES	95	Intersección con RN°95 y RPN°2		17	1,0	01/11/09	02/05/10	1.800	283	283	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	9	58	FORMOSA	11	Intersección c/RNN°81	(Prog.Inic. 1184) Int. e iluminación	17	1,0	01/11/09	02/07/10	3.000	318	318	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	51	SGO DEL ESTERO	89	Empalme RPN°116-Intersección en T Sucesiva en Empalme c/RNN°116		17	1,0	01/11/09	02/05/10	450	191	4.505	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	10	52	SAN LUIS	20 - 79	Intersección RNN°20 y RNN°79	Obra Puntual de Seguridad Vial	17	1,0	24/05/08	22/01/09	4.091	72	72	3.163	6,1%	89,5%	7		
16	7	10	53	CORDOBA	9	Jesús María - San José de la Dormida	Emp. RNN°60 (Alto Nivel Emp. RNN°9)	17	1,0	07/11/06	07/05/08	11.932	72	72	0	0,0%	100,0%	7		
16	7	11	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección I :Int. RPN°7 - Int. RPN°60	8	12,2	01/08/08	01/08/09	8.680	923	923	0	2,5%	3,5%	6		
16	7	12	51	MENDOZA	40	Intersección RNN°7 (El Cóndor) - Luján de Cuyo	Sección II :Int. RPN°60 - Int. RPN°2	8	4,0	01/11/09	01/06/10	3.500	662	662	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	13	51	CORRIENTES	14	RPN°40 - Gobernador Virasoro	Paso por Virasoro	17	4,0	01/11/09	01/06/10	7.000	634	634	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	14	51	BUENOS AIRES	33	Naposta - Tornquist	Acceso a Tornquist	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	15	51	BUENOS AIRES	33	A. Cochenleofu Chico - Pigüé	Acceso a Goyena y Cruce FFCC Roca	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	16	51	BUENOS AIRES	35	San German - Limite con La Pampa	Acceso a Villa Iris	17	5,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	17	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme RPN°7	Intersección con RNN°127	17	1,0	01/11/09	02/03/10	2.500	453	453	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	18	51	RIO NEGRO	151	Intersección RNN°151 - RPN°69		17	1,0				810	810	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	19	51	RIO NEGRO	151	Barda del Medio - Colonia Catriel	Km 28,95 (Acceso a Dique Ballester)	17	1,0				302	302	0	0,0%	0,0%	12		
16	7	20	51	RIO NEGRO	22	Emp. RPN°406 - Choele Choe	Km 994,2 -km 995,7	17	1,5	01/11/09	02/05/10	3.000	363	363	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	21	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - San Martín de los Andes	Paso por Junin de los Andes	17	1,6	01/11/09	02/05/10	10.000	906	906	0	0,0%	0,0%	0	A	
16	7	22	51	CHACO		Resistencia - Empalme RPN°90	Acceso a Colonia Benítez	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	23	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme RPN°90	Acceso a Margarita Belen	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	24	51	CHACO	11	Resistencia - Empalme RPN°90	Empalme RPN°90	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	25	51	CHACO	11	Empalme RPN°90 - Lte. Chaco / Formosa	Acceso a la Leonesa	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	26	51	SGO DEL ESTERO	34	Colonia Dora - Taboada - Travesía Urbana por Lugones	Km 613,030 - km 615,030	17	1,8	24/06/08	23/09/08	1.401	502	502	0	0,0%	99,4%	7		
16	7	27	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Herrera		17	1,0	01/11/09	02/04/10	3.000	636	636	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	28	51	SGO DEL ESTERO	34	Travesía Urbana por Taboada		17	1,0	01/11/09	02/03/10	3.000	636	636	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	29	51	SGO DEL ESTERO	34	Empalme RPN°5 - Pozo Hondo	Empalme RPN°5	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	30	51	SGO DEL ESTERO	89	Lte. con Chaco - Quimilí	Empalme RPN°92	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	31	51	CORDOBA	38	Villa de Soto - Río Pichanas	Paso Viejo	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	32	51	SANTA FE	9	Empalme RNN°A008 - Emp. RNN°A012	Paso por Funes (Semaforización y Señalización Horizontal y Vertical)	17	1,0	01/11/09	02/05/10	800	113	113	0	0,0%	0,0%	0		
16	7	33	51	CATAMARCA	38	Empalme RPN°27 - Lte. con Tucuman	Empalme RNN°64													

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
16	7	43	51	LA RIOJA	38	Chañar - Punta de los Llanos	Paso por Chemical	17	2,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	44	51	LA RIOJA	38	Punta de los Llanos - Empalme RNN°74	Empalme RNN°150 - Emp. RNN°74	17	1,0	01/11/09	02/07/10	5.000	453	453	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	45	51	LA RIOJA	76	Villa Union - Villa S.J. de Vinchina		17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	46	51	LA RIOJA		Desiderio Tello - Milagro	Acceso a Milagro	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	47	51	LA RIOJA	79	Olta - Chamental	Acceso a Olta	17	1,0	01/11/09	02/05/10	2.500	302	302	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	48	51	SANTA FE	9	Travesía Urbana por Funes		8	2,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	49	51	FORMOSA	11	Iluminación Paso por la Ciudad de Clorinda		8	1,5	01/11/09	31/10/11	4.500	159	159	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	50	51	JUJUY	9	RNN° 9 Mejoramiento de Acceso Circunvalación Vial Humahuaca		8	1,0	01/07/09	30/06/11	2.000	70	70	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	51	51	JUJUY	9	Río Leon - Empalme RNN°52	Tumbaya (km 1730,00 - km 1732,50)	17	2,5	01/08/09	30/01/10	350	50	50	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	52	51	JUJUY	9	Lte. Salta/ Jujuy - El Carmen	Acceso a Camping - El Carmen (km 1663,26 - km 1666,44)	8	2,8	01/06/09	30/01/10	2.950	120	120	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	53	51	JUJUY	9	S.S.Jujuy - Río Leon	Acceso a los Molinos - Río Yala (Km 1698,95 - km 1705,75)	17	7,0	01/04/09	30/11/09	1.800	191	191	0	0,0%	0,0%	0	
16	7	55	51	JUJUY	9,66	S.S.de Jujuy - Río Leon y RNN°9 - El Cuarteadero	Empalme RNN°66 - Pte. Paraguay - A/N RNN°9 - Paipala	12		01/10/09	30/09/10	4.500	318	318	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras de Seguridad Vial													32.675	37.289	11.299				
Obras de Conservación Mejorativas																			
16	8	1	51	PAIS	VS	Obras Menores de Conservacion Mejorativa		14	1.000,0	01/01/09	31/12/09	3.644	3.644	3.644	0	25,0%	25,0%	6	
16	8	2	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 999,00 - km 1016,00	8	17,0	01/11/09	31/10/10	3.923	278	278	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	3	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza	Km 1016,00 - km 1036,00	8	20,0	01/11/09	31/10/10	11.272	798	798	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	4	51	CORDOBA	148	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°14	Km 925,00 - km 966,66	5	41,7	01/04/09	31/03/10	30.000	3.057	3.057	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	5	51	JUJUY	52	Empalme Ex RNN°40 - Susques	Km 62,68 - km 72,55	5	10,0	01/06/09	30/01/10	15.000	1.147	1.147	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	7	51	LA PAMPA	154	Empalme RNN°35 - Km 111	Km 0,00 - km 111	8	111,0	01/11/09	01/08/10	17.109	1.614	1.614	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	8	51	LA PAMPA	154	Km 111 - Empalme RNN°22	Km 111,00 - km 136,48	8	25,3	01/11/09	01/08/10	17.000	1.219	1.219	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	9	51	LA PAMPA	152	Empalme RPN°106 - Casa de Piedra	Km 199,34 - km 292,62	8	94,0	01/11/09	01/08/10	10.100	953	953	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	10	51	LA PAMPA	143	Empalme RPN°19 - Acceso a Limay Mahuida	Km 128,30 - km 150,90	8	22,6	01/11/09	01/08/10	15.150	1.430	1.430	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	11	51	BUENOS AIRES	AO13	Empalme RNN°3 - Empalme Ex RNN°3	Km 11,825 - km 17,755	8	6,1	01/11/09	31/10/10	10.487	742	742	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	12	51	LA RIOJA	150	Empalme RNN°38 - Empalme RNN°76	Km 0,00 - km 85,83	8	85,8	01/11/09	01/08/10	7.355	694	694	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	14	51	SGO DEL ESTERO	89	Limite con Chaco - Quimili	Km 311,49 - km 386	5	74,5	01/04/09	31/03/10	7.130	5.563	5.563	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	15	51	SGO DEL ESTERO	16	El Cabure - Monte Quemado	Km 387,69 - km 443,02	5	55,3	01/04/09	31/03/10	7.600	5.916	5.916	0	0,0%	0,0%	0	
16	8	16	51	SGO DEL ESTERO	16	Monte Quemado - Limite con Chaco	Km 443,02 - km 484,35	5	41,3	01/04/09	31/03/10	7.700	5.994	5.994	0	0,0%	0,0%	0	
Total Obras de Conservación Mejorativas													33.049	33.049	0				
Total Mantenimiento													354.811	409.458	138.844				
CONSTRUCCIONES																			
Corredores Viales I																			
22	1	3	51	NEUQUEN	231	Lago Espejo - Lte. C/Chile	Lago Espejo - Aduana - Aduana Río Pereyra II	8	6,4	21/02/01	23/03/03	12.589	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	1	4	51	JUJUY	9	Ugchara - La Quiaca	Arroyo Ugchara - Puesto del Marqués	8	33,0	03/02/97	03/03/04	9.362	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	5	51	JUJUY	9	A° Ugchara - La Quiaca	Puesto del Marques - La Quiaca	8	48,3	03/02/97	03/05/04	13.596	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
22	1	6	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección I)	Antilla - Puente de Plata	8	35,0	28/01/97	27/10/03	17.646	121	543	421	0,0%	100,0%	7	
22	1	7	51	MENDOZA	7	Destilería YPF - Potrerillos	Sección IIIª Río Cacheuta - Empalme RNN°7	8	9,8	21/02/01	20/12/08	34.711	2.010	2.010	1.529	0,0%	99,1%	7	
22	1	8	51	SALTA	34	Antilla - Rosario de la Frontera (Sección II)	Puente de Plata - Rosario de la Frontera	8	29,7	28/01/97	26/08/05	22.243	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
Total Corredores Viales I													2.617	3.039	1.950				
Pasos Fronterizos y Corredores de Integración																			
22	2	2	51	CATAMARCA	40	Río Agua Clara - Río Las Cuevas	Río Agua Clara km 809 - El Eje km 847	8	38,0	17/04/06	15/04/08	94.127	2.186	2.186	0	0,0%	100,0%	8	
22	2	3	51	CHUBUT	40S	Río Mayo - Lte. c/santa Cruz	(1940-1979)	8	46,0	01/06/09	30/05/12	60.000	3.397	3.397	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. c/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/06	17/06/09	52.802	74	3.431	1.995	5,5%	57,7%	6	
22	2	14	51	MENDOZA	40	Malargüe - Barrancas	Sección I (prog. 502 - prog. 520)	8	18,0	04/01/05	03/01/07	15.139	121	1.001	0	0,0%	100,0%	8	B
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Empalme RNN°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog 11	8	11,0	01/11/09	31/10/10	13.000	1.062	1.062	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte. con Jujuy	Km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/09	30/10/12	60.000	3.571	3.571	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	23	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. c/Chaco - El Cabure	Sección II - Los Pirpintos - El Cabure	8	29,2	17/10/06	17/03/09	52.098	74	5.970	2.066	10,4%	99,1%	6	
22	2	32	51	JUJUY	40N	Lte. con Salta - Empalme RNN°52	Prog. 1412 - Prog. 1447	8	35,0	01/11/09	31/10/11	26.400	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/07	02/08/09	166.476	21.124	21.124	12.565	10,2%	68,4%	6	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/08	04/05/09	31.740	8.787	12.388	11.043	19,6%	82,2%	6	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/09	31/10/11	18.000	1.062	1.062	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrilllos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/09	31/10/11	46.000	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	47	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Barrancas	Sección II (prog. 520 - prog. 538)	8	18,0	04/01/05	03/02/07	12.835	121	510	510	0,0%	100,0%	8	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/09	02/05/11	68.244	2.415	2.415	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	01/11/09	01/05/12	40.000	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	51	51	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Chimen Aike - km 29	8	29,0	16/12/02	14/12/04	32.003	322	4.644	0	0,0%	97,7%	7	
22	2	51	52	SANTA CRUZ	3	Chimen Aike - Monte Aymond	Km 29 - Monte Aymond	8	26,0	12/05/03	09/11/04	33.502	356	356	0	0,0%	97,5%	7	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquén (S I)	Prog. 329 - prog. 393 (Empalme RNN°145) y Vte. Chihuido	8	63,0	01/11/09	31/10/11	57.152	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
22	2	53	51	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Intersección Empalme RPN°16 - Intersección Empalme RPN°20	8	18,2	16/11/05	16/03/09	82.330	6.016	23.842	1.363	8,2%	98,5%	6	
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RPN°20 - Empalme RP°J° (Colonia Elía)	8	27,7	26/11/06	25/10/09	122.557	33.200	33.200	7.188	1,0%	41,9%	6	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RP°J° (Colonia Elía) - A° Colman	8	34,8	21/09/07	19/09/10	187.536	55.405	55.405	1.323	0,0%	14,7%	6	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Empalme RPN°29	8	33,3	28/06/07	26/06/10	249.633	77.023	77.023	14.467	5,6%	43,1%	6	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RPN°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/07	28/07/10	304.814	81.846	81.846	20.410	7,3%	38,1%	6	
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Empalme RNN°18	8	35,0	01/06/07	30/05/10	225.151	58.269	58.269	1.565	0,6%	33,7%	6	
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RNN°18 - A° Ayuí Grande	8	32,7	01/06/07	30/05/10	246.047	79.055	79.055	14.197	5,9%	40,5%	6	
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	8	34,8	29/06/07	27/06/10	220.769	54.307	54.307	8.790	6,7%	54,4%	6	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Gualeguaychu - Paso de los Libres	A° Mandisoví Grande - Río Mocoreta	8	35,9	01/06/07	30/05/10	246.858	73.410	73.410	592	6,4%	39,7%	6	
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Río Mocoretá - A° Curupicay	8	33,6	21/09/07	19/09/10	198.117	56.152	56.152	1.207	7,2%	30,5%	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Empalme RNN°127	8	29,3	21/09/07	19/09/10	166.854	44.938	44.938	3.220	4,5%	29,9%	6	
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RNN°127 - Establecimiento San Agustín	8	32,4	01/10/07	29/09/10	185.609	54.665	54.665	9.875	6,0%	29,4%	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Establecimiento San Agustín - Empalme RPN°126	8	30,4	21/09/07	19/09/10	181.991	52.413	52.413	11.257	6,9%	39,6%	6	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RPN°126 - Empalme RNN°117	8	27,6	21/09/07	19/09/10	152.712	40.434	40.434	8.351	9,9%	38,4%	6	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Empalme RNN°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/07	11/12/10	68.839	18.762	18.762	1.705	7,5%	46,0%	6	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Gualeguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/06/09	31/05/10	10.000	3.096	3.096	0	0,0%	0,0%	2	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalacion Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/09	31/10/10	10.000	884	884	0	0,0%	0,0%	0	
Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración													844.689	880.959	133.690				
Obras por Convenio con Provincias																			
22	3	1	51	PAIS	VS	Convenios con Provincias y Municipios		14	1.030,1	01/01/09	31/12/09	7.287	7.287	7.287	0	25,0%	25,0%	6	
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina-Alto Jague y B: Acceso a Alto Jague	8	39,0	04/06/99	31/05/09	80.469	3.644	3.644	778	1,5%	68,6%	6	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección I)	Punta del Agua - Laguna Mulás Muertas	8	30,0	17/05/99	11/02/09	28.697	12.146	12.146	250	0,7%	96,5%	7	
22	3	4	51	LA RIOJA	76	Punta del Agua - Pircas Negras (Sección II)	Laguna Mulás Muertas - Barrancas Blancas (2455-98)	8	46,1	17/05/99	12/01/10	101.301	6.073	6.073	4.218	8,8%	98,1%	6	
22	3	5	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Sección III)	Barrancas Blancas - Pircas Negras (2457-98)	8	25,0	05/07/99	01/08/08	40.176	1.457	1.457	0	0,0%	83,6%	8	
22	3	6	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	Ia-Ib-II - Los Cajones - Anguinan	8	27,9	10/05/99	31/12/08	23.065	6.073	6.073	0	0,0%	99,9%	7	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/99	31/05/09	241.392	21.862	9.862	0	0,0%	0,1%	14	C
22	3	8	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anguinan	IV - RNN°75 - Pampa de la Viuda	8	16,7	01/07/99	29/05/07	45.524	1.031	1.600	1.575	0,0%	93,6%	7	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca	Campanas - Lte. con Catamarca	8	22,9	03/05/99	30/12/06	27.833	121	121	0	0,0%	98,9%	8	B
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Urugua- I - Deseado	8	45,0	01/05/92	29/03/00	32.610	1.337	1.337	0	0,0%	88,2%	7	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jagué - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/99	12/04/08	21.460	1.457	1.457	1.398	0,0%	100,0%	8	B
22	3	13	51	LA PAMPA	35	Ataliva Roca - Santa Rosa	Prog. 283.700 - Prog. 324.017	8	40,0	19/02/01	20/07/04	28.524	157	157	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	14	51	MISIONES	14	Dos de Mayo - San Pedro	Sección IV (El Alcazar - Dos de Mayo)	8	47,4	20/09/93	18/03/07	47.155	226	226	0	0,0%	99,2%	7	
22	3	15	51	JUJUY	9-66-52	Corredor Vial Paso de Jama	Río Yala-Empalme 52/ Perico-Jujuy/ Empale 9-Lte. c/Chile	8	267,0	08/09/00	08/03/04	209.057	1.800	1.800	0	0,0%	96,8%	7	
22	3	18	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte. con Catamarca (Obra Faltante)	Km 25 - Campanas (Acceso a Santo Domingo)	5	24,0	07/07/99	02/02/07	4.309	262	262	0	0,0%	87,6%	7	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martín (RNN°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/05	26/04/09	119.559	1.093	20.000	5.519	0,0%	77,2%	14	C
22	3	20	51	CHUBUT	25	Trelew - Rawson	Puente s/Río Chubut y Acceso a Rawson	8	0,1	13/10/04	13/04/06	12.688	453	1.324	461	0,0%	91,1%	7	
22	3	21	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Sección I-a : Bardas Blancas - Acceso a Cajón Grande	8	22,9	20/11/00	19/10/04	11.890	121	121	0	0,0%	99,5%	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Empalme RNN°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/97	25/04/00	15.305	121	211	31	0,0%	94,8%	7	
22	3	25	51	SANTA FE	95	Empalme RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. I km 862,31 - 912,02	5	49,7	01/09/05	30/09/08	106.412	5.466	5.466	0	0,0%	98,8%	7	
22	3	26	51	SANTA FE	95	Empalme RPN°286 - Lte. c/Chaco	Secc. II km 912,02 - 941,20	5	29,2	25/08/06	24/05/08	58.650	1.187	1.187	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	27	51	SANTA FE	A-008	Río Paraná-Autopista Rosario-Córdoba	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	01/11/09	31/10/11	37.564	2.429	2.429	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av Circunvalacion de Rosario (Colectoras)	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/09	31/10/11	30.000	2.672	2.672	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	28	51	MISIONES	101	Bernardo de Irigoyen - San Antonio	Km 0 - km 32,05	8	32,1	24/09/01	24/05/07	76.922	195	195	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	Km 77,00 - km 123,43	5	46,4	04/10/04	03/01/06	18.036	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	76	51	MISIONES	101	San Antonio - Piñalito	Km 32,05 - km 62,05	8	30,0	19/08/03	17/01/07	83.843	100	100	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Valcheta - Musters Km 77 - km 105 (Sección I)	8	28,2	01/12/04	31/12/07	27.988	766	842	0	0,0%	100,0%	8	
22	3	86	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Musters - Tte. Maza - Km 105 - km 137 (Sección II)	8	29,0	23/03/06	21/03/08	38.892	1.093	1.093	0	0,0%	99,8%	7	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejía - Km 137 - km 181 (Sección III)	8	44,0	21/03/06	18/11/08	44.637	2.429	2.429	3.927	0,0%	95,0%	7	
22	3	86	54	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Ramos Mexía - Talcahuala Km 181 - km 201 (Sección IV)	8	19,6	23/03/06	20/10/08	29.484	911	911	0	0,0%	96,0%	7	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada Km 201 - km 225 (Sección V)	8	23,9	23/03/06	20/10/08	28.554	1.215	1.215	0	0,0%	98,7%	7	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos Km 225 - km 269	8	43,8	01/02/07	02/05/09	75.816	3.644	3.644	6.301	2,5%	90,2%	6	A - C
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao Km 269 - km 340	8	72,0	23/03/06	21/03/09	98.758	5.747	5.747	22.440	1,7%	99,4%	6	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci Km 341,07 - km 414,57	5	73,5	01/11/09	01/05/12	120.000	36.437	36.437	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Pilcaniyeu Km 410 - km 537	8	126,7	01/11/09	01/05/12	110.000	60.728	60.728	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Empalme RNN°40 - Limite con Chile	Aduana - Limite con Chile	8	7,0	01/11/09	01/09/11	12.300	1.457	1.457	0	0,0%	0,0%	0	
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julián	Km 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/07	04/01/11	131.522	13.256	50.000	7.685	0,0%	17,7%	6	
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. RNN 3 - Pto. Deseado	Empalme RNN°3 - km 65 / Acceso Puerto Deseado	5	67,6	25/04/07	23/04/09	108.252				8,4%	79,6%	6	
Total Obras por Convenio con Provincias													206.577	251.834	54.582				
Mejoramiento y Reposición de Rutas																			
22	4	1	51	PAIS	Vs	Rehabilitaciones Menores		14	201,8	01/01/09	31/12/09	10.674							

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs		
22	4	25	53	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion III	Km 37,86 - km 47,7	8	9,8	09/09/05	08/06/08	130.429	1.215	1.215	0	0,0%	98,6%	7			
22	4	29	51	CHUBUT	3	Comodoro Rivadavia - Km 1886 (Rada Tilly)	Km 1838 - km 1845	8	6,8	12/04/05	10/09/08	35.624	1.579	1.579	903	0,0%	94,5%	7			
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/06/09	30/11/11	214.047	13.000	13.000	0	0,0%	0,0%	4			
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Sección III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/08	31/07/11	313.594	34.094	29.563	0	0,1%	4,9%	6			
22	4	32	51	MENDOZA	7	Uspallata - Lte. c/Chile	Construcción de Cobertizos 2 y 8	8	0,5	01/10/03	31/05/06	23.681	373	373	0	0,0%	96,3%	8			
22	4	34	51	SANTA CRUZ	RP 23	Pte.s/Río Las Vueltas - Va.Turística El Chaltén	Acceso a Bahía Túnel	8	20,5	27/09/06	27/03/09	41.028	2.551	20.265	3.497	2,2%	92,2%	6			
22	4	35	51	SANTA CRUZ	RP43	Km Heras - Perito Moreno (Sec. II)	Km 78 - Perito Moreno	5	90,0	01/11/03	08/01/06	39.924	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	36	51	SANTA CRUZ	RP43	Las Heras - Perito Moreno (Sec. I)	Las Heras - km 78	5	78,0	24/09/03	23/04/06	34.798	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepción - Acceso a Monteros y Acceso a Concepción	8	26,6	14/01/08	12/01/10	206.580	59.514	76.666	22.507	10,9%	48,0%	6			
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Emp. RNN°38 (Actual)	8	20,0	15/10/04	16/03/07	86.183	1.070	1.070	0	0,0%	97,6%	8			
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa María		8	5,0	30/11/09	31/05/11	19.000	12.146	12.146	0	0,0%	0,0%	0			
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Límite c/Chubut - Perito Moreno	Límite c/Chubut - Perito Moreno	8	67,5	17/11/06	17/05/10	119.445	49.537	49.537	8.111	7,0%	51,1%	6			
22	4	43	51	LA RIOJA	CV R 38 y 75	Conexión Vial Rutas 38 y 75 Circunvalación de La Rioja	Av. Ortiz de Ocampo - Las Padercitas	8	10,0	01/11/03	31/08/07	37.112	741	741	173	0,0%	94,6%	7			
22	4	44	51	CATAMARCA	60	Tinogasta-Fiambala	El Puesto - Río La Troya	8	9,3	08/09/03	07/10/04	7.038	279	279	0	0,0%	91,6%	7			
22	4	45	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza - Acceso Este Ciudad de Mendoza	Km 1038,67 - km 1041,90	8	3,2	14/05/04	13/05/06	13.654	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	46	51	CORDOBA	9	Villa María - Pilar	Villa María- James Craik; James Craik-Oncativo; Oncativo-Pilar	8	107,5	01/02/01	01/05/09	337.039	22.000	0	0	0,2%	68,8%	6			
22	4	47	51	BUENOS AIRES	P 6	Campana - La Plata	Secciones I - II - III - IV - V - VI	8	187,0	18/05/03	16/01/07	499.836	898	898	0	0,0%	99,9%	7			
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Empalme RNN°127	Km 489,25 - km 500,59	5	11,3	09/09/03	07/09/04	7.653	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	49	51	SANTA FE	168	Acceso a Ciudad de Santa Fe - Acceso al Túnel Subfluvial	Secciones I y II	5	11,0	18/03/04	17/08/06	10.479	121	121	0	0,0%	99,6%	7			
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martín de los Andes - Emp. RNN°231	Sección III: Lago Villarino - Acceso Villa Traful	8	25,9	08/10/04	05/12/12	56.278	17.827	4.457	0	10,2%	22,7%	6			
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte RNN°3 - Intersección Sur RNN°3	8	7,0	28/09/06	28/03/10	179.938	57.794	57.794	1.934	1,3%	30,9%	6			
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fértil - Los Baldecitos	Sección I (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/04	20/07/05	13.954	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	53	51	LA PAMPA	143	Emp. RPN°10 - Santa Isabel	II a: km 58,70 y II b: (Parcial) km 0,00 - km 11,077	8	14,4	08/10/04	08/04/06	1.291	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	54	51	FORMOSA	11	Remodelación cruce por la ciudad de Clorinda	Av. Juan Marana hasta Calle Mendoza	5	6,0	02/09/05	03/05/07	25.022	570	570	0	0,0%	94,1%	7			
22	4	55	51	SANTA CRUZ	3	Límite c/ Chubut - Caleta Olivia	Km 1904,7 - km 1906,7	8	3,0	03/06/03	02/12/03	4.501	159	159	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	56	51	CORDOBA	158	Villa María - Río Cuarto	General Deheza - Chucul	5	48,0	15/10/03	13/12/04	15.758	736	736	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra Faltante Puentes)	A° Curupí- BrazoGuayquiraró-Río Guayquiraró-A° Carumbe - km 646/ km 6	8	1,0	01/06/07	30/06/09	13.862	1.457	1.457	281	0,2%	54,2%	6			
22	4	59	51	ENTRE RIOS	P11	Variante Victoria - Conexión Rosario-Victoria	Etapas I y Etapa II	8	7,4	19/02/04	18/04/09	35.264	1.366	1.366	31	0,4%	89,4%	6			
22	4	60	51	BUENOS AIRES	P63	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-01	Avda. Gral. Paz - Acceso a Banfield	8	4,7	18/11/03	16/02/08	61.051	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	61	51	BUENOS AIRES	P632	Conexión Vial Sudoeste Camino Secundario 063-02	Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora	8	2,9	18/11/03	18/04/07	60.565	3.700	3.700	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	62	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Ranchos desde RPN°29	Acceso Senador Rey, Desvío Tránsito Pesado y Calles Internas	5	1,9	20/07/04	20/05/05	3.497	177	177	0	0,0%	92,2%	7			
22	4	63	51	MISIONES	P2	San Javier - Panambi	Interpuentes	8	3,5	01/01/03	31/12/03	6.541	363	363	0	0,0%	87,1%	7	A		
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazán	Km 1473,00 - km 1503,10	5	30,0	14/10/04	13/12/06	23.840	104	104	0	0,0%	99,8%	7			
22	4	64	52	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Juan G. Bazán - Pozo del Mortero y Acceso a Pozo del Mortero	8	25,0	14/10/04	13/10/06	34.499	104	104	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	53	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Pozo del Mortero - Laguna Yema	8	27,3	14/10/04	13/10/06	38.033	104	104	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	54	FORMOSA	81	Las Lomitas - Ingeniero Juárez	Laguna Yema - Los Chiriguano	8	28,0	13/10/04	13/07/07	40.501	72	72	0	0,0%	97,7%	7			
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juárez - Las Lomitas	Los Chiriguano - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/04	12/07/08	48.581	71	71	0	0,0%	93,3%	7			
22	4	64	56	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Lte. c/Salta	Sección I:Ing. Juarez - km 25,5	8	24,4	29/11/06	29/12/07	56.000	78	78	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	57	FORMOSA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	km 25,5 - Límite con Salta	8	27,0	10/10/06	09/12/07	41.991	71	71	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	58	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Lte. c/Formosa - Los Blancos - Secc VI	8	29,4	15/07/05	14/10/07	32.885	104	104	0	0,0%	99,9%	7			
22	4	64	59	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Coronel Juan Solá - Los Blancos - Secc V	8	30,0	07/06/05	06/08/07	27.008	81	81	0	0,0%	91,1%	7			
22	4	64	60	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Pluma de Pato - Cnel. Juan Solá - Secc IV	8	31,1	12/07/05	11/07/07	29.153	104	104	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/06	31/03/07	13.666	72	72	0	0,0%	99,1%	7			
22	4	64	62	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.II)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.091	104	104	0	0,0%	100,0%	8	A		
22	4	64	63	SALTA	81	Las Lomitas - Empalme RNN°34	Pluma de Pato - Emp. RNN°34 (Sec.I)	8	30,0	15/04/06	15/05/07	21.541	104	104	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	65	51	SAN JUAN	Ex RP 414	Variante Quebrada de Las Burras - Secc I	Empalme RPN°436 (Quebrada de Las Burras) - Emp. RPN°12 (Pachaco-Pi	8	16,0	05/05/04	04/04/05	5.454	121	121	0	0,0%	99,0%	7			
22	4	66	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Laguna Khami - Kosovo (km 2934 - km 2959)	8	25,0	16/04/04	15/04/06	48.775	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	67	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Laguna Khami - Rancho Hambre	Kosovo (Km 2959) - La Herradura (2988)	5	23,0	22/10/04	20/02/07	37.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	68	51	SANTA CRUZ	3	Repavimentación y Pavimentación Cruce RPN°5		8	8,0	29/05/03	26/12/04	9.402	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	69	51	SANTA CRUZ	288	Puerto Santa Cruz - Puerto Punta Quilla	Km 0,00 - km 14,50	8	14,5	28/10/03	27/07/07	27.377	9.500	9.500	0	0,0%	89,1%	7			
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acceso Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/03	10/06/09	103.732	9.000	9.000	5.488	3,5%	88,9%	6			
22	4	71	51	SANTA CRUZ	40	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección I: Perito Moreno - km 49	8	48,9	16/02/04	17/07/07	80.745	2.400	8.663	8.663	0,0%	83,8%	7			
22	4	72	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme RPN°11	Sección I: Tres Lagos - km 50	8	50,1	27/05/04	26/05/07	70.028	1.402	10.000	8.463	0,0%	96,0%	7			
22	4	73	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme RPN°11	Sección III: km 86 - Empalme RPN°11 (Prog. 86 - Prog. 127,6)	8	42,3	27/05/04	26/06/07	59.913	785	785	0	0,0%	97,5%	7			
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme RPN°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/03	20/06/09	28.632	1.295	1.295	0	0,0%	99,4%	14	C		
22	4	75	51	SANTA CRUZ	40S	Empalme RPN°11 - El Cerrito	Sección II: km 34 - Empalme RPN°11	8	28,4	07/02/03	07/06/04	37.081	121	1.121	0	0,0%	100,0%	7			
22	4	76	51	SANTA CRUZ	40S	Tapi Aike - Cancha Carrera		8	40,3	27/10/00	25/12/04	66.317	2.308	2.308	0	0,0%	80,4%	7			
22	4	78	51	SANTA CRUZ	40S	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	Km 2839,55 - km 2872,18	8	32,6	02/05/00	30/10/04	28.335	445	445	0	0,0%	96,1%	7			
22	4	79	51	SANTA CRUZ	40	Cancha Carrera - Pte. s/Río Turbio	Km 21,252 - km 28,740	8	7,5	22/08/01	21/03/06	19.527	121	121	0	0,0%	97,6%	7			
22	4	81	51	SANTA FE	7	Variante Laguna La Picasa	Km 380 - km 390,5	8	10,5	01/02/06	03/07/07	67.012	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Empalme RPN°2 (V. María) - V. María - Oncativo	8	91,0	17/04/06	15/04/09	474.997	10.063	20.395	80.098	4,5%	94,5%	6			
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Sección II: Empalme RPN°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/06	13/11/09	612.411	66.585	66.585	0	7,2%	48,4%	6			
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Sección Ib: Empalme RPN°E-59 - Intersección c/RNN°9 Actual	8	45,0	12/12/08	11/01/11	596.612	150.542	150.542	17.259	3,2%	3,2%	6			
22	4	82	54	SANTA FE	9	Autopista Rosario-Córdoba	Sección Ia: Int. con RNN°9 Actual - Empalme RNN°178 (Armstrong)	8	36,0	15/11/06	15/05/09	375.028	17.495	17.495	405	21,1%</					

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
22	4	84	51	FORMOSA	95	Empalme RNN°81 - Lte. c/Chaco- Sec. I	Lte. c/Chaco- Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/07	12/05/09	117.157	26.748	27.748	1.731	13,6%	56,9%	6	
22	4	84	52	FORMOSA	95	Empalme RNN°81 - Lte. c/Chaco- Sec. II	Prog 29,800 - Empalme RNN° 81	8	29,8	09/05/06	05/02/09	93.259	4.372	4.372	638	3,5%	99,8%	7	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. RNN°34		8	31,0	01/11/09	31/10/11	30.000	6.073	6.073	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Sta Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	46,1	21/02/06	21/04/09	85.260	3.036	3.036	158	1,2%	87,2%	6	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II - km 393 - km 445	8	52,0	01/11/09	31/10/11	70.000	8.502	8.502	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte. con Neuquen (S III)	Sección III km 445 - km 502	8	57,0	01/11/09	31/10/11	70.000	8.502	8.502	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos		8	221,0	01/11/09	30/10/14	193.000	14.575	14.575	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/09	31/10/10	4.400	4.858	4.858	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	91	51	MENDOZA	40S	Luján de Cuyo -Tunuyán (S I)	Sección I	8	7,0	17/09/01	15/11/04	21.266	121	121	0	0,0%	79,9%	7	
22	4	92	51	SANTA FE	34	CVN° 5- Paso p/ Ciudad Rafaela - Cruce Urbano por la Ciudad de Rafaela	Km 217 - km 225	5	8,0	02/08/05	30/11/08	59.904	3.000	3.000	2.915	0,0%	96,9%	7	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	38,6	01/11/09	01/05/12	177.131	7.287	7.287	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Gran Bajo San Julián - Comandante Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/05	14/12/09	92.724	1.215	31.026	20.577	0,8%	99,1%	6	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Establecimiento Los Alamos	8	118,0	15/09/05	14/12/09	152.445	5.466	5.466	0	3,6%	82,1%	6	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/05	01/12/09	145.396	7.895	7.895	0	2,9%	75,4%	6	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	26/11/06	26/04/10	114.130	27.935	37.056	11.004	7,4%	51,9%	6	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (RPN°39) - Río Olíne- km 2189,52 - km 2215,91	8	28,3	01/03/07	30/07/10	60.818	16.255	16.255	1.490	5,0%	61,1%	6	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olíne - Las Horquetas -Secciones I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/06	07/03/10	116.944	30.364	30.364	1.705	2,0%	26,5%	6	
22	4	96	53	SANTA CRUZ	40S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Las Horquetas - Acceso Puente s/Río Chico - Km 2289,64 - km 2344,99	8	55,4	15/09/06	14/04/09	97.665	13.191	13.191	3.380	3,4%	99,1%	6	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo caracoles - Tres Lagos	Acceso Puente s/Río Chico - Gdor. Gregores - Secciones I- II - s/ RPN°25	8	66,5	21/08/08	20/08/11	165.246	4.858	4.858	3.492	4,0%	10,3%	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Secciones I - II- s/ RPN°29	8	57,0	16/01/09	15/01/12	128.602	4.858	4.858	0	3,2%	3,2%	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40 S	Bajo caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Secciones I-II-III y Acceso Tres Lagos por RNN°2	8	116,8	01/11/09	30/10/12	115.000	9.717	9.717	0	0,0%	0,0%	0	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Empalme RPN°25 - Pico Truncado	Km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/07	15/04/09	123.783	12.147	8.543	1.299	0,2%	42,3%	6	
22	4	97	52	SANTA CRUZ	P12	Empalme RPN°25 - Pico Truncado	Empalme RPN 25 - km 245,00 (Gdor. Moyano)	8	204,0	30/12/04	29/11/07	109.954	1.457	1.457	0	0,0%	91,9%	7	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. de Acceso a Rospentek y Pavimentación en Avenida 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/06	19/06/09	42.128	2.368	9.245	271	1,9%	79,1%	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Empalme RPN°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/06	28/04/09	76.950	7.530	25.989	16.658	14,0%	82,1%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas												866.135	950.947	248.981					
Obras por Concesión sin Peaje COT																			
22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	297,3	01/06/98	28/05/11	222.530	8.000	10.000	8.087	1,4%	79,0%	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Empalme RNN°5	13	329,2	02/02/98	29/01/11	234.366	5.000	10.000	7.203	3,1%	76,4%	6	
Total Obras por Concesión sin Peaje COT												13.000	20.000	15.290					
Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes (**)																			
22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes)	Prog. 713,33	8	30,0	01/06/09	31/05/10	3.300	296	296	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/Río Batelito)	Prog. 735,68	8	30,0	01/06/09	31/10/09	1.500	102	102	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	5	51	CORRIENTES	12	Paso de los Libres - Mercedes (Pte. s/Río Miriñay)	Prog. 182	8	150,0	01/11/09	31/10/10	6.700	488	488	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	6	51	SAN JUAN	20	Caucete - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 564,70	8	200,0	23/08/02	22/04/04	6.344	121	121	0	0,0%	99,5%	7	
22	6	7	51	SAN JUAN	40N	Albardón - San Juan (Pte. s/Río San Juan)	Prog. 174,92	8	200,0	29/01/03	29/07/04	8.112	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	10	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Cte. Piedrabuena (Pte. s/Río Coyle)	Prog. 2522,81	8	200,0	24/01/03	24/11/03	8.307	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	6	11	51	SANTA CRUZ	3	Río Gallegos - Güer Aike (Pte. s/Río Gallegos)	Prog. 2581,32 (Ototel Aike- Río Gallegos)	8	90,0	28/06/05	27/09/07	18.034	421	5.000	0	0,0%	98,7%	7	
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.700	120	120	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	01/06/09	31/05/10	1.200	122	122	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Colastiné)	Prog. 413,87	8	37,0	01/11/09	31/10/10	1.300	70	70	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 3° Coronda)	Prog. 415,52	8	37,0	01/11/09	31/01/11	1.250	89	89	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	16	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 2° Coronda)	Prog. 416,67	8	80,0	05/12/07	30/03/09	14.622	2.429	4.000	2.498	4,5%	99,7%	6	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° 1° Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	01/11/09	31/10/10	1.470	104	104	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/09	31/10/10	1.140	80	80	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/09	31/10/10	1.460	103	103	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.170	83	83	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. s/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	106	106	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Empalme RPN°21 - Lte. c/Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	106	106	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargüe)	Prog. 336,20	8	80,0	01/11/09	31/01/11	2.100	100	100	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Aluminé)	Prog. 1,00 (Pte. s/Río Alumine)	8	30,0	01/06/09	31/05/11	18.487	520	520	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/09	31/10/10	1.900	243	243	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/06/09	31/05/10	3.000	243	243	0	0,0%	0,0%	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. s/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/06	11/06/09	17.821	1.822	1.822	620	7,0%	83,7%	6	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/09	31/10/10	3.700	843	843	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog. 1158,00	8	90,0	01/06/09	30/11/10	3.300	243	243	0	0,0%	0,0%	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno													

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs		
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/11/09	02/05/11	2.000	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Paraná - Empalme RNN°18 (Pte.s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/11/09	31/10/10	1.200	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. s/A° Mbiguá)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/11/09	31/10/10	1.350	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/11/09	31/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0	A		
22	6	48	51	CORRIENTES	123	Esteros Batel y Batelito	Puente Nuevo y Accesos	8	70,0	27/06/06	25/01/08	15.604	287	287	0	0,0%	98,7%	7			
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Caraparí	km 1480,80	8	60,0	01/11/09	31/10/10	3.800	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	50	51	CORDOBA		Nuevo Puente sobre Río Cuarto		8	50,0	16/02/07	30/05/09	20.689			0	1,5%	82,3%	6			
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acceso a Santa Cruz (Cuestecilla) - Pte. s/Río Paclín	8	100,0	01/11/09	31/10/10	2.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. s/ FF.CC. Belgrano, s/ A° del Zanjón, s/ Río Negro	8	400,0	01/11/09	31/10/11	50.000	843	843	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. s/Río Grande		8	200,0	01/11/09	02/05/11	30.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. s/Riacho Seco (1300 km.)	8	42,0	01/11/09	31/10/10	25.260	1.822	1.822	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Seco	Km 97,77	8	30,0	01/11/09	02/05/11	13.600	1.822	1.822	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. s/Viñaco		8	30,0	01/11/09	31/10/10	4.000	972	972	0	0,0%	0,0%	0			
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Santiago del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/08	29/06/10	33.903	6.073	6.073	0	12,5%	31,0%	6			
22	6	58	51	CORRIENTES	P 114	RPN°40 - RNN°14	Puente de H ° s/Río Miriñay (Paso Meza)	8		01/11/09	02/05/11	17.951	2.429	2.429	0	0,0%	0,0%	4			
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. Km 857,11	5	114,0	01/11/09	31/10/10	5.000	5.830	5.830	0	0,0%	0,0%	0			
Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes													43.519	49.669	4.929						
Obras en Corredores Viales Concesionados																					
22	7	1	51	BUENOS AIRES	226	CVN° 1 - Obra N° 8 - Emp.RNN° 3 - Acceso a Espigas	Km 262 - km 319,4	5	57,4	15/07/04	13/01/05	8.823	158	714	0	0,0%	97,6%	7			
22	7	1	52	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10A - Emp. RPN° 6 - Acceso Videla Dorna	Km 62,1 - km 65 / km 87,82 - km 118	5	33,1	05/08/04	03/02/05	6.855	165	165	0	0,0%	96,6%	7			
22	7	1	53	BUENOS AIRES	3	CVN° 1 - Obra N° 10B - Acceso Videla Dorna - Empalme RPN°61Dorna	Km 118 - km 156	5	38,0	27/01/06	28/03/07	15.332	100	100	656	0,0%	100,0%	8			
22	7	2	51	CORDOBA	7	CVN° 2-Obra N° 7-Alto Nivel RPN° 4 y FFCC Gral.San Martín-Emp. RPN°10	Km 500 - km 539	5	39,0	20/07/04	19/12/04	12.738	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Empalme RPN°1	Km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/04	03/10/05	17.420	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	2	54	LA PAMPA	5	CVN° 2 - Obra N° 13 - Empalme RPN°3 - Emp. RNN°35	Km 568 - km 606,65	5	39,0	08/10/04	08/06/05	13.317	352	352	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	51	BUENOS AIRES	9	CVN° 3 - Obra N° 1 - Campana - Río Areco	Km 77 - km 106	5	29,0	23/07/04	21/09/06	15.086	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	52	SANTA FE	9	CVN° 3 - Obra N° 2 - Ex RNN°191 - RNN°A012	Km 188 - km 278	5	90,0	23/07/04	22/12/05	46.473	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	53	SANTA FE	A009	CVN° 3 - Obra N° 12 - Puerto Reconquista - Empalme RNN°11	Km 0 - km 12	5	12,0	28/09/05	29/05/06	10.418	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	54	SANTA FE	A012	CVN° 3 - Obra N° 14 - Alto Nivel S/RNN° - Empalme RNN°9 (Salida Córdoba)	Km 0 - km 42	5	42,0	20/07/04	19/04/05	6.704	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Empalme RNN°168 - Emp. RPN°39	Km 476 - km 607	5	131,0	04/01/06	04/10/06	7.637	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	56	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16A - Empalme RPN° 38 - Empalme RPN°98	Km 684 - km 720	5	36,0	05/08/04	04/12/04	2.566	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	57	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 16B - Empalme RNN° 98 - Empalme RPN°40	Km 720 - km 730 / km 747 - km 787	5	50,0	06/12/05	06/08/06	24.037	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	58	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 17 - J.A. de la Peña - Alto Nivel FFCC G.S.M.	Km 61 - km 63 / km 86 - km 115 / km 124 - km 163	5	70,0	05/08/04	05/05/05	20.732	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	3	59	BUENOS AIRES	188	CVN° 3 - Obra N° 18 - Empalme RPN° 66 - Empalme RPN°101	km315-km323/km337-km364/km382-km384/km415-km420/km450-Km471	5	63,0	05/08/04	05/06/05	16.386	121	121	0	0,0%	99,9%	7			
22	7	4	51	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 3 - Rufino - Empalme RNN°8	Km 535,55 - km 631	5	95,5	23/11/04	23/12/05	17.560	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	4	52	SANTA FE	33	CVN° 4 - Obra N° 4 - Empalme RPN° 6 (S) - Emp. RPN°18 (S)	Km 676 - 754	5	78,0	28/07/04	27/06/05	18.721	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	4	53	BUENOS AIRES	193	CVN° 4 - Obra N° 29 - Empalme RNN° 9 - Empalme RNN°8	Km 3,67 - km 35,32	5	31,7	19/12/05	17/12/08	33.680	14.200	14.200	0	0,0%	98,4%	7			
22	7	4	54	CORDOBA	36-A005	CVN°4-ObraN°22-Emp.RNN°8-Emp.RNN°A005/Emp.RNN°8-Emp.RNN°36	km596-km606,30/km631,60-km640/km646-km649,5/km666-Km673/km717	5	42,0	19/05/05	18/04/07	30.444	881	881	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	51	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5A - Empalme RPN°64 - Rafaela	Km 151 km 225	5	74,0	20/07/04	20/05/05	24.083	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	52	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 5B - Rafaela - Empalme RPN°13	Km 225 km 247	5	22,0	14/07/04	13/12/04	1.626	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	53	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6A - Empalme RPN° 80 (S) - Empalme RPN°33	Km 299 - km 330	5	31,0	16/11/05	16/12/06	14.444	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	54	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 6B - Empalme RPN°23 - Lte. c/Sgo. del Estero	Km 361 - km 398	5	37,0	20/07/04	19/12/04	2.742	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	55	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 20 - Empalme 2° Circunv.de Rosario - RPN°65	Km 13,95 - km 66	5	52,1	05/01/05	05/12/05	29.468	100	100	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	5	56	SANTA FE	34	CVN° 5 - Obra N° 25 - Empalme RNP°65 - Empalme RNP°66	Km 86 - km 129	5	43,0	13/01/05	13/11/05	22.829	217	217	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	7	51	CHACO	16	CVN°6 - Obra N° 9 - Makalle - Empalme RNN°95	Km 62 - km 169	5	107,0	20/08/04	20/05/05	13.136	158	158	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	9	52	SANTA FE	7	CVN° 2 - Obra N° 23A - Acceso a Castellanos - A/N FFCC G.S.M.	Km 392 - km 399 - km 558 - km 585 - km 613 - km 616	5	7,0	21/12/05	20/06/08	18.257	1.650	1.650	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	9	53	MENDOZA	7	CVN° 2 - Obra N° 23B - km 568-km 585 / km 613-km616 / km 866-km871	Km 866 - km 871 (Lte S.Luis/Mdza-Acc a La Paz)	5	5,0	06/04/06	04/11/06	1.775	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	10	51	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 21 - San Francisco - Empalme RPN°81-A (S)	Km128,18-km131,50/km230-km243/km245-km247	5	32,0	24/04/06	23/08/07	16.339	121	121	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	10	52	CORDOBA	19	CVN°3 - Obra N° 207 - La Francia - Río Primero	Km 188 - km 193 / km 243 - km 245 / km 247 - km 280	13	40,0	18/05/06	16/01/08	29.891	633	633	0	0,0%	100,0%	8			
22	7	11	51	BUENOS AIRES	8	CV N°4 - Obra 19 A -Empalme RNN°188 - Empalme RPN°6 (S)	Km 224 - km 229 / km 233 - km 238 / km 248 - km 287 / km 304 - km 306	5	61,0	20/04/06	17/02/09	37.940	5.101	5.101	4.813	1,9%	98,9%	8			
22	7	11	54	SAN LUIS																	

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
22	7	23	58	SANTA FE	8	CVN°4 - Obra N° 19 B - Empalme RPN°3 - Empalme RNN°148	Km 442-km 468/km 475-km 480/km 595-km 600/km 695-km 723	5	64,0	01/05/06	31/07/07	36.836	160	160	0	0,0%	99,4%	7	
22	7	25	51	SANTA FE	11	CVN° 3- Obra N° 226: Empalme RPN°79 (S) - Calchaquí	Km 635 - km 661	5	26,0	28/02/07	27/09/08	21.351	1.032	1.032	0	0,0%	97,4%	7	
22	7	25	52	BUENOS AIRES	188	CVN° - Obra N°231: Acceso a Gral. Pinto - Lte. Bs As/ La Pampa	Km 256 - km 259 / km 364 - km 382	5	21,0	01/12/06	31/12/07	18.111	848	848	0	0,0%	94,3%	8	
Total Obras en Corredores Viales Concesionados												36.064	36.620	7.290					
Obras en Circuitos Turísticos																			
22	8	1	51	MISIONES		Corredor de las Misiones		8	33,2	01/11/09	31/10/11	9.000	1.686	1.686	0	0,0%	0,0%	0	
22	8	2	51	RIO NEGRO		Corredor de los Lagos		8	51,5	01/01/09	31/12/09	5.439	5.439	5.439	0	16,7%	16,7%	6	
Total Obras en Circuitos Turísticos												7.124	7.124	0					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II																			
22	9	1	51	JUJUY		Puente s/Río Xibi - Xibi		8		01/11/09	31/10/11	25.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Empalme RNN°52	Secciones I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Empalme RNN°52 - Coranzuli	Secciones I y II	8	72,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secciones I y II	8	68,5	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secciones I y II	8	67,0	01/10/09	30/09/11	75.000	2.654	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme RNN°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/09	30/10/12	7.000	496	496	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y RNN°226 - Olavarría - Azul	Empalme RNN°226 - Empalme RNN°3	8	40,0	23/11/07	21/11/09	90.605	38.000	42.979	3.793	5,1%	26,6%	6	A
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Vía 1 - Serranías Puntanas		5	220,0	01/11/09	30/10/13	47.800	1.770	1.770	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán		8	32,0	01/11/09	31/10/11	7.500	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono		8	35,0	01/11/09	31/10/11	10.000	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	160,0	01/11/09	30/10/13	73.000	2.381	2.381	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. I	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/09	31/10/11	120.000	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/09	31/10/11	120.000	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	0	C
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. III	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/09	31/10/10	48.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S. IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/09	31/10/11	90.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0	A
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	30,0	01/11/09	30/10/12	100.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte. c/San Juan	Estancia Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0	A
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte. c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/09	30/10/14	100.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	13	51	INTERPROVINCIAL	153	Ruta Unión - Ex Ruta Provincial 319		8	100,0	01/11/09	31/10/11	40.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección RNN° 14 - Empalme RPN°4		8	0,5	01/11/09	02/05/10	3.000	607	607	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	17	51	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme RPN° 63 - Empalme RNN°11 (Prog 0 - Prog 7,6)	8	7,3	18/10/06	17/04/09	65.362	4.251	14.289	14.406	7,6%	82,6%	6	
22	9	17	52	CHACO	16	Autovía Nicolás Avellaneda s/RNN°16 - Pte. Gral. Belgrano	Empalme Av. Sarmiento - Empalme RNN°11 (Prog 7,6 - Prog 13)	8	5,4	18/10/06	17/04/09	65.378	3.401	3.401	0	10,2%	46,9%	6	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/07	30/07/09	50.562	16.561	16.561	6.928	9,6%	60,1%	6	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	01/11/09	31/10/11	80.000	12.874	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	24	51	CATAMARCA	40	El Eje - Las Cuevas		8	25,0	01/11/09	31/10/11	80.000	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Río Santa María entre las localidades de San José y Palo Seco		8	0,2	01/11/09	31/10/10	8.000	1.093	1.093	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. I)	Empalme RNN°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9	01/06/09	31/05/11	80.000	1.822	1.822	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. II)	Cementerio - Autódromo y accesos	8	10,6	01/11/09	31/10/11	50.000	2.429	2.429	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía: Empalme RNN°89 - Acc. Margarita Belén (S. III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acceso M. Belén	8	14,7	01/11/09	31/10/11	70.000	1.822	1.822	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	28	51	CHACO		Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/09	30/10/14	200.000	12.146	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	51	INTERPROVINCIAL	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai	Sección I	8	47,0	01/11/09	30/10/14	5.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. II)	Sección II	8	46,9	01/11/09	30/10/14	150.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. III)	Sección III	8	44,6	01/11/09	30/10/14	210.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. IV)	Sección IV	8	55,3	01/11/09	30/10/14	150.000	2.827	2.827	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. V)	Sección V	8	42,4	01/11/09	30/10/14	180.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VI)	Sección VI	8	45,1	01/11/09	30/10/14	210.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VII)	Sección VII	8	45,0	01/11/09	30/10/14	180.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avía Terai (S. VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/11/09	30/10/14	180.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX km 621- km 667	8	46,7	01/11/09	31/10/11	85.000	2.529	2.529	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/09	31/10/11	80.000	2.381	2.381	0	0,0%	0,0%	0	A
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y Repavimentación Pto. Lavalle-Santa Sylvina	Puente s/ Río Bermejo	5	0,1	01/11/09	31/10/10	4.400	2.186	2.186	0	0,0%	0,0%	2	
22	9	31	51	CHACO		Puente Ñembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/09	31/10/10	6.000	486	486	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Empalme RNN°258 (Empalme RNN°40) - Cholia	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/05	15/05/09	36.995	2.930	2.930	1.712	13,2%	72,9%	6	
22	9	34	51	CHUBUT	S40-P70-S/El	Maiten - Empalme RNN°40 (ex 258-Epuyen)-Acceso a Bs As Chico	Km 6,074 - km 18,175 (1S40) - km 0,00 - km 28,896 (P70)	8	44,8	22/11/05	22/03/09	40.049	1.943	1.943	742	3,3%	91,9%	6	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. RNN°40	1ra. Sección Km 0 - km 30	8	30,0	01/02/06	01/06/09	47.948	3.279	3.279	2.595	3,6%	81,7%	6	
22	9	36	51	CHUBUT	259	Puente sobre Arroyo Seco - Trevelín - Esquel	Km 9,14 - km 15,45 (Pte. s/A° Seco)	8	6,3	01/04/07	30/03/09	19.726	1.457	4.808	2.851	0,8%	99,9%	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme RNN°9 - Límite c/Catamarca km 154		8	100,0	01/06/09	30/05/12	70.000	5.661	5.661	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	185,0	01/11/09	30/10/13	300.000	11.322	0	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	39	51	CORDOBA	19	Circunvalación de San Francisco		8	16,0	01/11/09	31/10/11	50.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	43	51	ENTRE RIOS		Obras reasfaltados de los accesos norte y sur a la Ciudad de Villaguay		5		01/11/09	02/05/11	5.000	389	389	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	44	51	ENTRE RIOS	130	Villa Elisa - Villaguay		8	79,0	01/11/									

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme RNN° 3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Estancia La Julia	8	73,6	07/03/07	05/03/10	225.760	36.437	21.884	0	1,1%	23,0%	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Autovía Güer Aike - Río Gallegos y Desvío Tránsito Pesado	8	21,0	07/03/07	05/03/10	147.447	30.364	30.364	8.604	5,3%	54,8%	6	
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike- Punta Loyola	Acceso Aeropuerto Río Gallegos - Pte. s/Río Chico	8	14,0	02/08/07	31/07/09	92.906	30.364	30.364	0	3,2%	9,2%	6	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Córdoba - Empalme RNN°60	Sec. I: km 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acceso a Sinsacate	8	2,2	01/03/06	29/01/08	22.251	1.170	1.170	0	0,0%	99,7%	7	
22	9	57	51	MISSIONES	101	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	Piñalito - Deseado - Empalme RPN°19	8	31,0	22/03/06	20/03/09	101.581	721	721	44	7,6%	100,0%	6	A
22	9	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Puente Victorino de la Plaza	Reparación de Puentes	5	0,1	14/02/08	14/10/08	3.863	1.493	1.493	844	0,0%	99,9%	7	
22	9	60	51	BUENOS AIRES	Av. Mitre	Calle 55 (Est. Hudson) - Av. F. Varela (Lim. Part. Quilmes)	Repavimentación y Ensanche Avenida Mitre	8	7,2	20/04/06	17/01/09	60.087	2.794	2.794	1.144	0,1%	99,4%	7	
22	9	61	51	BUENOS AIRES	S/N	Acceso a Parque Industrial Chacabuco	Av. Juan XXIII y Acceso a Parque Industrial	8	2,8	01/11/06	30/09/08	15.996	1.215	1.215	321	0,0%	98,5%	7	
22	9	62	51	BUENOS AIRES	Av. Vergara	Av. Vergara - Calle 23 - Camino Gral. Belgrano	Partido de Berazategui	8	4,6	24/02/06	23/09/08	47.531	1.527	3.328	2.198	0,0%	98,8%	7	
22	9	63	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acceso Autopista Buenos Aires - La Plata por Av. Iriarte (España)	Primera Etapa	8	2,6	24/01/05	23/02/07	25.238	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/07	27/02/10	79.074	8.094	8.094	3.860	7,5%	47,9%	6	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/09	31/10/10	6.000	177	177	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 3	Empalme Avenida Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/09	02/05/11	50.000	566	566	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	39	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca - S. 4	RPN°33 Puente s/Río del Valle	8	4,7	01/11/09	02/05/11	13.000	486	486	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	65	51	CATAMARCA	60	Fiambala - Paso San Francisco	Quebrada de las Angosturas - km 1419,10 - km 1425,06	8	6,0	14/01/08	13/09/08	4.147	1.430	1.430	375	0,0%	88,4%	7	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente Gral. Belgrano		5	0,5	01/11/09	30/10/13	158.624	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilización Cerro Chenque		5		01/11/09	31/10/11	4.000	353	353	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Empalme RNN°40 - Gualjaina	RNN°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/07	31/08/09	41.668	4.801	4.801	0	3,2%	52,1%	6	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acceso a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/07	06/03/10	61.361	17.004	17.004	532	10,8%	40,2%	6	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Empalme RNN°40	Km 30,00 - km 65,00 - 2° Sección	8	30,3	01/02/08	30/01/10	48.905	17.004	17.004	1.209	9,6%	34,0%	6	
22	9	74	51	CHUBUT	P56 Y 40	Alto Río Senguer - Empalme RPN°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/06	06/01/10	32.379	3.036	3.036	0	10,8%	63,4%	6	
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/11/09	31/10/11	25.000	1.062	1.062	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	78	51	CORDOBA	35	Empalme RNN°7 - Empalme RNN°8	Puente s/A° El Gato (km 669,87)	5	0,1	27/12/05	27/04/06	228	366	366	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	79	51	CORDOBA	38	Puente s/Río San Antonio en Carlos Paz		8	0,3	01/09/06	30/08/10	4.628	542	542	0	0,6%	70,4%	6	
22	9	85	51	CORRIENTES		Puente Reconquista - Goya	Puente Nuevo y Accesos	8	50,0	01/11/09	30/10/14	530.000	5.000	10.000	4.290	0,0%	0,0%	0	
22	9	86	51	FORMOSA	11	Aeropuerto El Pucu - Empalme RNN°81	Km 1167 - km 1184,44	8	10,9	23/11/06	23/05/08	14.819	1.268	1.268	0	0,0%	100,0%	7	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. de Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/11/09	31/10/11	32.762	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0	
22	9	89	51	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. I	I - Gral. Güemes - Fortín Leyes	8	25,1	07/05/07	05/05/09	95.699	18.218	18.218	0	15,9%	87,5%	6	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. II	II - Fortín Leyes - San Martín N° 2	8	32,7	10/08/07	08/08/09	100.466	30.364	30.364	12.051	9,9%	51,4%	6	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. III	III - San Martín 2 - Cabo 1° Lugones	8	24,8	20/11/07	18/11/09	78.161	27.935	27.935	7.706	11,9%	42,1%	6	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S. IV	IV - Cabo 1° Lugones - Posta Cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/07	08/10/09	112.225	36.437	36.437	15.550	7,4%	41,7%	6	
22	9	90	51	FORMOSA	P1	Misión Laishi - El Colorado	Presidente Irigoyen (23000) - el Colorado (35025,40)	5	58,0	27/06/05	26/04/08	16.882	1.266	1.266	0	0,0%	100,0%	8	
22	9	91	51	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He-He	Secciones I, II y III	5	70,0	20/05/05	18/04/08	54.654	3.279	3.279	0	0,0%	99,9%	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acceso Sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Empalme RNN°9	8	8,0	07/08/06	06/04/09	140.605	5.223	8.858	8.858	7,2%	94,7%	6	
22	9	94	51	MENDOZA	7	Luján - Potrerillos (Sector Agua de Las Avispas)	Destilería YPF - Potrerillos- Sector Agua de las Avispas	8	5,0	05/02/07	06/08/07	701	121	121	0	0,0%	98,6%	7	
22	9	95	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo - Tunuyán - Sección II	Empalme RNN°7 - Ugarteche	8	13,6	25/01/05	24/01/08	54.192	1.700	1.700	0	0,0%	83,4%	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Sección II - b	Prog. 22,900 - Acceso a Cajón Grande	8	20,9	01/11/09	02/05/11	25.427	1.264	1.964	72	0,0%	0,0%	0	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Sección III- b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/07	01/09/09	92.818	5.332	5.332	52	8,4%	26,2%	6	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Sección III - a	Acceso a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/07	13/01/10	96.624	1.212	5.267	4.800	13,1%	65,7%	6	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II												498.802	469.436	105.538					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III																			
22	10	1	51	MENDOZA		Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/11/09	31/10/10	25.000	1.533	1.533	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	2	51	MISSIONES		Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/11/09	30/10/12	10.000	460	460	0	0,0%	0,0%	0	A - C
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta Ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/09	31/10/10	1.500	243	243	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	5	51	NEUQUEN	40	Las Lajas - Chos Malal - Pte. s/A° Pilmatue	Ptes. s/R° Salado; R° Pichi Neuquén y R° Neuquén	8	1,0	15/03/07	14/07/07	2.309	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/11/09	31/10/11	36.000	1.274	1.274	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Empalme RNN°231	Sección IV: Acceso Villa Trafal - Empalme RNN°231	8	20,6	21/02/06	21/08/10	94.613	7.287	7.287	7.171	7,9%	63,7%	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acceso a Godoy	8	21,0	13/02/08	11/02/10	140.098	36.437	36.437	14.715	11,5%	33,6%	6	A
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy- Acceso a Cervantes	8	21,0	01/11/09	31/10/11	98.000	3.468	3.468	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Cervantes- Acceso a J.J. Gomez	8	22,2	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a J. J. Gomez - Acceso a Fernandez Oro	8	22,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	A
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Fernandez Oro - Acceso a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	01/10/09	30/09/11	43.000	1.522	1.522	0	0,0%	0,0%	0	A
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Empalme RNN°237	Secciones I y II	8	65,0	01/11/09	30/10/12	86.400	3.036	3.036	0	0,0%	0,0%		

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs		
22	10	20	51	SANTA CRUZ	3	PiedraBuena	Puente s/ Río Santa Cruz	5	0,2	01/11/09	31/10/10	5.000	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/07	29/07/10	193.736	29.150	29.150	11.561	6,7%	49,1%	6			
22	10	23	51	SANTA FE	168	Santa Fe- Túnel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia- Pte. s/Río Colastiné	5	3,5	01/06/09	30/05/12	140.269	4.737	4.737	0	0,0%	0,0%	4			
22	10	24	51	SANTA FE	178	Empalme RNN°33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	31,0	29/10/08	28/04/12	185.658	60.728	60.728	8.477	2,7%	5,7%	6			
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Empalme RNN°34	203-233	8	30,0	01/11/09	31/10/10	20.000	6.073	6.073	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	26	51	MENDOZA	143	Salto de la Rosa - San Rafael	Km 650 - km 655,55	5	5,5	31/01/07	02/05/07	400	121	121	0	0,0%	100,0%	7			
22	10	27	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Autopista Rosario - Córdoba (Av.Pellegrini)	Río Parana - Av. Pellegrini - km 0,00 - km 10,125	8	10,1	13/02/06	31/01/09	69.191	1.215	1.215	1.090	0,0%	88,9%	7			
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	19,9	01/06/09	31/05/11	130.000	3.918	3.918	0	0,0%	0,0%	2			
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi)- Principio Autopista	Sección V: Empalme Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/07	05/11/09	116.069	18.218	17.218	0	0,3%	71,1%	6			
22	10	34	51	ENTRE RIOS	P2-12-131-	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32		11	1,0	01/11/09	31/10/11	6.500	1.215	1.215	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección RNN°015 y Calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y RNN°14	8	1,0	01/11/09	02/05/10	653	911	911	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	36	51	LA PAMPA	35	Santa Rosa - Ataliva Roca		8	46,0	01/11/09	30/10/13	30.000	3.036	3.036	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/11/09	02/05/10	2.500	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección RNN°22 y RNN°237	8	1,5	01/11/09	02/05/10	2.500	5.769	5.769	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rotonda Av. Fortabat - Rotonda Empalme RPN°13	8	5,1	01/11/09	30/10/12	21.687	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0	A		
22	10	40	51	SANTA FE	11-A012	Acceso Sur - Mejoramiento Ferrovial	Intercambiador RNN°11 y RNN°A012 y Pte. s/Desvío Ferroviario	8	2,4	14/11/06	14/07/08	34.560	1.457	1.457	367	0,0%	82,8%	7			
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int.Av. H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acceso ParqueNacional Tierra del Fuego	8	22,0	01/11/09	02/05/11	60.000	4.858	4.858	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Empalme Ex. RNN°3	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/07/09	30/09/09	10.000	4.251	4.251	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	46	51	BUENOS AIRES	188	Variante paso por Pergamino	Km 64,50 - km 72,00	8	7,5	01/11/09	31/10/11	30.000	1.717	1.717	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme RNN°40 (S)- Emp. RPN°51	Sección I y Sección II	8	58,0	01/11/09	30/10/12	170.000	3.036	3.036	0	0,0%	0,0%	0			
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme RPN°51 - Límite con Chile	Sección I y Sección II	8	47,0	01/11/09	30/10/12	130.000	3.644								

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico				
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs	
22	11	12	51	SAN JUAN	40	Puente s/Río Jachal - Progresiva 0,00 - 41530,32		8	41,0	01/05/09	30/04/11	6.000	3.644	3.644	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	San Francisco - Saturnino Laspiur	8	46,1	01/11/09	30/10/12	230.600	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovia San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	32,2	01/11/09	30/10/12		3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/11/09	30/10/12	187.350	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/09	30/10/12	216.800	3.401	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Empalme RPN°6	8	36,6	01/11/09	30/10/12	183.100	3.522	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Empalme RPN°6 - Gral. Deheza	8	29,2	30/06/09	28/06/12	146.050	3.036	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. S/ Río Chucul	8	39,7	01/11/09	30/10/12	198.550	3.158	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/09	30/10/12	106.150	2.429	0	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 y RPN°73		8	0,5	01/11/09	31/10/10	3.000	901	901	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte. c/Jujuy		8	40,0	01/11/09	30/10/14	200.000	5.952	5.952	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	28	51	MENDOZA	7	San Martín - Mendoza (Acceso a Mercado Cooperativo)	Km 1034,9 (Acceso a Mercado Cooperativo)	8	2,0	22/11/07	22/07/08	2.192	1.093	1.093	0	0,0%	97,9%	7		
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalación de Santiago del Estero	Empalme RNN°9 (N) - Empalme RNN°9 (S)	8	7,5	01/02/08	30/01/10	49.971	17.004	17.004	3.421	9,3%	31,6%	6		
22	11	30	51	ENTRE RIOS	40	Trama Urbana Ciudad de Nogoyá	Empalme RNN°12 - Empalme RPN°26	8	3,8	13/06/07	12/03/08	8.670	1.006	1.006	0	-0,1%	96,6%	7		
22	11	31	51	MISIONES	12	Lte. c/Corrientes - A° Itaembé - Acceso a Garupá	Variante RNN°12	8	21,5	01/11/09	31/10/11	40.000	2.476	2.476	0	0,0%	0,0%	4		
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexión Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/11/09	30/10/12	54.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	33	51	RIO NEGRO	151	Empalme Acceso a Dique Ballester		8					1.380	1.380	0	0,0%	0,0%	12		
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Empalme RNN°22 - Colonia Catriel	Intersección con RPN° 69 - km 30,8 y Acceso a Villa Manzano	8	6,0	17/06/08	16/06/09	7.220	1.104	2.316	1.709	0,4%	35,6%	6		
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Empalme RN°66 - Empalme RN°34	8	13,0	01/11/09	30/10/12	60.000	25.914	25.914	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Empalme RN°IV 66 - Empalme RN°34	8	12,4	01/11/09	31/10/11	50.000	1.786	1.786	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/11/09	30/10/13	150.000	2.977	2.977	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	37	52	JUJUY	34	Acceso San Pedro de Jujuy - Libertador Gral. San Martín		8	57,0	01/11/09	30/10/15	400.000	3.969	3.969	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	39	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. IV)	Sección IV: 114.000 - 137.416	8	23,4	08/05/07	06/04/09	41.274	6.073	6.073	3.134	18,5%	96,8%	6		
22	11	40	51	CATAMARCA	60	Tinogasta - Fiambala y Fiambala - Lte. con Chile		8	248,0	25/06/04	24/12/05	42.846	607	607	0	0,0%	100,0%	7		
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Empalme Autopista RNN°38		8	8,0	01/11/09	02/05/11	21.000	991	991	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acceso a San Benito - Av. Almaguer (Paraná)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/11/09	31/10/11	15.000	1.591	1.591	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	I - Prog.48200 - 70000	8	21,8	25/04/08	23/01/10	57.876	15.789	15.789	3.984	12,7%	29,7%	6		
22	11	54	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. I)	II - 70000 - 92000	8	22,0	26/04/07	23/01/09	48.507	3.983	10.919	8.356	7,5%	100,0%	7		
22	11	55	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S. III)	Sección III: 92.000 - 114.000	8	25,0	08/05/07	06/04/09	46.886	4.490	4.490	3.069	16,3%	87,3%	6		
22	11	57	51	CORDOBA	PT227 - 13	Mina Clavero - San Lorenzo	Cura Brochero	8	6,2	15/11/06	15/08/08	5.064				0,0%	99,6%	7		
22	11	61	51	CORDOBA	RP 18	Acceso a Sanatorio J.J. Puente	Prog. 0,00 - Prog. 8,1	8	8,1	14/01/08	30/11/08	6.317				0,0%	34,1%	7		
22	11	63	51	CORDOBA	PS N° 397	Empalme RNN°13 - km 17		8	6,0	01/11/09	31/10/10	8.000	121	121	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	68	51	ENTRE RIOS	S/N	Diamante - Parque Nacional Pre Delta	Acceso Parque Nacional Pre Delta	8	5,1	26/06/07	24/09/08	6.167	497	497	0	0,0%	97,4%	7		
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Empalme RPN°5 - Parque Nacional El Rey	Acceso Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/08	30/09/09	18.970	0	3.001	2.571	4,7%	16,5%	6		
22	11	73	51	TUCUMAN	RP 307	Tafí del Valle - Limite con Catamarca	El Blanquito - El Infernillo	8	60,0	11/07/08	09/01/10	21.113				2,5%	10,7%	6		
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/11/09	31/10/11	10.000	1.212	1.212	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	Km 111,00 - km 136,48 (Empalme RNN°22)	8	25,5	01/11/09	31/10/11	15.000	802	802	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	81	51	SAN JUAN	20 - 141	Ciclovia Difunta Correa - Caucete - Empalme RNN°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I y Ia: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	01/11/09	31/10/10	7.000	1.670	1.670	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de Accesos a la Ciudad de Santa Fe (Circunvalación Oeste y Acceso Norte)		8	19,1	01/11/09	02/05/11	36.304	828	828	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	84	51	TUCUMAN	P323	Famailia - Río Colorado (Empalme RNN°38 - Empalme RNN°157)	Km 2164,79 - km 2184,79	5	10,0	03/03/08	02/07/09	8.848				2,1%	18,0%	6		
22	11	85	51	TUCUMAN	P325	Empalme RNN°38 (Monteros) - Empalme RNN°157 (Simoca)		8	18,0	26/02/08	25/09/09	12.814				5,1%	30,4%	6		
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde RNN°281 a Pto. Deseado	Intersección con RNN°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Indus	8	22,0	01/04/07	30/04/09	79.292	30.003	30.003	4.179	6,6%	47,6%	6		
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Perón en Posadas (Colectora)		8	40,5	01/11/09	31/10/11	14.000	188	188	0	0,0%	0,0%	0	A	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/08	16/05/09	4.969	0	0	0	5,2%	44,7%	6		
22	11	92	52	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Secc: II - Pr. 45,350 - Pr. 75,450	8	30,1	24/07/07	21/01/09	7.525	1.336	1.336	0	9,4%	99,9%	7		
22	11	92	53	JUJUY	P 83	Empalme RNN°34 - Valle Grande (Colorado)	Pr. 84,200 - Pr. 96,500	8	12,3	25/07/07	23/04/09	8.335	1.579	1.579	0	1,3%	65,5%	14		
22	11	92	54	JUJUY	P83	Empalme RNN°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/07	31/05/09	3.415	1.193	1.193	0	0,0%	13,6%	14	C	
22	11	93	51	SALTA	51-68	Av. J.F. Kennedy- Rda. Limache, El Aybal/RNN°68 y 51 Distr. Rda Limache		8		01/11/09	31/10/11	30.000	138	138	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Los Berros	Empalme RNN°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/09	31/10/11	30.000	2.136	2.136	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección RNN°228 Y RPN°73		8		01/11/09	31/10/10	3.000	919	919	0	0,0%	0,0%	0		
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	RNN°A010 (Acceso a Puerto Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/08	31/05/12	350.725	55.870	55.870	0	2,5%	13,9%	6		
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV													229.117	216.218	30.423					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V																				
22	12	1	51	PAIS	Vs	Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/09	30/12/09	3.644	3.644	3.644	322	25,0%	25,0%	6		
22	12	2																		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA														Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs		
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/09	31/10/11	32.500	1.150	1.150	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/09	31/10/11	23.400	828	828	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación Calles de Piedrabuena		11		14/12/07	12/12/09	29.625	12.146	0	0	2,3%	24,4%	6			
22	12	27	51	SANTA CRUZ		Pavimentación Urbana El Chaltén y Protección Márgenes río Fitz Roy		11	5,8	20/12/06	15/04/09	24.741			0	1,2%	86,8%	6			
22	12	28	51	SANTA CRUZ	281	Empalme RNN°3 - Pto. Deseado	Empalme RNN°3 - km 65 / Acceso Pto. Deseado						21.767	0	0	0,0%	0,0%	12			
22	12	29	51	CHACO	95	Empalme RNN°9 - Lte. con Formosa		8		01/11/09	31/10/11	50.000	1.770	1.770	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: RPN°2 - Yala		8	13,0	01/11/09	31/10/11	28.000	991	991	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Empalme Av. Belgrano (Av. Circunvalación de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/09	23/02/14	582.943	5.540	57.147	29.147	1,5%	1,5%	6			
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	01/11/09	31/10/11	79.505	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	2			
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/09	31/10/11	100.000	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	01/11/09	31/10/11	92.260	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Empalme RPN 65) - General Villegas (Emp. RNN°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/09	31/10/11	85.000	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	43	51	CHUBUT	- RP 2 -A01	Arroyo Verde - Empalme RNN°A 010 / Emp. RNN° 3 - Pto. Piramides	Empalme RNN°3 - Empalme RPN°1	8	87,3	22/08/08	21/08/11	134.301	4.751	4.751	2.217	2,3%	3,9%	6			
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/09	31/10/10	30.000	2.123	2.123	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Empalme RPN°4 - Emp. RPN°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/08	13/01/10	66.559	4.280	11.744	10.716	13,8%	44,5%	6			
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/09	31/10/11	40.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. Con Salta	Posta Cambio Zalazar - El Remanso - Lamadrid	8	250,0	01/11/09	30/10/14	250.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de Paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/09	31/10/11	70.000	2.476	2.476	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/09	31/10/11	20.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	53	51	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - km 2303,40	8	18,6				2.914	2.914	0	0,0%	0,0%	12			
22	12	54	51	SANTA CRUZ	P 39	Empalme RPN°43 - Bajo Caracoles	Km 0,00 - km 184	8	184,0	13/04/07	11/04/10	223.277			0	0,1%	46,0%	6			
22	12	55	51	SANTA CRUZ	P 49	Empalme RPN°39 - Empalme RNN°3		8	200,0	30/12/07	28/12/10	127.997	42.510	0	0	0,2%	29,7%	6			
22	12	60	51	LA PAMPA	2 (Ex RPN 1	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Empalme RNN°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/09	30/10/12	100.000	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Empalme RNN°152 - Chelforo (Emp. RNN°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	01/11/09	30/10/12	87.000	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	63	51	SANTA FE	34	Rosario - Empalme RNN°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,6	01/11/09	02/05/11	20.000	944	944	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Empalme RPN°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/09	02/07/10	6.449	685	685	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	68	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 1 - Empalme RNN°123 - Puesto Ciro	Prog. 0,00 - Prog. 34,00	8	34,0	01/11/09	31/10/11	92.112			0	0,0%	0,0%	4			
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Empalme RPN°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241	8	41,2	01/11/09	02/05/11	140.422	43.132	0	0	0,0%	0,0%	3			
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	01/11/09	31/10/11	64.500	1.625	1.625	0	0,0%	0,0%	2			
22	12	71	51	BUENOS AIRES	9	Rehabilitación antigua Traza e/A° Escobar y Calle Don Bosco		8		01/11/09	02/07/10	7.000	743	743	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/08	19/05/11	197.644	66.000	79.439	18.439	7,6%	29,6%	6			
22	12	83	51	TUCUMAN	EX365	RN°65 (EX365) Empalme RNN°38 Lte. c/Catamarca	RN°38 - Alpachiri	8	18,0	01/11/09	31/10/10	20.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	84	51	FORMOSA	S/N°	Aeródromo Localidad de Ingeniero Juarez	Empalme RNN°81 - Fin Tramo	8	1,5	17/10/07	17/03/08	10.762	228	228	0	0,0%	96,2%	7			
22	12	85	51	SGO DEL ESTERO	P6	Pampa de los Guanacos - Sachayoj	Km 0,00 - km 48,60	8	48,6	01/11/09	31/08/15	72.000		0	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	86	51	RIO NEGRO	P8	La Esperanza - Los Menucos	Km 56,00 - km 62,634	8	6,6	07/12/07	06/04/09	11.512	3.036	3.036	0	28,1%	97,4%	6			
22	12	87	51	CHUBUT	RP 7	Pavimentación Urbana Cdad. de Rawson y su Acceso por RPN°7		8	15,5	25/08/08	23/02/11	36.492	782	782	0	3,5%	6,7%	6			
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matías G. Sanches km. 3478,94 - km. 3537,80	8	58,9	01/04/09	31/03/11	43.333	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matías G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/04/09	31/03/11	56.250	2.654	2.654	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	93	51	MISIONES	101	Acceso a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento RNN°101	8	34,0	01/04/09	31/03/10	18.500	1.309	1.309	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	95	51	CORDOBA	9	Autovía Córdoba - Villa del Totoral		8	70,0	01/08/09	31/07/11	300.000	10.614	4.314	0	0,0%	0,0%	0			
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/04/09	31/03/11	350.000	12.384	0	0	0,0%	0,0%	0			
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V														312.607	241.579	60.860					
Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI																					
22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Savin y con RNN°11	8		01/04/09	31/03/11	38.000	1.345	1.345	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Empalme RNN°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/08	13/04/10	38.045	0	2.601	1.347	15,0%	60,4%	6			
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acceso Monteros - Empalme RNN°38 (Actual)	8	20,0	01/04/09	31/03/11	195.000	5.804	5.804	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	5	51	CATAMARCA		Paso Externo por la Ciudad de Belen		8		01/11/09	31/10/11	30.000	1.062	1.062	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	7	51	CHUBUT	26	Empalme RNN°3 - Pampa del Castillo (Intersección RPN°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/06/09	31/05/11	170.000	6.015	6.015	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/04/09	30/09/10	25.000	1.179	1.179	0	0,0%	0,0%	0	A - C		
22	13	10	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Sección II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	01/04/09	31/03/10	45.000	3.185	3.185	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	11	51	SALTA	68	El Carril - Río Ancho		8	24,0	01/07/09	30/06/11	82.000	2.902	2.902	0	0,0%	0,0%	0			
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza Lte. c/															

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/09	31/10/10	10.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/06/09	31/05/10	120.000	8.491	8.491	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Empalme RNN°40 - Lte. c/ Chile		8	185,0	01/08/09	31/07/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Obera	Variante por Oberá	8	12,0	01/08/09	30/01/11	50.000	2.359	2.359	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/08/09	30/01/11	20.000	944	944	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Vanante por Gral. Roca		8	14,0	01/10/09	30/09/11	50.000	1.770	1.770	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Misión la Paz - Tonono		8	114,0	01/09/09	31/08/11	300.000	10.614	4.314	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovía RNN°AO12		8	20,0	01/06/09	31/05/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	15,0	01/08/09	30/01/11	80.000	3.774	3.774	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Empalme RNN°98 - Lte. c/ Chaco	Variante Paso Reconquista y Avellaneda	8	16,0	01/07/09	30/12/10	60.000	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/10/09	30/09/11	160.000	5.661	5.661	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastian	Secciones I, II y III	8	92,0	01/10/09	31/03/12	230.000	6.510	6.510	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famailla	Secciones I, II , III , IV	8	78,0	01/09/09	31/08/11	400.000	122.810	31.407	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/10/09	30/09/11	20.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/07/09	30/06/11	20.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca		8	1,0	01/07/09	30/06/10	2.500	177	177	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidráulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/04/09	31/03/11	52.000	1.840	1.840	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ RPN°17		8		01/10/09	30/09/10	14.000	991	991	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión RNN°20 Y RNN°148	8	7,0	01/11/09	31/10/11	30.000	1.062	1.062	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/04/09	31/03/11	14.000	496	496	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovía Trelew - Gaiman	Sección I Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	01/05/09	30/04/11	92.800	3.406	3.406	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragón	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/08/09	30/01/11	20.000	944	944	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/10/09	30/09/11	90.000	3.185	3.185	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Ríos - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/10/09	01/04/11	35.000	1.651	1.651	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	49	51	PAIS	40	Acceso a Cantera - Antena		8		01/04/09	31/03/10	4.000	283	283	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/06/09	30/11/09	3.820	242	242	0	0,0%	0,0%	0	B
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Médano - Santa María	Río Yapez - Santa María	5	15,0	01/06/09	31/05/10	10.000	708	708	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	52	51	CHACO	95	Acceso Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/09	31/10/10	12.000	849	849	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	53	51	CORDOBA	9	Intersección con RPN°17		8		01/07/09	30/06/10	20.000	1.415	1.415	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme RNN°118	8	80,0	01/06/09	30/11/09	3.000	425	425	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Empalme RPN°40 - Empalme RNN°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/08/09	30/01/11	35.000	1.651	1.651	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero		5	120,0	01/09/09	02/03/11	120.000	16.983	3.415	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	58	51	BUENOS AIRES		Caminos de Acceso al Complejo Recreativo de Ezeiza		5		01/10/09	30/09/10	30.000	4.246	4.246	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	59	51	MENDOZA	143	Unión RNN°143 y 146	Acceso Norte a San Rafael	8	30,0	01/11/09	31/10/11	80.000	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección III	Anchoris - RPN°96	8	25,0	01/11/09	31/10/11	100.000	3.538	3.538	0	0,0%	0,0%	0	
22	13	61	51	MENDOZA	40	Luján de Cuyo -Tunuyán - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/09	31/10/11	80.000	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI												275.225	160.255	1.347					
Total Construcciones												4.075.814	3.952.418	797.347					
CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO																			
Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I																			
26	1	1	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. c/Chubut - Prog. 1.909,89 - Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	111,4	26/05/97	23/05/05	14.043	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	2	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog.1971,77- Prog. 1996,82- Pto. Deseado - Emp. RNN°3	13	132,3	24/04/97	21/12/04	13.515	121	121	0	0,0%	99,7%	7	
26	1	3	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Chacharramendi	13	127,8	03/07/97	30/10/04	9.733	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	4	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso a Cruz del Eje - Chemical / Empalme RPN°31 - Chemical	13	243,8	18/06/97	15/06/04	11.169	172	172	0	0,0%	97,7%	8	A
26	1	6	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta - Tucumán	Empalme RPN°307 - San Carlos / Empalme RNN°40N - Río Conchas (Pte)	13	142,3	04/06/97	30/11/09	26.257	583	583	342	1,3%	87,8%	6	
26	1	7	51	SALTA	68	Malla 401 B - Salta	Río Las Conchas (Pte) - Río Ancho (Pte)	13	114,8	30/04/97	26/09/09	28.145	476	476	119	1,5%	93,3%	6	
26	1	8	51	LA RIOJA	40N-60-75	Malla 403 - La Rioja - Catamarca	Emp.RNN°60 - Belén/ Aimogasta-Acceso Tinogasta/Aminga - Emp.RN°60	13	226,3	04/07/97	01/07/04	17.762	219	219	0	0,0%	97,7%	7	A
26	1	9	51	JUJUY	9-66	Malla 404 - Jujuy - Salta	Río Vaqueros (Pte.) - Lte. Salta-Jujuy /Lte. Salta - Jujuy-Río Yala (Pte)/Emp	13	148,9	05/04/97	02/09/04	12.938	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	10	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Acceso Gral. Pinedo - Lte. c/ Santiago del Estero / Lte. c/Chaco - Yuchán	13	178,6	22/05/97	18/12/05	23.197	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	11	51	SGO DEL ESTERO	89	Malla 405 B - Sgo. Del Estero	Yuchán - Empalme RNN°34	13	79,7	10/04/97	08/07/06	19.845	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	12	51	CORRIENTES	123-14-122	Malla 501 - Corrientes	Empalme RNN°117-Empalme RPN°155- km 139,00-Empalme RNN°14-Em	13	144,7	07/07/97	04/10/06	27.283	1.345	1.345	0	0,0%	85,8%	7	
26	1	13	51	ENTRE RIOS	12-18-32	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127-Lte. c/Corrientes -Empalme RNN°12-Empalme RPN°32	13	271,4	27/08/97	24/05/08	28.762	683	683	0	0,0%	98,2%	7	
26	1	14	51	CORRIENTES	119-123	Malla 507- Corrientes	Empalme RNN°14 - Empalme RNN°123 - Empalme RNN°12 - km 139,00	13	217,6	03/11/97	02/04/04	20.456	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	15	51	CHACO	95	Malla 508 - Chaco	Paralelo 28 - Tres Isletas	13	222,3	10/02/98	08/04/09	23.409	2.026	2.026	0	1,6%	95,3%	6	
26	1	16	51	CORRIENTES	14	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. c/Misiones	13	122,5	07/07/97	03/09/04	15.340	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	17	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Empalme RPN°20	13	272,6	14/10/97	11/10/04	20.028	121	526	526	0,0%	100,0%	7	
26	1	19	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro - Empalme RNN°50 / Empalme RNN°34 - Lte. c/Bolivia	13	204,7	18/07/97	15/08/04	16.672	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	21	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,8	15/08/97	13/08/03	16.006	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	22	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303													

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
26	1	29	51	BUENOS AIRES	229-249-22	Malla 206 - Buenos Aires	A/N RNN°3-P.Alta/ Empalme RNN°3- Emp. RNN°229/Emp. RNN°3-Pte. s/R	13	167,1	17/07/97	13/04/09	29.309	3.644	3.644	243	2,5%	89,5%	6	
26	1	31	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - km 123,43	13	123,4	09/12/97	08/05/04	26.066	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.c/ Río Negro- Empalme RNN°40S-Empalme RNN°258-Empalme RNN°2	13	201,2	01/12/97	28/12/08	34.892	1.094	1.094	949	0,8%	99,0%	7	
26	1	33	51	CHUBUT	3-25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 -Prog. 1512,60- Rawson- Pte. s/R.Chubut	13	250,4	14/11/97	11/11/04	21.472	121	121	0	0,0%	99,8%	7	
26	1	34	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Acceso a Las Lomitas	13	285,6	01/08/97	29/10/04	17.069	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/ Chubut-Lte. c/ Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/98	27/12/09	31.694	1.721	1.721	701	1,8%	96,2%	6	
26	1	36	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307 - San Luis	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,7	17/06/98	14/11/04	13.993	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	37	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Pte.s/Río Diamante	13	211,2	13/01/98	12/04/04	13.402	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	38	51	CORDOBA	9-60	Malla 204 - Cordoba	Jesús María- Lte.S.del Estero-Empalme RNN°9-Lte. c/Catamarca	13	309,5	12/07/97	09/06/04	15.095	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	39	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301- San Luis	Empalme RNN°20 - Emp. RNN°147 / Emp. RNN°7 - Emp. RNN°20	13	245,6	20/06/97	17/02/04	14.250	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	40	51	LA PAMPA	154	Malla 115 - La Pampa	Empalme RNN°35 - Empalme RNN°22	13	136,8	23/06/97	20/09/04	18.091	121	221	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN°86 - Empalme RNN°3	13	139,9	04/03/98	30/12/09	29.260	1.835	1.835	0	3,3%	98,2%	6	
26	1	43	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa - Carmensa / San Rafael - Emp. RNN° 40S / Pte. s/R Diam	13	223,3	13/08/97	11/03/04	15.295	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	44	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Emp. RNN°14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	25/10/97	22/07/09	28.724	394	394	173	1,8%	47,4%	6	
26	1	45	51	CORDOBA	20-148	Malla 210 - Córdoba - San Luis	A.S.J.Del Morro - Lte. c/Cordoba / Lte. c/San Luis - Villa Dolores / Villa Dolo	13	220,0	05/09/97	03/10/04	18.064	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Empalme RNN°12 - Emp. RNN° 14 Y 119	13	259,2	03/10/97	31/07/09	49.622	3.644	3.644	1.066	2,4%	75,2%	6	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso L. U3 - Empalme RPEX RNN°3	13	258,3	05/11/97	02/12/09	35.181	672	2.628	2.018	2,8%	98,1%	6	
26	1	48	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Río Negro	Empalme RNN°152 - Lte. La Pampa	13	281,3	14/06/97	12/06/03	14.887	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	50	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Río Colorado - Empalme RNN°152	13	221,6	31/07/97	28/10/04	17.642	166	166	0	0,0%	98,6%	7	A - C
26	1	51	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - A° La Teresa	13	195,7	29/10/97	27/07/04	9.986	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	52	51	NEUQUEN	237-231	Malla 109 - Neuquén	A° La Teresa - Lte. c/Río Negro- Emp. RNN°237-Emp.RNN°234	13	275,5	14/11/97	12/06/05	17.348	644	644	0	0,0%	90,1%	7	A
26	1	53	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Santiago del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	03/12/97	01/12/02	6.976	121	121	0	0,0%	100,0%	8	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquén	Arroyito - Acceso Zapala	13	134,7	31/10/97	28/02/10	31.735	1.336	1.336	1.270	2,0%	98,4%	6	
26	1	55	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso Larramendi	13	113,7	09/10/97	06/10/04	14.367	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	57	51	LA RIOJA	77-79-141	Malla 311 - La Rioja	Empalme RNN°79 - Emp. RNN°38 / Lte. c/San Luis - D. Tello / Emp. RNN°	13	282,8	13/11/97	12/05/04	13.412	121	121	0	0,0%	100,0%	8	A
26	1	60	51	RIO NEGRO	251	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°22 - Empalme RNN°250	13	118,7	25/07/97	23/03/04	14.994	160	160	0	0,0%	98,5%	7	A - C
26	1	61	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1817,55-Lte. c/Santa Cruz-Empalme RNN°3-Empalme RPN°20	13	140,7	23/06/97	20/11/07	20.403	1.097	1.097	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	62	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso Larramendi - Emp. RNN°33 (obras faltantes)	13	104,8	20/05/99	17/08/05	14.584	266	266	0	0,0%	96,3%	7	
26	1	63	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Est. Pozo Hondo - Acceso Malaspina	13	180,6	14/11/97	11/11/04	20.165	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	64	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 B - Santa Fe	Empalme RPN°2 - Lte. c/Chaco / Prog. 123,43 - Tostado	13	209,1	19/12/97	17/12/03	21.313	121	121	0	0,0%	100,0%	7	
26	1	65	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B - Corrientes	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	17/11/97	31/10/07	19.932	260	260	218	0,0%	93,8%	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Empalme RNN°Ex 3 - Empalme RNN°251	13	185,2	23/02/98	21/12/09	47.238	1.902	4.558	3.741	9,8%	86,7%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I													29.886	35.680	12.713				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II																			
26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquén	Catán Lil - Collón Curá	13	104,5	01/12/04	29/11/09	46.074	3.039	3.039	213	0,7%	89,1%	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Empalme RNN° 95 - Las Lomitas / Emp. RNN°81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/05	30/12/09	54.138	787	1.978	1.588	1,1%	96,8%	6	
26	2	50	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B - Río Negro	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/12/04	29/11/09	46.587	1.937	1.937	284	1,0%	97,0%	6	A - C
26	2	66	51	SAN JUAN	40N-150	Malla 306 - San Juan	Chimbas - Lte. c/La Rioja / Emp.RNN°40N - Arrequintin (Obras faltantes)	13	313,8	09/09/03	08/10/07	19.509	302	302	0	0,0%	96,6%	7	
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahía Blanca (Salida) - Lte. c/La Pampa / Lte. c/Bs.As. - Emp. RPN°1 (D)	13	138,0	01/03/05	27/02/10	60.293	6.000	6.000	324	0,5%	73,0%	6	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Empalme RPN°1 (D) - Estancia Los Manantiales	13	114,0	01/11/05	30/10/10	50.459	966	966	116	0,8%	95,1%	6	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Estancia Los Manantiales - Empalme RPN°10	13	111,3	01/05/05	29/04/10	74.804	10.000	10.000	2.233	6,1%	93,4%	6	
26	2	71	51	SANTA FE	A008	Malla 202 A - Santa Fe	F.C.G.Mitre - Empalme c/ Avda. Belgrano	13	27,9	19/11/03	17/01/07	38.487	192	192	0	0,0%	99,2%	7	
26	2	72	51	SANTA FE	11-33-34-A0	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	10/01/04	09/05/08	32.892	2.500	2.530	30	0,0%	98,5%	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucumán	Lte.c/ Cordoba - Empalme RNN°157 / Emp. RNN°60 - Acceso a Frías	13	114,6	01/02/05	30/01/10	38.548	834	853	446	0,8%	97,0%	6	
26	2	79	51	LA RIOJA	38-60	Malla 408 B - La Rioja - Catamarca	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Empalme RNN°38 - Aimogasta	13	166,7	03/12/04	01/12/09	59.945	521	1.308	807	0,6%	95,5%	6	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Empalme RNN°157 - Empalme RNN°38	13	171,9	02/05/05	30/06/10	53.282	1.319	1.319	413	0,8%	96,4%	6	
26	2	81	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A - Tucumán	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	19/06/01	17/07/09	28.019	222	222	32	1,7%	91,1%	6	C
26	2	93	51	MENDOZA	188	Malla 314 - Mendoza/San Luis	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	05/06/01	04/04/07	26.806	249	249	0	0,0%	97,6%	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Empalme RNN°5 - Estancia El Recreo	13	69,2	01/03/05	27/02/10	42.799	1.189	1.189	87	0,7%	97,3%	6	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/05	30/03/10	43.723	938	938	197	0,5%	98,1%	6	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Empalme RPN°10 - Lte. c/Córdoba / Emp. RNN° 35 - Acceso Quetrequén	13	158,3	01/04/05	30/04/10	42.559	1.400	1.400	0	1,2%	93,7%	6	
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Empalme RNN°7	13	71,9	01/03/05	29/04/10	40.405	954	954	334	0,5%	97,9%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II													33.349	35.377	7.104				
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III																			
26	3																		

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Total	Est	Obs
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Empalme RNN°40S - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/07	31/12/11	107.707	5.268	6.506	4.204	6,7%	68,7%	6	
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-24	Malla 332 - San Juan	Lte. c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circunvalación S	13	105,0	02/05/05	29/11/10	64.262	4.980	4.980	268	0,6%	97,6%	6	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Stgo. Del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/06	30/12/10	56.941	1.470	1.470	690	0,9%	93,9%	6	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R 9-Emp.R 34/Emp.R 66-E	13	148,9	01/10/05	29/09/10	49.337	850	850	807	1,5%	98,2%	6	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucumán	Santiago del Estero - Empalme RNN°38	13	151,9	01/08/05	30/10/10	52.920	3.036	3.036	523	1,0%	86,8%	6	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucumán - Sgo del Estero	Acceso a Frías - Empalme RPN°329	13	128,0	01/04/05	30/03/10	45.324	1.822	1.822	572	0,9%	91,8%	6	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12 - 131	Malla 513 B - Entre Ríos	Km 333,49 - Empalme RPN°32 / Empalme RPN°11 - Emp. RNN°12	13	99,9	01/03/05	27/02/10	46.073	928	928	500	1,1%	96,0%	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3 - 281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Empalme RNN°3	13	180,1	01/11/09	30/10/14	81.023	3.058	3.058	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	18	51	CHUBUT	3 - 25	Malla 102 A - Chubut	Empalme RNN°25 - Prog. 1512,60 / Rawson - Puente s/Río Chubut	13	250,4	01/12/04	29/11/09	47.004	7.287	7.287	0	0,8%	66,0%	6	
26	3	19	51	CHUBUT	3	Malla 102 B - Chubut	Estancia Pozo Hondo - Acceso a Malaspina	13	230,4	01/12/04	29/01/10	58.836	9.109	9.109	0	0,9%	70,7%	6	
26	3	20	51	LA PAMPA	152 - 143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Empalme RNN°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/06	31/12/10	38.665	1.394	1.394	663	1,3%	90,1%	6	
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Río Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/05	29/04/10	52.668	2.429	2.429	97	0,9%	89,8%	6	
26	3	22	51	NEUQUEN	31 - 237 - 40	Malla 109 - Neuquén	Empalme RNN°40S-Lte. c/Chile / A°La Teresa-Emp. RNN°40S / Emp. RNN°20	13	291,2	01/02/05	30/01/10	49.188	3.036	3.036	328	2,0%	91,0%	6	
26	3	23	51	LA RIOJA	38 - 79	Malla 207/304 - La Rioja - Córdoba	Acceso Dique Cruz del Eje-Chanical / Emp. RPN°31-Esperanza de Los Ce	13	334,0	01/07/05	29/06/10	51.440	3.036	3.036	638	0,9%	87,1%	6	A
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Empalme RNN°20	13	286,1	01/06/05	29/11/10	47.027	3.644	3.644	418	1,3%	87,7%	6	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte. c/La Pampa-Carmensa/San Rafael-Empalme RNN°40S/Pte.s/R.Diamante	13	223,3	01/03/05	27/02/10	40.306	1.457	1.457	203	1,5%	93,9%	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/05	29/06/10	44.867	1.579	1.579	365	0,8%	93,0%	6	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Empalme RNN°14 - km 139	13	108,2	30/04/08	28/04/13	70.421	8.226	19.139	10.478	12,0%	40,5%	6	
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julián	13	277,4	31/05/09	29/05/14	35.536	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	11	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Río Negro	Empalme RNN°3 - km 112,78 (EXP 11170/05)	13	112,8	01/09/07	29/08/12	73.859	6.485	13.240	12.717	14,3%	88,3%	6	
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133 - Neuquén	Empalme RNN°40 - Pichi Trafal y Nuevo Puente s/Río Aluminé	13	123,0	01/10/07	28/09/12	57.632	6.065	6.065	1.007	3,6%	35,1%	6	
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fé	Empalme RPN°2 - Emp. RPN°286 / Prog. 123 - Tostado	13	126,2	01/11/09	30/10/14	39.722	2.642	2.642	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Córdoba	Lte. c/La Pampa - Empalme RNN°8	13	203,3	01/06/09	30/05/14	91.463	43.407	37.107	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Córdoba	San Francisco - Villa María	13	156,6	01/06/09	30/05/14	57.227	18.988	18.988	0	0,0%	0,0%	1	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucumán	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/07	31/03/12	104.177	7.166	19.669	8.775	4,2%	87,0%	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437 - Tucumán	Lte. c/Catamarca - A/N RNN°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/06	28/04/12	92.236	14.653	14.653	5.080	13,4%	88,7%	6	
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/08	29/12/12	88.430	11.286	22.663	9.519	16,0%	53,4%	6	
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Empalme RNN°123 - Empalme RNN°123	13	109,3	01/11/09	30/10/14	49.194	30.848	30.848	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Empalme RNN°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/07	29/08/12	127.647	17.464	17.464	17.464	15,0%	49,9%	6	
26	3	39	51	NEUQUEN	22 - 237	Malla 106 - Neuquén	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/08	25/02/13	103.808	12.868	15.801	2.933	11,0%	33,0%	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - Prog. 1817,55	13	129,5	01/06/09	30/05/14	85.565	2.264	2.264	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Río Negro	Empalme RNN°251-Chimpay / km 258,84-Emp. RNN°22	13	192,1	01/11/09	30/10/14	112.363	10.574	10.574	0	0,0%	0,0%	2	A
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Empalme RPN°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/11/09	30/10/14	50.784	3.774	3.774	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Empalme RNN°33	13	104,9	01/11/09	30/10/14	47.183	3.585	3.585	0	0,0%	0,0%	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22 - 229 - 24	Malla 206 - Buenos Aires	Empalme RNN°3-Pte. s/Río Colorado / A/N RNN°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.	13	167,8	01/11/09	30/10/14	120.189	54.423	33.644	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Empalme RNN°7 - Puente s/Río Diamante	13	211,2	01/08/07	29/07/12	64.611	2.854	15.588	4.405	1,2%	84,4%	6	
26	3	46	51	SALTA	51 - 68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Puente)	13	109,5	01/06/09	30/05/14	99.838	21.851	5.463	0	0,0%	0,0%	2	
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/08	01/03/13	117.804	12.000	22.712	3.071	3,6%	28,8%	6	
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Empalme RPN°20	13	134,7	01/05/08	30/05/13	116.348	12.000	12.000	5.565	7,6%	19,0%	6	A-C
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Empalme RNN°11 - Emp. RNN°95	13	181,4	30/04/08	28/04/13	86.985	9.205	29.399	17.824	13,9%	44,9%	6	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III												407.716	489.452	129.443					
Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV																			
26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquén	Zapala - Catán Lil	13	133,7	01/11/09	30/10/14	60.183	2.271	2.271	0	0,0%	0,0%	0	A
26	4	2	51	LA PAMPA	43-151-V14	Malla 132 - La Pampa	Empalme RNN°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. RNN°1	13	114,1	01/11/09	30/10/14	69.000	46.088	38.088	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	3	51	LA PAMPA	152	Malla 134 - La Pampa	El Carancho - Casa de Piedra	13	222,0	01/11/09	30/10/14	99.900	4.529	4.529	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/07	28/03/13	57.162	9.239	9.239	2.851	7,5%	46,5%	6	
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Empalme RNN°40S / Emp. RPN°88 - Emp. RNN°143	13	145,8	01/08/06	29/07/12	47.344	4.428	4.428	0	3,8%	81,6%	6	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme RNN°144 - Malargüe	13	98,0	01/11/09	30/10/14	44.100	1.664	1.664	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Ríos	Empalme RNN°131 - Emp. RNN°127 / Emp. RNN°12 - Emp. RNN°32	13	133,3	31/05/07	28/05/12	90.882	8.185	8.185	5.480	5,8%	88,5%	6	
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaiquirí - Cuay Grande	13	103,7	01/07/07	28/06/12	76.7766							

CUADRO D
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

DATOS DE OBRA												Avance Financiero (en miles de \$)				Avance Físico			
PR	SP	PY	OB	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Cod	Long	Inicio	Fin	Inversión Total	Crédito Inicial	Crédito Vigente al 31/3/09	Devengado al 31/3/09	Avance 1° trim. 2009	Avance Total	Est	Obs
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/11/09	30/10/14	116.959	39.273	39.273	0	0,0%	0,0%	2	
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Empalme RNN°11 - Prog. 123	13	123,4	01/11/09	30/10/14	55.544	2.642	2.642	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquén	Lte. c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/11/09	30/10/14	125.100	4.721	4.721	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquén		13	114,5	01/11/09	30/10/14	51.503	1.943	1.943	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Empalme RNN°74 / Patquia - Emp. RNN°40N	13	300,8	01/07/06	28/06/12	81.225	11.015	17.898	17.643	13,3%	86,6%	6	B
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Darsena) / Emp. RNN°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/09	30/10/14	65.849	31.252	31.252	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Empalme RPN°13 (Prov. del Chaco) - Km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/06/09	30/05/14	144.614	47.460	47.460	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. RNN°50	13	205,1	01/06/08	30/05/13	130.000	58.874	8.874	1.913	2,8%	16,5%	6	
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Empalme RNN°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/08	28/04/13	142.998	22.982	22.982	22.982	17,0%	37,6%	6	
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120-S/N	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. RNN°14 - Emp. RNN°12/Acceso a Villaguay	13	194,5	01/11/09	30/10/14	87.512	47.460	47.460	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	35	51	ENTRE RIOS	18-130	Malla 510 - Entre Rios	Villaguay - Empalme RNN° 14 - Emp. RNN°14 - Villaguay	13	173,0	01/11/09	30/10/14	77.859	2.944	2.944	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Empalme RPN° 86 - Empalme RNN°3	13	139,6	01/11/09	30/10/14	62.829	2.371	2.371	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Empalme RNN°16- Empalme RPN°13	13	88,4	01/04/08	30/03/13	111.885	13.420	23.878	10.458	9,6%	54,4%	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/11/09	30/10/14	54.000	2.038	2.038	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Chapas - Paso de Indios	13	218,7	01/11/09	30/10/14	98.433	3.400	3.400	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	40	51	CHUBUT	25	Malla 631 - I	Las Plumas - Empalme RNN°62 - Km 310,80 - km 419,69	13	107,0	01/11/09	30/10/14	74.430	2.809	2.809	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Empalme RNN°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/11/09	30/10/14	69.354	2.617	2.617	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Empalme RNN°74 - Lte. con Catamarca / La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/06	30/07/11	56.292	1.535	1.535	1.075	4,3%	99,7%	6	B
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/11/09	30/10/14	56.174	2.044	2.044	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Empalme RNN°20	13	78,0	01/11/09	30/10/14	70.038	2.643	2.643	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquen - Lte. c/Chubut	13	144,4	01/11/09	30/10/14	42.319	3.019	3.019	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	46	51	RIO NEGRO	3-251	Malla 140 -I	Empalme RNN°251- Pasaje A Verde- Emp. RNN°250- Emp. RNN°3	13	254,0	01/11/09	30/10/14	114.291	3.019	3.019	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	47	51	CHACO	16	Malla 530	Empalme RNN°95 - Lte. con Santiago del Estero	13	143,0	01/11/09	30/10/14	64.278	2.425	2.425	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Empalme RPN°20	13	79,0	01/11/09	30/10/14	92.309	3.483	3.483	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	49	51	CORRIENTES	118	Malla 512 A	Empalme RNN°12 Sur - Pje. Iguate Pora	13	84,3	01/11/09	30/10/14	37.930	1.510	1.510	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	50	51	CORRIENTES	118	Malla 512 B	Pje. Iguate Pora - Empalme RNN°12 (Norte)	13	113,5	01/11/09	30/10/14	51.053	1.963	1.963	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Empalme RNN°35 - Emp. RNN°22	13	137,0	01/11/09	30/10/14	61.542	2.322	2.322	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79 - 141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Empalme RPN°31; Empalme RNN°79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/07	28/12/12	100.223	13.772	13.772	825	0,8%	30,5%	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	0(N) - 60 - 7	Malla 403	Empalme RNN°60 - Río Agua Clara; Aimogasta (S) - Acceso a Tinogasta	13	242,2	01/11/09	30/10/14	108.972	4.113	4.113	0	0,0%	0,0%	0	B
26	4	54	51	LA RIOJA	76 - 150	Malla 308	Empalme RNN°150 - Vinchina; Patquia - Portezuelo	13	307,0	01/11/09	30/10/14	138.038	5.209	5.209	0	0,0%	0,0%	0	B
26	4	55	51	SALTA	16	Malla 430	Lte. c/Chaco - Coronel Ollerios	13	114,0	01/11/09	30/10/14	51.282	1.935	1.935	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	RPN°6 A° Altamirano - Gral. Galarza/RPN°39 Nogoya - Emp. RPN°6	13	86,0	01/07/06	28/06/12	49.237	1.330	1.330	108	0,7%	90,4%	6	
26	4	59	51	SALTA	16	Malla 433	Coronel Ollerios - Empalme RNN°9 y N°34	13	90,0	01/11/09	30/10/14	40.698	1.536	1.536	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Empalme RNN°50 - Lte. c/Bolivia	13	159,0	30/11/07	27/11/12	129.245	16.682	16.682	8.665	3,1%	35,2%	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20 - 79	Malla 307	Acceso Quines - Lte. c/San Juan / Acceso Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/08	29/10/13	77.228	31.032	31.032	1.158	6,4%	14,2%	6	
26	4	62	51	INTERPROVINCIAL	16	Malla 436		13	170,0	01/11/09	30/10/14	76.500	2.887	2.887	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	63	51	CORDOBA	158	Malla 231	Villa María - Río Cuarto	13	231,0	01/11/09	30/10/14	62.312	2.351	2.351	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	66	51	MENDOZA		Malla 314	Empalme RPN°3 - Acceso a Colonia Alvear	13	161,5	01/11/09	30/10/14	100.000	2.742	2.742	0	0,0%	0,0%	1	
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbass - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/11/09	30/10/14	40.000	2.264	2.264	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40 - 150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/11/09	30/10/14	40.000	2.264	2.264	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26 - 40	Malla 635	Empalme Ex RPN°20 - Empalme RNN°40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/11/09	30/10/14	52.581	1.985	1.985	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. C/Río Negro - Emp. RPN° 14	13	119,8	01/11/09	30/10/14	78.000	2.944	2.944	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acc. Ascasubi - Emp. Ex RN N°3	13	124,7	30/11/07	27/11/12	113.634	15.491	18.094	18.094	11,9%	59,2%	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/11/09	30/10/14	80.000	6.039	6.039	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	76	51	RIO NEGRO	251 - 3	Malla 139	Empalme RNN°250 - Emp. RNN°3 / Emp. RNN°251	13	253,7	01/11/09	30/10/14	120.000	4.529	4.529	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	77	51	TUCUMAN		Malla 409 A	Empalme RPN°329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/11/09	30/10/14	50.000	1.887	1.887	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	78	51	SANTA FE	11-33-34-A0	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/11/09	30/10/14	80.000	3.019	3.019	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	Avenida de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	23,0	01/11/09	30/10/14	60.000	2.264	2.264	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/11/09	30/10/14	200.000	2.830	2.830	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/11/09	30/10/14	95.634	3.610	3.610	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Empalme RNN°34	13	186,6	01/11/09	30/10/14	82.152	3.101	3.101	0	0,0%	0,0%	0	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Empalme RPN°9	11	89,3	01/10/09	29/09/14	60.000	2.993	2.993	0	0,0%	0,0%	0	
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)												631.936	598.330	135.394					
Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento												1.102.887	1.158.839	284.655					
Total Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad												5.533.512	5.520.715	1.220.845					

N°	Estado
1	Publicada
2	Licitada
3	Adjudicada
4	Contratada
5	Replanteada
6	En Ejecucion
7	Finalizada Sin R.P.
8	Finalizada Con R.P.
9	Paralizada
10	Rescindida
11	Desestimada
12	Eliminada
13	A Reprogramar
14	Neutralizada
15	Preadjudicada
16	Suspendida

N°	Tipo de Obra
5	Reconstrucciones
8	Obras Nuevas
11	Mantenimiento
12	Señalamiento
13	Rehabilitación y Mantenimiento
14	Global
17	Obras de Seguridad

Referencias

A	Certificación demorada. Valor estimado
B	Global. El valor de certificación corresponde a la distribución proporcional del Crédito Vigente
C	Modificación de Obra en trámite
D	Convenio a convalidar Longitud y Monto sujeto a reajuste
E	Convenio finalizado con Monto inferior al previsto
F	Convenio en ejecución con avance inferior al previsto
H	Convenio a finalizar de acuerdo a lo previsto
I	Convenio con plazo vencido, con ampliación de plazo con el mismo monto de contrato
J	Reinicio de obra en estudio
K	Certificación de Pago Diferido.
S/D	Sin datos

Las Longitudes del Programa 22 - Subprograma 06 estan indicadas en metros

CUADRO E
INVERSION REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA AL 31/03/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	2.170.012.898	2.173.121.144	306.704.795	179.658.614	10,3%
Provincia de Buenos Aires	1.929.715.189	1.868.032.277	219.439.605	187.738.945	10,7%
Provincia de Catamarca	52.849.958	64.296.983	19.806.170	19.749.474	1,1%
Provincia de Córdoba	601.064.498	500.380.809	88.681.527	85.766.187	4,9%
Provincia de Corrientes	214.673.203	193.038.029	29.150.977	29.143.916	1,7%
Provincia del Chaco	200.770.140	204.080.114	43.819.804	43.782.965	2,5%
Provincia del Chubut	273.620.030	306.670.787	83.711.522	64.296.970	3,7%
Provincia de Entre Ríos	274.971.566	293.516.900	68.264.739	67.762.246	3,9%
Provincia de Formosa	386.746.557	257.581.881	75.940.835	75.413.422	4,3%
Provincia de Jujuy	105.262.932	108.102.892	21.730.944	21.727.644	1,2%
Provincia de La Pampa	149.211.739	146.989.891	11.191.026	11.144.676	0,6%
Provincia de La Rioja	85.470.222	81.709.218	24.616.788	24.616.788	1,4%
Provincia de Mendoza	193.977.763	228.721.593	44.139.856	42.568.104	2,4%
Provincia de Misiones	186.078.296	182.547.720	27.258.557	24.723.574	1,4%
Provincia del Neuquén	97.992.923	82.098.355	21.206.627	19.574.526	1,1%
Provincia de Río Negro	486.053.849	480.236.185	106.193.068	97.873.473	5,6%
Provincia de Salta	306.926.764	244.747.070	78.879.677	39.053.814	2,2%
Provincia de San Juan	77.484.319	77.834.319	23.478.408	23.458.184	1,3%
Provincia de San Luis	57.131.290	84.865.782	9.438.807	9.408.699	0,5%
Provincia de Santa Cruz	295.001.595	202.714.137	56.737.452	56.729.143	3,2%
Provincia de Santa Fe	569.550.540	669.875.590	93.478.170	92.426.800	5,3%
Provincia de Santiago del Estero	209.637.424	219.267.585	39.034.891	39.034.891	2,2%
Provincia de Tucumán	306.172.628	210.566.580	30.448.756	30.331.134	1,7%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico S	27.897.318	23.599.318	1.552.633	1.551.516	0,1%
Interprovincial	1.189.903.647	1.171.178.146	206.116.307	204.193.607	11,7%
Nacional	1.188.964.753	1.444.119.944	228.346.235	228.165.340	13,1%
Binacional	34.256.936	39.012.407	9.393.123	9.393.123	0,5%
No Clasificado	89.450.992	98.451.992	26.727.821	18.806.124	1,1%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	11.760.849.969	11.657.357.648	1.995.489.120	1.748.093.897	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	40.085.000	280.000	0,7%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	97.459.721	88.340.000	968,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	700.000	700.000	0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	3.350.000	0	0,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	0	0,0%
Ministerio de Producción	46.342.800	46.677.600	334.800	0,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	12.203.345.234	12.422.820.234	219.475.000	1,8%
Ministerio de Educación	559.087.005	559.916.882	829.877	0,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	270.000	0,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	138.474.000	0	0,0%
Ministerio de Salud	110.531.644	103.007.644	-7.524.000	-6,8%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	7.809.461	579.461	8,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	6.479.523.000	110.000.000	1,7%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.951.980.422	412.585.138	2,1%

CUADRO G
EJECUCION DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/03/2009
(en pesos)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	39.805.000	40.085.000	3.197.505	3.157.155	7,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	9.119.721	97.459.721	34.599.664	34.599.664	35,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	700.000	700.000	125.000	120.000	17,1%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	3.350.000	3.350.000	3.050.000	2.164.553	64,6%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	4.942.880	4.942.880	1.125.000	1.125.000	22,8%
Ministerio de Producción	46.342.800	46.677.600	4.115.115	804.454	1,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	12.203.345.234	12.422.820.234	2.249.077.049	2.231.644.017	18,0%
Ministerio de Educación	559.087.005	559.916.882	175.164.636	175.164.636	31,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	46.944.000	47.214.000	8.290.000	8.290.000	17,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	138.474.000	138.474.000	11.926.522	11.926.522	8,6%
Ministerio de Salud	110.531.644	103.007.644	26.650.527	19.221.221	18,7%
Ministerio de Desarrollo Social	7.230.000	7.809.461	1.015.231	1.015.231	13,0%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	6.369.523.000	6.479.523.000	329.529.551	329.529.551	5,1%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.951.980.422	2.847.865.800	2.818.762.005	14,1%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACION GEOGRAFICA AL 31/03/2009
(en pesos)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	4.661.150.909	4.820.598.170	547.409.580	542.287.950	19,2%
Provincia de Buenos Aires	1.648.269.130	1.874.042.831	577.469.736	567.268.833	20,1%
Provincia de Catamarca	187.484.311	187.828.479	27.450.546	27.450.546	1,0%
Provincia de Córdoba	608.990.353	583.106.165	92.420.021	91.481.987	3,2%
Provincia de Corrientes	300.084.799	269.517.264	11.163.427	10.755.583	0,4%
Provincia del Chaco	588.616.889	576.138.100	88.119.319	87.512.319	3,1%
Provincia del Chubut	390.231.856	385.669.785	84.345.141	84.123.758	3,0%
Provincia de Entre Ríos	186.652.575	186.566.267	42.340.118	41.024.095	1,5%
Provincia de Formosa	216.882.460	213.042.650	57.958.340	57.740.493	2,0%
Provincia de Jujuy	233.039.561	227.603.354	60.363.813	58.352.981	2,1%
Provincia de La Pampa	171.550.054	171.555.071	22.348.895	22.236.040	0,8%
Provincia de La Rioja	327.144.545	321.819.465	32.071.165	31.733.011	1,1%
Provincia de Mendoza	269.370.147	273.257.385	50.046.506	49.572.253	1,8%
Provincia de Misiones	241.762.337	213.423.014	65.743.349	64.505.445	2,3%
Provincia del Neuquén	125.911.388	126.712.695	24.336.719	23.955.052	0,8%
Provincia de Río Negro	260.440.358	263.217.112	71.472.177	71.135.547	2,5%
Provincia de Salta	314.072.237	277.288.350	90.559.027	88.328.304	3,1%
Provincia de San Juan	383.943.898	398.416.310	82.093.545	81.825.897	2,9%
Provincia de San Luis	38.211.441	38.186.851	4.173.618	3.666.498	0,1%
Provincia de Santa Cruz	721.702.683	721.753.312	226.786.901	226.693.025	8,0%
Provincia de Santa Fe	341.567.484	355.285.847	43.900.993	43.045.637	1,5%
Provincia de Santiago del Estero	410.966.003	410.805.372	87.296.167	87.050.542	3,1%
Provincia de Tucumán	589.010.467	576.412.065	109.243.424	109.243.424	3,9%
Prov. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico S	142.823.442	112.820.485	11.816.655	11.721.613	0,4%
Interprovincial	1.772.995.000	1.772.995.000	199.299.020	199.299.020	7,1%
Nacional	3.528.727.957	3.651.126.023	33.700.000	33.700.000	1,2%
Binacional	869.908.000	869.908.000	93.000.000	93.000.000	3,3%
No Clasificado	7.885.000	72.885.000	10.937.600	10.052.153	0,4%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.539.395.284	19.951.980.422	2.847.865.800	2.818.762.005	100,0%

CUADRO I
EJECUCION DE LA INVERSION REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCION AL 31/03/2009
(en pesos)

Finalidad Función	Administración Central			Org.Descentralizados e Inst.Seg.Social		
	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental						
Legislativa	912.286	0	912.286	0	0	0
Judicial	24.764.145	35.131.696	59.895.841	1.158	0	1.158
Dirección Superior Ejecutiva	2.244.955	120.000	2.364.955	0	0	0
Relaciones Exteriores	4.521.853	0	4.521.853	0	0	0
Relaciones Interiores	68.791	0	68.791	72.620	0	72.620
Administración Fiscal	1.012.246	0	1.012.246	499	0	499
Control de la Gestión Pública	76.006	0	76.006	117.604	0	117.604
Información y Estadística Básicas	44.077	0	44.077	0	0	0
Subtotal	33.644.360	35.251.696	68.896.056	191.880	0	191.880
Servicios de Defensa y Seguridad						
Defensa	2.177.960	0	2.177.960	0	0	0
Seguridad Interior	40.022.288	2.164.553	42.186.840	81.701	0	81.701
Sistema Penal	11.218.823	0	11.218.823	0	0	0
Inteligencia	0	0	0	0	0	0
Subtotal	53.419.071	2.164.553	55.583.623	81.701	0	81.701
Servicios Sociales						
Salud	22.769.609	26.066.976	48.836.586	3.102.311	0	3.102.311
Promoción y Asistencia Social	184.381	155.154.070	155.338.451	31.594	745.500	777.094
Seguridad Social	14.887	0	14.887	15.086.268	0	15.086.268
Educación y Cultura	10.696.709	284.792.782	295.489.491	329.063	619.664	948.727
Ciencia y Técnica	12.210.558	0	12.210.558	52.910.452	9.507.878	62.418.330
Trabajo	2.511.642	11.926.522	14.438.165	43.691	0	43.691
Vivienda y Urbanismo	585	955.003.625	955.004.210	0	0	0
Agua Potable y Alcantarillado	1.994.361	124.163.028	126.157.390	134.691.902	42.482.148	177.174.050
Subtotal	50.382.733	1.557.107.004	1.607.489.737	206.195.281	53.355.190	259.550.471
Servicios Económicos						
Energía, Combustibles y Minería	30.183	655.407.246	655.437.429	1.755.929	0	1.755.929
Comunicaciones	0	32.350.000	32.350.000	510.468	0	510.468
Transporte	63.178.046	203.718.130	266.896.176	1.319.301.515	278.150.416	1.597.451.932
Ecología y Medio Ambiente	3.555.073	666.450	4.221.523	2.022.784	0	2.022.784
Agricultura	221.288	0	221.288	1.670.394	0	1.670.394
Industria	11.485	3.926	15.412	7.571.895	0	7.571.895
Comercio, Turismo y Otros Servicios	3.790.876	587.393	4.378.269	66.949	0	66.949
Seguros y Finanzas	0	0	0	491.986	0	491.986
Subtotal	70.786.952	892.733.146	963.520.097	1.333.391.920	278.150.416	1.611.542.337
TOTAL	208.233.115	2.487.256.398	2.695.489.513	1.539.860.782	331.505.606	1.871.366.389

RESUMEN	Inv.Real Directa	Transferencias	Total	Inv.Real Dir. %	Transf. %
-Administración Central	208.233.115	2.487.256.398	2.695.489.513	11,91%	88,24%
-Org. Descentral. e Inst.Seg.Social	1.539.860.782	331.505.606	1.871.366.388	88,09%	11,76%
TOTAL	1.748.093.897	2.818.762.004	4.566.855.901	100,00%	100,00%
