

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSION PUBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Año 2012


INDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA	
<u>I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2012</u>	4
1- Según Nivel Institucional	4
2- Según Fuente de Financiamiento	5
3- Según Ubicación Geográfica	5
<u>II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN</u>	6
CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<u>I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2012</u>	11
1- Según Nivel Institucional	11
2- Según Fuente de Financiamiento	12
3- Según Ubicación Geográfica	13
4- Según Beneficiario	14
<u>II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	14
CUADROS ANEXOS	
Cuadro A: Modificaciones Presupuestarias de la Inversión Real Directa al 31/12/2012	
Cuadro B: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2012	
Cuadro C: Inversión Real Directa-Proyectos de Inversión al 31/12/2012	
Cuadro D: Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad al 31/12/2012	
Cuadro E: Inversión Real Directa según Ubicación Geográfica al 31/12/2012	
Cuadro F: Modificaciones Presupuestarias de las Transferencias de Capital al 31/12/2012	
Cuadro G: Transferencias de Capital por Jurisdicción al 31/12/2012	
Cuadro H: Transferencias de Capital por Ubicación Geográfica al 31/12/2012	
Cuadro I: Ejecución de IRD y Transferencias de Capital, por Finalidad Función al 31/12/2012	

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y también sirven como instrumento para la producción de bienes y servicios. Incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).


En el siguiente gráfico se aprecia que la Inversión Pública Nacional durante 2012 fue de \$58.542,9 millones¹, mostrando una suba del 6,9% respecto al ejercicio 2011. Debe destacarse el fuerte crecimiento del gasto en inversión en la comparación con el ejercicio 2003, donde se ejecutaron \$1.495,7 millones. Esta tendencia también se verifica analizando la evolución de la Inversión Pública Nacional con respecto al producto, ya que durante el año 2012 alcanzó a 2,71% del PBI mientras que en el año 2003 la relación fue de 0,40%.

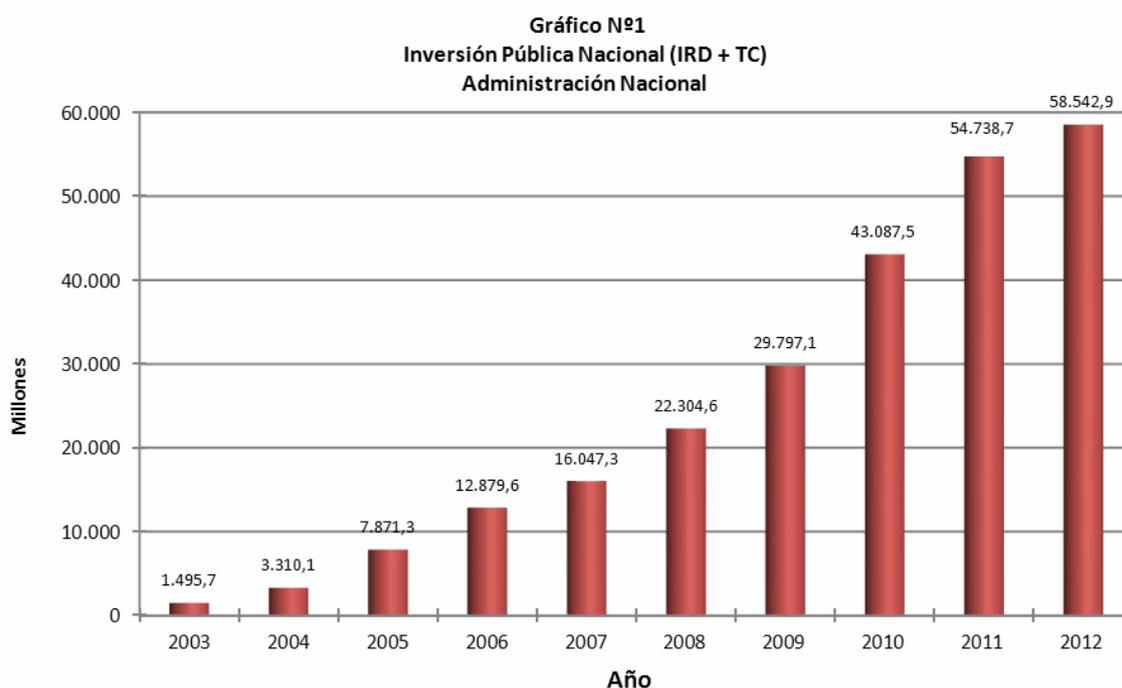

La Inversión Real Directa abarca los gastos de adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 31/12/12 un gasto devengado de \$15.645,0 millones (76,6% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias de recursos para gastos de capital, los cuales al 31/12/12 totalizaron \$42.897,8 millones, representando el 87,8% del crédito vigente a dicha fecha:


¹ La información financiera y física del presente informe corresponde a datos provisorios al mes de marzo de 2013.

Gráfico N°2 - Inversión Pública Nacional al 31/12/2012
Administración Nacional

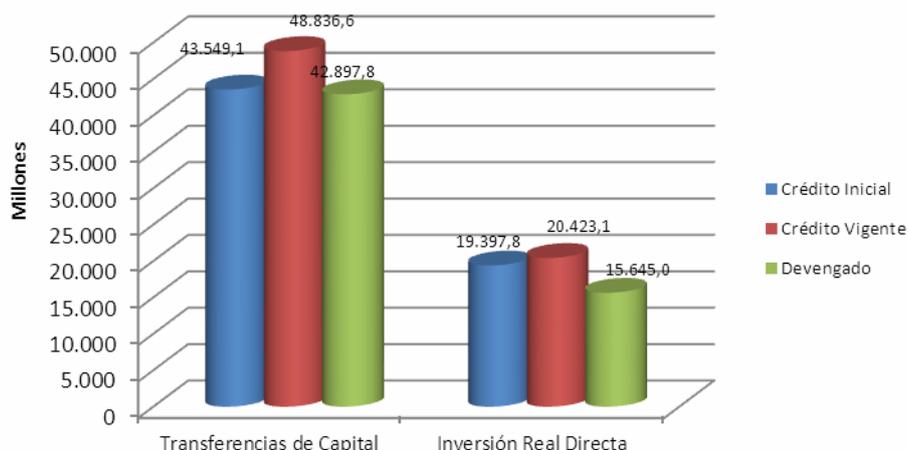


De acuerdo a los datos expuestos, el ritmo de ejecución de las transferencias de capital resultó superior al de la inversión real directa. Por su parte, la IRD puede discriminarse en **proyectos de inversión** (con una ejecución de \$12.985,2 millones) y en **maquinaria, equipos y otros conceptos** (\$2.659,9 millones):

Gráfico N°3 - Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2012
Administración Nacional

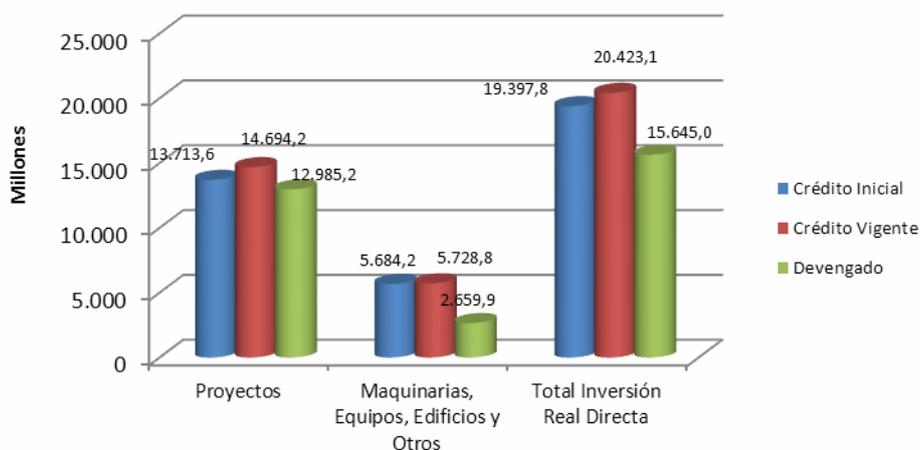

En cuanto a la ejecución de las transferencias de capital se destinaron \$23.645,3 millones a provincias y municipios (55,1% de la ejecución acumulada), \$13.578,9 millones a empresas públicas no financieras (31,7%), \$3.380,3 millones a empresas privadas (7,9%), \$1.341,2 millones a Fondos Fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional no Financiero (3,1%) y \$952,1 millones a otras transferencias (2,2%), como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico N°4
Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2012 - Administración Nacional

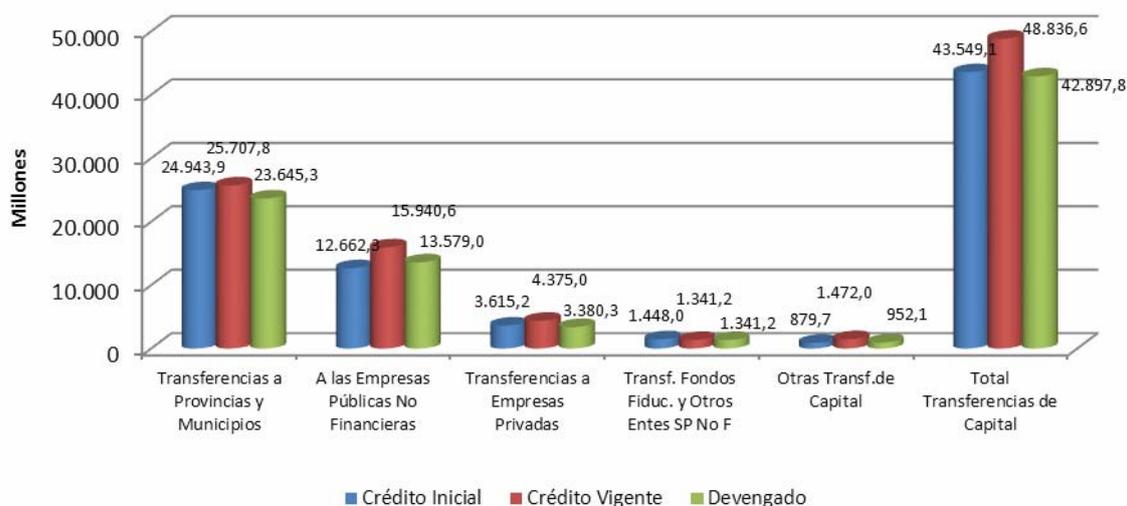

A continuación se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del ejercicio 2012, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 31/12/2012 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	19.397,8	20.423,1	15.645,0	26,7%	76,6%
Proyectos	13.713,6	14.694,2	12.985,2	22,2%	88,4%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	5.684,2	5.728,8	2.659,9	4,5%	46,4%
Transferencias de Capital	43.549,1	48.836,6	42.897,8	73,3%	87,8%
Inversión Pública Total	62.946,9	69.259,7	58.542,9	100,0%	84,5%

En lo que respecta a la Inversión Pública Total se registró al cierre del año 2012 una ejecución de 84,5% del crédito vigente, representando las transferencias de capital el 73,3% del monto global ejecutado. Desde el punto de vista de la evolución del crédito presupuestario, al cierre del año 2012 los proyectos de inversión aumentaron en \$980,7 millones (7,2%), la asignación inicial de las transferencias de capital aumentó \$5.287,5 millones (12,1%) y la adquisición de bienes creció \$44,6 millones (0,8%).

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tuvo una ejecución de \$15.645,0 millones al cierre del ejercicio 2012, mostrando un importante aumento en la última década. Se destaca también que para el cierre de 2012 el ratio IRD/PBI se ubicó en 0,72%:

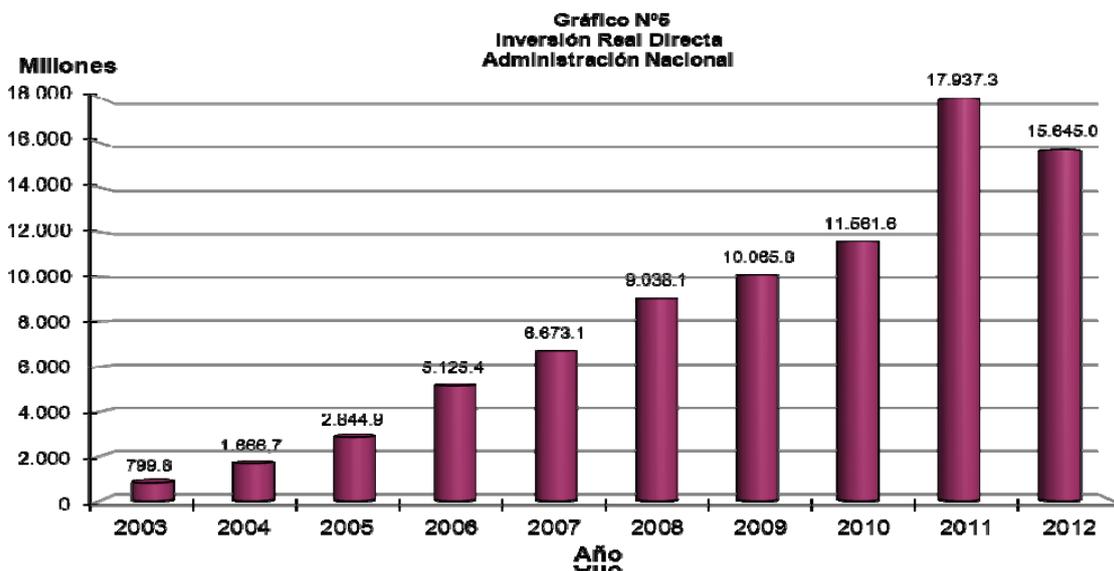

La ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 39,2% para el período 2003/2012, dando cuenta de su relevancia en la agenda pública de los últimos ejercicios.

1- Según Nivel Institucional

A continuación se expone un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del ejercicio de 2012, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 31/12/2012 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	4.927,0	4.832,0	2.980,5	19,1%	61,7%
Organismos Descentralizados	11.487,2	12.881,6	11.875,7	75,9%	92,2%
Instituciones de Seguridad Social	2.983,6	2.709,4	788,8	5,0%	29,1%
TOTAL	19.397,8	20.423,1	15.645,0	100,0%	76,6%

Los mayores montos se ejecutaron en los Organismos Descentralizados (75,9% del total), que a su vez tuvieron el porcentaje más alto de ejecución respecto a la asignación presupuestaria. A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor monto ejecutado al 31/12/12 y la variación interanual en relación a idéntico período de 2011:

Cuadro N° 3. Ejecución Inversión Real Directa comparada 4º trimestre 2011/2012 (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2011	Ejecución 2012	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	9.816,3	10.315,2	5,1%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Serv.	1.072,2	905,1	-15,6%
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	3.431,5	787,2	-77,1%
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	378,6	508,7	34,4%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	217,7	317,2	45,7%
Subtotal	14.916,3	12.833,4	-14,0%
Otros	3.021,0	2.811,6	-6,9%
Total IRD	17.937,3	15.645,0	-12,8%

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se aprecia que el 72,9% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente de Financiamiento al 31/12/2012 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente (CV)	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	14.608,1	13.616,7	11.410,3	72,9%	83,8%
Transferencias Internas	1.245,8	1.456,5	1.351,7	8,6%	92,8%
Otros Recursos Internos	1.873,8	3.775,3	1.823,6	11,7%	48,3%
Financiamiento Externo	1.670,1	1.574,6	1.059,5	6,8%	67,3%
TOTAL	19.397,8	20.423,1	15.645,0	100,0%	76,6%

La ejecución con **Tesoro Nacional** incluyó \$7.201,7 millones para proyectos viales, \$642,7 millones para el programa Conectar Igualdad.com.ar ejecutados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, \$460,7 millones para los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, \$349,7 millones para el proyecto Centro Cultural del Bicentenario en el edificio del Correo y Telecomunicaciones, \$294,4 millones para obras hídricas y de saneamiento y \$228,4 millones para el proyecto Recuperación y Reparación del Rompehielos ARA Almirante Irizar de la Armada Argentina. Con **Transferencias Internas** se financiaron obras viales por \$1.232,6 millones y con **Financiamiento Externo** sobresalieron \$567,5 millones destinados a construcciones y mallas viales.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentraron el 51,5% del gasto total. En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$2.195,0 millones incluyendo, principalmente, la inversión vial (\$1.537,7 millones), obras de saneamiento hídrico (\$156,3 millones) y la refuncionalización del Hospital Posadas (\$103,2 millones). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$3.574,1 millones) se registró una importante inversión en el Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Correo (\$349,5 millones), en la recuperación del rompehielos Irizar en el astillero Tandador (\$227,4 millones) y en la nueva sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el predio de las ex bodegas Giol (\$71,2 millones), entre otras iniciativas.

En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$749,7 millones, principalmente en construcciones viales. Entre ellas se destacan las obras en la Ruta Nacional N°60 empalme Ruta Nacional N°9 – Límite con Catamarca (\$78,8 millones), en las Rutas Nacionales N°9 y N°60 Villa del Totoral Límite con Santiago del Estero (\$78,6 millones) y en la autopista San Santa Fe-San Francisco (\$69,4 millones). En la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$949,9 millones, mayormente destinados a construcciones de rutas, comprendiendo la inversión en la Ruta Nacional N°22 Chichinales–Neuquén (\$123,7 millones), Ruta Nacional N°3 San Antonio Oeste – Límite con Chubut Secciones III y IV (\$108,8 millones), en la Malla 140 I de la Ruta Nacional

Nº251 (\$89,2 millones), Ruta Nacional Nº251 General Conesa – Acceso a San Antonio Oeste Secciones I y II (\$71,3 millones) y en la Ruta Nacional Nº23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (\$67,6 millones). Además en esta provincia se ejecutaron \$99,6 millones en inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica y \$78,9 millones inherentes al proyecto Misiones Satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. En la provincia de **Santa Fe** se devengaron \$588,6 millones, sobresaliendo las obras viales (\$546,6 millones) y destacándose diversos tramos en la Avenida Circunvalación de Rosario (\$190,70 millones), en la Ruta Nacional Nº178 empalme Ruta Nacional Nº 33 – Villa Eloisa (\$52,0 millones) y en la Ruta Nacional Nº95 empalme Ruta Provincial Nº2 (\$45,0 millones).

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura, que representa el 80,7% del costo total de la cartera y el 75,2% del gasto realizado al cierre del cuarto trimestre de 2012:

Cuadro Nº 5. Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Organismo	Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Devengado Ac. 31/12/11	Devengado 31/12/2012	% Dev. Ac. 2012/CT
DNV	Construcción de Rutas	84.462,9	28.701,4	5.861,1	40,9%
DNV	Proyectos CReMa	19.613,0	7.415,8	1.059,0	43,2%
DNV	Mantenimiento de Rutas	4.949,7	3.364,7	1.446,6	97,7%
CONAE	Misiones Satelitales	2.415,7	1.132,7	387,9	62,9%
CNEA	Construcción Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II	1.244,0	136,0	396,5	42,8%
Sec. Obras Púb.	Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo	926,8	463,4	349,5	87,7%
Sec. Transporte	Transporte Urbano de Bs As Etapa III	787,1	547,6	111,5	83,7%
CNEA	Construcción del Reactor RA-10	740,0	8,3	41,5	6,7%
ENOHSA	Construcción del Emisario Submarino Mar del Plata	199,2	145,9	111,3	129,1%
ENOHSA	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras Moreno	121,7	104,5	0,4	86,2%
	Subtotal	115.460,1	42.020,3	9.765,3	44,9%
	Total Proyectos	143.057,3	55.521,3	12.985,2	47,9%

(*) Costo total de proyectos de inversión, Inicio del ejercicio 2012

A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad tiene a su cargo el mantenimiento y la rehabilitación de 39.322 kilómetros de la red vial nacional y, eventualmente, realiza intervenciones en rutas fuera de la jurisdicción nacional.

Construcción de Rutas: representa la principal acción de inversión real directa que lleva a cabo la DNV, construyendo y rehabilitando rutas en toda la República Argentina. Al 31/12/12 en el subprograma **Pasos Fronterizos y Corredores Viales de Integración** se finalizaron diversas secciones en el tramo Galeguaychú – Paso de Los Libres (34,78 kilómetros en la provincia de Entre Ríos) y la Ruta Nacional Nº117 empalme Ruta Nacional Nº14 – Avenida Belgrano (8,04 kilómetros en la provincia de Corrientes). Además, se estaban realizando trabajos en distintas secciones de la Ruta Nacional Nº14, tramo Galeguaychú-Paso de Los Libres (299,57 kilómetros en las provincias de Entre Ríos y Corrientes), en la Ruta Nacional Nº40 tramos Malargüe-límite con Neuquén Sección III (50 kilómetros en la provincia de Mendoza) y límite con Santa Cruz empalme Ruta Provincial Nº22 (41,4 kilómetros en la provincia de Chubut) y comenzaron los trabajos en la Ruta Nacional Nº51 tramo Muñano – San Antonio de los Cobres (22,57 kilómetros


en la provincia de Salta). En el subprograma **Obras por Convenio con Provincias** se finalizaron obras en la Ruta Nacional N°23 tramo Valcheta-Pilcaniyeu (73,5 kilómetros en la provincia de Río Negro) y en rutas varias del territorio nacional en 23,32 kilómetros); encontrándose en ejecución 219 kilómetros al durante el cuarto trimestre de 2012. En el subprograma **Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes** se finalizaron los trabajos en 30 metros del puente Arroyo San Miguel en Ruta Nacional N°9 (provincia de Córdoba) y se encontraban en ejecución 4.213 metros al cierre del cuarto trimestre. En **Mejoramiento y Reposición de Rutas**, al 31/12/12, estaban en ejecución 4.072 kilómetros y se finalizaron 514,72 kilómetros:

Cuadro N° 6. Mejoramiento y Reposición de Rutas (km. finalizados al 31/12/12)

Ruta	Tramo	Sección	Provincia	Longitud
R.N.N°40S	Límite con Chubut – Perito Moreno		Santa Cruz	67,51
R.N.N°3	Gran Bajo San Julián - Río Gallegos	Est. Los Alamos-Aeropuerto Río Gallegos	Santa Cruz	112,00
R.P.N°71	Empalme RN.58 (Empalme RN.40) - Cholila	Km.0 – km 30	Chubut	30,00
R.N.N°38	Paso Externo por la Ciudad de Catamarca	Secciones I y V	Catamarca	10,73
R.N.N°22	Chichinales – Cipolletti	Acceso a Chichinales – Acceso a Godoy	Río Negro	21,00
R.N.N°7	Desaguadero – San Martín	La Paz – Santa Rosa	Mendoza	66,10
S/N°	Acceso desde R.N.N°281 a Puerto Deseado	Almirante Zar, Veneciano-Parque Industrial	Santa Cruz	22,03
R.N.N°7/8	Empalme RN8 – Empalme RP14/Límite con Córdoba –Empalme RN7		San Luis	44,96
R.N.N°149	Uspallata – Límite con San Juan	Estancia San Alberto-Estancia Tambillos	Mendoza	11,26
R.P.s/n°	Enlace con RN21 y RN226 – Olavarría – Azul	Empalme RN226 – Empalme RN°3	Buenos Aires	35,35
R.N.N°226	Bolívar-General Villegas	Km. 445,3- Km. 479,0	Buenos Aires	44,35
Rutas Varias	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		Nacional	49,43
Total				514,72

Seguidamente se presenta la evolución del programa **Construcciones**² de rutas durante el cuarto trimestre de los últimos 10 ejercicios, observándose el fuerte impulso desde el ejercicio 2003 y una tendencia a la baja desde el ejercicio 2009 por culminación de tramos, por el aumento de la complejidad de los trabajos (las autovías implican más dificultad que la pavimentación de caminos de ripio), por transferencias a provincias para inversiones en infraestructura³ y por el impulso a distintas iniciativas en corredores viales concesionados:

Gráfico N°6
DNV - Kilómetros en construcción durante el 4º trimestre (Programa Construcciones)

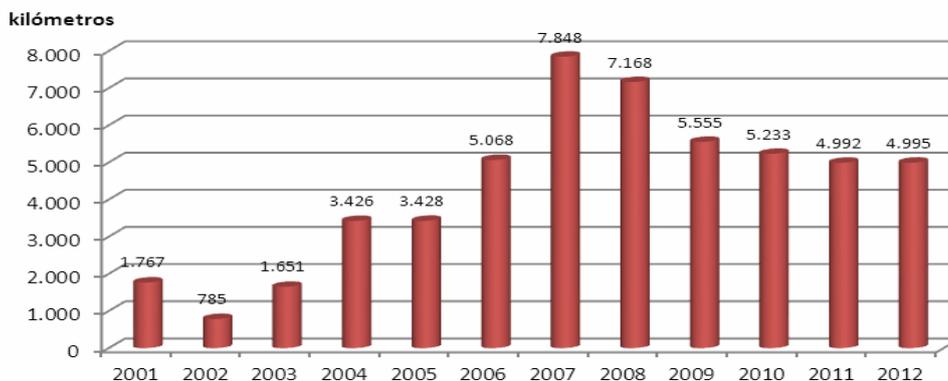

Proyectos Contratos de Recuperación y Mantenimiento (C.Re.Ma.): Al 31/12/12 las mallas en ejecución ascendían a 462 kilómetros para **C.Re.Ma I**, a 377 kilómetros para **C.Re.Ma II**, a 4.027 kilómetros para **C.Re.Ma III** y a 5.146 kilómetros para **C.Re.Ma IV**.

² Abarca las obras de inversión a cargo de la DNV, que se ejecutan bajo la modalidad de proyectos de inversión presupuestarios.

Mantenimiento de Rutas: Al 31/12/12 se efectuó el mantenimiento directo de caminos e indirecto mediante el **Sistema de Transferencias de Funciones Operativas** (se transfieren las funciones a las vialidades provinciales por convenios) y el **Sistema Modular** (de decreciente relevancia). La evolución de los kilómetros atendidos durante el quinquenio 2008/2012 se expone a continuación:

Cuadro Nº 7. Mantenimiento de la Red Vial (en kilómetros)

Sistema	2008	2009	2010	2011	2012
Directo	5.324	6.929	9.265	8.173	10.026
Sistema de Transferencias de Funciones Operativas	6.417	6.341	5.844	5.879	4.132
Sistema Modular	2.432	1.533	1.322	945	736
Total	14.173	14.803	16.431	14.997	14.894

Los kilómetros comprenden al promedio de los cuatro trimestres del de cada año.

Cabe agregar que al cierre de 2012 se finalizaron obras de conservación mejorativa en 3.150 kilómetros en el ámbito nacional, estando en trabajo 3.168 kilómetros. Asimismo, se finalizaron 35 kilómetros de obras de seguridad vial y se encontraban en ejecución 53 kilómetros.

Durante el ejercicio 2012 se finalizaron 17 obras de emergencia, estando en ejecución durante el cuarto trimestre otras 13 obras de emergencia y trabajos en 1.809 kilómetros de señalética turística y de señalización horizontal en 7.003 kilómetros en el litoral del país, 6.793 kilómetros en la zona norte del país, 2.765 kilómetros en la zona central del país, 3.049 kilómetros en la zona sur del país y 3.153 en el ámbito nacional.

Respecto a los programas del OCCOVI se encontraban en ejecución, al 31/12/12, diversas obras en 4.926 kilómetros y se finalizaron obras en 90,3 kilómetros en el Corredor Vial II, 51 kilómetros en el Corredor Vial III, 1.473 kilómetros en el Corredor Vial VI, 93 kilómetros en el Corredor Vial VII y 158,6 kilómetros en el Corredor Vial VIII. También se finalizaron 22,97 kilómetros en la Ruta Nacional Nº20 tramo Ruta Provincial Nº11 (Magdalena) – Ruta Provincial Nº36 (Vieytes) en la provincia de Buenos Aires. Cabe agregar que durante el cuarto trimestre estaban en ejecución trabajos en 312 kilómetros en el Corredor Vial I, 230 kilómetros en el Corredor Vial II, 481 kilómetros en el Corredor Vial III, 580 kilómetros en el Corredor Vial IV, 828 kilómetros en el Corredor Vial V, 1.467 kilómetros en el Corredor Vial VI, 534 kilómetros en el Corredor Vial VII, 268 kilómetros en el Corredor Vial VIII y 114 kilómetros en obras mejorativas con iniciativas privadas (Etapa I).

Comisión Nacional de Actividades Espaciales:

Misiones Satelitales: Al 31/12/12 en el marco del Plan Espacial Nacional 2007/2014 se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 8. Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
SAOCOM	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
SABIA 3-SARE I	Observación de la tierra	Brasil
SABIAMAR	Observación de la tierra	Brasil

³ La DNV no informa los kilómetros atendidos mediante transferencias de capital.

En la obra **Misión SAOCOM** continuaron las tareas de ingeniería de detalle preparatorias de la Revisión Crítica de Diseño de los módulos de transmisión-recepción de la Antena SAR y del segmento de vuelo y la construcción de modelos de calificación de la estructura del satélite, participando la firma INVAP SE, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Servicios Tecnológicos Integrados. Asimismo se realizó un informe favorable del comité de expertos internacionales y de la Agencia Espacial Canadiense. Durante el cuarto trimestre de 2012 se continuaron analizando los planes de implementación para la construcción de los modelos de vuelo de los satélites SAOCOM 1/A y 1/B con el objetivo de firmar los contratos de la construcción y prosiguieron las actividades correspondientes al contrato entre la CONAE y la empresa SPACE X para el lanzamiento de los satélites SAOCOM.

Los trabajos de la **Misión SABIA 3-SARE I** concernieron a las tareas de ingeniería conceptual del satélite, basándose en el concepto de arquitectura segmentada que remite a pequeños satélites que orbitan juntos formando un conjunto capaz de contener distintos instrumentos para observación de la tierra. Para estas tareas el contratista principal resultó la empresa Servicios Tecnológicos Integrados S.R.L. trabajando también en colaboración con diferentes entes del Sistema Científico Tecnológico Nacional.

Respecto a la **Misión SABIAMAR**, satélite argentino-brasileño de misión óptica, que proporcionará información sobre agua, ambiente y producción de alimentos en la zona del Mercosur, al 31/12/12 se continuó el desarrollo de la ingeniería conceptual, cuyo primer objetivo es establecer los requerimientos de la misión.

Comisión Nacional de Energía Atómica:

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase II: al 31/12/12 se continuó el proceso de restauración del predio CAREM (en la localidad bonaerense de Lima), se realizó la renovación de los antiguos laboratorios químicos, se preparó el sistema contra incendios y se integró el enlace telefónico y de internet entre el predio y la Sede Central. Asimismo se contrató a la firma NASA para la ejecución de la obra civil, estando a cargo de CNEA la dirección de la obra. El proyecto de inversión contempla una inversión global de \$1.244 millones y registró al 31/12/12 un avance físico del 18,92%.

Construcción del Reactor RA-10: el costo estimado asciende a \$740 millones, registrando al 31/12/12 un avance físico del 6,28%. En 2012 se completó la ingeniería conceptual y se dio curso a la ingeniería básica, habiéndose realizado la revisión preliminar de diseño. Asimismo se formalizaron los acuerdos de servicios para la realización de la ingeniería de acometida de servicios, para la ingeniería de combustibles y para la ingeniería básica del sistema de protección del reactor y del sistema de instrumentación nuclear.

Secretaría de Obras Públicas:

Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo: el propósito del proyecto es preservar un edificio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando un

centro cultural para uso de la ciudadanía. Al 31/12/12 continuó la ejecución de las obras y se registró un avance físico del 54,32%.

Secretaría de Transporte:

Transporte Urbano de Buenos Aires, Etapa III: al 31/12/12 continuaron los trabajos en las obras de pasos a diferente nivel en los partidos bonaerenses de Tigre y Malvinas Argentinas. También se llevaron a cabo mejoras en las estaciones de zona sur, sudoeste, oeste del conurbano y de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA):


Proyectos Cloacales y de Saneamiento: al 31/12/12 la construcción del emisario submarino en Mar del Plata, que ostenta un costo total de \$199,2 millones, registró una ejecución física acumulada de 70,06% con una ejecución financiera acumulada de \$191,7 millones. En lo que respecta a las obras de colectores cloacales y estaciones elevadoras en las localidades bonaerenses de Moreno y de Merlo, culminadas físicamente en el ejercicio 2010, se afrontaron durante 2011 y 2012 diversos gastos inherentes a certificaciones.

Por otra parte, al 31/12/2012 se terminaron los siguientes proyectos: Sistema de Provisión de Agua Potable Puerto Iguazú (provincia de Misiones), remodelación de la Planta Depuradora Sur y Cañerías Colectoras Tandil (provincia de Buenos Aires), construcción subacueducto de la Estación Reguladora de Presión N° 4 Cisterna Barrio Ciudadela Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), construcción de Colector Cloacal Oeste-Tramo II San Isidro (provincia de Buenos Aires), optimización Sistema Agua Potable – El Cadillal (provincia de Tucumán), Sistema de Provisión de Agua Potable Gualaguaychú (provincia de Entre Ríos), construcción del Sistema de Efluentes Cloacales en Campana (provincia de Buenos Aires), construcción Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales en Miramar (provincia de Buenos Aires), construcción de Acueducto Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (provincia de Chubut) y la Optimización Sistema Agua Potable Andalgalá (provincia de Catamarca).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 58,1% para el período 2003/2012, como se aprecia en el siguiente gráfico:

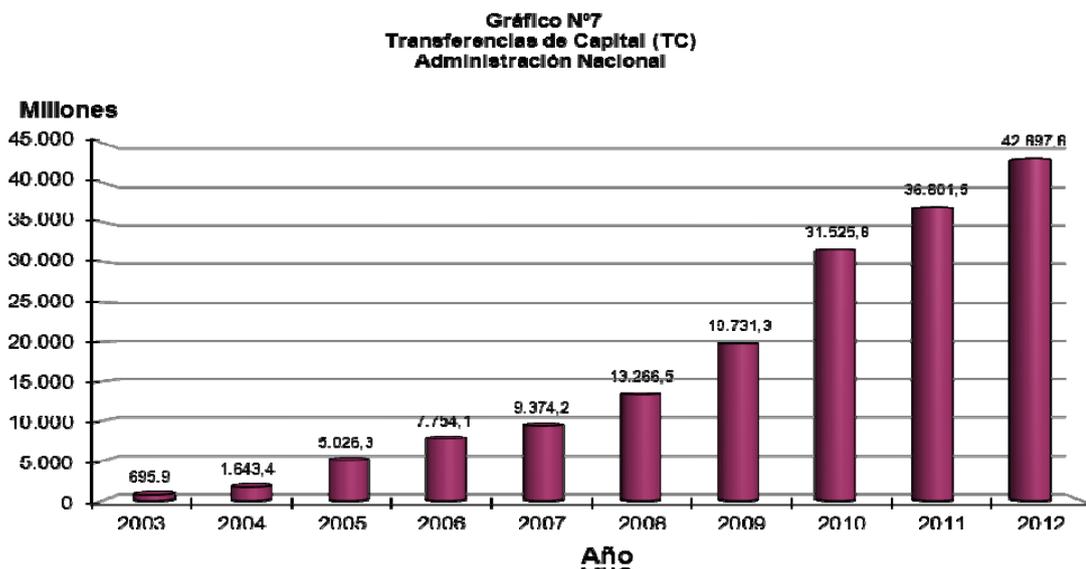

Respecto al PBI las transferencias de capital alcanzaron el **1,98%**, **totalizando una ejecución presupuestaria de \$42.897,8 millones** para 2012.

1- Según Nivel Institucional

Las transferencias de capital son realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°9: Ejecución de las Transferencias de Capital al 31/12/2012 (en millones \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	40.375,8	44.544,2	38.688,0	90,2%	86,9%
Organismos Descentralizados	3.173,3	4.292,4	4.209,9	9,8%	98,1%
TOTAL	43.549,1	48.836,6	42.897,8	100,0%	87,8%

A continuación se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 31/12/12 y la variación interanual respecto al ejercicio 2011:

Cuadro N° 10. Ejecución Transferencias de Capital al cierre del cuarto trimestre (en millones de pesos)

Organismo	Ejecución 2011	Ejecución 2012	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro (OCT)	15.137,3	20.991,6	38,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	15.631,0	14.618,0	-6,5%
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	3.074,4	2.925,5	-4,8%
Ministerio de Educación	1.315,1	1.989,9	51,3%
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	669,5	1.100,6	64,4%
Subtotal	35.827,3	41.625,6	16,2%
Otros	2.773,7	1.272,2	-54,1%
Total TC	38.601,0	42.897,8	11,1%

Las transferencias efectuadas por Obligaciones a Cargo del Tesoro correspondieron, principalmente, al Fondo Federal Solidario y a las firmas AySa S.A., Nucleoeléctrica Argentina S.A., Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., Energía Argentina S.A., Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios transfirió fondos para infraestructura habitacional, política energética, ferroviaria, aerocomercial y para obras públicas.

Además se destacaron los fondos para la construcción de rutas por convenio con las provincias (\$2.852,9 millones), para agua y saneamiento (\$1.100,6 millones) a cargo del ENOHSA, para equipamiento e infraestructura educativa (\$1.122,0 millones) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (\$581,1 millones).

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°11: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al al 31/12/2012 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	35.207,2	34.384,8	32.792,0	76,4%	95,4%
Financiamiento Externo	6.035,1	6.316,8	3.813,0	8,9%	60,4%
Recursos con Afectación Específica	2.056,1	2.078,9	491,3	1,1%	23,6%
Otros Recursos Internos	250,8	6.056,1	5.801,6	13,5%	95,8%
TOTAL	43.549,1	48.836,6	42.897,8	100,0%	87,8%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en transferencias, sobresaliendo las realizadas al Fondo Federal Solidario (\$7.326,0 millones), a AySA S.A. (\$3.229,0 millones), a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (\$2.514,7 millones), al programa Desarrollo Habitacional "Techo Digno" (\$2.258,4 millones), a la construcción de rutas provinciales (\$2.232,2 millones), a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (\$1.910,1 millones), a Energía Argentina S.A. (\$1.301,7), al fortalecimiento comunitario del hábitat (\$1.011,5 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$834,4 millones), para la política de energía eléctrica (\$724,4 millones), para formulación, ejecución y control de obras públicas (\$697,9 millones), acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura (\$697,0), a urbanización de villas y asentamientos precarios (\$602,8 millones) y para política de hidrocarburos (\$332,5 millones).

El **Crédito Externo** fue aplicado, principalmente, al desarrollo del Norte Grande (\$888,4 millones), a la ampliación de las redes eléctricas de alta tensión (\$763,6 millones), a infraestructura vial productiva (\$588,4 millones), al programa Más Escuelas, Mejor Educación (\$519,6 millones) y a AySA SA (\$253,8 millones); mientras que los **Recursos Afectados** correspondieron fundamentalmente al Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (\$419,8 millones)

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (47,7% del monto global). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe considerarse que una gran cantidad de obras no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la **provincia de Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias del Fondo Federal Solidario (\$1.553,9 millones), para infraestructura realizadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (\$740,5 millones), para la construcción de rutas por convenio con la provincia (\$514,8 millones), para urbanización de asentamientos precarios (\$452,0 millones) y al desarrollo habitacional "Techo Digno" (\$440,8 millones).

4- Según Beneficiario

A continuación se presenta un cuadro que muestra los fondos transferidos para infraestructura al cierre del cuarto trimestre de 2012, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 12. Ejecución por Beneficiario al 31/12/12 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Dev.
Gobiernos Provinciales	19.205,1	44,8%
Sector Público Empresarial	13.620,7	31,8%
Gobiernos Municipales	3.740,6	8,7%
Empresas Privadas	3.380,3	7,9%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	1.341,2	3,1%
Otros	1.610,0	3,8%
Total	42.897,8	100,0%

En el cuadro precedente se aprecia el impacto de las erogaciones con destino a los gobiernos provinciales, que representaron el 44,8% del monto total ejecutado al cierre del ejercicio 2012.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 94,4% del gasto realizado durante 2012:

Cuadro Nº 13. Principales transferencias de capital al 31/12/2012 (en millones de pesos)

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Participación
Asistencia Financiera al Sistema Energético	7.868,3	11.586,5	10.674,4	24,9%
Fondo Federal Solidario	9.010,4	8.010,4	7.326,1	17,1%
Transporte	4.994,8	6.085,7	5.043,0	11,8%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	4.796,8	5.344,4	4.914,5	11,5%
Acciones de Vivienda	5.248,8	4.993,2	4.827,6	11,3%
Inversión en Comunicaciones	3.798,7	4.714,4	3.108,8	7,2%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	3.628,8	3.030,1	3.012,2	7,0%
Acciones en el Norte Grande Argentino	1.372,8	1.899,8	1.573,5	3,7%
Subtotal	40.719,4	45.664,5	40.480,1	94,4%
Otros	2.829,7	3.172,1	2.417,7	5,6%
Total	43.549,1	48.836,6	42.897,8	100,0%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 31/12/12 el sector energético recibió \$10.674,4 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 24,9% del total de las asistencias financieras de capital efectuadas por la Administración Pública Nacional de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 14: Principales iniciativas en Energía y Combustibles al 31/12/12 (En millones de pesos)

Beneficiario	Devengad	
	o	Participación
Transferencias a Nucleoeléctrica Argentina S.A.	3.394,7	31,8%
Desarrollo de Líneas de Alta Tensión	2.350,1	22,0%
Transferencias a Energía Argentina S.A.	2.134,0	20,0%
Abastecimiento de Gas a Centrales Termoeléctricas	943,2	8,8%
Políticas de Energía Eléctrica a través de Gobiernos Provinciales	501,9	4,7%
Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior (FEDEI)	419,8	3,9%
Asistencia a Gobiernos Provinciales y Municipales para la Mejora de la Red de Gas	254,8	2,4%
Distribución de Gas y Fondo Fiduciario para el Subsidios a Consumos Residenciales	132,3	1,2%
Otros conceptos	543,6	5,1%
Total	10.674,4	100,0%

En lo relativo a los fondos para Nucleoeléctrica Argentina S.A, se continuaron las obras de terminación de la Central Nuclear Atucha II, como así también los trabajos de extensión de la vida útil de Embalse y de mantenimiento de Atucha I.

Al cierre del ejercicio 2012 la línea de alta tensión Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos-Calafate continuó en ejecución, registrando un avance financiero de \$2.350,1 millones, postulando la definitiva incorporación de la provincia de Santa Cruz al Sistema Interconectado Nacional e incrementando la seguridad y confiabilidad de su abastecimiento eléctrico. Asimismo la iniciativa permitirá conectar emprendimientos de generación en marcha (como la Central Termoeléctrica de Río Turbio) y futuros proyectos hidráulicos y eólicos, totalizando un **transporte de 500 Kv**. En cuanto al tendido NEA-NOA (1.210 kilómetros de extensión y 500 kv.) y a la línea eléctrica Comahue-Cuyo (707 kilómetros), se logró su habilitación comercial en 2011, registrándose durante 2012 diversas erogaciones vinculadas con las tareas transmisión provincial de dichos emprendimientos.

Por el lado de las transferencias para Energía Argentina S.A. se devengaron \$2.134,0 con el objeto de financiar diversas obras de infraestructura energética (como ser la construcción de centrales termoeléctricas, gasoductos y parques eólicos) en el marco del Programa de Energía Total. Este programa, creado en 2007, tiene como objeto garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos ya sea de combustibles líquidos como gaseosos, demandados tanto por el aparato productivo como por el conjunto de la población. Las cuatro líneas de acción llevadas adelante se enmarcan en el Plan General de Provisión de Combustibles Gaseosos, Plan de Provisión de Gas Natural Licuado, Plan de Provisión de Propano-Aire (Gas Sintético), Plan General de Provisión de Combustibles Líquidos.

Por otro lado, al 31/12/12 se devengaron \$943,2 millones para financiar las obras de ampliación de capacidad de abastecimiento central de gas destinado a Centrales Termoeléctricas y se ejecutaron \$501,9 millones en 8 obras de ampliación de líneas de tensión y una obra de repotenciación energética a través de gobiernos provinciales.

El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) tiene como finalidad la realización de obras para la generación, subtransmisión y distribución urbana y rural de energía eléctrica como así también la adquisición de materiales, respondiendo a las necesidades de desarrollo energético provincial. Al 31/12/12 se devengaron en este concepto \$419,8 millones,

con destino a las provincias de Misiones (\$25,6 millones), Santa Cruz (\$22,9 millones), Formosa (\$22,4 millones), Catamarca (\$21,7 millones) y La Rioja (\$21,1 millones).

Al 31/12/12 se ejecutaron obras de ampliación y optimización de la red gasífera a través de la asistencia financiera a gobiernos provinciales y municipales, registrando un devengado de \$254,8 millones. A continuación se detalla la composición geográfica de dichas asistencias:

Cuadro Nº 15: Asistencias a gobiernos provinciales y municipales para red de gas. Millones de pesos. Al 31/12/12

Provincia	Devengado	Participación
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	66,1	25,9%
Mendoza	52,4	20,6%
Buenos Aires	50,8	19,9%
Río Negro	41,3	16,2%
Santiago del Estero	20,3	8,0%
La Rioja	10,1	3,9%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5,3	2,1%
Córdoba	4,1	1,6%
Interprovincial	3,2	1,2%
Total	254,8	100,0%

Por otra parte se ejecutaron \$132,3 millones para atender erogaciones vinculadas al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (Ley Nº 25.565) y a las obras de suministro de gas natural a usuarios que anteriormente eran abastecidos por gas propano indiluido por red.

Fondo Federal Solidario:

Está integrado por el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de soja y sus derivados y se destina a financiar en provincias y municipios obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial. Estas asistencias financieras representaron el 17,1% de las transferencias de capital ejecutadas al 31/12/12. A continuación se detalla la participación de cada provincia dentro del **Fondo Federal Solidario**:

Cuadro Nº 16: Fondo Federal Solidario al 31/12/12 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	1.553,9	21,2%
Santa Fe	632,4	8,6%
Córdoba	628,4	8,6%
Chaco	353,0	4,8%
Entre Ríos	345,5	4,7%
Tucumán	336,6	4,6%
Mendoza	295,1	4,0%
Santiago del Estero	292,4	4,0%
Salta	271,2	3,7%
Corrientes	263,1	3,6%
Formosa	257,6	3,5%
San Juan	239,2	3,3%
Misiones	233,8	3,2%
Jujuy	201,0	2,7%
Catamarca	194,9	2,7%
Río Negro	178,5	2,4%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	174,6	2,4%
San Luis	161,5	2,2%
La Rioja	146,5	2,0%
La Pampa	132,9	1,8%
Neuquén	122,8	1,7%
Chubut	111,9	1,5%
Santa Cruz	111,9	1,5%
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico	87,3	1,2%
Total	7.326,0	100,0%

Políticas de Transporte

Al 31/12/12 se devengaron \$5.043,0 millones en materia de transferencias de capital destinándose el 84,3% a empresas privadas concesionarias de los servicios de transporte y a instituciones provinciales y municipales con el objeto de optimizar, garantizar y eficientizar el transporte ferroviario, vial, marítimo y aéreo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 17: Principales Beneficiarios en materia de Transporte al 31/12/2012 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Participación
Administración central provincial	3.032,4	60,1%
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.	751,9	14,9%
Aerolíneas Argentinas	155,2	3,1%
Ente Administrador Astillero Río Santiago	81,3	1,6%
Hidrovia S.A.	150,0	3,0%
Benito Roggio e hijos S.A.	61,8	1,2%
Trenes de Buenos Aires S.A.	49,8	1,0%
Nación Servicios S.A.	41,2	0,8%
Herso S.A.	5,7	0,1%
Otros organismos provinciales	18,0	0,4%
Municipio de Concordia	22,0	0,4%
Metrovias S.A.	1,8	0,0%
Municipio de Berisso	3,8	0,1%
Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.	2,1	0,0%
Ferrovías S.A.	2,0	0,0%
Sociedad Operadora de Emergencia S.A.	1,4	0,0%
Siemens S.A.	1,0	0,0%
Municipio de Escobar	0,8	0,0%
Ferrocarril S.A.	0,8	0,0%
Nuevo Central Argentino S.A.	0,1	0,0%
Otros Beneficiarios	660,2	13,1%
Total	5.043,0	100,0%

En lo que respecta a las transferencias a las provincias, sobresalieron por su envergadura las obras de mejoramiento y construcción de caminos y rutas de todo el país llevadas adelante por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En materia de transporte aerocomercial, se destacó la asistencia financiera a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de renovar la flota de aviones existente de la firma. Al 31/12/12 el monto ejecutado alcanzó la suma de \$ 155,2 millones.

El objetivo de las ayudas a empresas privadas es contribuir a cubrir los gastos de sostenimiento y reposición de la flota por parte de los concesionarios del servicio ferroviario de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado continuaron siendo relevantes los gastos de adquisición, rehabilitación y mantenimiento de material rodante y las obras de infraestructura destinadas a garantizar la rehabilitación del servicio, como ser la reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas y la extensión de la línea E de subterráneos. A continuación se detalla el avance físico de las principales obras desarrolladas al 31/12/12:

Cuadro Nº 18: Principales obras de Transporte Ferroviario. Grado de Avance al 31/12/2012

Proyectos	Avance Físico	
Modernización Línea Sarmiento	Renovación de vías entre las estaciones de Once-Castelar (obra original)	62,0%
	Renovación de vías entre las estaciones de Once-Castelar (modificación de obra según Resolución Secretaría de Transporte N°780/2012)	40,0%
Rehabilitación Tren de las Sierras	Fabricación y Construcción de 25 vagones doble piso	24,9%
	Etapa I, Rodríguez Bustos – San Roque	62,3%
	Etapa II, San Roque – Cosquín	46,1%
Subterráneo de Buenos Aires	Etapa urbana Córdoba Mitre – Alta Córdoba	35,2%
	Extensión de la Línea E a Retiro	77,6%

Asimismo la empresa Nación Servicios S.A. recibió asistencia financiera para la adquisición de máquinas validadoras, consolas de conductor y equipos lectograbadores para la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Dicha empresa tiene a su cargo el procesamiento, la recaudación, el *clearing*, el *back office* del servicio y las contrataciones que se requieren para implementar, gestionar y administrar el sistema.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$4.914,5 millones, destinándose el 74,9% a la firma AySA S.A para la realización de obras de sostenimiento y expansión de las plantas y redes de distribución, destacándose las tareas en la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre y la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui, ambas en la provincia de Buenos Aires.

El 25,1% del restante se destinó a gobiernos provinciales y municipales mediante los programas a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Durante 2012 se habilitaron 141 obras en el marco del Plan Agua Más Trabajo, el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA) y el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), con la siguiente distribución territorial:

Cuadro N° 19: ENOHSА-Distribución Geográfica de Obras Habilitadas. Al 31/12/12

Provincia	Cantidad
Buenos Aires	35
Tucumán	27
Santa Fe	13
Corrientes	8
Jujuy	8
Entre Ríos	8
San Juan	6
Mendoza	6
Formosa	6
Neuquén	5
Córdoba	5
Santa Cruz	4
La Rioja	3
Catamarca	2
Misiones	2
Chubut	2
Río Negro	1
Total	141

Asimismo, en el marco de la descentralización de obras en el Plan Agua Más Trabajo, el Programa Agua y Saneamiento para Todos (PAST), el Programa de Obras de Saneamiento en Áreas de Riesgo Sanitario (PROARSA), el Programa de Obras Menores de Saneamiento (PROMES), el Programa Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos Chicos (BID 1895) – (PROAS) y otras transferencias especiales, al concluir el ejercicio 2012 se encontraban en ejecución 420 obras.

Acciones de Vivienda

Al 31/12/12 se devengaron \$ 4.827,6 millones en obras de **vivienda**, de las cuales el 94,4% se destinaron a las asistencias financieras a los gobiernos provinciales y municipales para planes habitacionales como Techo Digno, Infraestructura Básica Habitacional, Mejor Vivir y

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA). A continuación se expone la evolución de los programas de vivienda realizados a en todo el país:

Cuadro Nº 20: Programas Federales de Vivienda. Cantidad de obras al 31/12/2012

Programa	Iniciativa	Terminadas	En ejecución
Techo Digno	Construcción de viviendas	17.758	68.208
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas	Mejor vivir en municipios y entidades intermedias	5.991	33.563
Programa Federal de Integración Socio-comunitaria por Cooperativa	Viviendas, soluciones habitacionales y centros integrales	4.121	9.058
Plan Solidaridad Habitacional	Viviendas y soluciones habitacionales	3.109	9.040
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios	Viviendas y soluciones habitacionales	763	19.444
PROPASA	Proyectos de agua potable y saneamiento	30	s/d
Obras de Infraestructura Urbana por Cooperativa	Proyectos varios	28	64
PROSOFA	Obras de Agua y Saneamiento	2	s/d
Otros Planes	Construcción de viviendas, Soluciones Habitacionales y Equipamiento Comunitario	686	3.312
TOTAL		32.488	142.689

Por otra parte sobresalieron las acciones inherentes al Programa de Mejoramiento Barrial (PROMEBA) y de asistencia al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Las primeras concernieron la habilitación de 40 barrios de viviendas, resultando beneficiadas 19.034 familias; mientras que las segundas se orientaron a trabajos de pavimentación y mejoras de accesibilidad en torno a asentamientos precarios. Por su parte, 201 familias resultaron beneficiarias del programa Rosario Habitat, recibiendo asistencia para la reinserción social y se llevaron adelante 149 proyectos de construcción de obras de infraestructura urbana.

Inversión en Comunicaciones

Durante 2012 se registró una ejecución de \$3.108,8 millones en materia de infraestructura para el mejoramiento de la Red Nacional de Comunicación, destinándose el 95,3% del gasto a la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y del Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina Conectada" (impulso de la Red Federal de Fibra Óptica), llevados adelante por la empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (AR-SAT).

En ese sentido AR-SAT se encarga de la implementación, operación y mantenimiento de la red, llevando así la posibilidad de acceso a banda ancha a todo el territorio nacional. Al cierre del ejercicio 2012 se encontraban operativas 59 estaciones digitales de transmisión y se distribuyeron más de 1,0 millón de decodificadores. Asimismo, se transmiten 23 señales gratuitas de televisión digital, variando su captación en función del alcance nacional o regional.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 31/12/12 se devengaron \$3.012,2 millones, destinándose el 57,7% a los gobiernos provinciales y el 23,1 % a instituciones de enseñanza provincial con el objeto de mejorar la infraestructura educativa, principalmente en el nivel primario y secundario. El restante 19,2% se destinó a universidades, gobiernos municipales y empresas públicas y privadas. A continuación se detalla la distribución geográfica de la citada ayuda financiera al sector educativo:

Cuadro N° 21: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura al 31/12/12

Provincia	Devengado	Participación
Buenos Aires	653,6	21,7%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	359,0	11,9%
Chaco	224,7	7,4%
Córdoba	157,3	5,2%
Tucumán	149,2	5,0%
Santa Fe	140,6	4,7%
Mendoza	132,9	4,4%
Misiones	116,0	3,9%
Salta	112,3	3,7%
San Juan	99,3	3,3%
Jujuy	93,3	3,1%
Catamarca	87,0	2,9%
Formosa	81,2	2,7%
Corrientes	71,5	2,4%
Nacional	65,8	2,2%
La Rioja	65,2	2,2%
Rio Negro	63,3	2,1%
La Pampa	54,3	1,8%
Santiago del Estero	53,3	1,8%
Santa Cruz	51,9	1,7%
Entre Ríos	48,7	1,6%
Neuquén	45,1	1,5%
San Luis	36,2	1,2%
Tierra del Fuego	28,9	0,9%
Chubut	21,6	0,7%
Total	3.012,2	100,0%

Por otra parte en el marco del programa “Mas Escuelas, Mejor Educación”, durante el ejercicio 2012 se asistió financieramente a gobiernos provinciales para la construcción de establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario, como así también en escuelas especiales y técnicas. El avance de esta iniciativa durante el período 2008/2012 puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22: Escuelas Terminadas, programa “Más Escuelas Mejor Educación”

	2008	2009	2010	2011	2012
Escuelas Terminadas	180	78	165	139	145

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones municipales y provinciales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías prioritarias de la Red Vial Nacional y vías alimentadoras de la Red Vial Provincial. Asimismo se destinaron fondos para resolver problemas de inundaciones, contaminación de fuentes de agua y escasez de agua para riego, como así también para garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. A continuación se detallan los montos transferidos al 31/12/2012 a las provincias en materia de asistencia vial y obras hídricas en el Norte Grande Argentino:

Acciones en el Norte Grande Argentino
Cuadro N° 23: Gasto por provincia. Al 31/12/2012 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	Participación
Chaco	534,3	34,0%
Santiago del Estero	476,4	30,3%
Tucumán	313,6	19,9%
Formosa	170,2	10,8%
Jujuy	60,7	3,9%
Corrientes	18,3	1,2%
Total	1.573,5	100,0%

CUADRO A
MODIFICACIONES DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2012

(en millones de \$)

	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	3,0	3,0	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nacion	352,4	249,3	-103,1	-29,3%
Ministerio Público	0,0	1,0	1,0	
Presidencia de la Nacion	34,1	21,1	-13,0	-38,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	154,9	162,2	7,3	4,7%
Ministerio del Interior y Transporte	566,2	818,1	252,0	44,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	565,2	540,3	-24,8	-4,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	200,9	183,9	-17,0	-8,5%
Ministerio de Seguridad	36,2	106,0	69,8	192,9%
Ministerio de Defensa	378,0	378,7	0,7	0,2%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	58,1	50,1	-8,0	-13,8%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	95,0	75,9	-19,1	-20,1%
Ministerio de Turismo	130,6	183,5	52,9	40,5%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	10.978,3	11.776,8	798,5	7,3%
Ministerio de Educación	1,0	0,5	-0,5	-52,0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	60,0	71,2	11,2	18,7%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	13,0	35,5	22,5	172,3%
Ministerio de Salud	86,4	36,7	-49,6	-57,5%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	13.713,6	14.694,2	980,7	7,2%
Poder Legislativo Nacional	38,3	78,6	40,3	105,3%
Poder Judicial de la Nacion	143,3	114,0	-29,3	-20,4%
Ministerio Publico	63,5	65,5	2,0	3,1%
Presidencia de la Nacion	115,8	150,3	34,5	29,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	130,0	99,7	-30,3	-23,3%
Ministerio del Interior y Transporte	115,2	219,6	104,3	90,5%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	47,3	45,9	-1,3	-2,8%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	60,5	91,9	31,3	51,8%
Ministerio de Seguridad	779,3	751,2	-28,0	-3,6%
Ministerio de Defensa	189,4	265,7	76,3	40,3%
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas	92,7	93,4	0,6	0,7%
Ministerio de Industria	16,0	11,6	-4,3	-27,2%
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca	110,7	196,9	86,2	77,9%
Ministerio de Turismo	51,6	20,6	-31,0	-60,0%
Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Ser	348,8	467,4	118,6	34,0%
Ministerio de Educacion	16,0	27,9	11,9	74,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovacion Productiva	96,6	110,5	13,9	14,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.996,7	2.703,0	-293,7	-9,8%
Ministerio de Salud	156,1	187,7	31,6	20,2%
Ministerio de Desarrollo Social	18,4	27,6	9,3	50,4%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	98,4	0,0	-98,4	-100,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.684,2	5.728,8	44,6	0,8%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.397,8	20.423,1	1.025,2	5,3%

CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/12/2012

(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	3,0	3,0	3,0	3,0	99,3%
Poder Judicial de la Nación	352,4	249,3	24,2	24,2	9,7%
Ministerio Publico	0,0	1,0	0,9	0,9	96,3%
Presidencia de la Nación	34,1	21,1	16,0	16,0	75,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	154,9	162,2	64,6	61,8	38,1%
Ministerio del Interior y Transporte	566,2	818,1	87,7	85,2	10,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	565,2	540,3	502,7	502,7	93,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	200,9	183,9	39,1	37,0	20,1%
Ministerio de Seguridad	36,2	106,0	84,7	84,7	79,9%
Ministerio de Defensa	378,0	378,7	332,0	328,8	86,8%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	58,1	50,1	12,1	12,1	24,2%
Ministerio de Industria	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	95,0	75,9	47,1	40,9	53,9%
Ministerio de Turismo	130,6	183,5	84,0	72,8	39,7%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	10.978,3	11.776,8	11.601,4	11.599,0	98,5%
Ministerio de Educación	1,0	0,5	0,4	0,4	82,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	60,0	71,2	71,2	71,2	100,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	13,0	35,5	22,4	22,4	63,2%
Ministerio de Salud	86,4	36,7	22,0	21,9	59,6%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	13.713,6	14.694,2	13.015,7	12.985,2	88,4%
Poder Legislativo Nacional	38,3	78,6	71,2	70,9	90,3%
Poder Judicial de la Nación	143,3	114,0	45,2	45,2	39,7%
Ministerio Publico	63,5	65,5	29,4	28,7	43,8%
Presidencia de la Nación	115,8	150,3	49,9	49,9	33,2%
Jefatura de Gabinete de Ministros	130,0	99,7	21,4	21,4	21,5%
Ministerio del Interior y Transporte	115,2	219,6	112,0	112,0	51,0%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	47,3	45,9	33,7	33,6	73,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	60,5	91,9	51,6	50,5	54,9%
Ministerio de Seguridad	779,3	751,2	582,7	575,7	76,6%
Ministerio de Defensa	189,4	265,7	154,0	146,2	55,0%
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	92,7	93,4	20,9	20,9	22,4%
Ministerio de Industria	16,0	11,6	2,8	2,8	23,7%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	110,7	196,9	129,1	122,5	62,2%
Ministerio de Turismo	51,6	20,6	8,3	8,3	40,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	348,8	467,4	344,9	330,9	70,8%
Ministerio de Educación	16,0	27,9	25,7	23,9	85,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	96,6	110,5	92,5	94,5	85,5%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	2.996,7	2.703,0	936,6	786,8	29,1%
Ministerio de Salud	156,1	187,7	126,4	118,2	63,0%
Ministerio de Desarrollo Social	18,4	27,6	17,1	17,1	61,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	98,4	0,0	0,0	0,0	
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	5.684,2	5.728,8	2.855,2	2.659,9	46,4%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	19.397,8	20.423,1	15.870,9	15.645,0	76,6%

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 31/12/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejecución Financiera acumulada al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 31/12/2012	Devengado al 31/12/2012	Ejecución Física acumulada al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vigente al 31/12/2012	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2012 (anual)
1	315	19				Poder Legislativo Nacional Imprenta del Congreso Impresiones y Publicaciones Parlamentarias Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (1)	0	3.000.000	3.000.000	2.980.000	0,00	10,03	10,03	5,00	5,00
			1			Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (1)	0	3.000.000	3.000.000	2.980.000	0,00	10,03	10,03	5,00	5,00
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación (1)	0	3.000.000	3.000.000	2.980.000	0,00	10,03	10,03	5,00	5,00
5	320	23				Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistratura (****) Justicia Ordinaria de la Capital Federal Fuero Criminal y Correccional Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1147 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	300.000	0	0,00	58,00	58,00	s/í	s/í
			1			Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	300.000	0	0,00	58,00	58,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Planta Baja y Entrepiso - Edificio Viamonte 1157 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1)	0	3.000.000	300.000	0	0,00	58,00	58,00	s/í	s/í
					2	Fuero Civil Remodelación y Adecuación de Sede Judicial (***)	190.597	35.000.000	35.000.000	87.581	50,00	60,00	60,00	s/í	s/í
					53	Construcción Nuevo Edificio Uruguay 722/28 - Capital Federal (***)	190.597	35.000.000	35.000.000	87.581	50,00	60,00	60,00	s/í	s/í
					3	Refacciones y Acondicionamiento Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1(****)	10.592.362	10.000	643.115	539.483	74,00	1,00	1,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Integral Datacenter. Lavalle 1240 (CABA). Etapa 1 (****)	10.592.362	10.000	643.115	539.483	74,00	1,00	1,00	s/í	s/í
					3	Fuero Comercial Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (1) (****)	0	3.000.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de los Juzgados Comerciales Nº 27 al 31 - Edificio Montevideo 546 - CABA (1) (****)	0	3.000.000	350.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					4	Fuero del Trabajo Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) (****)	0	3.500.000	350.000	0	0,00	50,00	50,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados del Trabajo - Edificio Corrientes 1132 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) (****)	0	3.500.000	350.000	0	0,00	50,00	50,00	s/í	s/í
					24	Justicia Federal Fuero Federal de la Seguridad Social Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (1) (****)	0	2.500.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					51	Adecuación Edificio para Instalación de Juzgados de la Seguridad Social - Edificio Lavalle 1441 - CABA (1) (****)	0	2.500.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					7	Área Cámara de la Plata Adecuación y Ampliación Sede Judicial (****)	0	14.000.000	8.217.501	4.670.270	0,00	81,00	81,00	s/í	s/í
					51	Juzgado Federal de Quilmes - Puesta en Funcionamiento (****)	0	7.500.000	7.500.000	4.670.270	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					52	Juzgado Federal de Junín - Ampliación y Remodelación de Edificio (****)	0	6.500.000	717.501	0	0,00	62,00	62,00	s/í	s/í
					8	Área Cámara Mar del Plata Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) (****)	0	4.000.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					51	Redistribución del Edificio de la Cámara Federal de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1) (****)	0	4.000.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					10	Área Cámara Mendoza Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (****)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	37,00	37,00	s/í	s/í
					51	Edificio La Rioja esquina Mitre San Juan Adecuación Sector Electoral (****)	0	4.000.000	4.000.000	0	0,00	37,00	37,00	s/í	s/í
					3	Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza (****)	0	6.329.000	479.000	0	0,00	10,01	10,01	s/í	s/í
					51	Construcción Sede Judicial Edificio Pedro Molina esquina España - Centro Judicial Mendoza (****)	0	6.329.000	479.000	0	0,00	10,01	10,01	s/í	s/í
					11	Área Cámara Rosario Adecuación y Remodelación de Sedes Judiciales (****)	7.319.850	4.569.190	4.569.190	0	64,00	10,00	10,00	s/í	s/í
					51	Juzgado Federal San Nicolás 1 y 2 - Refacción Edificio Calle Garibaldi (****)	7.319.850	1.178.000	1.178.000	0	64,00	10,00	10,00	s/í	s/í
					52	Adecuación Edificio Primera Junta 2687 - Santa Fe (****)	0	3.391.190	3.391.190	0	0,00	41,00	41,00	s/í	s/í
					2	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (****)	0	7.848.000	7.848.000	0	0,00	8,72	8,72	s/í	s/í
					51	Construcción Sede Judicial Edificio calle Junín, Caning, Humberto Primo y Esteban Echeverría, Rosario (****)	0	7.848.000	7.848.000	0	0,00	8,72	8,72	s/í	s/í
					3	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (1) (****)	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					51	Remodelación Edificio del Juzgado Federal de Rafaela - Provincia de Santa Fe (1) (****)	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					12	Área Cámara General Roca Remodelación y Ampliación Sede Judicial (****)	0	3.400.000	400.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					53	Tribunales Federales de Neuquén - Construcción de Edificio (****)	0	3.400.000	400.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					13	Área Cámara Paraná Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná (****)	0	4.000.000	300.000	0	0,00	40,00	40,00	s/í	s/í
					51	Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná (****)	0	4.000.000	300.000	0	0,00	40,00	40,00	s/í	s/í
					3	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay (****)	0	3.270.000	320.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					51	Readecuación Edificio Calle 9 de Julio Nº 810 Juzgado Federal Nº 2 - Concepción del Uruguay (****)	0	3.270.000	320.000	0	0,00	100,00	100,00	s/í	s/í
					14	Área Cámara Posadas Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas (****)	0	10.000.000	24.822.642	0	0,00	15,87	15,87	s/í	s/í
					51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas (****)	0	10.000.000	24.822.642	0	0,00	15,87	15,87	s/í	s/í
					15	Área Cámara Resistencia Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (****)	0	15.576.036	14.250.978	14.250.881	0,00	40,00	40,00	s/í	s/í
					51	Construcción Edificio Hipólito Irigoyen 83, Resistencia, Chaco (****)	0	15.576.036	14.250.978	14.250.881	0,00	40,00	40,00	s/í	s/í
					17	Área Cámara San Martín Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (****)	0	3.000.000	300.000	0	0,00	33,00	33,00	s/í	s/í
					52	Juzgado Federal 3 de Febrero, Puesta en Funcionamiento (****)	0	3.000.000	300.000	0	0,00	33,00	33,00	s/í	s/í

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 31/12/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejecución Financiera acumulada al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 31/12/2012	Devengado al 31/12/2012	Ejecución Física acumulada al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vigente al 31/12/2012	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2012 (anual)
					51	Recuperación Costanera Zárate - Provincia de Buenos Aires	0	10.000	10.000	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
					48	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	22.500.000	22.500.000	0	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
					51	Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata	0	22.500.000	22.500.000	0	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
					49	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	456.159	456.159	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe	0	456.159	456.159	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					50	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación del Puerto Caleta Paula - Etapa II - Provincia de Santa Cruz	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de 600m del Muro de Gravedad del Parque España - Sector Costero Próximo a Monumento a la Bandera	0	10.000	10.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
					52	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	500.000	500.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pavimento de Hormigón Armado y Cubierta para Vehículos - Edificio Av.España 2221 - CABA	0	500.000	500.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					53	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento de la Conectividad de la Hidrovía Paraguay - Paraná	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Iguazú - Provincia de Misiones (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					55	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					56	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Ampliación Muelle en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					57	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Escollera Interior Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					58	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Cierre de Dársena Puerto San Pedro - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					59	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal de Contenedores Espigón III Puerto Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Terminal Seca en Proximidad al Mercado Central - Puerto de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					61	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Nueva Instalación para Armada Argentina en Puerto Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					62	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Espigones VIII y IX - Puerto de Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
					63	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					64	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Reconquista - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					65	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1)	0	1.000.000	10.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
					51	Reconversión Puerto Villa Ocampo - Provincia de Santa Fe (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
					66	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1)	0	0	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
					51	Frente Muelles de Silos en Puerto Barranqueras - Provincia de Chaco (1)	0	0	10.000	0	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
					67	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Escollera, Puerto y Defensa de Embarque sobre Río Bermejo - Aguas Blancas - Departamento de Orán - Salta (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					68	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					51	Refulado Costero - Provincia de Buenos Aires (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
					69	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Edificio de Av. España 221) (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					70	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones Delegación Paraná Medio de la D.N.V.N. E.I-Entre Ríos (1)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					71	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de La Plata (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor Edificios e Instalaciones de la D.N.V.N en Distrito Río de La Plata (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
					72	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Muelle de la Dirección Nacional de Vías Navegables en Distrito Río de la Plata - Etapa I - CABA (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
					73	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (1)	0	10.000	10.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
					51	Reparación Varadero de la Delegación Paraná Medio de la Dirección Nacional de Vías Navegables - Provincia de Entre Ríos (1)	0	1.000	10.000	0	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
35						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
						Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto									
						Actividades Centrales									
					16	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	711.000	4.600.000	190.000	190.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	711.000	900.000	190.000	190.000		4479429,00	4479429,00		
					51	Construcción Archivo y Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	0	3.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17	Remodelación Edificio Junca - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	1.461.961	0	0	17,00	83,00	83,00	0,00	0,00
					51	Remodelación Edificio Junca - Ministerio Relaciones Exteriores y Culto - Ciudad de Buenos Aires	504.878	1.461.961	0	0	17,00	83,00	83,00	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 31/12/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejecución Financiera acumulada al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 31/12/2012	Devengado al 31/12/2012	Ejecución Física acumulada al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vigente al 31/12/2012	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2012 (anual)
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta de Separación de Residuos El Bolsón, Río Negro - Etapa II (1)	0	6.000.000	8.093.630	4.246.970	0,00	100,00	100,00	38,56	67,91
				15	51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz (1)	0	5.000.000	2.530.220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Isla Pingüinos - Pto. Deseado, Santa Cruz (1)	0	5.000.000	2.530.220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16	51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (1)	0	7.000.000	7.065.200	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (1)	0	7.000.000	7.065.200	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				17	51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán - Etapa I (1)	0	8.000.000	4.090.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Los Alicios - Concepción, Tucumán - Etapa I (1)	0	8.000.000	4.090.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				22	51	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071) (1)	0	6.068.000	6.068.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento Accesos al Parque Provincial Teyú. Cuaré - San Ignacio, Misiones (BID Nº 1071) (1)	0	6.068.000	6.068.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				23	51	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	557.600	112.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Casilla de Cobro Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	557.600	112.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				24	51	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Informes y Grupo Sanitario en Puerto Deseado - Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				25	51	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	501.840	501.840	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Centro de Informes en Zona Costera en el Parque Nacional Costero Monte de León - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	501.840	501.840	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				26	51	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID Nº 1071 (1)	0	8.200.000	1.113.102	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Centro de Visitantes y Portal de Acceso Sur y Saneamiento al Corredor de los Lagos - Esquel, Chubut BID Nº 1071 (1)	0	8.200.000	1.113.102	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				27	51	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071) (1)	0	3.608.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Acceso e Infraestructura sobre Arroyo Nant and Fall - Trevelin, Chubut (BID Nº 1071) (1)	0	3.608.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				28	51	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana (1)	0	4.198.400	4.198.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Mejoramiento del Acceso Peatonal a Misión Jesuítica Guaraní Santa Ana y Ampliación de la Playa de Estacionamiento - Santa Ana (1)	0	4.198.400	4.198.400	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				29	51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central (1)	0	5.494.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, huerto, capilla y eje procesional - Rehabilitación y Equipamiento Central (1)	0	5.494.000	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				30	51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) (1)	0	2.460.000	2.460.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Refacción Pasarelas y Obras Conexas para el Acceso a Refugios de Montaña - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) (1)	0	2.460.000	2.460.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				31	51	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) (1)	0	2.378.000	2.378.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Oficina de Información Turística - Centro de Artesanías - El Bolsón, Río Negro (BID Nº 1071) (1)	0	2.378.000	2.378.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				32	51	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	475.600	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Portada de Acceso y Obras Complementarias en el Parque Nacional Costero Isla Pingüino - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	475.600	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				33	51	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071) (1)	0	1.098.800	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción Edificio Institucional Auditorio en Gobernador Gregores - Santa Cruz - Etapa II (BID Nº 1071) (1)	0	1.098.800	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				34	51	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Oficina de Informes y Grupo Sanitario en El Cuadro - Casona - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	885.600	885.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				35	51	Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	1.328.400	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Pasarelas en Senderos Interpretativos y Refugios de Montaña - Bosques Petrificados - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	1.328.400	0	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				36	51	Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	1.623.600	1.623.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de Subcentral de Incendio en Gobernador Gregores - Perito Moreno - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	1.623.600	1.623.600	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				40	51	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	328.000	328.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
					51	Construcción de la Terminal de Ómnibus en Hipólito Yrigoyen - Santa Cruz (BID Nº 1071) (1)	0	328.000	328.000	0	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
				41	51	Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (7)	0	0	572.700	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
					51	Construc. Relleno Sanitario y Mejoram. Basural a Cielo Abierto - Etapa II GIRSU - Parque Lanín - S. M. de los Andes - Neuquén (7)	0	0	572.700	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
 AL 31/12/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejecución Financiera acumulada al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 31/12/2012	Devengado al 31/12/2012	Ejecución Física acumulada al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vigente al 31/12/2012	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2012 (anual)
					51	Ruta Nacional Nº 98 - Bandera - Pinto	0	5.213.778	12.065.793	12.065.781	1,12	65,50	65,50	3,40	56,16
					62	Ruta Nº 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 35 - km. 576 - km. 590 - Puente sobre Av. Circunvalación km. 576 - km. 579	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					63	Ruta Nº 18 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 18 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Provincial Nº 32 - Puente sobre Arroyo Quebracho y Acceso (km. 46,16)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					64	Ruta Nº 131 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 131 - Empalme Ruta Provincial Nº 11 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Puente sobre Arroyo La Ensenada y Acceso (km.19,10)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					65	Ruta Nº 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	248.889	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 11 - Puente sobre Río Monte Lindo	0	248.889	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					66	Ruta Nº 232 - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Gobernador Duva	0	288.889	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 232 - Empalme Ruta Nacional Nº 152 - Empalme Ruta Nacional 22 - Puente sobre Río Colorado - Gobernador Duva	0	288.889	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					67	Ruta Nº 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	400.000	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 12 - Límite Corrientes / Misiones - Puente sobre Río Zaimán	0	400.000	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					68	Ruta Nº 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	333.333	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Paranay Guazú (km. 1.502,65)	0	333.333	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					69	Ruta Nº 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragatay (km. 1.516,16)	0	244.444	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 12 - Paraná Mini - Montecarlo - Puente sobre Arroyo Caragatay (km. 1.516,16)	0	244.444	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					70	Ruta Nº 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	333.333	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 12 - Montecarlo - El Dorado - Puente sobre Arroyo Piray Guazú (km. 1.533,6)	0	333.333	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					71	Ruta Nº 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional Nº 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	266.667	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 12 - Posadas - Santa Ana - Ruta Nacional Nº 103 - Dos Puentes en Colectoras sobre Arroyo Zaimán	0	266.667	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					72	Ruta Nº 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Vaqueros (km. 1.608,62)	0	222.222	1	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					73	Ruta Nº 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	444.444	11	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9 - Salta - La Caldera - Puente sobre Río Caldera - (km.1.612,21)	0	444.444	11	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					74	Ruta Nº 34 - Mosconi - Pisquiereña - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 34 - Mosconi - Pisquiereña - Puente sobre Arroyo Yacucyito (km.1.450,75)	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					75	Ruta Nº 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 153 - Media Agua - Pedernal - Puente en km. 10,59	0	222.222	1	0	0,00	41,67	41,67	0,00	0,00
					76	Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	400.000	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Comuna de Alvear km. 281,67	0	400.000	11	0	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
					77	Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	400.000	11	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 9 - Empalme Ruta Nacional Nº A012 - Empalme A008 - Puente Acceso a Ciudad de Villa Gobernador Gálvez - km. 284,4	0	400.000	11	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					78	Ruta Nº 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	13.066.666	1	0	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 38 - Aguilares - Monteros - Puente sobre Río Medina - km. 729,20	0	13.066.666	1	0	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00
					79	Ruta Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	222.222	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nº 65 - Empalme Ruta Nacional Nº 38 Límite Tucumán Catamarca - Puente sobre Río Chirimayo - km. 17,68	0	222.222	1	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					80	Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá (1)	0	666.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 9 Puente sobre Río Grande - Tumbayá (1)	0	666.667	3	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
					81	Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 (1)	0	1.333.333	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 16 Empalme con Av. Sarmiento y Puente sobre Km. 12,59 (1)	0	1.333.333	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					82	Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle (1)	0	833.333	3	0	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Límite con Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81 Puente Lavalle (1)	0	833.333	3	0	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
					83	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pilagá y Monte Lindo (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					84	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional Nº 95 Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional Nº 86 Puentes sobre Arroyo Pavao y Porteño (1)	0	888.889	3	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					85	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (1)	0	600.000	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Ruta Nacional N1 34 Empalme Ruta Nacional Nº 50 - Río Seco y Puente sobre Río Bermejo Km. 1340,29 (1)	0	600.000	3	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					86	Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa (1)	0	251.852	1	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
					51	Empalme Ruta Nacional Nº 3 - Estancia María Luisa (1)	0	251.852	1	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
					87	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (1)	0	377.778	11	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					51	Complementarias "J/K"-Varios Puentes Solado Ortiz,Río Varela,Río Cambaceres,Río Chico y Río Almanza (1)	0	377.778	11	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
					88	Complementarias "A". Varios Puentes sobre Río Chapel Km. 6,5 y Arroyo El Vasco Km. 71,8- Arroyo El Medio y Arroyo El Muerto (1)	0	333.333	11	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

Cuadro C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 31/12/2012

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejecución Financiera acumulada al 2011	Crédito inicial 2012	Crédito Vigente al 31/12/2012	Devengado al 31/12/2012	Ejecución Física acumulada al 2011	Programación Inicial 2012	Programado Vigente al 31/12/2012	Ejecutado 4º trim	Ejecutado al 31/12/2012 (anual)
					54	Refacciones Integrales Pabellón Nº 10	0	600.000	600.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					55	Refacciones Integrales Pabellón Nº 3	0	500.000	500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					56	Refacciones Generales Pabellón Nº 4	0	300.000	300.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					57	Remodelación para Apertura Centro de Rehabilitación Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	16.000	300.000	300.000	0	0,66	99,34	99,34	0,00	0,00
910		60				Atención a Discapacitados Psicofísicos									
				8		Ampliaciones Varias en el Instituto Nacional de Rehabilitación	0	2.341.000	0	0	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				52		Ampliación Departamento Residentes	0	2.341.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación Cocina	0	726.000	995.000	796.000	0,00	100,00	100,00	80,00	80,00
				51		Remodelación Cocina	0	726.000	995.000	796.000	0,00	100,00	100,00	80,00	80,00
				10		Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	795.950	536.000	0	0	90,43	9,17	9,17	0,00	0,00
					53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica (1)	0	20.600	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					54	Mejoras en el Sistema de Calefacción. Reemplazo de Cañerías (1)	0	143.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					56	Instalación de Antepecho, Ignífugos, Pintura, Yesería y Reforma del Sector Internación	795.950	372.400	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Remodelación Patio Interno y Otros Espacios	277.979	0	315.782	315.781	56,21	43,79	43,79	0,00	43,79
				51		Remodelación Patio Interno	277.979	0	315.782	315.781	46,82	53,18	53,18	0,00	53,18
				13		Instalación Sistema Contra Incendios (1)	0	0	998.000	998.000	0,00	100,00	100,00	80,00	100,00
				51		Instalación Sistema Contra Incendios (1)	0	0	998.000	998.000	0,00	100,00	100,00	80,00	100,00
				14		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (1)	0	0	990.000	990.000	0,00	100,00	100,00	40,60	100,00
				51		Remodelación Sector Chiesa - Reemplazo Carpintería (1)	0	0	990.000	990.000	0,00	100,00	100,00	40,60	100,00

(*) Proyectos desestimados por la Dirección Nacional de Vías Navegables.

(**) Apertura durante el ejercicio no llegó a programar.

(***) La ejecución de los proyectos/obras se informa al cierre del ejercicio.

(****) Obra o Proyecto terminado, el devengado corresponde a certificaciones impagas, redeterminación de precios o adicionales de obra.

(1) Proyectos nuevos que inician en el ejercicio 2012

(2) Se aclara que al 30/09/2012 el devengado del proyecto Construcción Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio corresponde a gastos de capital, habiéndose asimismo ejecución inherente a la partida "Adelantos a proveedores y contratistas".

(3) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 1º trimestre del ejercicio 2012

(4) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 2º trimestre del ejercicio 2012

(5) Se informa únicamente el avance físico del ejercicio 2012, en virtud de que el valor acumulado informado por el organismo se encuentra en revisión.

(6) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 3º trimestre del ejercicio 2012

(7) Iniciativas incorporadas en la estructura programática durante el 4º trimestre del ejercicio 2012

(X) Se consideró la ejecución física y financiera de los proyectos dentro de la órbita del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios al 30/06/2012

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
Mantenimiento por Administración														
16	1	1	51	PAIS	varias	Mantenimiento por Administración		14		01/01/2012	31/12/2012	448.990	6	B
16	1	2	51	PAIS	varias	Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial		14		01/01/2012	31/12/2012	29.142	6	B
Total Mantenimiento por Administración												478.132		
Mantenimiento por Convenio con Provincias														
16	2	7	51	MENDOZA	40N-7-142	Mendoza-Lte.c/SanJuan/S.Martin-Mendoza/ Andre-Emp20	Varias (Sistema km-Mes)	11	194,7	22/08/1995	17/02/2007	11.831	8	
Mantenimiento por Convenio con Provincias												11.831		
Mantenimiento por Convenio con Provincias														
16	3	24	51	LA PAMPA		TFO La Pampa - Convenio 11		11	633,3	01/01/2008	31/12/2009	5.033	7	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 12	Catan Lil Lte. c/ Mendoza - Las Lajas Lte. c/Chile	11	536,4	01/01/2010	31/12/2011	14.500	7	
16	3	25	51	NEUQUEN	242-40	TFO Neuquén Convenio 13	Catan Lil - Lte. c/ Mendoza / Las Lajas - Lte. c/ Chile	11	533,2	01/01/2012	30/12/2013	18.843	6	
16	3	26	51	RIO NEGRO		TFO Río Negro - Convenio 12		11	1.291,1	01/01/2010	31/12/2011	24.224	7	
16	3	26	51	RIO NEGRO	242-40	TFO Río Negro Convenio 13		11	823,8	01/01/2012	30/12/2013	24.225	6	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	3;40;281;288;293	TFO Santa Cruz - Convenio 12		11	1.120,1	01/01/2010	31/12/2011	60.251	7	
16	3	27	51	SANTA CRUZ	281,288,293	TFO Santa Cruz - Convenio 13		11	1.179,1	01/01/2012	30/12/2013	81.131	6	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO		TFO Tierra Del Fuego - Convenio 11		11	350,3	01/01/2010	31/12/2011	11.506	8	
16	3	28	51	TIERRA DEL FUEGO	24CI-CA-CB	TFO Tierra del Fuego - Convenio 12		11	164,3	01/04/2012	31/03/2014	14.178	6	
16	3	30	51	JUJUY	52-40	TFO Jujuy Convenio 13		11	552,5	01/01/2012	30/12/2013	11.042	6	
16	3	30	51	JUJUY	52 - 40	TFO Jujuy Convenio 12	A° Churcalito - Lte. c/ Salta - Lte. c/ Salta - La Quiaca	11	552,5	01/01/2010	31/12/2011	11.042	7	
16	3	32	51	FORMOSA	86	TFO- Formosa - Convenio 9	Posta Cambio Salazar - El Remanso / El Solitario - Misión San Martín	11	116,0	01/01/2009	31/12/2010	6.000	7	
16	3	33	51	FORMOSA	86	El Remanso - El Solitario y Acc. al Remanso (T.F.O.)	km 1645,000 - Km 1771,000	11	144,1	10/08/2009	08/08/2012	14.911	7	
16	3	37	51	LA RIOJA	40;73;76;78	TFO La Rioja Convenio 10		11	380,2	01/01/2012	30/12/2013	9.851	6	
16	3	37	51	LA RIOJA	40;73;76;78	TFO La Rioja - Convenio 9		11	380,4	01/04/2010	30/12/2011	6.786	7	
16	3	38	51	CHACO	89	TFO Chaco - Convenio 4	Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai	11	241,2	01/01/2010	31/12/2011	7.530	7	
16	3	38	51	CHACO		TFO Chaco Convenio 5	Emp. R.N.Nº 11 - Cotelai	11	241,2	01/01/2012	30/12/2013	7.500	6	
Total Mantenimiento por Convenio con Provincias												328.553		
Señalamiento Horizontal														
16	4	1	51	PAIS	varias	Señalamiento Horizontal - Nacional		12		01/01/2012	31/12/2012	41.298	6	B
16	4	6	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalética Turística en Rutas Nacionales	Nacional	12		05/01/2011	04/12/2012	33.917	6	
16	4	7	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral	Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe	12		26/07/2010	24/07/2013	147.191	6	
16	4	8	51	PAIS	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Córdoba.	12		01/01/2012	31/12/2012	162.713	6	
16	4	9	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro	Mendoza, San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires	12	2.765,0	17/09/2010	15/09/2013	142.294	6	
16	4	10	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur	Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.	12	3.049,8	20/08/2010	18/08/2013	140.031	6	
16	4	11	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Litoral - Fase II	Bs As (parcial), Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Sta Fe (parcial)	12		01/11/2013	30/10/2016	117.636	0	
16	4	12	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Norte - Fase II	Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba (parcial), Santa	12		01/11/2013	31/10/2015	118.061	0	
16	4	13	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Centro - Fase II	Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba (parcial), La Pampa (parcial), Bs As (parcial)	12		01/11/2013	31/10/2015	119.806	0	
16	4	14	51	INTERPROVINCIAL	varias	Señalamiento Horizontal Zona Sur - Fase II	Bs As (parcial),La Pampa (parcial), Neuquén, Río Negro, Chubut, Sta Cruz (parcial), Tie	12		01/11/2013	31/10/2015	129.914	0	
Total Señalamiento Horizontal												1.152.861		
Obras de Emergencia														
16	5	1	51	PAIS	varias	Obras de Emergencia Menores	Nacional	14	48,0	01/01/2012	31/12/2012	1.584	6	B
16	5	2	51	PAIS	varias	Obras en Puentes	Nacional	14		01/01/2012	31/12/2012	12.234	6	B
16	5	3	51	PAIS	varias	Obras de Emergencia BID 795-OC/AR	Nacional	14		31/01/2007	30/01/2008		7	
16	5	4	51	PAIS	varias	Obras menores de Seguridad Vial	Nacional	14		01/01/2012	31/12/2012	24.164	6	B
Total Obras de Emergencia												37.982		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
16	8	66	51	TUCUMAN	9	Emp. R.N.N°9 - Pte. Lucas Córdoba		11	6,0	01/11/2013	02/05/2015	30.000	0	
16	8	69	51	FORMOSA	11	Formosa - Lte. c/ Paraguay	Puente Loyola	5	1,0	01/11/2013	01/09/2014	15.000	0	
16	8	70	51	CORDOBA	35	Emp. R.N.N°7 - Emp. R.N.N°8	Km 80,58	11	80,6	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
16	8	71	51	SAN JUAN	20	Lím. San Luis / San Juan - Caucete	Km 430 - km 450 / km 469 - km 471 / km 532 - km 547	11	37,0	01/11/2013	31/10/2014	23.880	0	
16	8	72	51	SAN JUAN	141	Río Bermejo - Difunta Correa	Km 139,45 (Control Policial) - km 180,15 (Acceso Difunta Correa)	11	40,7	01/11/2013	31/10/2014	24.240	0	
16	8	73	51	CHACO	95	Emp. R.P. N°9 - Emp. R.P. N°3	Km 1197,00 - km 1241,00	11	44,0	31/10/2013	31/08/2014	21.820	1	
16	8	74	51	BUENOS AIRES	S/N°	Pte. Nicolás Avellaneda	Construcción de Izadores	11		01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
16	8	76	51	CHACO	16	Saenz Peña - Lte. c/Sgo. del Estero	Km 176,35 - km 318,84	11	142,5	01/11/2013	01/09/2014	23.740	0	
16	8	77	51	CHUBUT	40	Río Mayo - Emp. R.N.N°26	Km 1390,00 - km 1416,54	11	26,5	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	78	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 138,33 - km 160,42	11	22,1	01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
16	8	79	51	CHUBUT	26	Sarmiento - Emp. R.N.N°40	Km 182,70 - km 210,12	11	27,4	01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
16	8	80	51	CORDOBA	158	San Francisco - Emp. R.P.N°13	Km 76,12	11	76,1	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
16	8	81	51	CORDOBA	38	Río Cruz del Eje - Lte. c/ La Rioja	Km 88,16	11	88,2	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
16	8	82	51	LA PAMPA	152	El Carancho - Acceso a las Sierras de Lihuel Calel	Km 72,06 - km 147,80	11	75,7	01/11/2013	01/09/2014	20.000	0	
16	8	83	51	LA PAMPA	152	km 160,69 - Emp. R.N.N°232	Km 160,69 - km 199,34	11	38,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	84	51	LA PAMPA	143	R.N.N°143 - Paso de los Algarrobos	Km 224,37 - km 204,65 (Puesto Paramillo - Emp. R.N. N° 151)	11	19,7	01/11/2013	02/07/2014	22.000	0	
16	8	85	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SI)	Km 148,96 - km 177,90	11	28,9	01/11/2013	02/07/2014	32.000	0	
16	8	86	51	LA PAMPA	143	Limay Mahuida - Paso de los Algarrobos (SII)	Km 177,90 - km 204,65	11	26,8	01/11/2013	02/07/2014	25.200	0	
16	8	87	51	NEUQUEN	40-242	Zapala - Las Lajas	Km 2405,35 - km 2454,85	11	101,1	31/10/2013	30/10/2014	42.204	1	
16	8	88	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Emp. R.N.N°3	Prog. 100,00 - Prog. 125,51	11	25,5	31/10/2013	30/10/2014	41.038	1	
16	8	89	51	SANTA CRUZ	3	Salida Río Gallego - Lte. Internacional c/Chile	Prog. 2633,00 - Prog. 2656,00	11	23,0	01/11/2013	31/10/2014	20.400	0	
16	8	90	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral	Km 386 - km 490	11	105,0	01/11/2013	01/09/2014	27.177	0	
16	8	91	51	SGO DEL ESTERO	16	Los Pirpintos - Lte. C/ Chaco/ Salta	Km 386,670 - km 502,620	11	116,0	01/11/2013	02/05/2014	17.567	0	
16	8	92	51	SGO DEL ESTERO	98	Los Tablero - Pte. S/ Río Salado	Km 329 - km 277	11	37,0	01/11/2013	02/05/2014	21.000	0	
16	8	93	51	TIERRA DEL FUEGO	3	La Herradura - Ushuaia	Km 3006,12 - km 3049,37	11	43,3	01/09/2013	31/08/2015	43.800	2	
16	8	94	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - La Herradura	Km 2949,94 - km 3006,12	11	56,2	01/11/2013	01/09/2014	34.000	0	
16	8	95	51	LA RIOJA	40	Acc. Al Campamento D.N.V. -Emp. 74	Km 3832,9 - km 3857,47	11	25,0	01/11/2013	01/09/2014	28.000	0	
16	8	96	51	LA RIOJA	77	Emp. Ruta 79- Emp. R. 38	Km 0 - km 102,51	11	102,5	01/11/2013	01/09/2014	28.000	0	
16	8	97	51	LA RIOJA	79	Desiderio Tello - Chemical	Km 137 - km 240,08	11	101,0	01/11/2013	01/09/2014	43.890	0	
16	8	98	51	SAN LUIS	7 - 8	Int. R.P.N°14 - R.N.N°8 / Lte. Córdoba -San Luis - Ex R.N.N°148		11	12,0	01/11/2013	31/10/2015	10.000	0	

Total Obras de Conservación Mejorativas

1.731.233

Total Mantenimiento

6.062.915

Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

22	2	3	51	CHUBUT	40S	Lte. c/Santa Cruz - Emp R.P.N°22	(1940-1979)	8	41,4	12/09/2011	12/03/2014	250.273	6	
22	2	6	51	SGO DEL ESTERO	16	Lte. con Chaco - El Cabure	Sección I: Lte. C/Chaco - Los Pirpintos	8	38,6	18/12/2006	16/09/2010	66.040	8	
22	2	18	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp.i	Emp. R.N.N°3 - Lte. con Chile	Prog. 0 - Prog. 10,88	8	10,9	31/10/2013	30/10/2014	44.185	1	
22	2	21	51	SALTA	40N	San Antonio de los Cobres - Lte con Jujuy	Km 1352 - km 1412	8	60,0	01/11/2013	30/10/2016	60.000	0	
22	2	34	51	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Prog. 156,37 - Prog. 220,62	8	62,9	04/04/2007	03/05/2010	244.064	8	
22	2	35	51	CORDOBA	158	Villa Maria - Río Cuarto	Chucul - Río Cuarto	5	19,0	05/05/2008	03/01/2010	38.272	7	
22	2	41	51	SALTA	34	Mosconi - Tartagal (Av. Urbana)		8	6,0	01/11/2013	31/10/2015	18.000	0	
22	2	46	51	MENDOZA	7	Potrillos - Lte. con Chile		5	70,0	01/11/2013	30/10/2016	46.000	0	
22	2	48	51	SAN JUAN	150	Km 351 - Km 370 - Lte. con Chile		8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	68.244	0	
22	2	50	51	SALTA	51	Muñano - San Antonio de los Cobres		8	22,6	20/10/2012	19/10/2014	84.954	6	
22	2	52	51	MENDOZA	40S	Malargue - Lte. con Neuquen (S III)	Prog. 2887,23 - Prog. 2937,27 A° Loncoche	8	50,0	20/07/2010	17/01/2013	183.033	6	A
22	2	53	52	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°20 - Emp. R.P "J" (Colonia Elia)	8	27,7	26/11/2006	26/05/2011	200.549	8	
22	2	53	53	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. RP"J" (Colonia Elia) - A°Colman	8	34,8	21/09/2007	20/05/2012	404.265	7	
22	2	53	54	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Colman - Emp. R.P.N°29	8	33,3	28/06/2007	26/11/2011	434.272	7	
22	2	53	55	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°29 - Ubajay	8	35,6	30/07/2007	27/12/2012	523.670	6	A
22	2	53	56	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Ubajay - Emp. R.N.N°18	8	35,0	01/06/2007	30/04/2013	423.445	6	A

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	2	53	57	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°18 - A° Ayui Grande	8	32,7	01/06/2007	31/03/2013	486.724	6	A
22	2	53	58	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Ayui Grande - A° Mandisovi Grande	8	34,8	29/06/2007	31/03/2013	340.295	6	
22	2	53	59	ENTRE RIOS	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Mandisovi Grande - Río Mocreata	8	35,9	01/06/2007	29/04/2013	487.656	6	A
22	2	53	60	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Río Mocreata - A° Curupicay	8	33,6	21/09/2007	19/04/2013	301.948	6	
22	2	53	61	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	A° Curupicay - Emp R.N.N°127	8	29,3	21/09/2007	19/12/2012	337.337	6	A
22	2	53	62	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp R.N.N°127 - Estab. San Agustín	8	32,4	01/10/2007	30/03/2013	377.224	6	
22	2	53	63	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Secc II: Estab. San Agustín - Emp. R.P.N°126	8	30,4	21/09/2007	18/01/2013	366.374	6	
22	2	53	64	CORRIENTES	14	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.P.N°126 - Emp. R.N.N°117	8	27,6	21/09/2007	21/05/2011	278.812	7	
22	2	53	65	CORRIENTES	117	Guauguaychú - Paso de los Libres	Emp. R.N.N°14 - Av. Belgrano (Acceso Aeropuerto)	8	8,0	13/12/2007	11/06/2012	126.980	7	
22	2	53	66	CORRIENTES	s/n	Guauguaychú - Paso de los Libres	Nuevo accesos al Centro de Frontera	8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	90.000	0	
22	2	54	51	JUJUY	9	Circunvalación Acceso a Los Alisos		8	5,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	

Total Pasos Fronterizos y Corredores de Integración

6.292.616

Obras por Convenio con Provincias

22	3	1	51	PAIS	varias	Convenios con Provincias y Municipios		14	0,0	01/01/2012	31/12/2012	24.786	6	B
22	3	2	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Alto Jague	A: Vinchina - A. Jague y B: Acc.a Alto Jague	8	39,0	04/06/1999	29/12/2012	120.808	14	
22	3	3	51	LA RIOJA	76	Punta Del Agua - Pircas Negras (Seccion I)	Punta del Agua - Laguna Mulas Muertas	8	30,0	17/05/1999	13/04/2009	28.697	8	
22	3	7	51	LA RIOJA	73	Los Cajones - Anquinan (Chilecito por el Velazco)	III - Pampa de la Viuda - Quebrada Seca	8	29,6	15/09/1999	31/01/2000	309	10	
22	3	9	51	LA RIOJA	P11	Famatina - Lte con Catamarca	Campanas - Lte con Catamarca	8	22,9	03/05/1999	30/12/2006	27.833	8	
22	3	11	51	MISIONES	P19	Wanda - Deseado	A° Uruguay - I - Deseado	8	45,0	01/05/1992	28/06/2001	32.610	7	
22	3	12	51	LA RIOJA	76	Vinchina - Pircas Negras	Alto Jague - Punta Del Agua (EXP 292-1998)	8	30,0	15/06/1999	12/04/2008	22.626	8	
22	3	19	51	SANTA CRUZ	3	Planta LU 12 - Calle Italia - Autovía	Aeropuerto - Av. San Martin (R.N.N°3) - 1° Etapa	8	6,4	26/09/2005	25/10/2011	119.559	7	
22	3	23	51	SALTA	9	Emp.R.N.N°9/34 - Ciudad de Salta	Prog 1591 - Prog 1602	8	11,0	25/02/1997	25/08/2000	15.305	7	
22	3	27	51	SANTA FE	A008	Av. Pellegrini (Autopista Rosario-Cordoba) - Av. San Martin (Tramo A)	Km 10,125 - km 20,846	5	10,7	15/07/2009	13/04/2013	283.307	6	
22	3	27	52	SANTA FE	A008	Av. Circunv. de Rosario (Colectoras) - Av S. Martin - Emp. Av Belgrano	Km 20,846 - km 29,00	8	8,3	01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
22	3	75	51	SANTA FE	98	Vera - Tostado	km 77,00 - km. 123,43	5	46,4	04/10/2004	05/03/2006	18.036	8	
22	3	86	53	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Teniente Maza - Ramos Mejia - km 137 - Km 181 (Seccion III)	8	44,0	21/03/2006	18/11/2008	45.854	7	
22	3	86	55	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu - Los Menucos	Talcahuala - Sierra Colorada km 201 - km 225 (Seccion V)	8	23,9	23/03/2006	20/10/2008	28.371	8	
22	3	86	56	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Sierra Colorada - Los Menucos km 225 - Km 269	8	43,8	01/02/2007	02/05/2009	87.226	7	
22	3	86	57	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao km 269 - Km 340	8	72,0	23/03/2006	21/03/2009	107.687	8	
22	3	86	58	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci km 341,07 - km 414,57	5	73,5	22/06/2009	21/12/2011	204.055	8	
22	3	86	59	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Jacobacci - Comallo km 0 - Km 45	8	45,0	13/09/2011	11/09/2014	260.072	6	A
22	3	86	60	RIO NEGRO	23	Ing. Jacobacci - Comallo	Km 45 - km 75	8	30,0	12/12/2011	11/08/2014	249.296	6	
22	3	86	61	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo	Km 75 - km 93	8	18,0	05/12/2011	04/08/2014	216.037	6	
22	3	86	62	RIO NEGRO	23	Comallo - Pilcaniyeu Viejo		8	35,0	31/10/2013	30/04/2016	298.209	1	
22	3	87	51	NEUQUEN	242	Emp. R.N.N°40 - Límite con Chile	Aduana - Límite con Chile	8	7,1	09/04/2010	08/05/2013	28.891	6	A
22	3	88	51	SANTA CRUZ	3	Caleta Olivia - Gran Bajo San Julian	Kkm 1970,40 - km 2026	8	55,6	06/01/2007	06/05/2013	195.800	6	A-C
22	3	88	52	SANTA CRUZ	281	Emp. R.N.N°3 - Pto. Deseado	Emp. R.N.N°3 - km 65 / Acc. Pto. Deseado	5	67,6	25/04/2007	23/12/2010	144.573	7	
22	3	89	51	SAN JUAN	149	Las Flores - Iglesias		8	12,8	20/11/2012	19/11/2013	29.462	6	A

Total Obras por Convenio con Provincias

2.619.409

Mejoramiento y Reposición de Rutas

22	4	1	51	PAIS	varias	Rehabilitaciones Menores	Nacional	14	201,8	01/01/2012	31/12/2012	135.771	6	B
22	4	5	51	SAN JUAN	40	San Roque - Huaco (obras faltantes)	Prog. 0 - Prog. 41,530	8	41,5	25/06/2009	23/12/2012	196.447	6	A
22	4	25	51	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion I	km 19,8 - km 29,2	5	9,4	16/05/2005	14/10/2008	65.813	8	
22	4	25	52	BUENOS AIRES	3	La Matanza Seccion II	Km 29,2 - km 37,86	8	8,7	30/09/2005	29/04/2010	287.125	7	
22	4	30	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion I)	Km 1845 - km 1867	8	22,3	01/04/2009	29/10/2013	375.705	6	
22	4	31	51	SANTA CRUZ	3	Acceso a Rada Tilly - Caleta Olivia (Seccion III)	Km 1867 - km 1908,6	8	41,6	01/08/2008	29/01/2014	690.861	6	
22	4	39	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Principio de Autopista (Sec. III)	Acceso a Concepcion - Acceso a Monteros y Acceso a Concepcion	8	26,6	14/01/2008	13/11/2010	249.842	7	
22	4	40	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B. Alberdi) - Principio de Autopista	Seccion IV: Acc. Monteros - Emp. RNN° 38 (Actual)	8	20,0	15/10/2004	15/08/2007	86.183	8	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	4	41	51	CORDOBA	158	Variante paso por Villa Maria	Interc. Con AU009 - Interc. RP N°2	8	13,1	01/05/2013	30/10/2014	345.258	4	
22	4	42	51	SANTA CRUZ	40S	Limite c/Chubut - Perito Moreno		8	67,5	17/11/2006	16/03/2012	168.017	7	
22	4	48	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - Emp. RNN° 127	km. 489,25 - Km. 500,59	5	11,3	09/09/2003	08/10/2004	7.653	8	
22	4	50	51	NEUQUEN	234	San Martin de los Andes - Emp. R.N.N°231	Sección III: Lago Villarino - Acc. Villa Traful	8	25,9	08/10/2004	06/04/2014	108.153	6	A
22	4	51	51	SANTA CRUZ	3	Variante Caleta Olivia	Intersección Norte R.N. N° 3 - Intersección Sur R.N.N°3	8	7,0	28/09/2006	26/12/2013	457.442	6	A
22	4	52	51	SAN JUAN	P510	Valle Fertil - Los Baldecitos	Sección I° (Río del Valle - Los Baldecitos)	8	54,6	20/01/2004	19/08/2006	13.954	8	
22	4	58	51	CORRIENTES	12	La Paz - Esquina (Obra faltante puentes)	A° Curupi-Bzo.Guayquiraro-R.Guayquiraro-A°Carumbe - km646/km648	8	1,0	01/06/2007	30/06/2010	11.755	8	
22	4	64	51	FORMOSA	81	Las Lomitas - Juan G. Bazan	km. 1473,00 - Km. 1503,10	5	30,0	14/10/2004	13/01/2007	24.771	7	
22	4	64	55	FORMOSA	81	Ing. Juarez - Las Lomitas	Los Chiriguanos - Ing. Juarez	8	44,9	13/10/2004	12/07/2008	48.581	7	
22	4	64	61	SALTA	81	Las Lomitas - Emp. R.N.N° 34	Pluma de Pato - Emp. R.N.N° 34 (Sec.III)	8	30,0	01/04/2006	31/03/2007	13.666	7	
22	4	70	51	SANTA CRUZ	S/N°	Ruta Parque Nacional Los Glaciares	Acc. Portal Parque Nacional Los Glaciares - Miradores	8	29,0	12/11/2003	10/12/2009	103.732	7	
22	4	74	51	SANTA CRUZ	40S	Emp. R.P.N°11 - El Cerrito	Sección I: El Cerrito - km 34	5	34,0	22/11/2003	20/10/2011	32.190	7	
22	4	82	51	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	IIb: Ballesteros-Emp R.P.N° 2 (V. Maria) - V. Maria - Oncativo (O.F.)	8	91,0	17/04/2006	15/08/2010	529.430	7	
22	4	82	52	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc II: Emp R.P.N°E-59 - Ballesteros	8	63,0	16/05/2006	13/04/2013	903.315	6	A
22	4	82	53	CORDOBA	9	Autopista Rosario-Córdoba	Secc Ib: Emp. R.P.N°E-59 - Int. c/R.N.N°9 Actual	8	45,0	17/12/2008	15/12/2012	1.234.546	6	A
22	4	82	55	SANTA FE	9	Autopista Rosario - Cordoba	Secc V: Emp. RN N° 178 - Carcaraña	8	39,6	02/10/2006	30/11/2009	421.566	7	
22	4	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N. 81 - Lte. C/ Chaco - Sec. I	Lte. c/Chaco - Prog 29,800 (C. B. Vista - Pto. Lavalle)	8	25,0	14/05/2007	11/01/2010	140.478	8	
22	4	85	51	SGO DEL ESTERO	89	Suncho Corral - Emp. R.N.N°34 (Taboada)	Km 490,51 - km 523,59	8	33,1	17/08/2010	15/10/2013	133.705	14	
22	4	86	51	SGO DEL ESTERO	98	Limite Santa Fe - Bandera	Km 180,79 - km 226,67	5	45,9	21/02/2006	21/08/2009	90.310	8	
22	4	87	51	MENDOZA	40	Malargüe -Lte. con Neuquen (Sección II)	Sección II km 2823,90 (LA PASARELA) - km 2887,25	8	63,4	01/05/2013	30/10/2015	87.614	4	
22	4	88	51	MENDOZA	40S	Malargüe - Lte con Neuquen (SI) Ex. Secc. III	Sección I km 2776,70 - km 2823,90 (Pasarela)	8	47,2	09/06/2010	31/12/2012	76.195	14	
22	4	89	51	SANTA CRUZ	288	Piedrabuena - Tres Lagos	Emp. R.P.N°27 (La Julia) - km 75	8	75,0	13/03/2012	11/03/2016	645.871	6	
22	4	89	52	SANTA CRUZ	288	Emp. R.P.N°73 (Laguna Grande) - Acc. Ea. Chalia	Km 169,81 - km 230,21	8	60,0				12	
22	4	89	53	SANTA CRUZ	288	Ea. La Julia - Emp.R.N.N°40 (Tres Lagos)	Km 75 - km 273,17 (Tres Lagos)	8	68,7	13/11/2012	11/11/2016	571.735	6	
22	4	90	51	SANTA CRUZ	3	Acceso Sur a Caleta Olivia		8	6,0	01/11/2013	31/10/2014	4.400	0	
22	4	93	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección III: km 89 - Bajo Caracoles	8	42,0	08/09/2009	07/04/2013	223.611	6	
22	4	94	51	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Gran Bajo San Julian - Cmdte Luis Piedrabuena	8	111,7	15/09/2005	14/12/2009	126.265	7	
22	4	94	52	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Comandante Luis Piedrabuena - Est. Los Alamos	8	118,0	15/09/2005	14/06/2011	162.311	7	
22	4	94	53	SANTA CRUZ	3	Gran Bajo San Julian - Río Gallegos	Est. Los Alamos - Aeropuerto Río Gallegos	8	112,0	03/12/2005	01/12/2011	156.999	7	
22	4	95	51	SANTA CRUZ	40S	Perito Moreno - Bajo Caracoles	Sección II: km 49 - km 89	8	40,0	24/11/2006	22/11/2011	170.664	7	
22	4	96	51	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Bajo Caracoles (R.P.N°39) - Río Olnie - km 2189,52 - km 2215,91	8	26,4	01/03/2007	29/10/2011	87.725	7	
22	4	96	52	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Río Olnie - Las Horquetas -Sec. I - II - km 2215,91 - km 2289,64	8	72,9	07/11/2006	30/04/2013	215.956	6	
22	4	96	54	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Acc. Pte s/Río Chico - Gdor. Gregores - Sec. I- II - sobre R.P.N°25	8	66,5	21/08/2008	20/05/2013	269.694	6	
22	4	96	55	SANTA CRUZ	40	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Gdor. Gregores - Lago Cardiel - Sec. I - II - Sobre R.P.N°29	8	57,0	16/01/2009	16/05/2013	235.763	6	
22	4	96	56	SANTA CRUZ	40S	Bajo Caracoles - Tres Lagos	Lago Cardiel - Tres Lagos -Sec. I-II	8	72,7	08/09/2009	08/05/2013	336.427	6	
22	4	96	57	SANTA CRUZ	40	Lago Cardiel - Tres Lagos	Sección III - Acc a Tres Lagos por R.N.N°288	8	44,1	08/09/2009	08/03/2013	292.830	6	
22	4	97	51	SANTA CRUZ	P12	Emp. R.P.N°25 - Pico Truncado	km 245,00 - Pico Truncado	8	105,0	06/01/2007	03/02/2013	191.223	6	
22	4	98	51	SANTA CRUZ	40	28 de Noviembre - Rospentek	Pte. De Acc. A Rospentek y Pavim en Av. 28 de Noviembre	8	11,0	19/01/2006	18/05/2013	62.024	6	
22	4	99	51	SANTA CRUZ	40S	Tres Lagos - Emp. R.P.N°11	Sección II: km 50 - km 86	8	36,0	30/05/2006	28/04/2010	83.653	7	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas

10.877.229

Obras por Concesión sin Peaje COT

22	5	1	51	FORMOSA	11-A011	Corredor 28	Resistencia - Lte. c/Paraguay	13	286,3	01/06/1998	26/12/2012	295.743	6	
22	5	2	51	BUENOS AIRES	33	Corredor 31	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	13	312,4	02/02/1998	31/05/2011	253.870	7	

Total Obras por Concesión sin Peaje COT

549.613

Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

22	6	3	51	CORRIENTES	12	Esquina - Goya (Pte. s/1° Aliviador R. Corrientes) metros	Prog. 713,33	8	30,0	01/09/2013	02/05/2015	14.576	2	
22	6	4	51	CORRIENTES	12	Goya - San Roque (Pte. s/ Río Batelito) metros	Prog. 735,68	8	30,0	01/05/2013	30/10/2015	5.254	4	
22	6	5	51	CORRIENTES	123	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°14	Pte. s/ Río Miriñay	8	150,0	01/11/2013	31/10/2014	25.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	6	12	51	SANTA FE	11	Puente s/Río San Lorenzo		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.700	0	
22	6	13	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Canal Serodino)	Prog. 349,22	8	30,0	25/02/2011	24/01/2013	4.701	6	
22	6	14	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Colastine)	Prog. 413,87 - Maciel - Coronda	8	37,0	17/07/2009	15/12/2012	7.451	6	
22	6	15	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 3º Coronda)	Prog. 415,736	8	22,0	01/08/2011	30/07/2013	11.087	14	
22	6	17	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° 1º Coronda)	Prog. 417,14	8	43,0	18/11/2009	17/11/2010	6.837	7	
22	6	18	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° Matadero)	Prog. 425,54	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.140	0	
22	6	19	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/A° Bragado)	Prog. 429,95	8	32,0	01/11/2013	31/10/2014	1.460	0	
22	6	20	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. S/A° de los Padres)	Prog. 443,03	8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.170	0	
22	6	21	51	CORDOBA	35	V. Mackena - Holmberg (Pte. S/A° El Gato)	Prog. 670,07	8	30,0	31/10/2013	30/10/2014	14.040	1	
22	6	22	51	CORDOBA	9	Emp. R.P.N°21 - Lte. c/ Sgo. del Estero (Pte. s/A° San Miguel)	Prog. 898,61	8	30,0	01/09/2010	31/12/2011	6.309	8	
22	6	24	51	MENDOZA	40S	Malargue - Bardas Blancas (Pte. s/Río Malargue)	Prog. 336,20	8	80,0	16/01/2012	14/01/2014	19.064	6	A
22	6	25	51	NEUQUEN	234	La Rinconada - Junín de Los Andes (Pte. s/Río Alumine)	Inicio y Fin del Puente s/Río Collon Cura y Accesos	8	1.195,0	24/02/2012	22/02/2014	34.167	6	A
22	6	26	51	RIO NEGRO	23	Clemente Onelli - Comallo (Pte. s/A° Comallo)	Prog. 516,00	8	50,0	01/11/2013	31/10/2014	1.900	0	
22	6	27	51	RIO NEGRO	23	Puente s/Río Pilcaniyeu		8	90,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	2	
22	6	28	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua (Pte. S/Río San Lorenzo)	Prog. 1245,5	8	330,0	12/09/2006	11/06/2009	19.134	7	
22	6	32	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. S/A° San Antonio)	Prog. 118,70	8	60,0	01/11/2013	31/10/2014	3.700	0	
22	6	33	51	TUCUMAN	157	Lte. c/Sgo. del Estero - Monteagudo (Pte. s/R. Graneros)	Prog.1158,00	8	90,0	01/11/2013	02/05/2015	3.300	0	
22	6	34	51	TUCUMAN	157	Puente s/A° El Chileno		8	30,0	01/11/2013	31/10/2014	1.604	0	
22	6	39	51	SGO DEL ESTERO	9	Acc. a Sto. Domingo - Río Saladillo	Pte. s/Río Saladillo	5	39,0	01/09/2013	31/08/2014	3.000	0	
22	6	40	51	ENTRE RIOS	12	Cerrito - La Paz (Pte. s/A° Feliciano)	Prog. 572	8	126,0	07/03/2007	05/08/2009	32.174	8	
22	6	41	51	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Km 1678,81 - Pte. s/ Arroyo Huayco Hondo	8	530,0	08/01/2010	09/06/2011	6.985	7	
22	6	41	52	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. R.N.N°66	Pte. Sobre Río los Alisos - Acc. (km 1681,55)	8	880,0	02/06/2011	01/04/2013	9.660	6	A
22	6	41	53	JUJUY	9	Lte. con Salta - Emp. Ruta Nacional N°66	Pte. s/ Río Perico - y accesos (km 1670,15)	8	1.300,0	02/12/2010	30/01/2013	18.238	6	A
22	6	42	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Ampascachi)	Prog. 115,40	8	60,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	43	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río La Viña)	Prog. 103,30	8	80,0	01/09/2013	31/08/2014	2.000	0	
22	6	44	51	ENTRE RIOS	12	Parana - Emp. R.N.N°18 (Pte. s/A°Las Tunas)	Prog. 447,34	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	45	51	SANTA FE	11	Rosario - Santa Fe (Pte. s/Río Carcaraña)	Prog. 343,44	8	70,0	01/09/2013	31/08/2014	2.347	0	
22	6	46	51	FORMOSA	11	Río Bermejo - Montelindo (Pte. S/A° Mbigua)	Prog. 1120,72	8	20,0	01/09/2013	31/08/2014	1.730	0	
22	6	47	51	SALTA	68	La Viña - Moldes (Pte. s/Río Chuñapampa)	Prog. 124,70	8	30,0	01/09/2013	31/08/2014	1.500	0	
22	6	49	51	SALTA	34	Obra Puente Río Carapari	Km 1480,80	8	60,0	31/10/2013	30/10/2014	14.792	1	
22	6	51	51	CATAMARCA	38	Tres Puentes - El Portezuelo	Acc. A Sta. Cruz (Cuestecilla) - Pte. S/Río Paclín	8	100,0	01/09/2013	31/08/2014	2.535	0	
22	6	52	51	JUJUY	34	San Pedro - Calilegua	Pte. S/ FF.CC. Belgrano s/ A° del Zanjón s/Río Negro	8	400,0	01/09/2013	31/08/2015	50.000	0	
22	6	53	51	JUJUY	9	Pte. S/Río Grande		8	200,0	01/09/2013	02/03/2015	30.000	0	
22	6	54	51	SALTA	34	Río Piedras - Pichanal	Pte. S/Riacho Seco (1300 km)	8	42,0	27/04/2009	25/12/2012	52.722	6	A
22	6	55	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Seco	Km 97,77	8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	13.600	0	
22	6	56	51	SALTA	68	La Viña/ Moldes - Pte. S/Viñaco		8	30,0	01/09/2013	02/03/2015	4.000	0	
22	6	57	51	SGO DEL ESTERO	0064	La Banda - Sgo del Estero	Puente sobre Río Dulce y Accesos	8	855,6	30/06/2008	29/09/2010	41.027	7	
22	6	59	51	LA PAMPA	22	Puente s/ Río Colorado	Prog. km 857,11	5	114,0	01/09/2013	31/08/2014	12.000	0	
22	6	60	51	CHUBUT	259	Trevelin - Lim. c/Chile	Ptes. s/ Arroyo Baguilt, Los Rifleros y Blanco	8		01/09/2013	02/03/2015	12.000	0	
22	6	61	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Pte. s/Río Salado	8	627,0	06/06/2011	05/04/2013	14.797	6	A
22	6	62	51	CATAMARCA	35	km 576 - km 590	Pte s/ Av. Circunvalación km 576 - 579	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	63	51	ENTRE RIOS	18	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°32	Pte. s/ A° Quebracho y Acc. (km 46,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	64	51	ENTRE RIOS	131	Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	Pte. s/ A° La Ensenada y Acc. (km 19,10)	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	65	51	FORMOSA	11	Pte. s/Río Monte Lindo		8		01/09/2013	31/08/2014	11.200	0	
22	6	66	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Emp. R.N.N°22	Pte. s/Río Colorado en Gobernador Duval	5		01/09/2013	31/08/2014	13.000	0	
22	6	67	51	MISIONES	12	Lte. Corrientes / Misiones - Posadas	Pte. s/Río Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	0	
22	6	68	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Parany Guazu - (km 1502,65)	8	204,0	01/09/2013	31/08/2014	91.125	0	
22	6	69	51	MISIONES	12	Parana Mini - Montecarlo	Pte. s/A° Caragatay - (km 1516,16)	8		01/09/2013	31/08/2014	11.000	0	
22	6	70	51	MISIONES	12	Montecarlo - El Dorado	Pte. s/A° Piray Guazu (km 1533,6)	8	168,0	01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
22	6	71	51	MISIONES	12	Posadas - Santa Ana (R.N.N°103)	Cuatro Puentes en Colectoras s/A° Zaiman	8		01/09/2013	31/08/2014	12.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	6	72	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Vaqueros - km 1608,62	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	73	51	SALTA	9	Salta - La Caldera	Pte. s/ Río Caldera km1612,21	8		01/09/2013	31/08/2014	20.000	0	
22	6	74	51	SALTA	34	Mosconi - Piquirenda	Pte.s/ A° Yacucyito - km 1450,75	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	75	51	SAN JUAN	153	Media Agua - Pedernal	Puente en km 10,59	8		01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	6	76	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Comuna de Alvear - km 281,67	8		01/11/2013	31/10/2014	18.000	0	
22	6	77	51	SANTA FE	9	Emp. R.N.N°A012 - Emp. A008	Pte. acceso a Ciudad de Villa Gobernador Galvez - km 284,4	8		01/09/2013	31/08/2014	18.000	0	
22	6	78	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Medina (km 729,20)	8		01/09/2013	31/08/2014	22.553	0	
22	6	79	51	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tuc. Catamarca	Pte. s/ Río Chirimayo km 17,68	8		01/09/2013	31/08/2014	10.000	0	
22	6	80	51	JUJUY	9	Puente sobre Río Grande	Localidad de Tumbaya	8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	6	81	51	CHACO	16	Emp. R.N.N°16 - Emp. c/ Av. Sarmiento	Pte s/ km 12,59	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	0	
22	6	82	51	FORMOSA	95	Lte. c/ Chaco - Emp. R.N.N°81	Puente Lavalle	11	1,0	01/11/2013	02/07/2014	25.000	0	
22	6	83	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pilaga y Monte Lindo	5	1,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	0	
22	6	84	51	FORMOSA	95	Emp. R.N.N°81 - Emp. R.N.N°86	Puentes s/ A° Pavao y Porteño	5	2,0	01/09/2013	02/03/2014	20.000	0	
22	6	85	51	SALTA	34	Emp. R.N.N°50 - Río Seco	Pte s/ Río Bermejo km 1340,29	8		01/11/2013	31/10/2014	27.000	0	
22	6	86	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp A	Emp. R.N.N°3 - Ea. Ma. Luisa		8		01/09/2013	30/10/2014	25.229	2	
22	6	87	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp J/K	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	17.000	0	
22	6	88	51	TIERRA DEL FUEGO	Comp. A	Varios Puentes		8		01/11/2013	31/10/2014	15.000	0	
22	6	89	51	TUCUMAN	38	Aguilares - Monteros	Pte. s/ Río Gastona (km 739,64)	8		01/09/2013	02/03/2014	15.000	2	
22	6	90	51	SAN LUIS	7	Lte. Cordoba/ San Luis - Lte. San Luis/ Mendoza	km 674	11	2,0	01/10/2013	31/08/2014	25.000	0	
22	6	91	51	JUJUY	9	Emp. R.N.N°52 - Tilcara	Quebrada de Hornillos - km 1761,9	8	0,0	01/11/2013	01/09/2014	7.000	0	
22	6	99	51	PAIS	varias	Global de Puentes	Construcción de Puentes de Menor Volumen de Obra	14		01/01/2012	31/12/2012	2.633	6	B

Total Mejoramiento y Reconstrucción en Puentes

1.123.441

22	7	2	53	BUENOS AIRES	5	CVN° 2 - Obra N° 11B - Cruce FC Sarmiento - Emp. RPN° 1	km 504 - km 527 - km 470 - km 480	5	33,0	04/10/2004	03/11/2006	17.420	8	
22	7	3	55	SANTA FE	11	CVN° 3 - Obra N° 15 - Emp. RNN° 168 - Emp. RPN° 39	km 476 - km 607	5	131,0	04/01/2006	04/10/2006	7.637	8	

25.057

Obras en Circuitos Turísticos

22	8	1	51	MISIONES	varias	Corredor de las Misiones		18	33,2	01/11/2013	31/10/2015	9.000	0	
22	8	2	51	PAIS	S/N°	Corredor de los Lagos	Global Trabaja por Año	18	51,5	01/01/2012	31/12/2012	1.955	6	B

Total Obras en Circuitos Turísticos

10.955

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

22	9	1	51	JUJUY	9	Puente s/ Río Xibi - Xibi		8		01/11/2013	30/10/2016	50.000	0	
22	9	2	51	JUJUY	40	Lte. C/ Salta - Emp. R.N.N°52	Secc. I y II - Corredor Minero	8	97,5	01/10/2013	01/08/2015	100.000	0	
22	9	2	52	JUJUY	40	Emp. R.N.N°52 - Coranzuli	Secc. I y II	8	72,0	01/10/2013	31/08/2015	545.000	0	
22	9	2	53	JUJUY	40	Coranzuli - Orosmayo	Secc. I y II	8	68,5	01/09/2013	31/08/2015	267.050	0	
22	9	2	54	JUJUY	40	Orosmayo - Paicone	Secc. I y II	8	67,0	01/10/2013	31/08/2015	365.000	0	
22	9	3	51	LA PAMPA	151	Empalme R.N.N°143 - La Pampa - Río Negro		8	59,0	01/11/2013	31/10/2016	7.000	0	
22	9	4	51	BUENOS AIRES	P S/N°	Enlace con Ruta 21 y R.N.N°226 - Olavarría - Azul	Emp. R.N.N°226 - Emp. R.N.N°3	8	35,3	23/11/2007	21/10/2012	141.333	7	
22	9	5	51	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Límite Córdoba / San Luis (km 653,94) - Acc. a Fraga - (km 730,97)	5	77,0	01/09/2013	31/08/2015	214.000	2	
22	9	5	52	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	Acc. A Fraga (km 730,55) - San Luis (km 792,42)	5	62,0				12	
22	9	5	53	SAN LUIS	7	Límite Córdoba / San Luis - Límite San Luis - Mendoza	San Luis (km 792,54) - Limite San Luis / Mendoza (km 865,68)	5	134,0	01/09/2013	31/08/2015	484.000	2	
22	9	7	51	SALTA	50	Pichanal - San Ramon de la Nueva Oran	km 0,00 - km 20,56	8	20,6	01/07/2008	30/04/2014	263.008	6	A
22	9	8	51	SALTA	86	Tartagal - Tonono y Pte S/ Río Carapary		8	33,0	01/11/2013	01/08/2014	52.620	0	
22	9	9	51	SALTA	51	Campo Quijano-El Tunal-Chorrillos-San Antonio de los Cobres-Minapona		8	13,5	01/11/2013	30/10/2016	248.000	0	
22	9	9	52	SALTA	51	Campo Quijano - Chorrillos	Secc II: El Tunal (km 40,00) - Est. Chorrillos (km 44,87)	8	4,5	01/11/2013	31/10/2014	49.998	0	
22	9	10	51	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SI	La Dársena - Angastaco	8	43,0	01/11/2013	31/10/2016	355.000	0	
22	9	10	52	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S II	Angastaco - Molinos	8	39,0	01/11/2013	31/10/2016	370.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	9	10	53	SALTA	40	La Dársena - Cachi - SIII	Molinos - Seclantas	8	16,0	01/11/2013	31/10/2016	400.000	0	
22	9	10	54	SALTA	40	La Dársena - Cachi - S IV	Seclantas - Cachi	8	28,0	01/11/2013	31/10/2016	670.000	0	
22	9	12	51	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Estancia San Alberto - Estancia Tambillos	8	11,3	19/06/2009	17/01/2012	40.110	7	
22	9	12	52	MENDOZA	149	Uspallata - Lte c/San Juan	Est. Tambillos - Lte. San Juan	8	27,0	01/09/2013	31/08/2015	150.000	0	
22	9	12	53	SAN JUAN	149	Lte c/Mendoza - Calingasta	Barreal - Calingasta	8	38,0	01/11/2013	30/10/2018	100.000	0	
22	9	16	51	MISIONES	14	Obras Intersección R.N.N°14 - Empalme R.P.N°4		8	0,5	01/09/2013	31/08/2014	3.000	0	
22	9	18	51	CHACO	16	Paso por Saenz Peña		8	5,0	01/08/2007	31/05/2010	68.184	7	
22	9	22	51	TUCUMAN	38	Rio Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección II: Acceso a Aguilares - Concepción	8	9,5	11/10/2011	09/10/2013	196.964	6	A
22	9	24	51	CATAMARCA	40	Agua Clara - Rio Las Cuevas	El Eje - Las Cuevas	8	32,8	01/08/2009	31/03/2013	407.182	6	
22	9	25	51	CATAMARCA	40	Pte.s/Rio Santa Maria entre las localidades de San Jose y Palo Seco		8	0,2	01/09/2013	31/08/2014	8.000	0	
22	9	26	51	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S I)	Emp. R.N.N°89 - Cementerio Parque Jazmín	8	16,9				12	
22	9	26	52	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S II)	Cementerio - Autódromo y Acceso (Cem. Pque Jazmin - Seminario)	8	5,3	10/02/2010	12/05/2011	8.563	10	
22	9	26	53	CHACO	11	Autovía Emp. R.N.N°89 - Acc. Margarita Belen (S III)	Autódromo Yaco Guarnieri - Acc. M. Belen	8	14,7				12	
22	9	28	51	CHACO	P16	Puente Ferroautomotor Chaco-Corrientes		8	12,0	01/11/2013	30/10/2018	620.000	0	
22	9	29	51	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección I	8	40,2	31/10/2013	30/10/2015	135.212	1	
22	9	29	52	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai	Sección II	8	41,2	31/10/2013	30/10/2015	176.763	1	
22	9	29	53	CHACO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S III)	Sección III	8	44,6	31/10/2013	30/10/2015	187.363	1	
22	9	29	54	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S IV)	Sección IV	8	55,3	01/09/2013	31/08/2015	150.000	0	
22	9	29	55	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S V)	Sección V	8	42,4	01/11/2013	31/10/2015	180.000	0	
22	9	29	56	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VI)	Sección VI	8	45,1	01/09/2013	31/08/2016	140.000	0	
22	9	29	57	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VII)	Sección VII	8	45,0	01/09/2013	31/08/2016	140.000	0	
22	9	29	58	SGO DEL ESTERO	16	Corredor Bioceánico Norte - Metan - Avia Terai (S VIII)	Sección VIII	8	46,7	01/09/2013	31/08/2016	140.000	0	
22	9	29	59	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Sección IX - km 621.12-667.81	8	46,7	01/11/2013	31/10/2015	140.000	0	
22	9	29	60	SALTA	16	Corredor Bioceánico Norte	Km 667,81 - km 707,25	8	39,4	01/11/2013	31/10/2015	140.000	0	
22	9	30	51	CHACO	95	Reconstrucción Pte.Lavalle y repavimentación Pto.Lavalle-Santa Sylvina	Puente sobre Rio Bermejo	5	0,1	27/04/2009	26/08/2010	5.745	7	
22	9	31	51	CHACO	11	Puente Ñeembucu - Integración Pilar - Bermejo		8	0,2	01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	9	33	51	CHUBUT	P71	Emp. R.N.N°258 (Emp R.N.N°40) - Cholila	Km 0 - km 30	8	30,0	15/12/2005	14/05/2012	66.917	8	
22	9	35	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Ira. Sección km 0 - km 30	8	30,0	01/02/2006	01/05/2013	79.505	6	
22	9	37	51	CORDOBA	60	Empalme R.N.N°9 - Limite c/Catamarca	Km 826,6 - km 929,00	8	102,4	19/04/2010	18/07/2013	304.752	6	A
22	9	38	51	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba		8	41,2	01/09/2013	31/08/2017	800.000	0	
22	9	38	52	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Cañada Jeanmaire - Arroyito	8	56,2	01/11/2013	30/10/2016	448.000	0	
22	9	38	53	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Arroyito - Rio Primero	8	54,8	01/09/2013	30/08/2016	657.000	0	
22	9	38	54	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Río Primero - Montecristo	8	24,7	01/09/2013	31/08/2015	141.000	0	
22	9	38	55	CORDOBA	19	San Francisco - Córdoba	Montecristo - Cordoba	8	24,7	01/11/2013	31/10/2016	149.500	0	
22	9	46	51	ENTRE RIOS	S/Nº	Puente Binacional Salto - Concordia		8	0,6	01/11/2013	31/10/2014	26.000	0	
22	9	51	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Inter. con Acceso a Dique Ballester en B. del Medio km 28,95	8	0,5	06/06/2011	04/12/2012	10.071	14	
22	9	52	51	SANTA CRUZ	288	Empalme R.N.N°3 - La Julia	Cdte. Luis Piedrabuena - Ea. La Julia	8	73,6	07/03/2007	04/06/2013	337.960	6	
22	9	53	51	SANTA CRUZ	40	Guer Aike - Punta Loyola	Autovía Guer Aike - Rio Gallegos y desvio transito pesado	8	21,0	07/03/2007	31/12/2012	207.258	6	A
22	9	53	52	SANTA CRUZ	40	Güer Aike - Punta Loyola	Acc. Aerop. R. Gallegos - Pte s/R. Chico	8	14,0	02/08/2007	30/06/2013	165.388	6	
22	9	56	51	CORDOBA	9	Cordoba - Emp. R.N.N°60	Sec. I: km. 752,08 - 753,66 y II: Rotonda Acc. A Sinsacate	8	2,2	01/03/2006	29/01/2008	22.251	7	
22	9	64	51	CATAMARCA	38	Paso Externo por la ciudad de Catamarca	Secciones I y V	8	10,7	01/03/2007	29/05/2012	144.482	7	
22	9	64	52	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 2	Santa Cruz - El Portezuelo (Cuestecilla)	8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	6.000	0	
22	9	64	53	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 3	Emp. Av. Circunvalación (salida a La Rioja)	8	16,2	01/11/2013	02/05/2015	50.000	0	
22	9	64	54	CATAMARCA	38	Paso externo por la ciudad de Catamarca - S 4	R.P.N°33, Puente s/Río del Valle - Puentes	8	4,7	01/11/2013	02/05/2015	13.000	0	
22	9	67	51	CHACO	16	Puente General Belgrano	Defensa contra Impacto de Embarcaciones	5	2,5	26/10/2009	24/12/2013	253.418	6	
22	9	70	51	CHUBUT	3	Estabilizacion Cerro Chenque	Acc. a Comodoro Rivadavia	5	0,0	19/12/2011	18/06/2013	187.116	6	
22	9	71	51	CHUBUT	P12	Emp. R.N.N°40 - Gualjaina	R.N.N°40 - km 27,00	8	27,0	01/02/2007	01/12/2010	57.119	8	
22	9	72	51	CHUBUT	P17	Trevelin - Corcovado	Sec. I :km 0 - km 26,28 y Acc. a Cerro Centinela (km 15,24-km 20,96)	8	32,0	08/03/2007	05/05/2013	107.472	14	
22	9	73	51	CHUBUT	P19	Río Pico - Emp. R.N.N°40	Km 30,00 - Km 65,00 - 2º Sección	8	30,3	01/02/2008	01/05/2013	83.052	6	A
22	9	74	51	CHUBUT	P56-40	Alto Rio Senguier - Emp. R.P.N°20	Km 0 - km 7,735 (R40) - km 0 - km 28,896 (P56)	8	39,0	09/03/2006	07/05/2011	51.540	7	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	9	77	51	CORDOBA	8	Río Cuarto - Santa Catalina (Est. Holmberg)		8	6,4	01/09/2013	31/08/2015	45.000	0	
22	9	85	51	CORRIENTES	P11-12	Puente Reconquista - Goya	Puente nuevo y accesos	8	50,0	01/11/2013	30/10/2018	2.750.000	0	
22	9	87	51	FORMOSA	11	Nueva Av. De Circunvalación de Formosa		8	20,4	01/09/2013	31/08/2015	32.762	0	
22	9	89	52	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - SII	II - Fortín Leyes - San Martín N°2	8	32,7	10/08/2007	09/06/2010	143.986	7	
22	9	89	53	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio a Zalazar - S III	III - San Martín 2 - Cabo 1º Lugones	8	24,8	20/11/2007	19/06/2011	103.808	7	
22	9	89	54	FORMOSA	86	Va. Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar - S IV	IV - Cabo 1º Lugones - Posta cambio a Zalazar	8	37,5	10/10/2007	09/06/2011	155.074	7	
22	9	92	51	JUJUY	P1	Acc sur a San Salvador de Jujuy (Río Blanco)	Pte. J. M. Gorriti - Emp. R.N.N°9	8	8,0	07/08/2006	06/04/2010	195.302	7	
22	9	97	51	MENDOZA	145	Paso Pehuenche Seccion II - b	Prog. 22,900 - Acc. A Cajon Grande (km 18,5 - km 43,84)	8	25,3	22/03/2010	31/01/2013	58.640	14	
22	9	98	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche (Seccion III - b)	Km 13,6 - Hito Pehuenche	8	16,8	02/01/2007	30/12/2012	157.617	6	
22	9	99	51	MENDOZA	145	Paso Hito Pehuenche Seccion III	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/Chile (km 0 - km 13,6)	8	13,6	15/01/2007	13/01/2010	106.895	7	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase II

15.856.980

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

22	10	1	51	MENDOZA	S/Nº	Obras Menores Ferrocarril Trasandino		8		01/09/2013	31/08/2014	32.500	0	
22	10	2	51	MISIONES	S/Nº	Puente Internacional Encarnación - Posadas		17	1,0	01/09/2013	02/05/2014	8.515	0	
22	10	4	51	NEUQUEN	40	Acceso a Buta ranquil y Barrancas		8	2,5	01/11/2013	31/10/2014	1.950	0	
22	10	6	51	NEUQUEN	231	Av. Circunvalación Villa La Angostura		8	6,0	01/09/2013	31/08/2015	245.655	2	
22	10	7	51	NEUQUEN	231-65-234	San Martín de Los Andes - Emp. R.N.Nº231	Sección IV: Acc. Villa Traful - Emp. R.N.Nº231	8	38,9	21/02/2006	21/05/2013	137.587	6	
22	10	8	51	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Chichinales - Acc. a Godoy	8	21,0	13/02/2008	13/03/2012	248.692	7	
22	10	8	52	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acceso a Godoy - Acc. a Cervantes	8	21,0	01/09/2011	30/08/2013	390.952	6	A
22	10	8	53	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Cervantes - Acc. a J. J. Gomez	8	22,0	03/02/2012	01/02/2014	505.106	6	A
22	10	8	54	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a J. J. Gomez - Acc. a Fernandez Oro	8	22,0	01/05/2013	30/04/2015	367.521	4	
22	10	8	55	RIO NEGRO	22	Chichinales - Cipolletti	Acc. a Fernandez Oro - Acc. a Parque Industrial Cipolletti	8	9,7	23/09/2011	21/09/2013	124.605	6	A
22	10	9	51	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº237	I y II	8	32,1	21/10/2011	19/01/2014	225.416	6	
22	10	9	52	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Sección II	8	32,0	21/10/2011	19/10/2013	214.771	6	
22	10	9	53	RIO NEGRO	23	Pilcaniyeu Viejo - Emp. R.N.Nº40	Acc. a Complejo Tecnológico Pilcaniyeu	8		21/10/2011	19/10/2013	65.476	6	A
22	10	11	51	RIO NEGRO	40	Acc. A Bariloche por Calle Monseñor Esandi	Emp. Calle 12 de Octubre - Emp. R.N.Nº40	8	3,6	23/09/2008	23/03/2013	34.265	6	
22	10	11	52	RIO NEGRO	S/Nº	Acceso a Bariloche por calles Wiederhold y Miramar	Emp. Ex R.N.Nº258 - Emp. R.N.Nº40	8	1,9	03/05/2010	15/12/2012	17.744	6	
22	10	11	53	RIO NEGRO	S/Nº	Reparación de calles Capraro, Onelli y Elordi		5		01/09/2013	31/08/2014	4.760	0	
22	10	13	51	SALTA	16	Lte. c/Chaco - Emp. R.N.Nº34	El Quebrachal - J.V. Gonzalez	5	1,4	01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	10	15	51	SAN JUAN	150	Ischigualasto - R.N.Nº40	Km 106 - km 131	8	25,0	15/07/2009	13/12/2012	295.154	6	
22	10	15	52	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.Nº40	Sección II - a 2 km 131 - km 143	8	12,0	15/07/2009	12/09/2013	339.292	6	A
22	10	15	53	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.Nº40	Caballo Anca - R. Bermejo (Sección IIb) km 143 - km 155	8	12,0	24/06/2008	22/12/2012	76.078	6	
22	10	15	54	SAN JUAN	150	Ischigualasto - Emp. R.N.Nº40	R. Bermejo - Emp. R.N.Nº40 (Sección III)	8	36,4	21/08/2007	19/12/2010	167.679	7	
22	10	22	51	SANTA FE	168	Río Colastine - Túnel Subfluvial Hernandarias		5	9,0	31/07/2007	30/03/2011	249.616	8	
22	10	23	51	SANTA FE	168	Tunel Subfluvial Hernandarias	Intercambiador La Guardia - Pte. s/Río Colastine	5	3,5	01/05/2013	29/04/2016	140.269	4	
22	10	24	51	SANTA FE	178	Emp. R.N.Nº33 - Villa Eloisa	Km 115,76 - km 146	8	33,6	29/10/2008	28/04/2013	317.253	6	
22	10	25	51	SANTA FE	178	Las Rosas - Emp. R.N.Nº34	203-233	8	30,0	01/10/2013	31/08/2016	78.000	0	
22	10	31	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección I: Río Marapa (Alberdi) - Acceso a Aguilares	8	21,0	10/06/2009	09/03/2013	258.712	6	A
22	10	32	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (Alberdi) - Principio Autopista	Sección V: Emp. Traza Actual - Principio Autopista	8	13,9	08/03/2007	06/05/2011	135.323	7	
22	10	34	51	ENTRE RIOS	P-6-P2-12-131-P32	Intersecciones rutas: 127/P6 -127/P2-12/131/P32-18/P32	Intersecciones varias	11	1,0	01/09/2013	31/08/2015	8.450	0	
22	10	35	51	ENTRE RIOS	A015	Intersección R.N.NºA015 y calle Rösch	Conexión Acceso a Salto Grande y R.N.Nº14	8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	849	0	
22	10	37	51	LA PAMPA	35-P102	Rotonda Intersección (Castex)		8	0,5	01/09/2013	02/03/2014	3.915	0	
22	10	38	51	NEUQUEN	22	Neuquen - Arroyito	Intersección R.N.Nº22 y R.N.Nº237	8	1,5	01/09/2013	02/03/2014	4.856	0	
22	10	39	51	NEUQUEN	22	Urbano Zapala	Intersección Rot. Av. Fortabat - Rot. Emp. R.P.Nº13	8	5,5	31/01/2011	31/05/2014	128.258	6	
22	10	41	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia- Lapataia	Int. Av H.Irigoyen/LNAlem-Portal Acc. Parque N.Tierra del Fuego-Ba. Lapataia-Acc.Ca	8	22,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	10	42	51	TIERRA DEL FUEGO	3-V-1	Emp. Ex. R.N. 3 - Usuahia	Km 3049,52 - km 3054,86	8	5,0	01/11/2010	02/04/2011	16.012	7	
22	10	47	51	CHUBUT	260	Empalme R.N.Nº40 (S) - Emp. R.P.Nº51	Sección I y II	8	58,0	01/11/2013	30/10/2016	170.000	0	
22	10	48	51	CHUBUT	260	Empalme R.P.Nº51 - Límite con Chile	Sección I y II	8	47,0	01/09/2013	31/08/2016	130.000	0	
22	10	49	51	MENDOZA	7	Variante paso por Palmira		8	35,0	01/09/2013	31/08/2015	230.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	10	52	51	CORDOBA	19	Autopista Santa Fe - San Francisco	Sección III: Lte. c/Sta Fe - R.N.N°158	8	6,2	07/09/2009	06/12/2012	221.976	6	A
22	10	54	51	CORRIENTES	117	Cotecar - Construccion Complejo Terminal de Cargas	Ingreso al CO.TE.CAR (D) - Control Aduanero	8	1,0	05/06/2006	05/02/2013	121.035	6	A
22	10	63	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 (Gramado) - Emp. RP N° 17 (1 Sec.)	Prog. 1056,00- 1090,00	8	34,6	16/03/2011	14/03/2014	406.734	6	A
22	10	64	51	MISIONES	14	Emp. RP N° 20 - Emp. RP N°17 (2 Sec.) (Dos Hermanas)	Prog. 1090 - 1117 - Piñalito - Emp. R.P.N°17	8	21,4	16/03/2009	14/03/2013	245.342	6	A
22	10	65	52	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°5 - R.N.N°20	8	12,6	01/09/2013	31/08/2015	100.000	0	
22	10	65	53	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.N.N°20 - R.P.N°E55	8	4,3	01/11/2013	31/10/2015	200.000	0	
22	10	65	54	CORDOBA	A019	Circunvalación Noroeste (O.F.)	R.P.N°E55 - Av. Spilimbergo	8	5,3	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	10	67	51	SANTA CRUZ	40-293	Rospentek - Guer Aike - Rospentek - El Zurdo (Pte. Blanco)	R.N.N°293-Tr.: Emp R.N.N°40 - Paso Fronterizo Laurita	8	64,3	01/08/2006	29/12/2015	263.802	6	
22	10	67	52	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - SII	El Zurdo - Ea. Bella Vista (Puente Blanco)	8	81,5	22/03/2007	19/06/2014	325.181	6	
22	10	67	53	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S III	Ea. Bella Vista - Ea. Buitreras	8	41,0	09/04/2007	05/02/2013	204.030	6	
22	10	67	54	SANTA CRUZ	40	Rospentek - Guer Aike - S IV	Ea. Buitreras- Guer Aike	8	42,0	09/04/2007	06/11/2011	173.644	7	
22	10	72	52	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2026,00 - km 2088,55	8	62,6	20/05/2006	18/10/2010	153.209	7	
22	10	72	53	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2164,79 - km 2184,79 y km 1907,80 - km 1970,00	5	82,2	01/11/2010	01/05/2013	274.304	6	
22	10	72	54	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2284,79 - 2303	5	18,6	22/08/2007	20/08/2009	52.641	8	
22	10	72	55	SANTA CRUZ	3	Fitz Roy - Gran Bajo San Julián	Km 2088- 2164,79	8	76,2	01/05/2013	30/04/2015	207.175	4	
22	10	73	51	TUCUMAN	65(EX365)	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca		8	30,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	10	73	52	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. c/ Catamarca	Sección III Alpachiri - Cochuna	8	18,0	01/09/2013	31/08/2015	54.000	0	
22	10	73	53	TUCUMAN	65	Emp. R.N.N°38 - Lte. Tucuman/ Catamarca	Sección IV Cochuna - Lte. Tucumán/ Catamarca	8	22,0	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	10	76	51	SALTA	34	Puente Internacional Salvador Mazza - Yacuiba		8	9,7	01/09/2013	31/08/2015	100.000	2	
22	10	79	51	CORDOBA	38	Reordenamiento Accesos a Cosquín - 2 Puentes		8	1,0	05/05/2007	02/05/2013	41.015	14	
22	10	80	51	CORDOBA	8	Obra de Intersección R.N.N°8 - Acceso Este Ciudad de la Carlota	Acceso Este Ciudad de la Carlota	8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	2.080	0	
22	10	81	51	CHACO	16	Autovía 16 - E. R. 63 - E. Cc. Puerto Tirol		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	100.000	0	
22	10	84	51	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	(Sección I) Prog. 0,00 - Prog. 15,00	8	15,0	22/12/2008	22/10/2011	60.663	7	
22	10	84	52	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección II	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	10	84	53	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección III	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	10	84	54	SGO DEL ESTERO	98	Bandera - Pinto	Sección IV	8	15,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	10	88	51	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	La Paz - Santa Rosa	8	66,1	29/11/2007	28/05/2012	330.050	7	
22	10	88	52	MENDOZA	7	Desaguadero - San Martín	Desaguadero - La Paz	8	33,0	13/11/2008	13/05/2013	158.073	6	A
22	10	90	51	SAN LUIS	20	Villa Dolores - Quines	Límite con Córdoba - Quines	8	48,0	01/09/2013	31/08/2014	20.625	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase III

10.085.810

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

22	11	6	51	SAN JUAN	149	Barreal - Uspallata	El Leoncito - Límite con Mendoza - Secc. I y II y Acc. Parque Nac. El Leoncito	8	42,6	14/05/2010	12/05/2013	70.119	6	A
22	11	13	51	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Sección I a San Francisco - Quebracho Herrado	8	23,5	01/09/2013	30/08/2019	435.101	0	
22	11	13	52	CORDOBA	158	Autovía San Francisco - Las Varillas	Saturnino Laspiur - Las Varillas	8	43,3	01/11/2013	30/10/2019	680.475	0	
22	11	13	53	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	Las Varillas - La Playosa	8	37,5	01/09/2013	31/08/2016	477.531	0	
22	11	13	54	CORDOBA	158	Las Varillas - Villa María	La Playosa - Villa María	8	43,4	01/11/2013	31/10/2016	569.764	0	
22	11	13	55	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Villa María - Emp. R.P.N°6	8	36,6	01/09/2013	31/08/2016	183.100	0	
22	11	13	56	CORDOBA	158	Villa María - Gral. Deheza	Emp. R.P.N°6 - Gral. Deheza	8	29,2	01/11/2013	31/10/2016	219.075	0	
22	11	13	57	CORDOBA	158	Gral. Deheza - Río Cuarto	Gral. Deheza - Pte. s/Río Chucul	8	39,7	01/09/2013	31/08/2016	198.550	0	
22	11	13	58	CORDOBA	158	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	Pte. s/Río Chucul - Río Cuarto	8	21,2	01/11/2013	31/10/2016	106.150	0	
22	11	14	51	SANTA CRUZ	288-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8	0,5	01/11/2013	31/10/2014	12.730	0	
22	11	19	51	SALTA	34	Fin Multitrocha - Lte., c/Jujuy		8	40,0	01/09/2013	31/08/2015	136.500	0	
22	11	29	51	SGO DEL ESTERO	9	Circunvalacion de Sgo del Estero	Emp. R.N.N°9 (N) - Emp. R.N.N°9 (S)	8	7,5	01/02/2008	01/10/2010	63.918	7	
22	11	32	51	SAN JUAN	153	Conexion Vial Los Berros - Barreal	Río Nikes - Pampa del Yalguaraz	8	39,8	01/09/2013	31/08/2016	54.000	0	
22	11	32	52	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	Ingreso a Túnel - El Portezuelo	8	17,0	01/11/2013	02/05/2015	98.000	0	
22	11	32	53	SAN JUAN	153	Pedernal - Intersecc. R.N.N°149	El Portezuelo - R.N.N°149	8	19,0	01/11/2013	02/05/2015	86.500	0	
22	11	34	51	RIO NEGRO	151	Emp. R.N.N°22 - Colonia Catriel	Intersección con R.P.N°69 - km 30,78 y Acc. a V. Manzano	8	6,0	17/06/2008	16/08/2009	11.663	8	
22	11	35	51	JUJUY	IV66	Perico - El Milagro	Emp. R.N°66 - Emp. R.N°34	8	13,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	11	36	51	JUJUY	66	Perico - El Cuarteadero	Emp. R.N.N°IV 66 - Emp. R.N°34	8	12,4	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	11	37	51	JUJUY	34	Lte. con Salta - Acceso a San Pedro de Jujuy		8	60,0	01/09/2013	31/08/2016	150.000	0	
22	11	37	52	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín		8	57,0	01/11/2013	02/05/2015	400.000	0	
22	11	37	53	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	San Pedro (km 1197,50) - Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,52)	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	203.500	0	
22	11	37	54	JUJUY	34	San Pedro - Libertador General San Martín	Pte. s/ Río Ledesma (km 1232,50) - Calilegua (km 1250,00)	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	0	
22	11	45	51	TUCUMAN	157	Vte. Bella Vista - Emp. Aut. R.N.N°38		8	8,0	01/11/2013	02/05/2015	21.000	0	
22	11	47	51	ENTRE RIOS	12	Acc a San Benito - Av Almafuerite (Parana)	Acceso Sur a Paraná	8	3,1	01/09/2013	31/08/2015	44.971	0	
22	11	53	51	SGO DEL ESTERO	P6	Sachayoj - Otumpa (S I)	I - Prog. 48200 - 70000	8	21,8	25/04/2008	24/04/2010	60.413	7	
22	11	70	51	SALTA	RP N° 20	Emp. RP N° 5 - Parque Nacional El Rey	Acc. Parque Nacional El Rey	8	46,0	01/04/2008	01/05/2010	100	10	
22	11	77	51	LA RIOJA	75	Las Padercitas - Sañogasta	Las Padercitas - Control Policial (Dique los Sauces)	8	6,0	01/09/2013	31/08/2014	17.128	0	
22	11	78	51	LA PAMPA	154	Emp. R.N.N°35 - Emp. R.N.N°22	Km 111,00 - Km 136,48 (Emp. RN N° 22)	5	25,5	15/07/2010	31/12/2012	21.173	14	
22	11	81	51	SAN JUAN	20-141	Ciclovía Difunta Correa - Caucete - Emp. R.N.N°141 - Caucete y Difunta Correa	Sección: I - I a - I b - II y III: Acceso Difunta Correa - Lado Norte	8	29,8	28/09/2009	29/03/2011	13.698	7	
22	11	83	51	SANTA FE	A007	Red de accesos a la ciudad de Santa Fe (Circunv. Oeste y Acc. Norte)	19,1 kms	8	19,1	01/09/2013	02/03/2015	36.304	0	
22	11	86	51	SANTA CRUZ	S/N	Acceso desde R.N.N°281 a Pto. Deseado	Intersección con R.N.N°281 - Calle Almirante Zar; Veneciano - Parque Industrial	8	22,0	01/04/2007	29/03/2012	106.812	7	
22	11	88	51	MISIONES	12	Avda. Las Palmeras - Avenida Juan Domingo Peron en Posadas (Colectora)	Acceso Aeropuerto Capitalino - La Garita (km 10) y Acc. por Av. Cocomarola y R.P.N°2	8	10,0	01/09/2013	31/08/2015	119.345	2	
22	11	92	51	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Colorado	Abra de Cañas - Río Jordan	8	15,2	16/07/2008	14/01/2010	6.530	7	
22	11	92	54	JUJUY	P83	Emp. R.N.N°34 - Valle Grande	Pr 0,000 - Abra Cañas	8	30,0	22/10/2007	31/05/2008	298	10	
22	11	94	51	SAN JUAN	153	Medía Agua - Los Berros	Emp. R.N.N°40- Pte. s/Río Korich	8	23,6	01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	11	95	51	BUENOS AIRES	228-P73	Rotonda en Intersección R.N.N°228 y R.P.N°73		8		01/11/2013	31/10/2015	26.000	0	
22	11	96	51	CHUBUT	3-P4	Puerto Madryn - Trelew (2da. Calzada y Acceso a Puerto Madryn)	R.N.N°A010 (Acceso a Pto. Madryn) - Rotonda Norte a Trelew	8	61,0	01/01/2008	31/05/2014	626.105	6	A

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase IV

5.516.554

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

22	12	1	51	PAIS	-	Accesos a localidades desde Rutas Nacionales		14	18,8	01/01/2012	31/12/2012	26.023	6	B
22	12	2	51	TUCUMAN	40	Las Mojarras - Emp. R.P.N°357 (Acc. a Quilmes)	Secciones I y II	8	20,0	04/05/2009	02/06/2013	92.645	6	
22	12	3	51	TUCUMAN	9	Pavimentación colectora e iluminación en Las Talitas		8	2,0	01/09/2013	31/08/2014	32.500	0	
22	12	12	51	ENTRE RIOS	127	Int.RNN 127 con Av. Antelo e Irigoyen (Fed) Acc. a Conscripto Bernardi	A° Machuca - Calle Cepeda (km 200)	8	2,5	27/08/2009	31/03/2013	34.054	6	A
22	12	13	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Hosteria Kaiken - Acceso a cabecera Lago Fagnano		8	6,8	01/11/2013	02/05/2015	13.000	0	
22	12	14	51	BUENOS AIRES	P66	Ameghino - Blaquier	Int. c/ R.N.N°188 - Cruce FFCC Gral San Martín	13	27,4	17/09/2007	16/12/2010	127.110	7	
22	12	18	51	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección I: Vte en la RP N° 007-01	8	8,0	01/11/2013	31/10/2015	954.000	0	
22	12	18	52	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección II: Distribuidor El Guanaco - El Cholo	8	10,5	01/11/2013	31/10/2015	120.000	0	
22	12	18	53	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección III: Paraje El Cholo - 2° Acceso a Médanos	8	28,0	01/11/2013	31/10/2015	336.000	0	
22	12	18	54	BUENOS AIRES	3	Intersección R.N.N°3 y R.N.N°252 - Bifurcación R.N.N°3	Sección IV: Distribuidor El Guanaco - Acceso Puerto de Bahía Blanca	8		01/11/2013	31/10/2015	40.000	0	
22	12	19	51	SAN JUAN	40	Tres Esquinas - Lte. c/Mendoza	Doble Vía	8	109,0	01/09/2013	02/03/2016	35.000	0	
22	12	20	51	TUCUMAN	38	Paso por Monteros y Av. de Circunvalación		8	3,5	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	12	21	51	SANTA CRUZ	288	Emp. RNN 3 - Pto. Santa Cruz	Mejoramiento Accesibilidad al Puerto	5	30,0	31/01/2012	29/01/2015	244.090	6	
22	12	23	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección I	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	10.000	0	
22	12	24	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección II	8	33,3	01/11/2013	31/10/2015	32.500	0	
22	12	25	51	SANTA CRUZ	40	Punta Loyola - Cabo Vírgenes	Sección III	8	34,3	01/11/2013	31/10/2015	23.400	0	
22	12	26	51	SANTA CRUZ	S/N	Repavimentación y Pavimentación calles de Piedrabuena		11		14/12/2007	12/09/2011	42.350	7	
22	12	29	51	CHACO	95	Emp. RNN 9 - Lte. Con Formosa	Emp. R.P.N°3 - Pte. Lavalle	8	10,1	01/12/2011	29/11/2013	71.413	6	A
22	12	30	51	JUJUY	9	Autovía Tramo: R.P.N° 2 - Yala	Puente Asunción del Paraguay - Acceso a Yala	8	12,6	22/12/2010	20/12/2012	431.019	6	A
22	12	39	51	SANTA FE	A008	Río Parana - Emp. Av Belgrano (Av. Circunv. de Rosario)	Km 1,310 - km 29,395	8	29,0	25/02/2009	23/02/2014	1.150.753	6	
22	12	40	51	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección I km 416,00 - km 426,7 y km 445,35 - km 479,00	8	44,4	28/08/2009	26/02/2012	117.010	7	
22	12	40	52	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección II km 404 - km 416, km 426 - km 445 y km 479 - km 517	8	69,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	40	53	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección III: km 517,28 - km 568,55 - km 580 - km 584	8	55,3	28/07/2009	26/04/2013	169.830	6	A
22	12	40	54	BUENOS AIRES	226	Bolívar (Emp. R.P.N°65) - General Villegas (Emp. R.N.N°33)	Sección IV: km 568 - km 580 y km 584 - km 623	8	51,0	01/11/2013	31/10/2015	85.000	0	
22	12	42	51	CHACO	11	Variante paso por Resistencia	Km 955 - km 5,95	8	19,0	31/10/2013	30/10/2015	100.000	1	
22	12	43	51	CHUBUT	3 - RP 2 -A010	Arroyo Verde - Emp. R.N.N°A010 / Emp. R.N.N° 3 - Pto. Piramides	Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°1	8	87,3	22/08/2008	30/04/2013	207.755	6	A
22	12	44	51	SANTA FE	9	Rosario - Carcaraña		8	39,0	01/11/2013	31/10/2015	40.753	0	
22	12	45	51	BUENOS AIRES	3	Emp. R.P.N°4 - Emp. R.P.N°6	Km 22421,54 - km 28142,32	8	5,6	15/05/2008	13/07/2013	203.178	6	A

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	12	46	51	SGO DEL ESTERO	89	Quimili - Suncho Corral		8	106,0	01/11/2013	31/10/2015	40.000	0	
22	12	47	51	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Posta Cambio Zalazar - el Remanso	8	34,1	01/06/2011	30/05/2013	212.795	6	
22	12	47	52	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Remanso - Lamadrid	8	34,1	01/09/2011	30/08/2013	155.003	6	
22	12	47	53	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Lamadrid - Guadacazar	8	17,1	01/06/2011	30/05/2013	210.870	6	
22	12	47	54	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Guadacazar - El Solitario	8	38,2	15/08/2011	13/08/2013	173.113	14	
22	12	47	55	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	El Solitario - Puerto Irigoyen	8	42,0	15/08/2011	13/08/2013	169.040	14	
22	12	47	56	FORMOSA	86	Posta Cambio Zalazar - Lte. con Salta	Puerto Irigoyen - Misión San Martín	8	30,0	15/08/2011	13/08/2013	158.112	14	
22	12	49	51	SANTA FE	34	Variante de paso por Rafaela	Km 214,38 - km 231,50	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	12	52	51	ENTRE RIOS	130	Variante paso por Villaguay		8	5,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	12	60	51	LA PAMPA	232 (Ex RPN 106)	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección I	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	61	51	LA PAMPA	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo	Sección II	8	37,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	12	62	51	RIO NEGRO	232	Emp. R.N.N°152 - Chelforo (Emp. R.N.N°22)	Sección III - Las Japonesas - Chelforo	8	42,0	15/04/2009	13/12/2012	118.684	14	
22	12	63	51	SANTA FE	34	Calle Grandoli - Lopez Bouchard / Rosario - Emp. R.N.N°A012	Variante (km 0,00 - km 1,4) y Desagües	8	1,4	12/08/2009	10/02/2011	29.245	8	
22	12	67	51	CHUBUT	EX RP N 20	Tamariscos - Emp. R.P.N°56	Prog. 159,300 - Prog. 166,500	8	7,0	01/11/2013	02/07/2014	6.449	0	
22	12	69	51	CORRIENTES	P 40	Tramo 2 - Puesto Ciro - Emp. R.P.N°114	Prog. 34,00 - Prog. 75,241 (PASO A INC. V)	8	41,2				12	
22	12	70	51	SAN JUAN	150	Las Flores - Lte. Internacional con Chile	Sección II: Peñasquito km 351 (Ojo de Agua)	8	28,3	27/10/2009	26/04/2013	92.315	6	A
22	12	79	51	BUENOS AIRES	3	Av. General Paz - Cañuelas	Km 43,110 - km 61,383	8	18,3	20/05/2008	19/07/2011	296.285	7	
22	12	83	51	TUCUMAN	65	R.N.N°65 (EX365) Emp R.N.N°38 Lte. c/Catamarca	R.N.N°38 - Alpachiri - (km 3,2 - km 18,16)	8	15,0	02/03/2010	31/08/2011	20.012	8	
22	12	88	51	SAN JUAN	40	Villicum - Talacasto	Cruce F.C.G.B. - Matias G. Sanches km 3478,94 - km 3537,80	8	58,9	01/11/2013	31/10/2015	70.000	0	
22	12	89	51	SAN JUAN	40	Talacasto - San Roque	Matias G. Sanches - San Roque km 3537,80 - km 3608,82	8	71,0	01/11/2013	31/10/2015	90.000	0	
22	12	93	51	MISIONES	101	Acc. a Aeropuerto Pto. Iguazu - Andresito	Mejoramiento R.N.N°101	8	34,0	01/05/2013	30/04/2014	56.288	4	
22	12	96	51	INTERPROVINCIAL	11	Autovía Resistencia - Formosa		8	150,0	01/11/2013	31/10/2018	350.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase V

7.387.594

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

22	13	2	51	CHACO	16	Proyecto y Construcción Viaducto en Intersección con Av. Sarmiento	Proyecto de Intersección con Av. Sabin y con R.N.N°11	8		28/09/2010	27/08/2013	127.625	6	A
22	13	3	51	FORMOSA	P2	Emp. R.N.N°11 - Riacho He - He		5	15,0	14/04/2008	13/06/2010	41.540	7	
22	13	4	51	TUCUMAN	38	Río Marapa (J.B.Alberdi) - Principio de Autopista	Sección IV: Acc. Monteros - Emp. R.N.N°38	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	195.000	0	
22	13	5	51	CATAMARCA	40	Paso Externo por la ciudad de Belen		8		01/11/2013	31/10/2015	30.000	0	
22	13	7	51	CHUBUT	26	Emp RN N° 3 - Pampa del Castillo (Intersecc. R.P.N°37)	Prog 0,00 - Prog 41,88	8	42,0	01/11/2013	31/10/2015	170.000	0	
22	13	9	51	RIO NEGRO	237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc I: San Carlos de Bariloche - Puerto Moreno	8	10,6	01/05/2013	30/10/2014	25.000	4	
22	13	10	51	RIO NEGRO	P Ex 237	Av. Bustillo e/San Carlos de Bariloche y Llao Llao	Secc II: Puerto Moreno - Llao Llao	8	14,8	20/01/2010	18/01/2014	41.808	6	
22	13	11	51	SALTA	68	Chicoana - Río Ancho	Km 141,90 - km 176,04	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	612.147	0	
22	13	12	51	MENDOZA	40	Mendoza, Lte c/ San Juan	Borbollon - Lte c/ San Juan	8	68,1	01/11/2013	31/10/2015	12.000	0	
22	13	16	51	SALTA	51	Campo Quijano - El Tunel - Chorrillos - Alto Chorrillo - Alto Tocomar		8	126,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	13	16	52	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Mina La Poma - Alto Chorrillos	8	20,0	01/11/2013	01/09/2015	61.000	0	
22	13	16	53	SALTA	51	San Antonio de los Cobres - Paso Sico	Alto Chorrillos (km 180) - P° de Sico (km 289)	8	109,0	01/11/2013	31/10/2017	500.000	0	
22	13	17	51	CORRIENTES	118	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.P.N°5 (Saladas - S. Miguel)	Pte. s/ Arroyo Naranjito, Río Santa Lucía	5		01/05/2013	30/10/2013	5.948	4	
22	13	18	51	CORRIENTES	123	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°119	Vte. por Santuario Gaucho Gil y Accesos	8	2,0	01/11/2013	02/03/2015	23.000	0	
22	13	19	51	ENTRE RIOS	12	Gral. Galarza - Nogoya		8	60,0	01/11/2013	02/05/2016	190.000	0	
22	13	20	51	ENTRE RIOS	S/N	Nogoya - Villaguay		8	75,0	01/11/2013	31/10/2016	270.000	0	
22	13	22	51	JUJUY	52	Emp. Ex R.N.N°40 - Susques	Km 78,00 - km 102,00	8	24,0	01/11/2013	02/07/2014	7.000	0	
22	13	23	51	JUJUY	52	Susques - Emp R.P.N°16	Km 150,00 - km 150,50	17	0,5	01/11/2013	02/03/2014	1.500	0	
22	13	24	51	JUJUY	40	Paicone - La Quiaca	Secciones I, II y III	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	0	
22	13	24	52	JUJUY	40	Paicone - Ppio Superposic. Ex R.P.N°64	Sección II	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	130.000	0	
22	13	24	53	JUJUY	40	Ppio Superposic. Ex R.P.N°64 - La Quiaca y Acc. a Sta. Catalina	Secciones I, II y III	8	94,0	01/11/2013	31/10/2015	400.000	0	
22	13	25	51	LA RIOJA	76	Punta de Agua - Pircas Negras	Sección III	8	25,0	01/11/2013	31/10/2014	10.000	0	
22	13	26	51	MENDOZA	7	Acceso Este a Mendoza		8	36,0	01/11/2013	31/10/2014	110.000	0	
22	13	27	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. C/ Chile		8	185,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	28	51	MISIONES	14	Leandro N. Alem - Oberá	Variante por Oberá	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	50.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	13	29	51	MISIONES	12	Prolongacion Variante Yabebiry	Variante por San Ignacio	8	5,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	0	
22	13	30	51	MISIONES	12	Variante por Gral Roca		8	14,0	01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	
22	13	31	51	SALTA	86	Mision la Paz - Tonono		8	114,0	01/11/2013	31/10/2015	300.000	0	
22	13	32	51	SANTA FE	AO12	Autovia R.N.N°AO12		8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	33	51	SANTA FE	33	Variante por Perez		8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	80.000	0	
22	13	34	51	SANTA FE	11	Variante paso por Reconquista y Avellaneda (RPN° 41 - km 804,5)	Km 776,8 - km 804,5	8	44,7	01/11/2013	31/10/2015	653.841	0	
22	13	35	51	SANTA FE	11	Recreo - San Justo	Prolongación de Circunvalación a Ciudad de Santa Fe	8	19,0	01/11/2013	31/10/2015	160.000	0	
22	13	36	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Hito 1 - San Sebastián	Secc. I, II y III	8	92,0	01/05/2011	29/04/2014	509.213	6	A
22	13	37	51	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I, II , III , IV	8	23,7	01/11/2013	31/10/2015	400.000	0	
22	13	37	52	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. I. R. Marapa (Alberdi) - Acc. Aguilares y Alberdi	8	19,9	01/11/2013	31/10/2015	105.240	0	
22	13	37	53	TUCUMAN	38	Río Marapa - Famaillá	Secc. II: Acc. Aguilares - Concepción	8	7,2	01/11/2013	31/10/2015	50.100	0	
22	13	38	51	CATAMARCA	38	Acceso Sur a Catamarca	Km 572,37 - km 576,37	8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	13	39	51	LA PAMPA	35	Paso por Santa Rosa		8	4,0	01/11/2013	31/10/2015	20.000	0	
22	13	40	51	LA PAMPA	35	Paso por Ataliva Roca - Emp R.P.N°18 - Santa Rosa	Km 279,80 - km 281,75	8	2,0	10/08/2010	09/10/2011	11.200	7	
22	13	41	51	CHACO	16	Viaducto y Adecuación Hidraulica en Intersección con Av. Sarmiento		8		01/11/2013	31/10/2015	52.000	0	
22	13	41	52	CHACO	16	Lte. Corrientes/Chaco - Makalle	Intersección Ruta Nacional N°11 (km 17,56)	8		01/11/2013	31/10/2014	60.000	0	
22	13	42	51	CORDOBA	9	Intersección c/ R.P.N°17		8		01/11/2013	31/10/2014	30.174	0	
22	13	43	51	CORDOBA	20-148	Circunvalación Sur a Villa Dolores	Conexión R.N.N°20 (km 199,69) y R.N.N°148 (961,92)	8	7,1	01/03/2010	29/04/2013	43.038	6	A
22	13	44	51	SAN JUAN	40	Albardon - Talacasto		8	44,3	01/11/2013	31/10/2015	14.000	0	
22	13	45	51	CHUBUT	25	Autovia Trelew - Gaiman	Sección I: Variante Parque Industrial y Acceso	8	8,0	19/06/2009	18/04/2013	141.782	6	A
22	13	46	51	CHUBUT	26	Pampa del Castillo - Cerro Dragon	Km 41,88 - km 80,00	8	20,0	01/11/2013	02/05/2015	20.000	0	
22	13	47	51	CORRIENTES	12	Empedrado - Paso de la Patria	Variante Paso por Corrientes	8	25,0	01/09/2013	31/08/2015	90.000	0	
22	13	48	51	CORRIENTES	12	Lte. c/ Entre Rios - Goya	Variante Paso por Esquina	8	10,0	01/11/2013	31/10/2016	130.000	0	
22	13	50	51	MENDOZA	143	San Rafael - Las Paredes	Km 664 - km 668,60	8	4,6	01/11/2013	02/05/2014	3.820	0	
22	13	51	51	CATAMARCA	40	Pie de Medano - Santa Maria	Km 4247,24 (Río Yapez) - km 4261,54 (Santa Maria)	5	14,3	09/11/2011	08/06/2013	18.362	6	
22	13	52	51	CHACO	95	Acc. Oeste a Villa Angela		5	4,0	01/11/2013	31/10/2014	12.000	0	
22	13	54	51	CORRIENTES	12	Ita Ibate - Ituzaingo	Empalme R.N.N°118	8	80,0	01/11/2013	02/05/2014	3.000	0	
22	13	55	51	CORRIENTES	14	Emp. R.P.N°40 - Emp. R.N.N°120	Variante por Virasoro	8	10,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	0	
22	13	57	51	CORDOBA	9-60	Villa del Totoral - Lte. Santiago del Estero	Jesús María - Lte. Sgo. del Estero/Emp. R.N.N°9 - Lte. Catamarca	5	222,7	14/04/2010	12/12/2013	456.896	6	A
22	13	58	51	BUENOS AIRES	S/N°	Acc. a Construir al CE.RE.NA	Acc. a Caminos a Reparar o Construir - Bicisenda	5		08/05/2009	05/12/2012	92.586	6	A
22	13	59	51	MENDOZA	143	Union Rutas Nac.N°143 N°146	Acc. Norte a San Rafael	8	33,7	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	60	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección III	Anchoris - R.P.N°96	8	28,2	07/06/2010	05/06/2013	238.620	6	A
22	13	61	51	MENDOZA	40	Lujan de Cuyo -Tunuyan - Sección IV	Variante por Tunuyán	8	30,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	62	51	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 100 - km 120	5	20,0	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	13	62	52	SAN JUAN	149	Pachaco - Calingasta	Km 120 - km 134 (Pte. s/ Río Calingasta)	5	14,0	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	13	63	51	SAN JUAN	AO14	B/N R.N.N°40 - B/N R.N.N°40		8		01/11/2013	31/10/2018	35.000	0	
22	13	64	51	MENDOZA	40	Calle Azcuenaga - Emp. R.N.N°7	Intersecc. c/R.P.N°10 (Calle Paso)	8		13/07/2009	12/10/2011	53.315	7	
22	13	65	51	CHUBUT	25	Rawson - Trelew		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	13	66	51	CHUBUT	25	Trelew - Gaiman	Sección II	8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	67	51	MENDOZA	40	Acceso Sur a Mendoza		8	16,0	01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	13	68	51	CATAMARCA	40	Emp. R.N.N°60 - Belen	Pte s/ Río Huayco y Accesos	8	0,1	17/12/2009	17/10/2011	8.780	7	
22	13	69	51	CHACO	11	Acc. a Margarita Belen		8	1,0	01/11/2013	02/05/2014	6.600	0	
22	13	70	51	SAN LUIS	7 - 8	Emp. R.N.N°8 - Emp. R.P.N°14 / Lte. c/ Cordoba - Emp. R.N°7	Km 677,01 - km 692,80; km693,78 - km 722,95	5	45,0	25/09/2009	25/03/2012	75.907	7	
22	13	71	51	BUENOS AIRES	S/N°	Campamento Zárate		8		01/11/2013	02/07/2014	20.000	0	
22	13	72	51	TUCUMAN	38	Monteros - San Martin de Tucumán	Pte. Canal Sur (km 801,39) Avda. Democracia	8		01/09/2013	01/06/2014	10.483	2	
22	13	74	51	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Los Menucos - Maquinchao (km 269 - km 340)	8	72,1	15/10/2010	14/04/2013	182.652	6	
22	13	74	52	RIO NEGRO	23	Valcheta - Pilcaniyeu	Maquinchao - Jacobacci	8	73,4	31/10/2013	30/10/2015	203.940	1	
22	13	75	51	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (I)	El Sosneado - La Jaula	8	71,9	01/05/2013	30/10/2015	559.595	4	
22	13	75	52	MENDOZA	40	El Sosneado - Pareditas (II)	La Jaula - Emp. R.P.N°98	8	67,8	01/09/2013	01/03/2016	261.600	2	
22	13	76	51	MENDOZA	143	Av. Ballofet		5		01/11/2013	31/10/2014	7.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	13	77	51	MENDOZA	40	Mendoza - Lte. c/San Juan		5		01/09/2013	31/08/2015	501.943	0	
22	13	78	51	FORMOSA	11	Rotonda Cruz del Norte - Rotonda Virgen del Carmen		5		01/12/2011	01/03/2014	145.768	6	
22	13	79	51	FORMOSA	11	Autovía Formosa - Clorinda		8	80,0	01/11/2013	31/10/2014	300.000	0	
22	13	80	51	NEUQUEN	22	Plottier - Arroyito		8	32,6	01/05/2013	30/04/2015	231.509	4	
22	13	81	51	CHUBUT	3	Variante Circunvalación Autovía Comodoro Rivadavia - Emp. R.N.N°26		5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	13	83	51	MENDOZA	40	Bardas Blancas - Malargüe	Variante Cuesta de Chihuido y Paso por Malargüe (km 2887,23 - Km 2951,31)	8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	
22	13	84	51	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Circunv. de Córdoba - Juarez Celman	8	11,0	01/11/2013	31/10/2015	61.000	0	
22	13	84	52	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Juarez Celman - Sinsacate	8	44,0	01/11/2013	31/10/2015	220.000	0	
22	13	84	53	CORDOBA	9	Córdoba - Villa del Totoral	Sinsacate - Villa del Totoral	8	23,0	01/11/2013	31/10/2015	184.000	0	
22	13	85	51	LA RIOJA	76	Quebrada Santo Domingo - Pircas Negras	Barrancas Blancas - Pircas Negras	8	77,0	01/08/2011	29/09/2014	548.130	6	A
22	13	86	51	LA RIOJA	75	La Padercita - Dique Los Sauces		8	6,0	01/11/2013	31/10/2016	30.000	0	
22	13	88	51	LA RIOJA	40	Villa Union - Nonogasta - (Los Tambillos - Río Miranda)	Km 520,00 - km 539,00	8	19,0	01/11/2013	30/10/2013	357.111	6	
22	13	89	51	SAN JUAN	20	Caucete - Av. de Circunv. de San Juan	Km 557,30 - km 581,92	8	24,6	01/11/2013	31/10/2014	130.000	0	
22	13	90	51	SAN JUAN	40	Av de Circunv. De San Juan - Albardon	Km 3467,61 - km 3478,94	8	11,3	01/11/2013	31/10/2014	80.000	0	
22	13	91	51	SAN JUAN	149	Barreal - Calingasta	Sorocayense - Cerro Alcazar	5	2,8				12	
22	13	94	51	NEUQUEN	40	Camino de Vinculacion R.N. N° 40 - Las Lajas		8	1,4	01/11/2013	01/08/2014	4.657	0	
22	13	95	51	JUJUY	52	Emp. R.N. N° 9 - EMP. R.P. N° 79	Purmamarca - Chalala	8	2,4	01/11/2013	02/05/2015	16.000	0	
22	13	96	51	RIO NEGRO	251	General Conesa - Acc. A San Antonio Oeste	Secc I: km 120 a km190,50	5	70,5	18/11/2011	18/05/2014	227.563	6	A
22	13	97	51	RIO NEGRO	251-3	General Conesa - S. Antonio Oeste / San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc II: km 190,50 - km204 y km 1139,25 - 1180,00	5	54,3	15/09/2011	15/03/2014	216.160	6	
22	13	98	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc III: km 1180,00 al km 1242,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	245.936	6	A
22	13	99	51	RIO NEGRO	3	San Antonio Oeste - Lte. c/Chubut	Secc IV: km 1242,00 a km 1304,00	5	62,0	26/08/2011	23/02/2014	233.275	6	A

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VI

12.997.364

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

22	14	2	51	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo I	Acc. Oeste - Acc. Barrio 20 de Junio - Pontevedra Prog. 25,55	8	25,0	10/03/2010	07/09/2015	710.339	6	A
22	14	2	52	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo II	Acc. Barrio 20 de Junio - R.P.N°58 Prog. 53,98	8	28,4	01/03/2010	28/09/2015	821.781	6	A
22	14	2	53	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo III	R.P.N°58 - R.P.N°53 Prog. 72,60	8	18,6	08/03/2010	05/09/2015	471.778	6	A
22	14	2	54	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre Tramo IV	R.P.N°53 - Autopista Bs. As. - La Plata Prog. 94,00	8	25,0	10/03/2010	07/09/2012	512.548	9	
22	14	2	55	BUENOS AIRES	varias	Camino del Buen Ayre	Tramo Existente	5		01/11/2013	31/10/2015	100.000	0	
22	14	3	51	PAIS	varias	Plan Remediación de Canteras		14		01/01/2012	31/12/2013	27.941	6	B
22	14	4	51	TUCUMAN	9	Avenida de Circunvalación - Canal San Cayetano y Av. Del Campo	Km 1288,15 - km 1300,05	8	11,9	23/02/2012	21/02/2014	118.640	6	A
22	14	5	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 72,06 - Km 118,68	5	46,5	01/11/2013	02/05/2015	70.000	0	
22	14	6	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 118,68 - Km 147,67	5	30,0	01/11/2013	02/05/2015	44.600	0	
22	14	7	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 147,67 - Km 160,62	5	14,3	01/11/2013	02/05/2015	21.300	0	
22	14	8	51	LA PAMPA	152	Emp. R.N.N°143 (El Carancho) - Emp. R.P.N°106	Km 160,62 - Km 180,87	5	20,8	01/11/2013	02/05/2015	30.900	0	
22	14	9	51	SANTA FE	9-11-33	Red de Accesos a Rosario		8	56,7	01/11/2013	31/10/2015	173.000	0	
22	14	12	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 768,77 - km 813,09 y Acc.a Pozo Borrado	5	44,3	25/02/2011	23/02/2014	197.057	6	
22	14	13	51	SANTA FE	95	Emp. R.P.N°2 - Lím. Santa Fe/Chaco	Km 813,09 - km 862,64	8	49,6	01/11/2013	31/10/2015	48.000	0	
22	14	17	51	JUJUY	52	R.N.N°52 - Emp. R.P.N°79 (Ex R.N.N°40)	Susques (km 62,68) - Santuario Tres Pozos (km 79,85)	8	17,0	01/11/2013	31/10/2014	18.830	0	
22	14	18	51	CATAMARCA	38	Lte. c/La Rioja - Río Ongoli	Km 509,45 - km 575	8	65,0	01/11/2013	31/10/2015	250.000	0	
22	14	19	51	BUENOS AIRES	7	Emp. ex R.N.N°7 - Emp. actual R.N.N°7	Km 65,03 - km 74,00	5	9,0	09/09/2011	07/09/2013	202.137	6	A
22	14	20	51	BUENOS AIRES	205	Autopista Ricchieri - Cañuelas	Acceso a Cañuelas	8		01/11/2013	02/05/2015	25.300	0	
22	14	21	51	BUENOS AIRES	1	Intercambiador Ensenada - Av. del Petróleo	Secc. I y II	8		01/09/2013	30/08/2016	684.079	2	
22	14	22	51	BUENOS AIRES	35	Bahía Blanca - Nueva Roma	Km 7,70 - km 50,00	5	42,3	01/11/2013	31/10/2014	32.681	0	
22	14	23	51	BUENOS AIRES	35	Nueva Roma - San German	Km 50,00 - km 81,07	5	31,1	01/11/2013	31/10/2014	30.748	0	
22	14	24	51	BUENOS AIRES	35	San German - Lte Bs As / La Pampa	Km 81,07 - km 125	5	43,9	02/09/2013	01/09/2014	34.149	0	
22	14	25	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección I	5	37,3	01/11/2013	02/05/2015	40.100	0	
22	14	26	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección II	5	34,0	01/11/2013	02/05/2015	41.000	0	
22	14	27	51	CORRIENTES	119	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°123	Sección III	5	38,1	15/09/2013	16/03/2015	40.000	0	
22	14	28	51	ENTRE RIOS	127	Federal - Emp. R.N. N° 14	Seccion: II - km 227,56 - km 259,27	5	31,7	01/09/2013	31/08/2015	90.000	2	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	14	29	51	ENTRE RIOS	18	Tramo I: Int. R.N.N°12 - Int. R.P.N°32	Colectoras Pavimentadas Prog. 67 , 750	8	67,8	01/09/2011	30/08/2014	660.164	6	A
22	14	30	51	ENTRE RIOS	18	Tramo II: Int. R.P.N°32 - Int. R.P.N°6	Colectoras Pavimentadas 67 + 750 - Int. R.P.N°20 (135 + 600)	8	67,9	02/10/2011	30/09/2014	819.812	6	A
22	14	31	51	ENTRE RIOS	18	Int. R.P.N ° 20 - A° Sandoval	Int. R.P.N °20 - A° Sandoval	8	30,4	27/10/2011	26/04/2014	281.012	6	A
22	14	32	51	ENTRE RIOS	18	Tramo IV: Int. R.P. N° 20 - Prog. 180 - 606	A° Sandoval - Interseccion R.N.N°14	8	61,9	24/05/2011	22/05/2014	829.503	6	A
22	14	34	51	LA RIOJA	40	Las Tucumanesas - Sañogasta	Secciones I Los Tambillos, II Bordo Atravesado y III Cuesta de Miranda	8	51,0	01/10/2013	02/03/2015	90.000	0	
22	14	35	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección I	8	21,6	01/09/2013	30/08/2016	667.487	2	
22	14	36	51	LA RIOJA	73	Anguinan - Emp. R.N.N°75	Sección II	8	18,8	01/10/2012	30/09/2015	776.543	6	
22	14	37	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	Km 1054,30 - km 1063,41	5	8,8	01/09/2013	31/08/2015	26.171	0	
22	14	38	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile (S.2)	Km 1063,41 - km 1087	5	23,8	01/11/2013	31/10/2015	44.762	0	
22	14	39	51	MENDOZA	7	Emp. R.N.N°40 - Lte. c/ Chile	Km 1139,23 - km 1149,18	11	10,0	01/11/2013	31/10/2014	14.700	0	
22	14	40	51	MENDOZA	188	Gral. Alvear - Malargüe	Sección II: Soitué -Emp. R.P.N°179	8	21,0	01/11/2013	02/05/2015	80.242	0	
22	14	41	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Uspallata	Curva de la Soberanía	8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
22	14	42	51	MENDOZA	7	Potrerrillos - Uspallata	Variante por Uspallata	8		01/11/2013	31/10/2015	80.000	0	
22	14	43	51	MENDOZA	145	Bardas Blancas - Hito Pehuenche	Acc. a Cajon Grande - Lte. c/ Chile (km 0 - km 13,6)	5	13,6	01/11/2013	02/05/2015	60.000	0	
22	14	44	51	NEUQUEN	22	Variante por Plaza Huincul y Cutral - C6	Km 1325 al km 1335	8	10,0	01/10/2013	02/03/2015	55.000	0	
22	14	45	51	NEUQUEN	VTE 22	Intersección RPN° 7 - Calle Conquistadores del Desierto		8	4,0	01/11/2013	31/10/2014	55.000	0	
22	14	47	51	SANTA CRUZ	281	Pto. Deseado - Emp. R.N.N° 3	Pto. Deseado - km 32,55	8	32,6	27/08/2010	26/05/2013	101.670	6	
22	14	48	51	SANTA FE	A012 - 34	Emp. R.N.N° 9 (O) - Emp. R.N.N°11	Km 41,93 - km 66,71 / km 1,26 - km 13,95	8	24,8	24/08/2011	22/08/2013	109.721	6	A
22	14	49	51	SANTA FE	34	San Vicente - Rafaela	Paso por Rafaela	5		01/11/2013	31/10/2014	20.000	0	
22	14	50	51	SGO DEL ESTERO	9-34	Enlace R.N.N°9 c/ R.N.N°34		8	22,0	01/10/2013	30/08/2016	15.000	0	
22	14	51	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. R.N.N°3 (San Sebastian) - Emp. Comp. C		8		01/11/2013	31/10/2016	100.000	0	
22	14	52	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. c - Emp Comp. B		8		01/11/2013	02/05/2016	80.000	0	
22	14	53	51	TIERRA DEL FUEGO	S/N°	Emp. Comp. b - Emp Comp. D		8		01/11/2013	31/10/2015	50.000	0	
22	14	54	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Tolhuin - Ushuaia	La Herradura (km 3006,2) - Ushuaia (km 3049,5)	8	43,3	01/10/2013	02/03/2015	25.000	0	
22	14	55	51	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Emp. Ex R.N.N°79 - pte. S/Rio Sali	11	2,8	01/11/2013	02/05/2015	25.000	0	
22	14	55	52	TUCUMAN	9	A° Mista - San Miguel de Tucumán	Acc. a Tucumán por Ex R.N.N°9 (Prog 0,00) -	8	4,0	01/11/2013	02/03/2015	35.000	0	
22	14	56	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	km 0,00 - km 35,00	8	35,0	01/11/2013	31/10/2015	42.000	0	
22	14	57	51	CORDOBA	158	San Francisco - Las Varillas	Km 35 - km 76	8	41,0	01/11/2013	31/10/2015	49.000	0	
22	14	58	51	TUCUMAN	A016	Emp. R.N.N°9 - Emp. R.N.N°34 (7 de abril)	Pte. s/Rio Sali - Emp. RPN°321	8	20,0	01/11/2013	31/10/2015	110.000	0	
22	14	59	51	CHACO	16	Aut. Makalle - Pte. R.S.Peña	Segunda Calzada	8	120,0	01/11/2013	30/10/2017	600.000	0	
22	14	60	51	CHACO	11	Aut. R.P.N°13 - Resistencia	Segunda Calzada	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	120.000	0	
22	14	61	51	RIO NEGRO	22	Chimpay - Villa Regina	Km 1050 - km 1112	5	62,0	01/11/2013	31/10/2015	180.000	0	
22	14	62	51	LA RIOJA	78	Pte Rio capayan - Famatina		5	12,0	01/11/2013	31/10/2015	25.000	0	
22	14	63	51	SGO DEL ESTERO	9	Autovia Sgo del Estero - Termas de Rio Hondo		8	65,0	01/11/2013	31/10/2016	300.000	0	
22	14	64	51	SANTA FE	33	Autopista Rufino - Rosario	Rufino (Km 535,29)- Acceso a San Eduardo (Km 607,92)	8	72,6	01/11/2013	30/10/2018	1.000.000	0	
22	14	64	52	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario. Secc II	Acceso a San Eduardo (km 607,92) - Acceso a Chovet (km 670,52)	8	62,6	01/11/2013	30/10/2016	259.687	0	
22	14	64	53	SANTA FE	33	Aotivia Rufino - Rosario Secc III	Acceso a Chovet (km 607,52) - Acceso a Colonia Las Flores (km 732,37)	8	61,9	01/11/2013	30/10/2016	256.575	0	
22	14	64	54	SANTA FE	33	Autovia Rufino - Rosario Secc IV	Acceso a Las Flores (km 732,37) - Arroyo Ludueña (km 781,3)	8	48,9	01/11/2013	30/10/2016	202.978	0	
22	14	65	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección I: Camino a Ing. White (km 8,65) - Ea. Don Enrique (km 41,00)	8	32,5	01/09/2013	31/08/2016	190.000	0	
22	14	66	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección II: Ea. Don Enrique (km 41,00) - Río Sauce Chico (km 73,00)	8	32,0	01/11/2013	31/10/2016	190.000	0	
22	14	67	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección III: Río Sauce Chico (km 73,00) - A° Cochenleofu Chico (km 102,21)	8	28,9	01/11/2013	31/10/2016	170.000	0	
22	14	68	51	BUENOS AIRES	33	Bahía Blanca - Pigüé	Sección IV: A° Cochenleofu Chico (km 102,21) - Emp. R.P.N°67 (km 133,65)	8	31,4	01/11/2013	31/10/2016	180.000	0	
22	14	69	51	SAN JUAN	40	Va. Aberastain - San Juan	Km 3444,89 - km 3456,72	8	12,0	01/11/2013	02/05/2015	35.000	0	
22	14	70	51	SALTA	9	Acceso a la ciudad de Salta		8		01/11/2013	31/10/2015	26.600	0	
22	14	71	51	LA PAMPA	35	Lte, Buenos Aires - Emp. R.P. N° 1 (Bernasconi)	Km 124,50 - km 146,00	5	21,5	01/11/2013	02/05/2015	27.282	0	
22	14	72	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 1B)	Distribuidor R.P.N°39 - R.P.N°192 (Parada Robles) (km 69,2 - km 78,1)	8	8,4	25/11/2011	24/12/2013	240.008	6	A
22	14	73	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 2)	R.P.N°192 (Parada Robles)-San Antonio de Areco y Vte. S.A. de Areco 78,1-114,857	8	26,2	01/09/2013	31/08/2015	313.681	2	
22	14	74	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 3)	Fin Vte. San Antonio de Areco - Inicio Vte. Arrecifes (114,857-171,20)	8	26,1	01/06/2013	31/05/2015	312.127	0	
22	14	75	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 4)	Inicio Variante Arrecifes - Acceso a Fontezuela (km 171,20 - km 212,9)	8	15,0	01/10/2013	30/09/2015	333.357	0	
22	14	76	51	BUENOS AIRES	8	Autopista Pilar - Pergamino (Tramo: 5)	Vte. Pergamino desde Acc. a Fontezuela a fin de Autopista (212,9-237,5)	8	23,7	01/05/2013	30/10/2015	472.383	4	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
22	14	77	51	CORDOBA	35	Lte. c/La Pampa - Int. R.P. N°27	Prog. km 505,67 - km 572,76	5	67,1	01/11/2013	31/10/2014	123.627	0	
22	14	78	51	CORDOBA	35	Int. R.P.N°27 - Int. R.N.N°8	Prog. 572,76 - km 708,55	5	135,8	01/11/2013	31/10/2015	272.490	0	
22	14	81	51	BUENOS AIRES	8	Ramal Pilar - Colectoras Frentistas		8		01/11/2013	31/10/2014	23.647	0	
22	14	82	51	BUENOS AIRES	A003	Ramal Tigre - 3° Carril + Banquinas		8		01/11/2013	31/10/2015	91.571	0	
22	14	83	51	LA RIOJA	40	Nonogasta - chilecito	Km 3870 - km 3875	5	2,5	01/11/2013	02/07/2014	40.000	0	
22	14	84	51	BUENOS AIRES	A001	Av. Lugones - Acceso Oeste	Km 0,00 - km 13,76	8	13,8	01/11/2013	30/10/2016	200.000	0	
22	14	86	51	CATAMARCA	38	Empalme Ruta Provincial N°9 (km 639,38) - Huacra (km 661,25)		8	21,9	01/11/2013	31/10/2014	131.280	0	
22	14	87	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Santa María	Punta Balasto - San José	8	25,0	01/11/2013	02/05/2015	250.000	0	
22	14	88	51	CATAMARCA	40	Paso externo Ciudad de Tinogasta	Km 1300,56 - km 1330,12	8	21,6	01/09/2013	31/08/2015	147.800	0	
22	14	89	51	CHUBUT	259	Trevelin - Límite con Chile	Km 39,16 - km 75,74	8	36,6	01/11/2013	31/10/2015	90.000	0	
22	14	90	51	CORRIENTES	S/N°	Def. costera Lavalle - Obra Complementaria al Pte. Goya - Reconquista		5	1,3	01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	14	91	51	ENTRE RIOS	136	Emp. R.P.N°20 - L. Int. Uruguay	Km 0,00 - km 42,42	5	42,4	01/11/2013	31/10/2014	42.000	0	
22	14	92	51	MENDOZA	40	Gran Mendoza - Acceso al Aeropuerto	Km 3296 - km 3305	17	9,0	01/10/2013	02/03/2015	20.000	0	
22	14	93	51	SANTA CRUZ	3	Cmte. Luis Piedrabuena - Emp. R.N.N°40	Km 2374,57 - km 2579,95	8	205,4	01/11/2013	02/05/2015	40.000	0	
22	14	94	51	SANTA CRUZ	40	Tapi Aike - Cancha Carrera		8		01/11/2013	31/10/2015	60.000	0	
22	14	95	51	SANTA FE	9 (Aut)	R.N.N°A012 - R.N.N°A008	Km 278,29 - km 288,47	8	10,2	01/11/2013	31/10/2015	250.000	0	
22	14	96	51	SANTA FE	34	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 1,40 - km 13,95	8	12,6	01/11/2013	31/10/2016	100.000	0	
22	14	97	51	SANTA FE	12	Capitán Bermudez - R.N.N°A012	Km 318,52 - km 326,23	8	7,7	01/10/2013	31/08/2015	90.000	0	
22	14	98	51	SANTA FE	178	Variante paso por Bigand	Km 87,27 - km 88,64	8	1,4	01/10/2013	31/08/2014	30.000	0	
22	14	99	51	SANTA FE	Aut 9	R.N.N°A008 - R.N.N°A012	Km 297 - km 314,10	8	17,1	01/11/2013	30/10/2016	50.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VII

17.716.788

Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

22	15	1	51	CHUBUT	1540	Límite con Río Negro - Emp. R.N.N°40	Lte. con Río Negro - El Maitén / Emp. R.P.N°70 - Emp. R.N.N°40	8	25,0	01/11/2013	31/10/2015	48.000	0	
22	15	2	51	BUENOS AIRES	3	Camino de Cintura (R.P.N°4) - R.P.N°21	Km 19,6000 - km 29,200	5	9,6	01/11/2013	31/10/2015	200.000	0	
22	15	3	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P. N°17 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2014	30.000	0	
22	15	4	51	BUENOS AIRES	3	Int. R.P.N°6 - Construcción de Distinto Nivel		8		01/11/2013	31/10/2015	150.000	0	
22	15	5	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Ushuaia - Tolhuin		5	99,6	01/11/2013	31/10/2016	94.601	0	
22	15	6	51	SANTA FE	178	Villa Eloisa - R.P.N°65	Km 146,47 - km 206,81	5	60,3	01/11/2013	31/10/2015	177.000	0	
22	15	7	51	ENTRE RIOS	130	Emp. R.N.N°14 - Emp. R.P.N°20	Cruce por Villa Elisa	8	7,0	01/11/2013	31/10/2015	15.000	0	
22	15	8	51	SALTA	Vte RP 54	Tonono - Misión La Paz - Sección I	Tonono - km 37 (R.P.N°54 Curva de Juan)	8	21,0	01/11/2013	31/10/2015	43.334	0	
22	15	8	52	SALTA	P54	Tonono - Misión La Paz - Sección II	Km 37 (Curva de Juan) - Misión La paz	8	107,0	01/11/2013	31/10/2015	151.200	0	
22	15	9	51	BUENOS AIRES	3	San Miguel del Monte - Las Flores	Km 105 - km 187	8	82,0	01/11/2013	31/10/2017	1.000.000	0	

Total Mejoramiento y Reposición de Rutas Fase VIII

1.909.135

Total Construcciones

92.968.545

CONTRATOS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Contratos de Recuperación y Mantenimiento I C.Re.Ma. I

26	1	25	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acc. Malaspina - Km. 1817,55	13	124,5	11/11/1997	09/07/2009	25.570	7	
26	1	32	51	CHUBUT	40S-258-259	Malla 113 - Chubut	Lte.C/ Río Negro-Emp. RN 40S-Emp. Rn 258-Emp. Rn 25 Emp. Rn N° 40s Trevelin	13	201,2	01/12/1997	28/12/2008	34.892	7	
26	1	35	51	RIO NEGRO	258-237	Malla 114 - Río Negro	Bariloche-Lte. c/Chubut-Lte. c/Neuquén- Ent. Bariloche	13	141,9	01/04/1998	26/11/2012	46.814	7	
26	1	41	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°83 - Emp. R.N.N°3	13	139,9	04/03/1998	29/12/2012	49.790	7	
26	1	46	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N° 14 y 119	13	259,2	03/10/1997	29/01/2011	50.954	7	
26	1	47	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acc. L. U3 - Emp. R.P.Ex R.N.N°3	13	258,3	05/11/1997	02/12/2009	38.681	7	
26	1	54	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acc. Zapala	13	134,7	31/10/1997	27/12/2010	36.825	7	
26	1	66	51	RIO NEGRO	3	Malla 120 - Río Negro - Buenos Aires	Emp. R.N.N°Ex 3 - Emp. R.N.N°251	13	180,2	23/02/1998	20/10/2012	58.133	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. I

341.659

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

26	2	24	51	NEUQUEN	40S	Malla 131 - Neuquen	Catan Lil - Collon Cura	13	104,5	01/12/2004	28/11/2013	64.523	6	
26	2	37	51	FORMOSA	81	Malla 338 - Formosa	Emp.RN N° 95 - Las Lomitas / Emp. RN N° 81 - Villa General Güemes	13	171,0	01/01/2005	30/12/2009	55.138	7	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
26	2	68	51	LA PAMPA	35	Malla 116 A - La Pampa - Buenos Aires	Bahia Blanca (Sal.) - Lte. C/La Pampa / Lte. C/Bs.As. - Emp. R.P.N° 1 (D)	13	138,0	01/03/2005	30/03/2010	46.060	8	
26	2	69	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B - La Pampa	Emp. R.P.N° 1 (D) - Est. Los Manantiales	13	114,0	01/11/2005	29/10/2012	53.984	7	
26	2	70	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A - La Pampa	Est. Los Manantiales - Emp. R.P.N°10	13	111,3	01/05/2005	29/08/2010	74.804	7	
26	2	78	51	TUCUMAN	60-157	Malla 408 A - Catamarca - Sgo del Estero - Tucuman	Lte.c/ Cordoba - Emp. R.N.N° 157 / Emp. R.N.N° 60 - Acceso a Frias	13	117,1	01/02/2005	01/02/2012	46.104	7	
26	2	80	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C - Catamarca	Emp.R.N.N° 157 - Emp.R.N.N° 38	13	171,9	02/05/2005	29/04/2012	56.428	7	
26	2	94	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215 - Buenos Aires	Emp. R.N.N° 5 - Est. El Recreo (EXP N 17629/2010)	13	69,2	01/03/2005	29/06/2011	45.112	7	
26	2	95	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A - Buenos Aires	Estancia El Recreo - Estancia El Mate	13	72,8	01/04/2005	30/03/2010	43.736	7	
26	2	97	51	LA PAMPA	35-188	Malla 117 B - La Pampa	Emp. R.P.N°10 - Lte. C/Cordoba / Emp.R.N.N° 35 - Acc. Quetrequen	13	158,3	01/04/2005	29/05/2013	59.442	6	A
26	2	98	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 B - Buenos Aires	Estancia El Mate - Emp. R.N.N° 7	13	71,9	01/03/2005	30/05/2011	41.217	7	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. II

586.548

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

26	3	1	51	SANTA FE	95	Malla 209 B - Santa Fe	Emp. R.P. Secundaria N°286 - Lte. con Sta Fe/Chaco	13	79,0	01/06/2013	30/05/2018	43.116	0	
26	3	3	51	ENTRE RIOS	18	Malla 513 A - Entre Rios	Emp. R.P.N°32 - Emp. R.P.N°20	13	90,3	01/01/2005	30/12/2009	43.010	7	
26	3	5	51	RIO NEGRO	22-151	Malla 103 - Rio Negro	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	163,0	15/01/2005	13/02/2010	52.117	7	
26	3	6	51	CHUBUT	259-40	Malla 113 - Chubut	Lte.c/Rio Negro - Emp. R.N.N°259	13	149,2	01/09/2013	30/08/2018	196.473	2	
26	3	7	51	SAN LUIS	146-147	Malla 301 - San Luis	Emp. R.N.N°20 - Emp.R.N.N°147 / Emp.R.N.N° 7 - Emp. R.N.N°20	13	235,8	01/02/2005	29/01/2013	54.811	6	A
26	3	8	51	SAN LUIS	188	Malla 129 - La Pampa - San Luis	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.N° 3	13	129,4	01/09/2005	29/09/2012	47.663	7	
26	3	9	51	SANTA FE	178-177	Malla 205 - Santa Fe - Buenos Aires	Pergamino - Emp. R.P.N°65 / Emp. R.P.N°21 - Alto Nivel R.N.N°9	13	173,2	01/07/2008	29/06/2013	219.965	6	A
26	3	10	51	MENDOZA	7	Malla 330 - Mendoza	Emp. R.N.N°405 - Lte. c/Chile	13	182,5	02/01/2007	30/01/2013	126.713	6	A
26	3	11	51	SAN JUAN	40N-A014-20	Malla 332 - San Juan	Lte.c/Mendoza - San Juan / Acceso Sur/Norte/Este Avda. Circ. San Juan	13	105,0	02/05/2005	29/11/2010	65.677	8	
26	3	12	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B - Santiago del Estero	Río Saladillo (Puente) - Santiago del Estero (Entrada)	13	120,9	01/01/2006	30/11/2011	59.017	7	
26	3	13	51	JUJUY	9-66-IV66	Malla 404 - Jujuy - Salta	R.Vaqueros-Lte.c/Jujuy/Lte.c/Salta-R.Yala/Emp.R.9-Emp.R.34/Emp.R.66-Emp.R.34	13	148,9	01/10/2005	29/09/2010	56.568	7	
26	3	14	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407 - Sgo del Estero - Catamarca - Tucuman	Santiago del Estero - Emp. R.N.N°38	13	151,9	01/08/2005	30/08/2011	57.458	7	
26	3	15	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acceso a Frias - Emp. R.P.N°329	13	128,0	01/04/2005	30/03/2011	47.489	7	
26	3	16	51	ENTRE RIOS	12-131	Malla 513 B - Entre Rios	Km 333,49 - Emp. R.P.N°32 / Emp. R.P.N°11 - Emp. R.N.N°12	13	99,9	01/03/2005	28/04/2013	67.544	6	
26	3	17	51	SANTA CRUZ	3-281	Malla 101 B - Santa Cruz	Prog. 1970,32 - Prog. 2026 / Puerto Deseado - Emp. R.N.N°3	13	180,1	01/06/2013	30/05/2018	81.023	0	
26	3	20	51	LA PAMPA	152-143	Malla 104 - La Pampa	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.N°35 - El Carancho	13	128,5	02/01/2006	30/12/2012	47.943	6	A
26	3	21	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A - Rio Negro	Chimpay - Allen	13	146,5	01/05/2005	29/04/2010	54.311	7	
26	3	22	51	NEUQUEN	231-237-405	Malla 109 - Neuquen -21358/2009- EN SIGO	Emp.R.N.N°405-Lte. c/Chile/A°La Teresa-Emp.R.N.N°405 / Emp.R.N.N°237-Lte.c/Río Negro	13	291,2	01/02/2005	29/01/2013	152.409	6	A
26	3	23	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207/304 - La Rioja - Cordoba	Acc. Dique Cruz del Eje-Chemical / Emp. R.P.N°31-Esperanza de Los Cerrillos	13	324,7	01/07/2005	30/07/2010	51.440	7	
26	3	24	51	SAN JUAN	20 - 141	Malla 302 - San Juan	Lte. c/San Luis - San Juan / Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.N°20	13	286,1	01/06/2005	30/06/2011	54.752	7	
26	3	25	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312 - Mendoza	Lte.c/La Pampa-Carmensa/S.Rafael-Emp.R.N.N°405/Pte.s/R.Diamante-Emp.R.N.N°14	13	223,3	01/03/2005	29/03/2013	60.596	6	A
26	3	26	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A - Sgo. del Estero	Lte. c/ Córdoba - Río Saladillo	13	96,7	01/07/2005	29/06/2011	48.125	7	
26	3	27	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	108,2	30/04/2008	28/04/2013	77.601	6	A
26	3	28	51	SANTA CRUZ	3	Malla 105 - Santa Cruz	Prog. 2026 - Gran Bajo de San Julian	13	277,4	01/06/2013	30/05/2018	35.536	0	
26	3	29	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A - Rio Negro	Emp. R.N.N°3 - km 112,78	13	112,8	01/09/2007	29/08/2013	76.368	6	A
26	3	30	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Trafal y nuevo puente s/Rio Alumine	13	123,0	01/10/2007	28/09/2014	134.349	6	A
26	3	31	51	SANTA FE	95-98	Malla 209 C - Santa Fe	Emp. R.P.N°2 - Emp. R.P.N°286 / Prog. 123 - Tostado	13	160,9	01/09/2011	29/08/2016	244.903	6	
26	3	32	51	CORDOBA	35	Malla 212 - Cordoba	Lte. c/La Pampa - Emp. R.N.N°8	13	203,3	01/09/2013	30/08/2018	198.485	2	
26	3	33	51	CORDOBA	158	Malla 230 - Cordoba	San Francisco - Villa Maria	13	208,8	01/06/2013	30/05/2018	142.704	0	
26	3	34	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo. del Estero/Salta/Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	251,9	03/04/2007	31/03/2013	192.481	6	
26	3	35	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/Catamarca - Emp. R.N.N°9 - San Miguel de Tucumán	13	145,7	01/05/2006	01/05/2013	111.459	6	A
26	3	36	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/01/2008	28/02/2013	94.229	6	A
26	3	37	51	CORRIENTES	119	Malla 532 - Corrientes	Emp. R.N.N°123	13	109,3	01/06/2013	30/05/2018	95.655	0	
26	3	38	51	CHUBUT	40-259	Malla 632 - Chubut	Emp. R.N.N°259 - La Paulina (D)	13	159,6	01/09/2007	29/09/2012	142.216	7	
26	3	39	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106 - Neuquen	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,4	28/02/2008	25/02/2013	125.270	6	
26	3	40	51	CHUBUT	3	Malla 107 A - Chubut	Acceso Malaspina - prog. 1817,55	13	117,7	01/08/2009	30/07/2014	103.097	6	
26	3	41	51	RIO NEGRO	22-250	Malla 108 B - Rio Negro	Emp. R.N.N°251-Chimpay y Pomona / km258,84 - Emp.R.N.N°22	13	192,1	30/05/2010	28/05/2015	155.153	6	A
26	3	42	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 A - Buenos Aires	Emp. R.P.N°65 - Acceso a Larramendy	13	112,8	01/06/2013	30/05/2018	118.520	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
26	3	43	51	BUENOS AIRES	226	Malla 201 B - Buenos Aires	Acceso a Larramendy - Emp. R.N.N°33	13	104,9	01/06/2013	30/05/2018	110.059	0	
26	3	44	51	BUENOS AIRES	22-229-249	Malla 206 - Buenos Aires	Emp. R.N.N°3-Pte.S/Río Colorado / A/N R.N.N°3 B°Mirasol-P.Alta / Emp.R.N.N°3-En	13	167,8	01/11/2009	30/10/2014	192.391	6	A
26	3	45	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis - Mendoza	Emp R.N.N°7 - Pte. sobre Río Diamante	13	211,2	01/08/2007	29/07/2013	70.307	6	A
26	3	46	51	SALTA	51-68	Malla 401 B - Salta	El Aybal - Campo Quijano / Talapampa - Río Ancho (Pte)	13	109,5	01/09/2009	30/08/2014	120.709	6	A
26	3	47	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/Corrientes - Campo Grande	13	125,9	01/02/2008	01/03/2013	130.171	6	A
26	3	47	52	MISIONES	14	Malla 539	Campo Grande - Emp. R.P.N°20	13	134,7	01/05/2008	30/05/2013	133.040	6	A
26	3	48	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	30/04/2008	28/04/2013	93.686	6	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. III

4.586.609

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. IV

26	4	1	51	NEUQUEN	40S	Malla 130 - Neuquen	Zapala - Catan Lil	13	133,7	01/09/2013	30/08/2018	141.165	2	
26	4	2	51	LA PAMPA	143-151-V143	Malla 132 - La Pampa	Emp. R.N.N°151 - Lte. con Mendoza / Lte. con Río Negro - Emp. R.N.N°143	13	114,1	30/05/2010	28/05/2015	263.729	6	A
26	4	4	51	MENDOZA	143	Malla 313 A	Km 550,00 - Salto de Las Rosas	13	113,0	31/03/2007	28/05/2013	61.688	6	A
26	4	5	51	MENDOZA	143-40S	Malla 313 B - Mendoza	Salto de Las Rosas - Emp. R.N.N°40S / Emp. R.P.N°88 - Emp. R.N.N°143	13	145,8	01/08/2006	29/07/2012	52.371	7	
26	4	6	51	MENDOZA	40S	Malla 334 - Mendoza	Empalme R.N.N°144 - Malargüe	13	110,3	01/09/2012	30/08/2017	78.889	6	A
26	4	7	51	ENTRE RIOS	12-18	Malla 533 - Entre Rios	Emp. R.N.N°131 - Emp. R.N.N°127 / Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°32	13	133,3	31/05/2007	28/06/2013	107.968	6	A
26	4	8	51	CORRIENTES	14	Malla 534 - Corrientes	Guaivirai - Cuay Grande	13	103,7	01/07/2007	28/06/2013	85.142	6	
26	4	9	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Malla 603 - Tierra del Fuego	Comienzo Pavimento - Fin Pavimento	13	183,8	01/10/2007	28/11/2013	109.703	6	
26	4	11	51	CORRIENTES	14-122-123	Malla 501 - Corrientes - Yapeyu	Emp. R.N.N°117- Emp.R.P.N°155- km139,00- Emp. R.N.N°14-Emp. R.N.N°14-Yapeyú	13	144,7	01/08/2006	29/07/2013	62.615	6	
26	4	12	51	ENTRE RIOS	127	Malla 506 - Entre Rios	Emp. R.N.N°12 - Emp. R.N.N°14 y 19	13	261,2	01/06/2013	30/05/2018	186.484	0	
26	4	13	51	LA RIOJA	40N	Malla 337 - La Rioja	Lte.c/San Juan - Las Tucumanesas	13	72,6	01/06/2013	30/05/2018	123.463	0	
26	4	14	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	220,3	01/12/2007	28/01/2013	127.051	6	
26	4	15	51	TUCUMAN	40N	Malla 435 - Catamarca - Tucuman	Río Las Cuevas - Límite con Salta	13	139,2	01/06/2013	30/05/2018	47.223	0	
26	4	17	51	CATAMARCA	60	Malla 440 - Catamarca	Tinogasta - Lte.c/ Chile	13	236,1	01/06/2013	30/05/2018	106.245	0	
26	4	18	51	FORMOSA	86	Malla 531 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°22 / Emp. R.N.N°95 - Fin Pavimento	13	171,0	01/11/2010	30/10/2015	148.042	6	
26	4	19	51	CORRIENTES	12	Malla 535 - Corrientes	Lte.c/Entre Rios - Acceso a Maruchas	13	113,9	01/06/2013	30/05/2018	114.700	0	
26	4	20	51	SANTA CRUZ	3	Malla 101 A - Santa Cruz	Lte. con Chubut - Prog. 1909,89 / Prog. 1913,01 - Prog. 1971,77	13	115,3	01/06/2013	30/05/2018	50.117	0	
26	4	21	51	CHUBUT	3-26	Malla 107 B - Chubut	Prog. 1818 - Lte.c/Santa Cruz / Emp. R.N.N°3 - Emp.R.P.N°20	13	135,5	01/11/2007	31/12/2012	139.136	6	
26	4	22	51	NEUQUEN	22	Malla 111 - Neuquen	Arroyito - Acceso a Zapala	13	134,7	01/01/2011	30/12/2015	93.107	6	A
26	4	23	51	BUENOS AIRES	3-A026-A025	Malla 120 - Buenos Aires - Río Negro	Emp. R.P. Ex R.N.N°3 - Lte. con Río Negro/Emp. R.N.N°3 - Puerto San Antonio Oeste	13	222,0	15/06/2012	13/06/2017	164.656	6	
26	4	25	51	BUENOS AIRES	3	Malla 208 - Buenos Aires	Acceso a Colonia Los Alamos - Lte. con Río Negro	13	153,2	01/01/2010	01/03/2015	166.092	6	A
26	4	26	51	SANTA FE	98	Malla 209 A - Santa Fe	Emp. R.N.N°11 - Prog. 123	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	70.000	0	
26	4	27	51	NEUQUEN	40S	Malla 135 - Neuquen	Lte.c/Mendoza - Las Lajas	13	278,0	01/06/2013	30/05/2018	125.100	0	
26	4	28	51	NEUQUEN	40S-242	Malla 136 - Neuquen		13	114,5	01/06/2013	30/05/2018	148.269	0	
26	4	29	51	LA RIOJA	38-74-40N	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74 / Patquia - Emp. R.N.N°40N	13	300,8	01/07/2006	28/06/2013	91.241	6	A
26	4	30	51	SALTA	40N-68	Malla 401 A - Salta	Lte. con Salta - San Carlos (Dársena) / Emp. R.N.N°40 N - Talapampa	13	146,3	01/11/2010	30/12/2015	148.707	6	A
26	4	31	51	CHACO	89	Malla 405 A - Chaco - Santiago del Estero	Emp. R.P.N°13 (Prov. del Chaco) - km 386 (Prov. de Santiago del Estero)	13	122,8	01/09/2009	30/10/2014	184.277	6	A
26	4	32	51	SALTA	34-50	Malla 406 - Salta - Jujuy	San Pedro de Jujuy - Lte. con Salta / Lte. con Jujuy - Emp. R.N.N°50	13	205,1	01/06/2008	30/07/2013	167.674	6	A
26	4	33	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502 - Entre Rios	Emp. R.N.N°127 - Lte. con Corrientes	13	146,8	30/04/2008	28/04/2013	173.218	6	A
26	4	34	51	CORRIENTES	14-120	Malla 503 - Corrientes	Cuay Grande - Lte. con Misiones/Emp. R.N.N°14 - Emp. R.N.N°12/Acceso a Yacreta	13	194,5	01/10/2011	28/09/2016	284.158	6	A
26	4	35	51	ENTRE RIOS	130	Malla 510 - Entre Rios	Emp. R.N.N°14 - Villaguay	13	82,0	01/06/2011	29/05/2016	87.147	6	A
26	4	36	51	BUENOS AIRES	228	Malla 211 - Buenos Aires	Emp. R.P.N°86 - Emp. R.N.N°3	13	139,6	01/09/2013	30/08/2018	144.500	2	
26	4	37	51	CHACO	89	Malla 536- I	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/04/2008	30/03/2013	125.395	6	
26	4	38	51	CHACO	95	Malla 537-I	Tres Isletas- Pte. Gral. Lavalle	13	120,0	01/06/2013	30/05/2018	54.000	0	
26	4	39	51	CHUBUT	25	Malla 630 - I	Las Plumas - Emp. R.N.N°40 (TEKA)	13	214,7	01/10/2012	29/09/2017	209.673	6	A
26	4	41	51	CORDOBA	60	Malla 233	Emp. R.N.N°9 - Lte. c/Catamarca	13	154,1	01/06/2013	30/05/2018	69.354	0	
26	4	42	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303 - La Rioja	Emp. R.N.N°74 - Lte. con Catamarca /La Rioja - Aminga	13	237,9	01/08/2006	30/07/2011	64.742	7	
26	4	43	51	MENDOZA	7-40	Malla 336 - I	San Martín - Lte. c/San Juan	13	122,0	01/06/2013	30/05/2018	56.174	0	
26	4	44	51	MENDOZA	142	Malla 331 - I	Gustavo Andre - Emp. R.N.N°20	13	78,0	01/06/2013	30/05/2018	70.038	0	
26	4	45	51	RIO NEGRO	40	Malla 114	Lte. c/Neuquén - Lte. c/Chubut	13	144,4	31/10/2013	29/10/2018	112.909	1	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
26	4	46	51	RIO NEGRO	251	Malla 140	Emp. R.N.º251- Pasaje a Verde- Emp. R.N.º250- Emp. R.N.º 3	13	119,3	24/09/2010	22/09/2015	180.697	6	
26	4	48	51	CHUBUT	40	Malla 634	La Paulina (D)- Emp. R.P.º20	13	79,0	01/11/2013	30/10/2018	224.779	0	
26	4	51	51	LA PAMPA	154	Malla 115	Emp. R.N.º35 - Emp. R.N.º22	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	61.542	0	
26	4	52	51	LA RIOJA	79-141	Malla 311	Lte. c/San Luis - Emp. R.P.º31; Emp. R.N.º79 - Lte. c/San Juan	13	282,5	31/12/2007	28/01/2013	63.161	6	
26	4	53	51	LA RIOJA	40-60-75	Malla 403	Emp. R.N.º60 - Río Agua Clara ; Aimagasta (S) - Acc. a Tinogasta	13	242,2	01/11/2011	29/10/2016	244.883	6	A
26	4	54	51	LA RIOJA	76-150	Malla 308	Emp. R.N.º150 - Vinchina ; Patquia - Portezuelo	13	218,9	01/12/2011	28/01/2017	290.150	6	
26	4	56	51	ENTRE RIOS	RP6 RP39	Malla 513 C - Entre Rios	R.P.º6 Aº Altamirano - Gral. Galarza/R.P.º39 Nogoya - Emp. R.P.º6	13	86,0	01/07/2006	28/06/2013	52.833	6	A
26	4	60	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.º50 - Lte. c/Bolivia	13	56,8	30/11/2007	28/06/2013	159.400	6	A
26	4	61	51	SAN LUIS	20-79	Malla 307	Acc. Quines - Lte. c/San Juan / Acc. Quines - Lte. c/La Rioja	13	187,8	31/10/2008	29/10/2013	90.328	6	A
26	4	66	51	MENDOZA	188	Malla 314	Emp. R.P.º3 - Acc. a Colonia Alvear	13	161,5	01/05/2011	28/04/2016	90.447	6	A
26	4	69	51	SAN JUAN	40	Malla 306 - Chimbab - San Roque	Km 3429,78 - km 3568,79	13	141,5	01/06/2013	30/05/2018	40.000	0	
26	4	70	51	SAN JUAN	40-150	Malla 339: Huaco - Lte.c/La Rioja/Emp.RN N°40 -Arrequeintin	Km 3608,95 - 3671,26 - km 223,15 - 333,16	13	172,3	01/06/2013	30/05/2018	40.000	0	
26	4	71	51	CHUBUT	26-40	Malla 635	Emp. Ex R.P.º20 - Emp. R.N.º40 / Río Mayo - Acceso a Facundo	13	175,3	01/06/2013	30/05/2018	153.316	0	
26	4	72	51	LA PAMPA	151	Malla 137	Lte. c/Río Negro - Emp. R.P.º14	13	119,8	01/06/2013	30/05/2018	189.900	0	
26	4	73	51	BUENOS AIRES	3	Malla 234	Acceso Ascasubi - Emp. Ex R.N.º3	13	124,7	30/11/2007	27/12/2012	126.865	6	
26	4	74	51	CHACO	95	Malla 508	Km 941,20 - km 1078,00	13	130,4	01/12/2011	28/11/2016	139.464	6	A
26	4	76	51	RIO NEGRO	251-3	Malla 139	Emp. R.N.º250 - Emp. R.N.º3 / Emp. R.N.º251	13	253,7	01/06/2013	30/05/2018	120.000	0	
26	4	77	51	TUCUMAN	157	Malla 409 A	Emp. R.P.º329 (Monteagudo) - Tucumán	13	75,3	01/06/2013	30/05/2018	112.953	0	
26	4	78	51	SANTA FE	9-11-33-34-A012	Malla 202 B - Santa Fe	Tramos Varios	13	95,7	01/10/2011	28/09/2016	238.041	6	A
26	4	79	51	SANTA FE	A007 - 168	Malla 232 - Santa Fe	A. de Circunvalación / Pte. Oroño -Túnel Subfluvial	13	35,8	01/06/2013	30/05/2018	101.631	0	
26	4	80	51	CORDOBA	AU009	Malla 235	Carcaraña - Pilar	13	312,0	01/06/2013	30/05/2018	200.000	0	
26	4	81	51	FORMOSA	81	Malla 540	Las Lomitas - Lte. con Salta	13	212,5	01/06/2013	30/05/2018	95.634	0	
26	4	82	51	SALTA	81	Malla 439	Lte. con Formosa - Emp. R.N.º34	13	186,6	01/06/2013	30/05/2018	82.152	0	
26	4	83	51	CHACO	95	Malla 541	Km 1078,00 - km 1167,20 - Emp. R.P.º9	11	88,9	01/09/2013	30/08/2018	111.637	2	
26	4	84	51	TUCUMAN	157	Malla 408 D - Tucuman - Sgo del Estero	Acc. a Frias Prog. 1046,12 - Emp. R.P.º329 (Monteagudo)	13	242,2	01/06/2013	30/05/2018	115.164	0	
26	4	85	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 A	Lte. c/Córdoba - Pte. s/Río Saladillo	13	96,7	01/11/2013	31/10/2018	50.911	0	
26	4	86	51	SGO DEL ESTERO	9	Malla 402 B	Pte. s/Río Saladillo - Santiago del Estero	13	127,7	01/09/2013	30/08/2018	61.401	2	
26	4	87	51	SGO DEL ESTERO	64	Malla 407	Santiago del Estero - Emp. R.N.º38	13	151,9	01/06/2013	30/05/2018	95.885	0	
26	4	88	51	SAN JUAN	20-141	Malla 302	Lte. c/San Luis - San Juan/ Lte. c/La Rioja - Emp. R.N.º20	13	167,0	01/06/2013	30/05/2018	134.708	0	
26	4	90	51	SAN LUIS	188	Malla 129	Acceso a Quetrequen - Emp. R.P.º3	13	129,4	01/06/2013	30/05/2018	62.509	0	
26	4	91	51	SAN LUIS	146 - 147	Malla 301	Emp. R.N.º20 - Emp. R.N.º147 / Emp. R.N.º7 - Emp. R.N.º20	13	235,8	01/11/2013	30/10/2018	173.424	0	
26	4	92	51	RIO NEGRO	22 - 151	Malla 103	Allen - Acc. a Cipolletti / Acc. a Cipolletti - Lte. c/La Pampa	13	236,1	01/10/2013	29/09/2018	196.422	1	
26	4	93	51	RIO NEGRO	22	Malla 108 A	Chimpay - Allen	13	146,9	01/06/2013	30/05/2018	132.246	0	
26	4	94	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 B	Km 112,78 - km 258,01	13	145,2	01/06/2013	30/05/2018	130.707	0	
26	4	95	51	NEUQUEN	40-231	Malla 109	Lte. con Río Negro - Pte. s/Río Limay Chico / Emp. R.N.º40 - Aduana	13	160,0	01/06/2013	30/05/2018	104.409	0	
26	4	96	51	NEUQUEN	237-40	Malla 131	Aº La Teresa - Collon Chural / Pte. s/Aº Limay Chico - Rinconada	13	188,5	01/06/2013	30/05/2018	169.659	0	
26	4	97	51	LA RIOJA	38-79	Malla 207 / 304	Acc. Cruz del Eje - Chamarica / Emp. R.P.º31 - Esperanza de los Cerillos	13	334,0	01/06/2013	30/05/2018	300.600	0	
26	4	98	51	LA PAMPA	143-152	Malla 104	El Carancho - Chacharramendi / Emp. R.N.º35 - El Carancho	13	128,5	01/06/2013	30/05/2018	97.900	0	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV (C.Re.Ma. IV)

9.851.920

Contratos de Recuperación y Mantenimiento C.Re.Ma. V

26	5	1	51	SAN JUAN	141	Malla 340	Límite c/La Rioja - Emp. R.N.º20	13	121,7	01/06/2013	30/05/2018	105.599	0	
26	5	2	51	LA PAMPA	35	Malla 116 B	Emp. R.P.º1(D) (Prog. 146,00)/ Est. Los Manantiales (Prog. 260,00)	13	124,4	01/11/2013	30/10/2018	119.587	0	
26	5	3	51	LA PAMPA	35	Malla 117 A	Est. Los Manantiales (Prog. 260,00) / Emp. R.P.º10 (Prog. 370,90)	13	134,5	01/06/2013	30/05/2018	100.699	0	
26	5	4	51	JUJUY	9-66-1v66	Malla 404	Río Vaqueros (Pte.)-Río Yala (Pte.)/Emp. R.N.º9 - Emp. R.N.º34/Emp. R.N.º66 - Fr	13	148,9	01/06/2013	30/05/2018	109.400	0	
26	5	5	51	FORMOSA	86-95	Malla 338	Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Salazar/Fortín Lavalle - Villa Gral Güemes	13	241,0	01/06/2013	30/05/2018	246.891	0	
26	5	6	51	FORMOSA	81	Malla 542	Pozo del Mortero - Límite con Salta	13	160,1	01/09/2013	30/05/2018	144.126	2	
26	5	7	51	ENTRE RIOS	12-136	Malla 509	Emp. R.N.º14 (Ceibas) - Galarza	13	120,9	01/06/2013	30/05/2018	119.061	0	
26	5	8	51	ENTRE RIOS	12/131	Malla 513 B	Km 333,49 - Emp. R.P.º32/Emp. R.P.º11 - Emp. R.N.º12	13	99,9	01/06/2013	30/05/2018	279.317	0	
26	5	9	51	CHUBUT	25	Malla 102 A	Pte. s/Río Chubut (Rawson) - Pte. s/Río Chubut (Las Plumas)	13	137,0	01/06/2013	30/05/2018	123.000	0	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
26	5	10	51	CHUBUT	3	Malla 102 B	A/N Emp. R.N.N°25 (Trelew) - Acc. a Malaspina	13	230,4	01/06/2013	30/05/2018	207.000	0	
26	5	11	51	CATAMARCA	60-157	Malla 408 A	Lte. c/La Rioja - km 576,37 / Emp. R.N.N°38 - Aimagasta	13	114,4	01/06/2013	30/05/2018	114.557	0	
26	5	12	51	CATAMARCA	38-60	Malla 408 B	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	166,7	01/10/2013	29/09/2018	114.510	1	
26	5	13	51	CATAMARCA	60	Malla 408 C	Emp. R.N.N°157 - Emp. R.N.N°38	13	173,5	01/06/2013	30/05/2018	164.137	0	
26	5	14	51	BUENOS AIRES	33	Malla 215	Emp. R.N.N°5 (Prog. 321,00) - Est. El Recreo (Prog. 390,00)	13	69,2	01/06/2013	30/05/2018	62.298	0	
26	5	15	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 A	Est. El Recreo (Prog. 390,00) - Est. El Mate (Prog. 462,71)	13	72,8	01/06/2013	30/05/2018	65.475	0	
26	5	16	51	BUENOS AIRES	33	Malla 216 - B	Est. El Mate (Prog. 462,71) - Emp. R.N.N°7 (Prog. 534,61)	13	71,9	01/06/2013	30/05/2018	64.710	0	
26	5	18	51	MENDOZA	143-144-146	Malla 312	Lte. con La Pampa - Carmensa/San Rafael - Emp. R.N.N°40/Pte. s/Río Diamante Emp.	13	219,3	01/06/2013	30/05/2018	80.182	0	
26	5	19	51	LA PAMPA	35 - 188	Malla 117 B	Emp. R.P.N°10 - Lte. con Córdoba/Emp. R.N.N°35 - Acceso a Quetrequen	13	125,3	01/06/2013	30/05/2018	95.300	0	
26	5	22	51	LA RIOJA	79	Malla 341	Emp. R.P.N°31 - Esperanza de Los Cerrillos	13	167,5	01/06/2013	30/05/2018	111.374	0	
26	5	23	51	SANTA CRUZ	3-28	Malla 601	G.B. San Julián - km 2443,98/Pto. Pta. Quilla - Emp. R.N.N°3	13	181,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	0	
26	5	24	51	SANTA CRUZ	3-40	Malla 602	Km 2443,98 - Emp. R.N.N°40S/Punta Loyola - Fin Sup R.N.N°3	13	123,4	01/06/2013	30/05/2018	86.165	0	
26	5	25	51	CORRIENTES	12	Malla 543	Lte. con Entre Ríos - Emp. R.P.N°25	13	141,0	01/06/2013	30/05/2018	100.000	0	
26	5	26	51	LA RIOJA	38-75	Malla 303	Emp. R.N.N°74 - Lte. Catamarca/La Rioja - Emp. R.N.N°38	13	237,9	01/06/2013	30/05/2018	100.000	0	
26	5	27	51	CATAMARCA	38	Malla 441 - Catamarca	El Portezuelo - Lte. con Tucumán	13	66,1	01/06/2013	30/05/2018	39.630	0	
26	5	28	51	CHACO	89	Malla 536 - Chaco	Emp. R.N.N°16 - Emp. R.P.N°13	13	88,4	01/06/2013	30/05/2018	53.034	0	
26	5	29	51	CHUBUT	259-40	Malla 632	Emp. R.N.N°40 - Pque. Industrial Trevelin/La Paulina - Emp. R.N.N°259	13	165,6	01/06/2013	30/05/2018	95.772	0	
26	5	30	51	CHUBUT	3 - 26	Malla 107 B	Emp. R.P.N°39 - Lte. c/ Santa Cruz y Emp. R.N.N°3 - Emp. R.P.N°20	13	136,0	01/11/2013	30/10/2018	95.000	0	
26	5	31	51	CORDOBA	1 V 09	Malla 236	Leones - Pilar	13	196,5	01/06/2013	30/05/2018	117.906	0	
26	5	32	51	CORRIENTES	14 - 122 - 123	Malla 501	Emp.R.N.N°117-Emp.R.P.N°155/Emp.R.N.N°14-Yapeyú/km139,00-Emp. R.N.N°14	13	144,4	01/06/2013	30/05/2018	86.598	0	
26	5	33	51	CORRIENTES	14	Malla 534	Guaviravi - Cuay Grande	13	102,3	01/06/2013	30/05/2018	60.954	0	
26	5	34	51	CORRIENTES	123	Malla 507 - Corrientes	Emp. R.N.N°14 - km 139	13	125,0	01/06/2013	30/05/2018	64.908	0	
26	5	35	51	ENTRE RIOS	12	Malla 502	Emp. R.N.N°127 - Lte. c/ Corrientes	13	146,7	01/06/2013	30/05/2018	88.014	0	
26	5	36	51	ENTRE RIOS	12	Malla 513 C	Gral Galarza - Nogoya	13	84,2	01/06/2013	30/05/2018	50.400	0	
26	5	37	51	ENTRE RIOS	12	Malla 533	Emp. R.N.N°131- Acceso a San Benito/ A ³ Las Tunas - Emp. R.N.N°127	13	80,9	01/06/2013	30/05/2018	52.650	0	
26	5	38	51	FORMOSA	81	Malla 505 - Formosa	Emp. R.N.N°11 - Emp. R.N.N°95	13	181,4	01/06/2013	30/05/2018	108.846	0	
26	5	39	51	JUJUY	9	Malla 432 - Jujuy	Emp. R.N.N°52 - La Quiaca	13	219,4	01/06/2013	30/05/2018	142.800	0	
26	5	40	51	LA RIOJA	38-74-40	Malla 309	Chemical - Emp. R.N.N°74/Patquia - Emp. R.N.N°40/Emp. R.N.N°74 - Emp. R.P.N°12	13	219,9	01/06/2013	30/05/2018	120.000	0	
26	5	41	51	LA RIOJA	79-141-77	Malla 311	Lte. c/San Luis - km 138,42 / Emp. R.N.N°79 - Lte. c/San Juan / Emp. R.N.N°79 - Emp. R.N.N°79	13	282,5	01/06/2013	30/05/2018	120.000	0	
26	5	42	51	MENDOZA	7	Malla 330	Emp. R.N.N°40 - Lte. con Chile	13	182,3	01/11/2013	30/10/2018	109.230	0	
26	5	43	51	MENDOZA	143-40	Malla 313 B	San Rafael (Sal.) - Emp. R.N.N°40/ Emp. R.N.N°143 - Tunuyán (Sal.)	13	145,8	01/06/2013	30/05/2018	87.474	0	
26	5	44	51	MENDOZA	143	Malla 313 A - Mendoza	Km 550,00 - Salta de las Rosas	13	113,1	01/06/2013	30/05/2018	67.866	0	
26	5	45	51	MISIONES	14	Malla 504 - Misiones	Lte. c/ Corrientes - Campo Grande	13	126,0	01/06/2013	30/05/2018	75.582	0	
26	5	46	51	NEUQUEN	234	Malla 133	Emp. R.N.N°40 - Pichi Traful	13	123,7	01/06/2013	30/05/2018	74.244	0	
26	5	47	51	NEUQUEN	22-237	Malla 106	Plottier - Arroyito / Arroyito - A° La Teresa	13	195,0	01/06/2013	30/05/2018	117.000	0	
26	5	48	51	RIO NEGRO	250	Malla 123 A	Emp. R.N.N°3 - Emp R.N.N°251	13	112,9	01/06/2013	30/05/2018	67.848	0	
26	5	49	51	SALTA	34	Malla 434	Emp. R.N.N°50 - Lte. con Bolivia	13	159,3	01/11/2013	30/10/2018	95.574	0	
26	5	50	51	SAN LUIS	146	Malla 305 - San Luis / Mendoza	Emp. R.N.N°7 - Pte. s/ Río Diamante	13	211,3	01/11/2013	30/10/2018	126.450	0	
26	5	51	51	SGO DEL ESTERO	34	Malla 431 - Sgo del Estero / Salta / Tucuman	La Banda - Rosario de la Frontera	13	249,0	01/06/2013	30/05/2018	115.000	0	
26	5	52	51	TIERRA DEL FUEGO	3	Comienzo Pavimento (San Sebastian) - Fin Pavimento (Tolhuin)		13	179,0	01/11/2013	30/10/2018	161.344	0	
26	5	53	51	TUCUMAN	38	Malla 437	Lte. c/ Catamarca - A/N R.N.N°9 (San Miguel Tucumán)	13	145,6	01/06/2013	30/05/2018	87.408	0	
26	5	54	51	CORRIENTES	118	Malla 512	Emp. R.N.N°12 (Sur) - Emp. R.N.N°12 (Norte)	13	193,0	01/06/2013	30/05/2018	120.000	0	

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento V (C.Re.Ma. V)

5.414.920

Total Contratos de Recuperación y Mantenimiento

20.781.656

Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)

27	0	1	51	FORMOSA	11 - A011	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Resistencia - Limite con Paraguay	5	286,3	01/09/2013	31/08/2019	800.000	0	
27	0	2	51	BUENOS AIRES	33	Contrato OMG (Obra; Mantenimiento; Gestión)	Bahía Blanca - Emp. R.N.N°5	5	312,4	01/09/2013	31/08/2019	800.000	0	

Total Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión (COMAGE)

1.600.000

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
Infraestructura en Concesiones Viales														
37	0	4	51	BUENOS AIRES	226	Autovía Mar del Plata - Balarce 2º tramo	Km 31,7 - km 64,686	20	33,0	01/02/2009	30/03/2013	219.929	6	
37	0	5	51	BUENOS AIRES	205	Travesía Urbana km 65.800 - km 67.300 Cañuelas		21	1,5	01/10/2006	31/03/2008	4.727	7	
37	0	6	52	BUENOS AIRES	188	Adecuación Urbana km 155,866 - 160,146 - Junin		21	1,0	01/08/2007	29/11/2009	5.821	7	
37	0	8	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección I: km 67.479 - km 73.495	20	6,0	01/10/2007	01/06/2013	49.579	6	A
37	0	8	52	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes	Sección III: km 85.78 - km 96.65	20	10,9	01/07/2006	30/07/2011	119.332	7	
37	0	9	51	BUENOS AIRES	9	Campana - Zárate	3er. Carril km 72,60 - km 85,20	20	12,6	01/06/2006	31/03/2011	202.358	7	
37	0	10	52	SANTA FE	11	Travesía Urbana km 787,23 - Reconquista		21	1,0	01/04/2007	29/09/2009	13.585	7	
37	0	12	51	CORDOBA	A005	Circunvalación de la Ciudad de Río Cuarto	Km 0,00 - km 11,32	20	11,3	01/06/2008	01/03/2010	45.752	7	
37	0	13	52	SANTA FE	34	Mejora Acceso a Ceres y Construcción de Colectoras	km 386,300 - km 390,400	21	1,0	01/12/2007	29/11/2009	8.605	7	
37	0	14	61	BUENOS AIRES	3	Canal de Desagües Pluviales km 555,90	Localidad de Aparicio Coronel Dorrego	21	1,0	01/11/2012	02/05/2013	420	11	
37	0	14	79	CORDOBA	38	La Cumbre; San Esteban; Los Cocos; San Marcos Sierra	Construcción de Pasarela Peatonal km 59,56 Villa Giardino	21	1,0	18/04/2011	17/03/2013	18.517	6	A
37	0	17	55	BUENOS AIRES	5	Pasarela peatonal km 74,18 Jauregui		21	1,0	11/10/2005	10/01/2006	346	7	
37	0	21	51	BUENOS AIRES	8	Pasarela Peatonal km 78 - Exaltacion de la Cruz		21	1,0	01/12/2004	02/03/2005	264	7	
37	0	24	51	SALTA	9	Constr. Multitrocha km1547-1555 Cabeza de Buey		20	8,0	01/02/2009	01/01/2010	39.640	7	
37	0	29	51	CORRIENTES	12	km 1.017,85 - km 1.030,00 - Riachuelo		21	12,2	08/10/2007	06/10/2008	8.031	7	
37	0	30	53	BUENOS AIRES	7	Acc.Carmen de Areco km 139,29 - S. A. de Giles	Km 101,81 - km 103,25	22	1,0	01/04/2007	29/01/2009	6.081	7	
37	0	30	54	SANTA FE	11	Intersecc.c/ Calle Sargento Cabral - San Lorenzo		22	1,0	01/07/2008	30/11/2009	3.448	7	
37	0	30	61	BUENOS AIRES	3	Acceso por Av. Piazza km 298 Azul		22	1,0	01/05/2008	01/06/2013	6.159	14	C
37	0	35	51	MISIONES	12	Construcción Tercera Trocha	Km 1370.038 - km 1594.400	20	100,0	01/02/2006	31/12/2010	154.036	7	
37	0	37	51	LA PAMPA	5	Acceso a Santa Rosa	km 605.03 - km 606.65	21	1,6	01/05/2006	29/12/2008	6.579	7	
37	0	38	51	MENDOZA	7	Doble vía Santa Rosa - Gral. San Martín	Km 965.51-km 998.80	20	33,3	01/12/2005	01/05/2008	129.820	7	
37	0	39	51	BUENOS AIRES	5	Autopista Luján - Mercedes Etapa I	Sección II Jáuregui km 72,420 - Peaje Olivera km 85, 680	20	13,3	01/08/2005	01/05/2007	29.924	7	
37	0	67	51	TUCUMAN	9	Las Talitas Pav.Calle Colectora, Ilum.y constr. Pasarelas Peatonales		21	1,0	01/09/2006	31/03/2008	4.126	7	
37	0	69	51	SANTA FE	188	Intersec. Canaliz.bConstrucción bicensenda Florentino Ameghino		21	1,0	10/07/2007	07/02/2008	4.517	7	
37	0	69	53	SANTA FE	8	Travesías Urbanas Venado Tuerto R.N.Nº8	Kkm 365,4 - km 369 Murphy R.N.Nº33 km 710,84	21	1,0	01/05/2007	29/01/2008	2.142	7	
37	0	71	52	BUENOS AIRES	A002	Autopista Ezeiza Cañuelas - Variante Cañuelas		20	9,5				12	
37	0	72	51	INTERPROVINCIAL	22	Vte. R.N.Nº22 y Vincul. al 3º Puente: Secc. R.N.Nº151 - R.P.Nº7		20	5,8	01/03/2009	29/06/2013	102.190	6	A
37	0	74	51	BUENOS AIRES	226	Aut. y Rot. en int. con C. Rivadavia - R.P.Nº76 - C. Pellegrini - Olavarría		20	6,0	15/12/2008	13/02/2011	65.319	7	
37	0	76	51	INTERPROVINCIAL	9	Constr. Protec.con Erosión Hídrica y Saneamiento	Km 1429.75 - km 1446.50 / km 1146.30 - km 1153.55	21	1,0	01/05/2013	30/10/2013	2.579	4	
37	0	78	51	ENTRE RIOS		Acc.Sur a Gualaguaychú - Calz.Adic., Rehab.Calz.Existe Ilum.		21	7,3	01/11/2007	30/11/2008	25.241	7	
37	0	80	51	BUENOS AIRES	188	Intersección (km 360.785) con R.N.Nº33. General Villegas		21	1,0	01/05/2013	29/01/2014	5.176	4	
37	0	81	52	BUENOS AIRES		Acc.a Bragado por Av.Elizondo y al Pque.Ind.-Colect	Km 208.85 y km 210.48	21	1,0	01/10/2007	30/12/2010	7.622	7	
37	0	85	51	ENTRE RIOS		Autopista Mesopotámica - Ceibas-Gualaguaychú		22	120,0	01/03/2007	29/12/2009	155.024	7	
37	0	86	51	BUENOS AIRES	5	Const.rot. km 159,33 - Rep.calz. bicacc.al Pque.Ind.- peatonal - Chivilcoy	Const. Rotonda km 159,33 - Rep. Calzada Bicensenda acceso al Parque Industrial-Pasarela	21	1,0	22/10/2008	22/08/2009	5.042	7	
37	0	87	51	BUENOS AIRES	S/Nº	Autopista Ribereña - Ciudad de Buenos Aires		20	6,0	01/09/2013	01/04/2014	60.000	0	
37	0	89	51	CORDOBA	36	Variante Perilago Almafuerte		20	10,2	24/11/2009	31/12/2012	77.810	14	
37	0	96	51	RIO NEGRO	22	Pav.urb.y Repav. km1212,40 km1215,83-Cipolletti		21	3,4	01/03/2009	29/09/2010	12.415	7	
37	0	97	51	CORDOBA	38	Rot.km 120,20 Acc.a Cruz del Eje-Pas.Peat.km 92,78 Charbonier		21	1,0	10/11/2010	01/08/2013	15.064	14	
37	0	98	51	BUENOS AIRES	205	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	Inters.Rotac.y Acc.a Roque Pérez, km 132,700 - km 134,700.	21	1,0	01/02/2009	02/12/2009	10.836	7	

Total Infraestructura en Concesiones Viales

1.628.056

Infraestructura en Areas Urbanas

38	0	5	51	BUENOS AIRES	36	R.P.Nº36 e/ Rtda. Gutierrez y R.P.Nº2 F. Varela - Berazategui	Vinculación y Remodelación R.P.Nº36 e/ Rtda Gutiérrez y R.P.Nº2 F Varela - Berazategui	20	6,5	03/07/2006	01/03/2013	170.988	6	C
38	0	9	51	ENTRE RIOS	14	Mejora en Acceso Sur R.N.Nº14 km 252,60 Concordia		22	1,0	01/11/2007	30/11/2008	18.811	7	
38	0	14	51	BUENOS AIRES	25	R.P.Nº25 Tramo: Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	Rehab. y Mejora Tramo Ramal Pilar del Acceso Norte - Acceso Oeste	20	20,9	29/10/2007	28/07/2009	48.145	7	
38	0	15	51	SANTA FE	8	Obra de Vinculación Acceso a Wheelwright R.P.Nº9 R.N.Nº8 km 294.82		21	1,0	01/08/2007	30/08/2009	7.500	7	
38	0	16	51	ENTRE RIOS	14	R.N.Nº14 Puerto Yerúa - R.N.Nº14 Km 242,36	Acceso a Puerto Yerúa desde R.N.Nº14 Tramo: Puerto Yerúa - R.N.Nº14 km 242,36	21	1,0	01/08/2008	30/09/2009	51.026	7	
38	0	17	51	BUENOS AIRES	S/N	R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	Autovía 201 entre R.P.Nº4 y Calle Gral. Hornos. Partido de 3 de Febrero	20	1,0	01/09/2013	31/08/2015	82.719	2	
38	0	20	51	BUENOS AIRES	S/N	Autovía R.P.Nº215 tramo R.P.Nº29 Brandsen-R.P.Nº6 La Plata-Bransen		20	9,5	04/11/2010	04/04/2013	73.506	6	A

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
38	0	25	51	BUENOS AIRES	S/N	Colectora descendente Ramal Campana - Calle Eiffé	y Calle Eiffel Tramo: Calle Otto Krause - Calle Constituyentes. Partido de Malvinas Argent	22	1,0	06/05/2008	03/02/2009	9.418	7	
38	0	25	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel	Colectora Ascendente Ramal Pilar - Calle Eiffel. Partido de Malvinas Argentinas.	21	1,0	03/01/2011	01/03/2013	14.539	6	
38	0	26	51	BUENOS AIRES	205	Construcción Doble Calzada R.N.N°205 Ezeiza	Acceso a la Ciudad de Ezeiza Construcción Doble Calzada R.N.N°205 Ezeiza	21	1,1	01/11/2008	31/12/2009	8.044	7	
38	0	27	51	BUENOS AIRES	20	R.P.N°11 (Magdalena) - R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	R.P.N°20 Tramo I: R.P.N°11 (Magdalena)- R.P.N°36 (Vieytes) Magdalena	21	23,0	01/08/2009	29/11/2012	80.755	7	
38	0	28	51	BUENOS AIRES	S/N	Obras de Seguridad en Berazategui, Florencio Varela y La Plata		21	1,0	01/01/2009	01/09/2011	16.247	7	
38	0	28	52	BUENOS AIRES	S/N	Colectora Adicional hasta la Localidad de El Peligro	(Berazategui - La Plata)	21	1,0	01/09/2013	31/08/2014	10.800	2	
38	0	29	51	BUENOS AIRES	S/N	Distribuidor Las Flores. Autopista Buenos Aires - La Plata, km 14	Ramas de Ingreso Ascendente y Egreso Descendente. Partido de Avellaneda	20	2,3	15/01/2010	14/04/2013	91.902	6	A
38	0	31	52	BUENOS AIRES	9	Acceso a Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103	Central Nuclear "Atucha II" R.N.N°9 km 103 - Partido de Zárate.	20	11,0	01/02/2010	01/04/2013	119.712	6	A

Total Infraestructura en Areas Urbanas

804.112

Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales

39	0	2	51	BUENOS AIRES	9	OM N°214 Corredor Vial N°3 - Rio Tala / Acceso a Ramallo	Km 157,00 / km 206.00	5	79,0	01/11/2006	31/08/2010	84.880	7	
39	0	5	54	SANTA FE	34	OM N°218	R.N.N°34 km 66-86	5	20,0	01/07/2007	29/10/2010	54.098	7	
39	0	8	54	SANTA FE	11	Obra 223 a C.V. 3 RN. 11	Arosena - Santo Tomé	20	1,0	01/09/2013	31/08/2014	45.469	2	

Total Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales (*)**

184.447

Obras en Corredores Viales

Corredor I

40	1	1	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Seguridad en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	21		18/04/2011	17/05/2015	505.815	6	A
40	1	1	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Seguridad en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	21		19/04/2011	31/07/2014	32.469	6	A
40	1	1	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Seguridad en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	21		01/03/2013	30/04/2014	18.384	0	
40	1	1	54	BUENOS AIRES	varias	ONU C.1-18 Obras de Seguridad en Corredor Vial I	Global	14	1.284,0	01/03/2013	30/10/2013	7.655	4	
40	1	2	51	BUENOS AIRES	3	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°3 (Corredor Vial I)	Global	22	755,2	08/02/2011	08/04/2015	681.827	6	
40	1	2	52	BUENOS AIRES	205	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°205 (Corredor Vial I)	Global	22	244,3	08/02/2011	06/02/2016	507.873	6	A
40	1	2	53	BUENOS AIRES	226	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°226 (Corredor Vial I)	Global	22	524,0	01/12/2011	29/11/2015	288.740	6	

Total Corredor I

2.042.763

Corredor II

40	2	1	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Seguridad en R.N.N°5 (Corredor Vial II)	Global	14	5,0	15/03/2011	13/03/2014	21.074	6	A
40	2	1	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Seguridad en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	21	15,4	09/05/2011	28/02/2014	83.415	6	A
40	2	1	53	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial II	Global	22	330,1	09/05/2011	23/08/2012	7.720	7	
40	2	2	51	INTERPROVINCIAL	5	Obras de Refuerzo de Infraestructura (Corredor Vial II)	Global	22	236,0	15/03/2011	13/06/2013	350.924	6	A
40	2	2	52	INTERPROVINCIAL	188	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°188 (Corredor Vial II)	Global	22	365,0	15/03/2011	09/04/2015	448.036	6	A

Total Corredor II

911.169

Corredor III

40	3	1	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Seguridad en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	18,0	27/05/2011	25/05/2014	178.439	6	A
40	3	1	52	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial III	Global	17	1,0	01/08/2011	28/02/2013	18.905	6	A
40	3	2	51	INTERPROVINCIAL	7	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°7 (Corredor Vial III)	Global	22	227,9	10/01/2011	09/08/2014	1.127.237	6	A

Total Corredor III

1.324.581

Corredor IV

40	4	1	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Seguridad en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	14	5,5	01/03/2013	30/04/2014	54.537	0	
40	4	1	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Seguridad en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	17	107,0	01/09/2013	31/10/2014	279.138	0	
40	4	1	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	21	195,3	01/04/2011	30/06/2015	939.601	6	
40	4	1	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Seguridad en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	17	2,5	01/09/2013	31/10/2014	101.895	0	
40	4	1	55	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial IV	Global	21	0,0	01/09/2013	02/03/2014	16.890	4	
40	4	2	51	ENTRE RIOS	18	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°18 (Corredor Vial IV)	Global	22	135,8	01/02/2011	01/04/2015	124.887	6	A
40	4	2	52	INTERPROVINCIAL	19	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°19 (Corredor Vial IV)	Global	22	213,1	01/02/2011	30/04/2014	296.582	6	
40	4	2	53	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial IV)	Global	22	610,1	08/11/2010	07/06/2014	397.442	6	

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
40	4	2	54	INTERPROVINCIAL	38	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°38 (Corredor Vial IV)	Global	22	162,2	01/09/2013	30/04/2015	92.114	0	
Total Corredor IV												2.303.086		
Corredor V														
40	5	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	21	32,0	01/09/2013	02/03/2015	86.281	0	
40	5	1	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	21	19,0	01/09/2013	02/03/2015	104.102	0	
40	5	1	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	0	
40	5	1	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	0	
40	5	1	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	0	
40	5	1	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2016	10.000	0	
40	5	1	57	INTERPROVINCIAL	Vs	Obras de Seguridad en Corredor Vial V	Global	17	46,0	01/12/2011	01/03/2013	36.057	6	
40	5	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	647,9	05/02/2011	19/12/2013	655.402	6	
40	5	2	52	INTERPROVINCIAL	11	Obras de Seguridad en R.N.N°11 (Corredor Vial V)	Global	22	836,2	01/09/2011	01/05/2015	526.436	6	
40	5	2	53	SANTA FE	A012	Obras de Seguridad en R.N.N°A012 (Corredor Vial V)	Global	22	41,8	01/09/2011	01/07/2013	76.130	6	
40	5	2	54	SANTA FE	A009	Obras de Seguridad en R.N.N°A009 (Corredor Vial V)	Global	22		01/09/2013	30/08/2019	10.000	0	
40	5	2	55	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en Autopista R.N.N°9 (Corredor Vial V)	Global	22	167,8	01/09/2011	01/07/2013	343.823	6	
40	5	2	56	BUENOS AIRES	193	Obras de Seguridad en R.N.N°193 (Corredor Vial V)	Global	22	31,7	01/05/2013	30/04/2014	25.238	0	
Total Corredor V												1.903.469		
Corredor VI														
40	6	1	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Seguridad en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	21	249,3	01/07/2012	30/06/2015	492.790	6	A
40	6	1	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Seguridad en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	22	47,6	01/12/2011	29/11/2014	629.001	6	
40	6	1	53	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial VI	Global	17	1.472,8	12/09/2011	29/09/2012	11.817	7	
40	6	2	51	INTERPROVINCIAL	12	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°12 (Corredor Vial VI)	Global	22	1.122,3	22/02/2011	22/04/2015	674.628	6	
40	6	2	52	INTERPROVINCIAL	16	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°16 (Corredor Vial VI)	Global	14	265,0	21/03/2011	19/04/2014	220.788	6	
Total Corredor VI												2.029.024		
Corredor VII														
40	7	1	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Seguridad en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	21	11,0	01/09/2012	08/01/2014	68.302	6	A
40	7	1	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Seguridad en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	21	329,5	01/09/2013	01/12/2013	12.008	2	
40	7	1	53	INTERPROVINCIAL	9 - 34	Obras de Seguridad en Corredor Vial VII	Global	21	152,2	22/04/2011	15/04/2013	8.884	6	A
40	7	2	51	INTERPROVINCIAL	9	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°9 (Corredor Vial VII)	Global	22	360,1	13/07/2011	30/04/2015	387.427	6	A
40	7	2	52	INTERPROVINCIAL	34	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°34 (Corredor Vial VII)	Global	22	571,5	10/02/2011	10/04/2014	554.538	6	A
Total Corredor VII												1.031.159		
Corredor VIII														
40	8	1	51	CORDOBA	A005	Obras de Seguridad en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21	9,6	01/05/2013	02/03/2015	88.650	4	
40	8	1	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Seguridad en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	21	37,8	01/04/2012	30/03/2016	478.975	6	
40	8	1	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Seguridad en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	21	2,0	01/05/2013	30/04/2014	19.828	6	
40	8	1	54	CORDOBA	36	Obras de Seguridad en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	76.400	0	
40	8	1	55	INTERPROVINCIAL	varias	Obras de Seguridad en Corredor Vial VIII	Global	21	158,6	14/05/2011	30/01/2013	3.559	6	
40	8	2	51	CORDOBA	A005	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°A005 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	16.200	0	
40	8	2	52	INTERPROVINCIAL	8	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°8 (Corredor Vial VIII)	Global	14	467,5	14/04/2011	12/04/2015	593.301	6	A
40	8	2	53	INTERPROVINCIAL	33	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°33 (Corredor Vial VIII)	Global	14	347,2	01/09/2011	28/02/2016	167.304	6	
40	8	2	54	CORDOBA	36	Obras de Refuerzo de Infraestructura en R.N.N°36 (Corredor Vial VIII)	Global	21		01/03/2013	28/02/2016	52.045	0	
Total Corredor VIII												1.496.262		
Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas														
40	9	1	51	INTERPROVINCIAL		Obras Mejorativas en Iniciativas Privadas (Etapa I)	Global	21		01/06/2010	30/05/2013	254.701	6	
Total Obras Mejorativas en Iniciativas Viales Privadas												254.701		
Total General												254.701		

CUADRO D
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (PROYECTOS Y OBRAS AL 31/12/2012)

Pr	Sp	Py	Ob	Provincia	Ruta	Tramo	Sección	Tipo	Long.Km	Inicio	Fecha Fin	Inversión Total	Est	Obs
Total Obras en Corredores Viales												13.296.214		
TOTAL DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD												137.325.945		

CUADRO E
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2012
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	Estructura %
Ciudad Autonoma de Buenos Aires	7.063,2	6.944,1	3.770,8	3.574,1	22,8%
Provincia de Buenos Aires	2.087,6	2.634,9	2.201,2	2.195,0	14,0%
Provincia de Catamarca	125,9	98,3	91,4	91,3	0,6%
Provincia de Cordoba	553,7	614,4	749,8	749,7	4,8%
Provincia de Corrientes	436,0	471,5	227,8	227,6	1,5%
Provincia del Chaco	255,5	150,9	302,0	301,6	1,9%
Provincia del Chubut	393,5	322,9	312,8	312,0	2,0%
Provincia de Entre Rios	778,4	532,0	330,8	329,8	2,1%
Provincia de Formosa	187,7	404,7	452,0	451,7	2,9%
Provincia de Jujuy	166,5	193,1	209,3	207,9	1,3%
Provincia de La Pampa	75,0	100,2	105,0	104,9	0,7%
Provincia de La Rioja	184,0	235,3	251,4	250,9	1,6%
Provincia de Mendoza	452,4	368,6	382,1	379,6	2,4%
Provincia de Misiones	175,0	159,7	131,1	129,0	0,8%
Provincia del Neuquen	204,1	295,0	283,8	277,4	1,8%
Provincia de Rio Negro	818,2	1.040,6	953,3	949,9	6,1%
Provincia de Salta	298,0	320,8	287,5	287,0	1,8%
Provincia de San Juan	205,1	208,1	187,3	187,3	1,2%
Provincia de San Luis	21,3	25,3	43,7	43,6	0,3%
Provincia de Santa Cruz	1.057,3	574,6	372,1	372,1	2,4%
Provincia de Santa Fe	656,7	587,0	590,8	588,6	3,8%
Provincia de Santiago del Estero	96,3	122,5	227,8	227,7	1,5%
Provincia de Tucuman	229,8	198,6	243,1	243,0	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlanti	91,5	172,2	216,9	216,9	1,4%
Interprovincial	2.057,2	1.922,8	1.103,9	1.103,9	7,1%
Nacional	692,9	1.533,4	1.554,4	1.553,8	9,9%
Binacional	1,2	1,0	32,4	32,4	0,2%
No Clasificado	33,9	190,6	256,2	256,2	1,6%
TOTAL INVERSION REAL DIRECTA	19.397,8	20.423,1	15.870,9	15.645,0	100,0%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 31/12/2012
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nacion	81,8	91,9	10,2	12,5%
Jefatura de Gabinete de Ministros	331,9	435,5	103,6	31,2%
Ministerio del Interior y Transporte	1,8	1.479,9	1.478,1	82118,6%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	0,0	11,3	11,3	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,7	0,7	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	2,8	2,8	0,0	0,0%
Ministerio de Defensa	0,0	0,8	0,8	
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	70,6	15,6	-55,0	-77,9%
Ministerio de Industria	54,2	41,2	-13,0	-23,9%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	17,9	64,1	46,2	258,1%
Ministerio de Turismo	4,3	13,0	8,8	206,0%
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser	20.208,7	22.148,6	1.939,9	9,6%
Ministerio de Educación	1.695,1	1.993,8	298,7	17,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	81,6	81,6	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,6	102,6	-29,0	-22,0%
Ministerio de Salud	187,0	330,5	143,5	76,7%
Ministerio de Desarrollo Social	42,6	47,8	5,2	12,2%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	20.636,6	21.974,8	1.338,3	6,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	48.836,6	5.287,5	12,1%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCION AL 31/12/2012
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nacion	81,8	91,9	64,6	64,6	70,3%
Jefatura de Gabinete de Ministros	331,9	435,5	200,6	197,5	45,4%
Ministerio del Interior y Transporte	1,8	1.479,9	501,8	501,5	33,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	0,0	11,3	11,3	11,3	100,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ministerio de Seguridad	2,8	2,8	2,3	2,3	84,0%
Ministerio de Defensa	0,0	0,8	0,8	0,8	100,0%
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas	70,6	15,6	15,1	15,1	96,7%
Ministerio de Industria	54,2	41,2	13,1	13,1	31,7%
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca	17,9	64,1	52,8	42,9	66,9%
Ministerio de Turismo	4,3	13,0	11,8	11,8	90,8%
Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Ser	20.208,7	22.148,6	18.629,5	18.648,6	84,2%
Ministerio de Educacion	1.695,1	1.993,8	1.990,6	1.989,9	99,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Productiva	81,6	81,6	81,5	81,5	99,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	131,6	102,6	46,9	46,9	45,8%
Ministerio de Salud	187,0	330,5	252,1	242,6	73,4%
Ministerio de Desarrollo Social	42,6	47,8	35,7	35,7	74,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	20.636,6	21.974,8	20.991,7	20.991,7	95,5%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	48.836,6	42.902,3	42.897,8	87,8%

CUADRO H
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/12/2012
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autonoma de Buenos Aires	9.185,7	9.154,2	14.374,0	14.337,6	33,4%
Provincia de Buenos Aires	6.625,3	6.957,7	6.079,2	6.133,7	14,3%
Provincia de Catamarca	550,3	394,4	429,5	429,5	1,0%
Provincia de Cordoba	1.690,5	1.408,6	1.063,7	1.063,5	2,5%
Provincia de Corrientes	928,4	777,9	553,8	553,4	1,3%
Provincia del Chaco	1.320,4	2.032,8	2.097,2	2.096,0	4,9%
Provincia del Chubut	349,9	431,8	317,7	317,7	0,7%
Provincia de Entre Rios	952,0	1.185,7	1.326,5	1.326,5	3,1%
Provincia de Formosa	1.010,4	1.425,5	1.947,6	1.947,5	4,5%
Provincia de Jujuy	570,9	690,8	853,3	853,3	2,0%
Provincia de La Pampa	422,4	381,8	362,0	362,0	0,8%
Provincia de La Rioja	833,4	844,8	809,5	809,5	1,9%
Provincia de Mendoza	695,0	662,7	716,1	715,1	1,7%
Provincia de Misiones	785,2	764,7	840,7	840,5	2,0%
Provincia del Neuquen	429,7	398,0	420,9	420,9	1,0%
Provincia de Rio Negro	678,2	650,9	544,1	541,5	1,3%
Provincia de Salta	644,5	673,8	678,9	678,7	1,6%
Provincia de San Juan	768,1	659,2	561,1	560,9	1,3%
Provincia de San Luis	293,2	250,8	246,2	238,0	0,6%
Provincia de Santa Cruz	933,2	1.054,8	1.263,6	1.259,0	2,9%
Provincia de Santa Fe	1.272,1	1.079,2	960,2	960,1	2,2%
Provincia de Santiago del Estero	964,0	1.363,2	1.302,9	1.302,9	3,0%
Provincia de Tucuman	1.210,0	1.230,7	1.163,2	1.163,2	2,7%
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del At	245,1	293,4	305,2	301,7	0,7%
Interprovincial	5.461,3	7.091,3	3.497,5	3.497,5	8,2%
Nacional	4.614,8	6.792,3	70,8	70,8	0,2%
Binacional	28,5	78,5	38,5	38,5	0,1%
No Clasificado	86,3	107,1	78,6	78,6	0,2%
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.549,1	48.836,6	42.902,3	42.897,8	100,0%

CUADRO I
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR
FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/12/2012
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	54,4		54,4
Judicial	110,2	0,0	110,2
Dirección Superior Ejecutiva	77,4	17,9	95,3
Relaciones Exteriores	26,2	0,1	26,3
Relaciones Interiores	50,3	7.667,6	7.717,9
Administración Fiscal	6,9		6,9
Control de la Gestión Pública	22,4		22,4
Información y Estadística Básicas	6,3		6,3
Subtotal	354,1	7.685,6	8.039,7
Defensa y Seguridad			
Defensa	177,3	0,4	177,7
Seguridad Interior	678,1	4,3	682,4
Sistema Penal	77,9		77,9
Inteligencia	12,9	0,3	13,2
Subtotal	946,3	5,0	951,3
Servicios Sociales			
Salud	253,8	388,1	641,9
Promoción y Asistencia Social	18,7	906,9	925,6
Seguridad Social	146,7		146,7
Educación y Cultura	1.090,0	3.012,2	4.102,2
Ciencia y Técnica	1.310,9	109,8	1.420,7
Trabajo	22,0	46,9	69,0
Vivienda y Urbanismo	0,3	5.073,7	5.074,1
Agua Potable y Alcantarillado	341,0	5.427,3	5.768,4
Subtotal	3.183,5	14.965,0	18.148,4
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	27,7	10.674,4	10.702,2
Comunicaciones	226,9	3.108,8	3.335,8
Transporte	10.530,4	5.857,6	16.388,0
Ecología y Medio Ambiente	125,0	251,4	376,4
Agricultura	60,4	170,4	230,8
Industria	94,2	137,9	232,0
Comercio, Turismo y Otros Servicios	93,8	41,8	135,6
Seguros y Finanzas	2,8		2,8
Subtotal	11.161,2	20.242,3	31.403,5
Total	15.645,0	42.897,8	58.542,9
