


INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL
Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Semestre 2022

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2022 alcanza a \$1.430.515,1 millones, con la siguiente evolución nominal ¹:

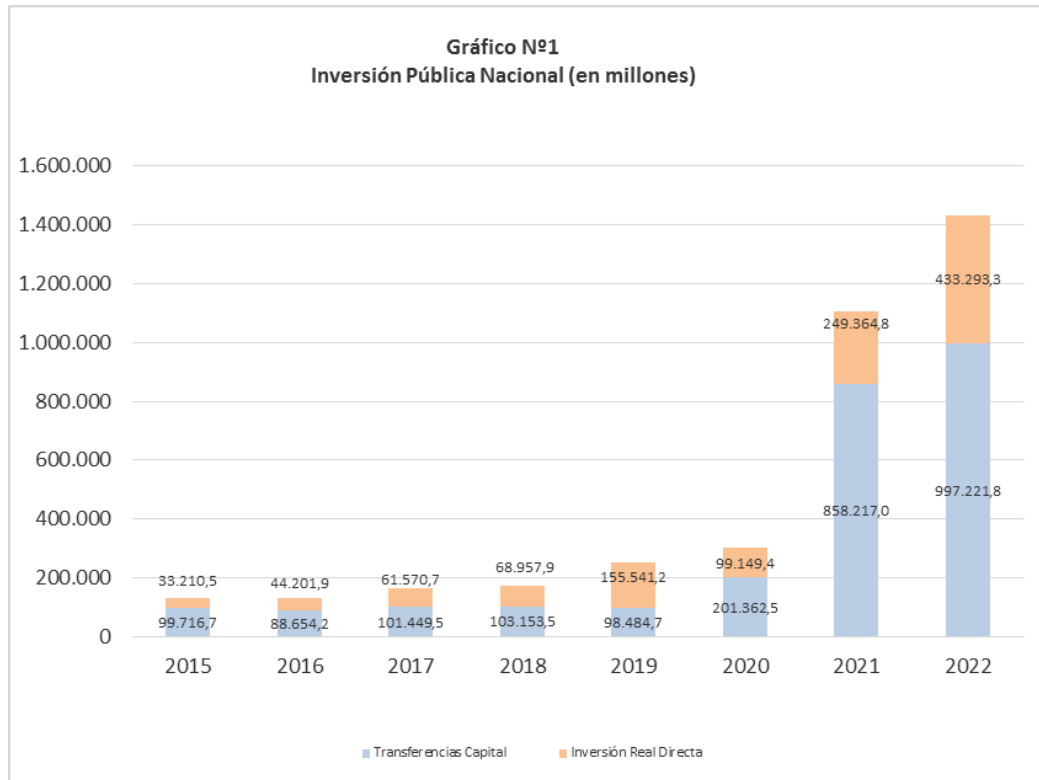

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/2022 un devengado de \$149.143,3 millones (34,4% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realiza transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron \$336.965,2 millones, representando el 33,8% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2015/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2015/2020 del FEDEI.

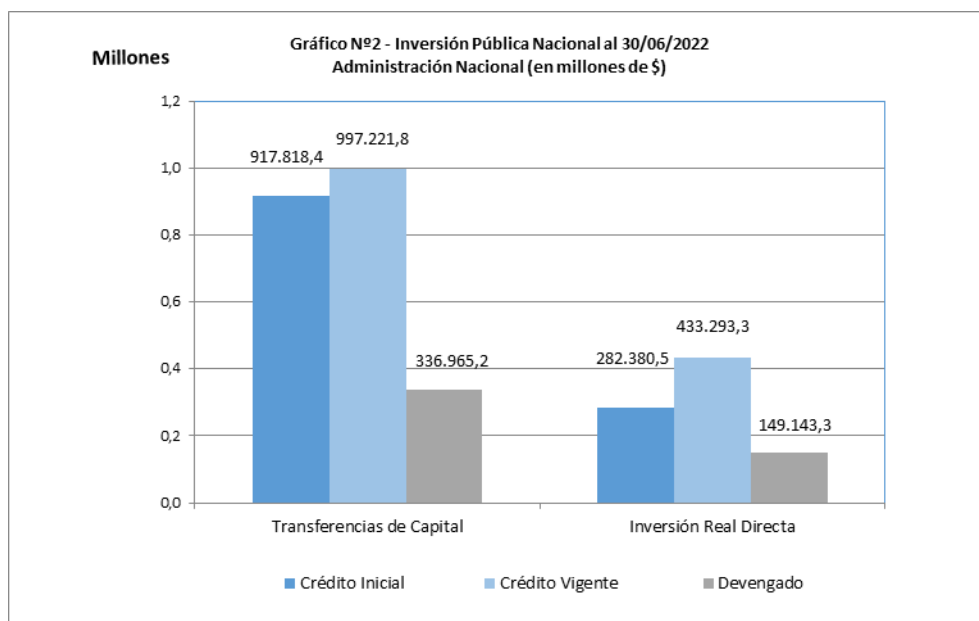

A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al cierre del primer semestre de 2022, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2022 (en millones de \$)


Administración Nacional					
Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	282.380,5	433.293,3	149.143,3	30,7%	34,4%
Obras de Inversión	200.927,8	259.552,7	97.718,0	20,1%	37,6%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	81.452,7	173.740,6	51.425,3	10,6%	29,6%
Transferencias de Capital	917.818,4	997.221,8	336.965,2	69,3%	33,8%
Total Inversión Pública Nacional	1.200.198,9	1.430.515,1	486.108,4	100,0%	34,0%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/06/2022 una ejecución del 34,0% del crédito vigente (casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 44,8%), representando las transferencias de capital el 69,3% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto alcanzar en el año 2022 a \$433.293,3 millones, conforme a la siguiente evolución:

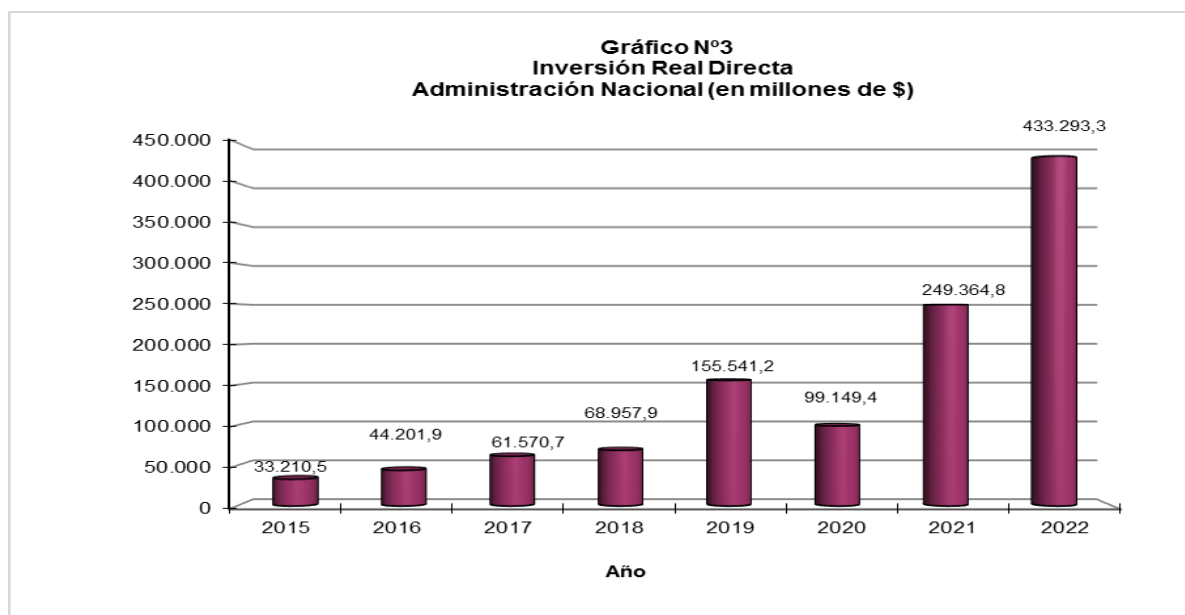

(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 53,4% para el período 2015/2022.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al cierre del primer semestre de 2022, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2022 (en millones de \$)

Administración Nacional					
NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	115.022,9	216.845,6	66.743,7	44,8%	30,8%
Organismos Descentralizados	164.020,0	211.924,2	80.904,4	54,2%	38,2%
Instituciones de Seguridad Social	3.337,6	4.523,5	1.495,2	1,0%	33,1%
TOTAL	282.380,5	433.293,3	149.143,3	100,0%	34,4%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 54,2% del gasto ejecutado en 2022. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2021:

**Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/06 - Años 2021/2022 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2022 -**

Organismo	Devengado 2021	Devengado 2022	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	47.945,5	64.907,1	35,4
Ministerio de Educación	4.948,8	34.385,9	594,8
Ministerio de Transporte	2.758,0	10.045,9	264,3
Comisión Nacional de Energía Atómica	4.826,8	9.670,0	100,3
Ministerio Obras Públicas	7.028,5	5.127,4	-27,0
Estado Mayor General Fuerza Aérea	4.061,9	4.193,3	3,2
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	1.650,8	2.766,5	67,6
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.834,5	1.953,6	6,5
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.441,2	1.643,1	14,0
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	222,1	1.493,9	572,5
Ministerio Desarrollo Social	618,2	1.339,5	116,7
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.296,3	1.223,4	-46,7
Subtotal	79.632,5	138.749,6	74,2
Otros	4.619,6	10.393,6	125,0
Total IRD	84.252,1	149.143,3	77,0

Se aprecia en el cuadro precedente la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente del programa Construcción de Autopistas y Autovías, y la Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración; seguida por el Ministerio de Educación, con relevancia de la iniciativa Conectar Igualdad y del Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles; el Ministerio de Transporte principalmente para la renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas, y la mejora integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor CAREM y el RA - 10; el Ministerio de Obras Públicas, principalmente con la ejecución de obras de infraestructura de transporte, principalmente de obras de pavimentación interjurisdiccionales, y para el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo; la Fuerza Aérea Argentina con el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea en el marco del Fondo Nacional de la Defensa - "FONDEF"; el Ministerio de Defensa con el mantenimiento, producción y soporte logístico para la Defensa Aérea; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con las misiones satelitales; el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con la ampliación del sistema de recolección y tratamiento de efluentes en la Cuenca El Paramillo, y la construcción de redes colectores en la Provincia de Tucumán; la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en equipamiento para la administración y apoyo logístico, y para el proyecto de protección de niños y jóvenes; el Ministerio de Desarrollo Social para la remodelación y construcción en Espacios de Primera Infancia; y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la construcción rellenos sanitarios y plantas de recuperación de materiales.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 53,5% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/06/2022 (en millones de \$)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	144.270,8	220.495,4	79.861,8	53,5%	36,2%
Financiamiento Externo	72.683,1	101.440,4	29.882,4	20,0%	29,5%
Crédito Interno	40.187,4	42.871,6	30.351,4	20,4%	70,8%
Recursos Afectación Específica	17.430,4	32.365,8	6.288,0	4,2%	19,4%
Transferencias Internas	1.846,1	26.359,0	1.139,3	0,8%	4,3%
Recursos Propios	5.962,6	9.761,0	1.620,4	1,1%	16,6%
TOTAL	282.380,5	433.293,3	149.143,3	100,0%	34,4%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, las obras de la Dirección Nacional de Vialidad por \$31.382,2 millones, en el Ministerio de Educación se financió la adquisición de equipamiento para la implementación de la iniciativa Conectar Igualdad por \$24.537,2 millones, las obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica por \$9.670,0 millones (principalmente los proyectos Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II y Construcción de Reactor RA-10), y el equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina por \$3.311,6 millones principalmente en el marco del Fondo Nacional de la Defensa - "FONDEF". Con **Financiamiento Externo** (Crédito y Transferencias Externas) se destaca el gasto destinado al Ministerio de Transporte por \$9.404,3 millones principalmente para la renovación de vías y corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (\$ 5.924,2 millones). Además, sobresale el Ministerio de Educación por \$8.608,6 millones destinados principalmente a Conectar Igualdad (\$4.439,0 millones) y para el fortalecimiento de jardines infantiles por \$ 4.080,1; el gasto por \$3.588,3 millones para obras de la Dirección Nacional de Vialidad; y por \$1.519,7 millones para proyectos del ENOHS. Por otra parte, la ejecución con **Crédito Interno** incluyó \$24.208,5 millones para proyectos y \$1.829,3 millones en equipamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Por último, los **Recursos con Afectación Específica** correspondieron principalmente a las obras del Ministerio de Obras Públicas por \$2.710,8 millones para la ejecución de obras de pavimentación interjurisdiccionales e infraestructura de Transporte Masivo VAP III.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que concentraron el 66,7% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$52.390,1 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$27.619,2 millones, destacándose la inversión vial en la construcción de autopistas y autovías (\$10.249,9 millones), la Construcción del Reactor RA-10 en la Comisión Nacional de Energía Atómica (\$3.760,7 millones) y la infraestructura de transporte del Ministerio de Obras Públicas (\$3.020,0 millones). En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$7.402,1 millones, siendo importantes las inversiones en la Construcción de la Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158 (Tramo Ruta Nacional N° 9 - Ruta

Provincial N° 2), la en la Ruta Nacional N° 8 (Rio Cuarto - Holmberg), y la repavimentación de la Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 60. En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron \$6.411,2 millones, fundamentalmente en la construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 y en la repavimentación de rutas nacionales.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera prevista para 2022

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2021	Devengado 30/06/2022	% Dev. Ac.30/06/22 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	959.513,2	316.817,9	61.217,4	39,4%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	152.841,0	33.097,0	5.924,2	25,5%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	94.362,1	18.538,7	5.328,6	25,3%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	79.071,0	13.967,2	1.692,0	19,8%
Construcción de Reactor RA-10	38.699,9	9.638,8	3.763,7	34,6%
Infraestructura de Transporte Masivo VAP III	8.466,6	7.226,6	890,5	95,9%
Construcción de Jardines de Infantes	11.604,6	6.134,7	4.088,7	88,1%
Total (Proyectos de gran envergadura)	1.344.558,3	405.420,8	82.905,1	36,3%

(*) Costo total de obras de inversión extraído de BAPIN. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión de mayor envergadura, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 36,3% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia, a los fines de contextualizar el análisis del presente apartado. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. En lo que respecta a los kilómetros en construcción en Autopistas se alcanzaron los 999 kilómetros en distintas provincias del país. Asimismo, los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales alcanzaron a 3.881 kilómetros, en promedio, al cierre del primer semestre.

Por otra parte, en las Obras de Repavimentación se encontraban en ejecución obras de repavimentación en 1.016 kilómetros. Asimismo, al 30/06/22 en el programa Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, se finalizó una intervención de seguridad vial y se encontraban en ejecución 10 intervenciones.

En relación con las acciones de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/06/22 se encontraban en construcción 1.571 metros de obras en puentes. Respecto de las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias, finalizaron 10 intervenciones con 115 que continuaban en ejecución. Asimismo, el programa Construcción de Rutas Seguras registró en

el primer trimestre 98 kilómetros en construcción. Respecto del programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes tuvo en ejecución 12 kilómetros de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial y 2.020 metros en construcción de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles.

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional al 30/06/22 se encontraban 2 obras en ejecución. Por otra parte, en el programa Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial al primer trimestre contaba con 7 kilómetros en construcción de obras viales menores.

Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte estuvieron en ejecución 8 intervenciones y se finalizó una intervención en el periodo.

Ministerio de Transporte:

Al 30/06/22 continuaron las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas con una ejecución financiera acumulada de \$39.021,2 millones de devengado, que registra una ejecución física acumulada de 58,6%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/06/22 en el marco del Plan Espacial Nacional se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Al respecto, se completó la serie SAOCOM 1, Satélite Argentino de Observación con radar de Microondas, formada por el satélite SAOCOM 1ª y por el satélite SAOCOM 1B, que llevan a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) en banda L, compuesto por siete paneles con una superficie total de 35 metros cuadrados y un peso de 1,5 toneladas. El objetivo es generar información útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y generar datos sobre humedad de suelo, con beneficios para la actividad productiva nacional, entre otros sectores. Los SAOCOM funcionan en conjunto con cuatro satélites italianos COSMOSkyMed en el marco del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la CONAE y la agencia espacial italiana ASI, para contribuir a la gestión de emergencias y al desarrollo económico. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 98,6%.

Por otra parte, la **Misión SABIAMAR**, se dedica esencialmente a la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. La obra alcanza un avance físico acumulado de 93,99%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor, se asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina; consolidará las capacidades para desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas. Al 30/06/22, el proyecto registra un avance físico acumulado de 71,06% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$13.402,5 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 31/03/22, el proyecto registra un avance físico acumulado de 60,61% y una ejecución financiera acumulada de \$23.867,3 millones.

Ministro de Obras Públicas:

Se destacan las asignaciones para obras de infraestructura de transporte, destinándose \$8.117,1 millones con el fin de mejorar la circulación del transporte público automotor de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires, el marco del proyecto **Infraestructura Transporte Masivo - VAP III**.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, conforme la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. En dicho marco, representa una política con perspectiva de género al fomentar la escolarización niñas y niños bajo cuidado de las madres, que les permite realizar otras tareas (laborales, sociales, entre otras). Al 30/06/22 la ejecución financiera acumulada resulta de \$10.223,4 millones.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto de primer semestre 2022 ascendió a \$ 51.425,3 millones, financiado principalmente por Tesoro Nacional (75,3%), seguido por Crédito Externo (13,9%) y Crédito Interno (6,9%). En ese marco, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 93,1% del gasto en maquinaria, edificios y otros al 30/06/22.

Cuadro N°7: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/22 (en millones de pesos)
- según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	18.838,8	75.722,8	31.418,2	61,1%	41,5%
Acciones para la Defensa	15.377,3	20.392,4	6.962,2	13,5%	34,1%
Fortalecimiento del Transporte	6.659,4	14.898,7	3.794,7	7,4%	25,5%
Acciones para la Seguridad	3.211,7	4.352,8	1.434,5	2,8%	33,0%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	4.057,4	6.580,8	1.468,8	2,9%	22,3%
Ecología y Medio Ambiente	2.161,7	3.494,0	1.068,0	2,1%	30,6%
Equipamiento para la Seguridad Social	3.670,9	6.850,9	1.075,0	2,1%	15,7%
Administración Gubernamental	3.454,0	5.298,0	651,7	1,3%	12,3%
Subtotal	57.431,1	137.590,4	47.873,3	93,1%	34,8%
Otros	24.021,6	36.150,2	3.552,0	6,9%	9,8%
Total	81.452,7	173.740,6	51.425,3	100,0%	29,6%

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, se devengaron \$31.418,2 millones (41,5% del crédito), de los cuales el 92,2% se destinó a la iniciativa Conectar Igualdad (\$28.976,2 millones). Este plan abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina. Cabe destacar que esta categoría está en un 84,7% financiada con Tesoro Nacional

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$6.962,2 millones, el 13,5% del total en equipamiento. El mayor gasto se realizó con fuentes Tesoro Nacional (87,9%), Crédito Interno (12,0%) y el resto con Recursos con Afectación Específica. Dentro de las acciones llevadas a cabo, se destacan los gastos del Fondo Nacional de la Defensa "FONDEF" en el marco Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea (\$4.117,9 millones) y el Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa Aérea (\$2.753,4 millones).

Fortalecimiento del Transporte

Al 30/06/22 se devengaron \$3.794,7 millones que corresponden al 7,4% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario corresponden al equipamiento la Dirección Nacional de Vialidad (\$3.689,7 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red (\$3.269,7 millones).

Acciones para la Seguridad

Al 30/06/22 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de \$1.075,0 millones que corresponden al 2,1% del gasto global en equipamiento, destacándose la adquisición de equipamiento por el Ministerio de Seguridad (\$700,0 millones) principalmente destinado al Programa Federal de Seguridad (\$392,5 millones). Por otra parte, se destinaron \$224,2 millones al equipamiento de la Gendarmería Nacional Argentina principalmente destinado a las Operaciones Especiales de Seguridad.

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 30/06/22 se destinaron \$1.468,8 millones al equipamiento con destino a acciones de ciencia y técnica. Se destaca la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación principalmente en el marco del Programa de Innovación Federal (PIF) que corresponden al 40,5% del total de este apartado (\$595,0 millones). Además, en este Ministerio se devengaron \$318,6 millones para el Fortalecimiento de Instituciones de Ciencia y Tecnología. Asimismo, el 21,0% corresponde a la adquisición de equipamiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran (\$288,7 millones).

Por otra parte, se destinaron \$128,2 millones a la Comisión Nacional de Energía Atómica, destacándose el programa Investigación y Aplicaciones no Nucleares (\$51,5 millones) y el equipamiento de Servicios Operativos de Apoyo (\$36,2 millones).

Ecología y Medio Ambiente

Al 30/06/22 se destinaron \$651,7 millones a acciones de ecología y medio ambiente, principalmente destinados a equipamiento para el Control y el Monitoreo Ambiental en el marco del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (\$339,5 millones). Asimismo, se destinaron \$104,2 millones al equipamiento para el Fortalecimiento de la Economía Circular, Inclusiva, Comunitaria y Local (PRECICLO) para fortalecer la gestión integral de residuos domiciliarios en los centros urbanos del país.

Equipamiento para la Seguridad Social

Al 30/06/22 se destinaron \$1.434,5 millones para el equipamiento del sistema de seguridad social. Se destaca la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) (99,9% del total), que destinó \$771,1 millones a equipamiento para administración general y apoyo logístico y \$660,8 millones en gastos de inversión del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes.


Administración Gubernamental

Se devengaron \$1.068,0 millones al 30/06/22, principalmente en el marco de las acciones del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para la emisión del Documento Nacional de Identidad (\$ 695,35 millones) y de la Dirección Nacional de Migraciones para el Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional (\$ 322,9 millones).

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2009-2021 se puede apreciar en el siguiente gráfico².

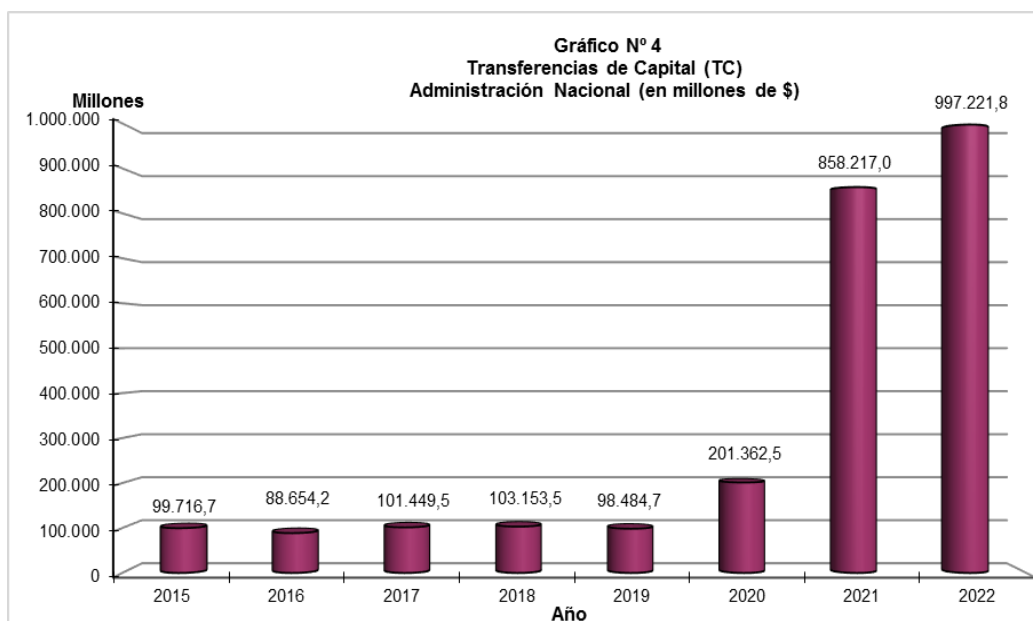

1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°8: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2022 (en millones \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Administración Central	851.613,1	932.957,9	301.772,8	89,6%	32,3%
Organismos Descentralizados	66.205,3	64.264,0	35.192,4	10,4%	54,8%
TOTAL	917.818,4	997.221,8	336.965,2	100,0%	33,79%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/22 y la variación interanual respecto al ejercicio 2021:

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2015/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2015/2020 la ejecución del FEDEI.

Cuadro Nº 9: Ejecución Transferencias de Capital al 30/06/22
(en millones de pesos) – según Ejecución 2022

Organismo	Ejecución 2020	Ejecución 2021	% Variación
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	50.353,3	123.119,6	144,5
Ministerio Obras Públicas	38.296,2	56.738,0	48,2
Obligaciones A Cargo del Tesoro	45.334,5	65.288,5	44,0
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	17.480,9	20.299,2	16,1
Secretaría de Energía	6.812,5	20.021,8	193,9
Dirección Nacional de Vialidad	12.414,3	12.529,1	0,9
Ministerio de Educación	21.435,6	9.629,5	-55,1
Ministerio Desarrollo Social	2.075,9	4.680,8	125,5
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,0	7.886,0	
Subtotal	194.203,2	320.192,5	64,9
Otros	18.563,3	16.772,7	-9,6
Total Transferencias de Capital	212.766,5	336.965,2	58,4

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat transfirió \$123.119,3 millones de los cuales \$95.815,2 millones fueron para el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y \$20.001,5 millones al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias por \$56.738,0 millones destinadas a: AySA S.A. (\$16.879,6 millones), Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFHI) (\$8.000,0 millones), y transferencias en el marco del Plan Argentina Hace (\$7.782,2 millones). Además, realizó transferencias en el marco de las acciones para Norte Grande por (\$9.282,0 millones) y asistencias financieras para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia por \$4.665,1 millones, entre otras.

Por otra parte, la jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó principalmente transferencias a la firma AySA (\$19.500,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$10.359,3 millones), a Energía Argentina S.A. (\$10.257,3 millones), a Operador Ferroviario S.E. (\$3.768,9 millones) y a la Casa de Moneda (\$3.126,0 millones). Asimismo, se realizaron asistencias financieras a provincias por \$10.208,3 millones.

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) realizó transferencias para el Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable - PROFESA por \$9.547,3 millones y para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace por \$7.269,0 millones, entre otras. La Secretaría de Energía realizó principalmente transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (\$12.758,7 millones) para el apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa. Asimismo, realizó transferencias a provincias en el marco de las acciones de Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera (\$4.601,7 millones) y a las empresas adjudicatarias del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales PERMER II (\$1.128,8 millones). La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a por

\$12.529,1 millones a provincias para la construcción de obras viales fuera de la Red Vial Nacional.

El Ministerio de Educación realizó asistencias financieras a organismos provinciales para ampliación y refacción edilicia (\$2.703,4 millones), para nuevas obras (\$1.341,2 millones), para la construcción de nuevos jardines de infantes (\$496,7 millones) y para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (\$2.404,9 millones). Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social realizó transferencias en el marco de las acciones del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo (\$1.673,5 millones) y en el marco de las acciones de abordaje territorial se realizaron transferencias (\$1.948,0 millones).

Por último, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó transferencias por \$7.886,0 millones de las cuales \$7.504,4 millones se realizaron en el marco de la Ley N° 27.614 de Promoción Federal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°10: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/06/2022 (en millones \$)

FUENTE FINANCIAMIENTO	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Crédito Interno	466.600,9	464.618,5	130.091,1	38,6%	28,0%
Tesoro Nacional	343.284,9	424.213,5	174.366,8	51,7%	41,1%
Financiamiento Externo	89.328,4	98.101,4	30.541,7	9,1%	31,1%
Otros recursos internos	15.300,5	3.844,8	1.508,9	0,4%	39,2%
Recursos con Afectación Específica	3.303,7	6.443,7	456,7	0,1%	7,1%
TOTAL	917.818,4	997.221,8	336.965,2	100,0%	33,79%

El **Crédito Interno** financió el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$62.925,8 millones) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$20.000,0 millones), del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; el Desarrollo de Infraestructura Urbana en el marco del Plan Argentina Hace (\$7.462,2 millones), obras para adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías (\$10.116,6 millones), la Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia (\$5.718,5 millones) y el Programa de Emergencia Municipal Provincia de Buenos Aires (\$4.665,1 millones), del Ministerio de Obras Públicas; y la asistencia financiera a empresas públicas y otros entes del Ministerio de Transporte de Obligaciones a Cargo del Tesoro (\$3.768,9 millones).

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en las transferencias realizadas en el marco de la ejecución del Pro.Cre.Ar. (\$32.889,4 millones) del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, las transferencias a la firma AySA (\$19.500,0 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$10.359,3 millones), a Energía Argentina S.A. (\$10.257,3 millones) realizadas por Obligaciones a Cargo de Tesoro. Asimismo, se realizaron transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (Decreto N° 1381/01) (\$12.758,7 millones) por la Secretaría de Energía. También se realizaron transferencias para obras a provincias y

municipios para Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (\$8.176,4 millones) por la Dirección Nacional de Vialidad.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en un 99,5% a **Crédito Externo**, aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. (\$16.879,6 millones) y a las provincias para el desarrollo y ejecución de obras de infraestructura hídricas (\$3.984,5 millones), ambas realizadas por el Ministerio de Obras Públicas.

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y La Rioja (64,5% del monto global). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$138.654,0 millones) debe considerarse que una gran cantidad de iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. (\$20.732,7 millones); para el desarrollo de la infraestructura en el marco del Plan Argentina Hace (\$6.162,1 millones) y para obras por transferencia a provincias y municipios para Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (\$4.109,2 millones). En la **provincia de Santa Cruz** se destacaron las transferencias para Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa (\$13.030,8 millones). Por último, se realizaron transferencias a la provincia de La Rioja (\$9.558,3 millones) de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 (prorrogada por el Decreto N°882/2021).

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al cierre del primer semestre de 2022, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 11: Ejecución por Beneficiario al 30/06/22 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Fondos Fiduciarios y otros Entes	142.910,5	42,41%
Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras	71.144,7	21,11%
Gobiernos Provinciales	64.433,0	19,12%
Gobiernos Municipales	33.037,0	9,80%
Universidades Nacionales	4.971,9	1,48%
Organismos Internacionales	4.662,5	1,38%
Otros	15.805,6	4,69%
Total	336.965,2	100,0%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones a los Fondos Fiduciarios y otros Entes, al Sector Público Empresarial e Instituciones Públicas Financieras y a gobiernos provinciales (viviendas, transporte, educación, entre otros). Dentro de los **Fondos**

Fiduciarios, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$95.815,2 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$20.001,5 millones), el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (\$20.758,7 millones), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (\$3.141,0 millones) y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego (\$1.547,1 millones).

En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a AySA (\$36.379,6 millones), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$10.868,00 millones), a Energía Argentina S.A. (\$10.529,4 millones), a Operador Ferroviario S.E. (\$3.768,9 millones) y Casa de Moneda (\$3.126,0 millones), acumulando el 90,9% de las erogaciones al sector público empresarial.

Respecto de las transferencias a **Gobiernos Provinciales** se destacan las que tienen destino a las acciones en el marco del Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable (PROFESA) (\$8.315,9 millones), para obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (\$ 2.760,8 millones), y para la Evaluación y Promoción de Infraestructura Hidrocarburífera (\$ 1.523,9 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 89,7% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/06/22:

Cuadro Nº 12: Principales transferencias de capital al 30/06/22 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	326.608,6	343.956,7	132.454,4	39,3%	38,5%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	174.907,3	180.031,4	53.814,2	16,0%	29,9%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	130.972,4	130.504,4	34.142,3	10,1%	26,2%
Políticas de Transporte	83.770,1	90.409,1	30.219,1	9,0%	33,4%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	52.791,1	78.991,9	13.706,9	4,1%	17,4%
Infraestructura Provincial	16.267,1	30.117,2	11.090,0	3,3%	36,8%
Políticas de Asistencia Social	26.793,9	22.247,0	8.396,1	2,5%	37,7%
Acciones de Salud	18.267,0	19.784,7	8.022,9	2,4%	40,6%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	12.988,0	17.441,2	14.773,1	4,4%	84,7%
Acciones en el Norte Grande Argentino	9.502,7	8.857,5	7.301,9	2,2%	82,4%
SubTotal	852.868,3	922.341,2	313.920,9	93,2%	34,0%
Otros	64.950,1	74.880,7	23.044,2	6,8%	30,8%
Total	917.818,4	997.221,8	336.965,2	100,0%	33,8%

Acciones de Vivienda

Al 30/06/22 se devengaron \$173.454,4 millones para la construcción de viviendas, principalmente de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales y por

gobiernos provinciales y municipales. Estas asistencias financieras representaron el 46,5% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas:

Cuadro N° 13: Acciones de Vivienda al 30/06/22 (en millones de pesos)

Iniciativa	Devengado	% Part. Devengado
PROCREAR	95.815,2	72,3%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	20.001,5	15,1%
Plan Argentina Hace	7.734,4	5,8%
Resto	8.903,4	6,7%
Total	132.454,4	100,0%

De acuerdo a lo indicado en el cuadro precedente, el Fondo PROCREAR es la iniciativa con mayor participación en el total de la función (72,3%), conforme a la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Asimismo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, iniciativa que tiene como objetivo financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, corresponde al 15,1% del total devengado.

Por último, se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los \$7.734,4 millones (5,8%).

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a obras de infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$53.814,2 millones, destinándose el 43,5% a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) (\$23.430,3 millones). Asimismo, al 30/06/22 se transfirieron \$13.514,1 millones con destino a las provincias, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento y agua potable y para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas. Además, se realizaron transferencias por \$8.000,0 millones (14,9% del devengado) al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica. Por otra parte, se transfirieron \$7.299,3 millones para el desarrollo de infraestructura de agua potable y saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/22 el sector energético recibió \$34.142,3 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 6,3% del total de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 14: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 30/06/22 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH)(Decreto N° 1381/01)	12.758,7	37,4%
Integración Energética Argentina S.A	10.529,4	30,8%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios	4.904,5	14,4%
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio	2.275,5	6,7%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	1.130,0	3,3%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	1.128,8	3,3%
DIOXITEK S.A.	435,0	1,3%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	104,1	0,3%
Resto	876,4	2,6%
Total	34.142,3	100,0%

De acuerdo a la información del cuadro, se destaca las transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) (Decreto N° 1381/01) por \$12.758,7 millones también se realizaron en el marco del apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz. Asimismo, la asistencia financiera a la empresa Energía Argentina S.A. por \$10.529,4 millones se destinó principalmente a la finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) en las Provincias de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe y para la construcción de la Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner que integra el sistema de producción nacional Transport.Ar entre las localidades de Trátayen y Salliqueló.

Además, se realizaron transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios, por \$4.904,5 millones destinadas a la evaluación y promoción de la infraestructura hidrocarburífera y eléctrica, principalmente a la construcción del Gasoducto de Aproximación en las localidades de Chamaical, Patquia, Chilecito y EMyR en la provincia de La Rioja - Plan AcercAR Gas. Al 30/06/22 se destinaron \$2.275,5 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, \$1.130,0 millones a Nucleoeléctrica Argentina S.A., y \$1.128,8 millones a las empresas adjudicatarias del proyecto PERMER II, para facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, alejadas de las redes de distribución, a partir de la provisión e instalación de equipos para la provisión de energía eléctrica y comunicaciones; fines térmicos; bombeo de agua potable y proyectos productivos.

Por otra parte, se transfirieron \$435,0 millones a DIOXITEX SA y \$104,1 millones a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, este último como apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande en la provincia de Entre Ríos.

Políticas de Transporte

Al 30/06/22 se devengaron \$30.219,1 millones bajo este concepto, que corresponden al 9,0% del total de las transferencias de capital, destinándose el 54,1% a empresas públicas y el 45,9% a transferencias a instituciones provinciales y municipales principalmente con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro N° 15: Principales Beneficiarios en Transporte al 30/06/22
(en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	10.868,0	36,0%
Administración Municipal	9.007,0	29,8%
Administración central provincial	4.850,3	16,1%
Operador Ferroviario S.E.	3.768,9	12,5%
Corredores Viales SA	908,1	3,0%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	653,8	2,2%
Otros Beneficiarios	163,0	0,5%
Total	30.219,1	100,0%

La mayor parte de las asistencias se otorgaron a la firma Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF) por \$10.868,0 millones principalmente con destino a asistencias financieras para el Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros. Asimismo, las administraciones municipales \$9.007,0 millones y administraciones provinciales recibieron \$4.850,3 millones, principalmente destinadas a obras viales fuera de la red vial nacional.

Adicionalmente la firma Operador Ferroviario S.E. recibió \$3.768,9 millones en el marco del Plan de Infraestructura de Transporte de Pasajeros. Además, la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. recibió \$653,8 millones y Corredores Viales S.A. recibió \$908,1 millones en el marco de las asistencias financieras a empresas públicas.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/22 se devengaron \$13.706,9 millones, destinándose el 66,2% a gobiernos provinciales y municipales principalmente destinado a mejorar la infraestructura y el equipamiento educativo, para la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, y el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, mientras que el 32,6% se destinó a Universidades Nacionales (\$4.474,4 millones). Asimismo, el resto se destinó a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro (\$83,4 millones) principalmente en el marco de las acciones de fomento, producción y difusión del teatro, y a EDUCAR SE (\$78,0 millones). A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro N° 16: Distribución Geográfica Asistencia Financiera para Infraestructura y Equipamiento Educativo al 30/06/22 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	1.819,6	13,3%
Provincia del Neuquén	1.402,0	10,2%
Provincia de Santa Fe	1.200,4	8,8%
Provincia de San Juan	1.165,4	8,5%
Provincia del Chaco	918,9	6,7%
Provincia de Tucumán	766,7	5,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	743,7	5,4%
Provincia de Entre Ríos	726,8	5,3%
Provincia de Salta	652,4	4,8%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	622,3	4,5%
Provincia de Corrientes	499,0	3,6%
Provincia de Córdoba	469,6	3,4%
Provincia de Santa Cruz	399,2	2,9%
Provincia de Misiones	333,0	2,4%
Provincia de Río Negro	305,5	2,2%
Provincia del Chubut	269,3	2,0%
Provincia de Catamarca	238,3	1,7%
Provincia de San Luis	216,2	1,6%
Provincia de La Pampa	208,7	1,5%
Provincia de Mendoza	205,3	1,5%
Provincia de La Rioja	180,6	1,3%
Provincia de Santiago del Estero	111,5	0,8%
Provincia de Jujuy	97,8	0,7%
Interprovincial	78,0	0,6%
Provincia de Formosa	74,8	0,5%
Nacional	1,9	0,0%
Total	13.706,9	100,0%

Infraestructura Provincial

Se transfirieron \$11.090,0 millones con destino a infraestructura provincial que corresponden al 3,3% del total. Al respecto, el 86,2% se destinó a la provincia de La Rioja, conforme al artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2021 (prorrogada por el Decreto N°882/2021). Asimismo, se realizaron transferencias a la provincia de Tucumán en el marco de las asistencias financieras a provincias y municipios por \$900,0 millones. Además, el Ministerio del Interior realizó transferencias para el fortalecimiento de la gestión provincial (\$439,4 millones) y para el apoyo a la asistencia provincial y local en la emergencia (\$192,3 millones).

Cuadro N° 17: Infraestructura Provincial
Gasto por provincia. Al 30/06/22 (en millones de pesos)

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de La Rioja	9.558,3	86,2%
Provincia de Tucumán	902,2	8,1%
Provincia del Neuquén	178,8	1,6%
Provincia de Corrientes	157,7	1,4%
Provincia del Chaco	120,8	1,1%
Provincia de Buenos Aires	116,9	1,1%
Provincia de Salta	26,4	0,2%
Provincia de Santa Fe	24,1	0,2%
Provincia de Mendoza	4,4	0,0%
Provincia del Chubut	0,1	0,0%
Provincia de Entre Ríos	0,1	0,0%
Provincia de Misiones	0,1	0,0%
Total	11.090,0	100,0%

Políticas de Asistencia Social

Entre las principales acciones, al 30/06/22 se devengaron \$8.396,1 millones que corresponden al 2,5% del total de las transferencias de capital. Dentro de esas asistencias, \$1.673,5 millones corresponden al Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo. Asimismo, en el marco del abordaje territorial del Ministerio de Desarrollo Social se realizaron transferencias por \$1.948,0 millones para la articulación socio productiva, asistencia a instituciones y articulación y comunicación comunitaria.

Por otra parte, el Ministerio del Interior realizó transferencias a municipios para infraestructura social por \$1.958,2 millones. Con el mismo destino, desde el Ministerio de Obras Públicas se realizaron transferencias por \$421,4 millones en el marco de las acciones de Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas.

Adicionalmente, se realizaron transferencias desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social para la Promoción, Capacitación y Fomento Cooperativo Mutuo por \$691,8 millones.

Acciones de Salud

Al 30/06/22 se realizaron transferencias por \$8.022,9 millones que corresponden al 2,4% de las erogaciones. El 58,1% de estas transferencias se destinó a la construcción de Hospitales Modulares de Emergencia, para la atención de la emergencia del coronavirus. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas transfirió \$1.955,6 millones a la Construcción de Centros de Desarrollo Infantil y \$877,2 millones para el apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria. Además, el Ministerio de Salud realizó transferencias a las administraciones centrales provinciales por \$321,0 millones.

Infraestructura de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras de infraestructura destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Al 30/06/22 se destinaron \$14.773,1 millones para la ejecución de obras con este destino.

Acciones en el Norte Grande Argentino

Se asistió financieramente a distintas instituciones provinciales y municipales con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en la región del Norte Grande Argentino por un total de \$7.301,9 millones. A continuación se detallan los montos transferidos a cada provincia:

Cuadro N° 18: Acciones en el Norte Grande Argentino.
Gasto por provincia. Al 30/06/22 (en millones de pesos)

Provincia	Devengado	% Part. Devengado
Provincia de Salta	1.025,9	14,1%
Provincia del Chaco	1.401,1	19,2%
Provincia de Santiago del Estero	1.273,4	17,4%
Provincia de Formosa	1.344,9	18,4%
Provincia de Corrientes	674,8	9,2%
Provincia de Tucumán	681,3	9,3%
Provincia de Jujuy	196,8	2,7%
Provincia de Misiones	331,0	4,5%
Provincia de Catamarca	334,1	4,6%
Provincia de Entre Ríos	0,0	0,0%
Resto de Provincias	38,5	0,5%
Total	7.301,9	100,0%

Al 30/06/22 se destinaron \$7.051,9 millones destinados a infraestructura de agua y saneamiento, incluyendo el programa de Desarrollo de la Cuenca del Río Bermejo. Este último, se propone mejorar la gestión hidrológica de la cuenca que cuenta con severos problemas de desbordes y escurrimientos, afectando a la población del área y al potencial productivo de la región debido al impacto sobre la calidad de los suelos. Además, se destacan las transferencias de \$249,9 millones para infraestructura vial.

CUADRO A
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	347,7	347,7	241,7	198,1	57,0%
Poder Judicial de la Nación	639,4	1.438,6	976,7	331,3	23,0%
Ministerio Público	87,9	195,5	117,7	42,6	21,8%
Presidencia de la Nación	362,4	362,4	79,8	63,6	17,6%
Ministerio del Interior	285,7	588,8	328,8	212,5	36,1%
Ministerio de Seguridad	964,6	962,3	341,4	323,7	33,6%
Ministerio de Defensa	767,8	775,7	70,7	65,2	8,4%
Ministerio de Economía	11.636,1	20.413,9	10.024,7	9.545,9	46,8%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	34,0	30,7	15,2%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.108,6	2.071,3	1.147,1	427,5	20,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	90,6	23,9	12,4	12,3	51,5%
Ministerio de Transporte	16.538,9	34.323,9	10.273,2	10.014,3	29,2%
Ministerio de Obras Públicas	145.461,4	175.649,2	95.590,2	67.920,3	38,7%
Ministerio de Educación	10.730,0	7.914,7	5.413,5	4.088,7	51,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.396,2	6.376,7	2.120,7	1.905,5	29,9%
Ministerio de Cultura	495,3	795,6	555,9	273,8	34,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	252,1	317,9	61,8	60,8	19,1%
Ministerio de Salud	458,1	653,8	420,4	121,5	18,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.376,0	3.917,6	855,6	769,0	19,6%
Ministerio de Desarrollo Social	1.726,7	2.151,7	1.605,4	1.310,5	60,9%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	0,0	69,4	0,0	0,0	0,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	200.927,8	259.552,7	130.271,7	97.718,0	37,6%
Poder Legislativo Nacional	887,0	1.369,6	358,2	276,1	20,2%
Poder Judicial de la Nación	1.239,3	2.225,0	831,2	316,3	14,2%
Ministerio Público	1.631,5	1.144,1	382,2	319,6	27,9%
Presidencia de la Nación	1.759,6	2.354,2	620,8	470,6	20,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.339,8	2.766,2	529,0	459,6	16,6%
Ministerio del Interior	2.159,5	3.788,5	1.300,9	1.068,4	28,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional	156,5	381,1	60,3	40,6	10,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	472,4	751,4	260,5	95,2	12,7%
Ministerio de Seguridad	3.487,9	6.665,3	1.618,4	1.079,6	16,2%
Ministerio de Defensa	15.988,7	21.087,4	9.326,3	7.054,5	33,5%
Ministerio de Economía	2.938,8	3.865,4	1.005,8	770,2	19,9%
Ministerio de Desarrollo Productivo	4.628,0	4.975,7	84,6	71,0	1,4%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.934,3	4.400,3	273,5	244,1	5,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	224,9	238,3	97,1	68,3	28,7%
Ministerio de Transporte	1.334,7	6.434,7	619,1	94,3	1,5%
Ministerio de Obras Públicas	8.410,3	11.939,3	4.851,2	3.780,8	31,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	596,1	793,9	127,7	65,6	8,3%
Ministerio de Educación	17.107,2	71.092,2	35.161,1	30.301,3	42,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.725,0	1.795,8	1.254,3	972,1	54,1%
Ministerio de Cultura	1.560,3	4.356,6	1.969,9	1.040,4	23,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	3.992,1	5.106,6	1.700,0	1.533,4	30,0%
Ministerio de Salud	2.984,9	9.956,2	1.650,5	581,3	5,8%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3.453,5	5.297,6	1.139,4	651,7	12,3%
Ministerio de Desarrollo Social	367,0	776,0	32,2	31,5	4,1%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	73,5	179,3	82,9	38,9	21,7%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.452,7	173.740,6	65.337,0	51.425,3	29,6%

CUADRO B
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	347,7	347,7	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	639,4	1.438,6	799,2	125,0%
Ministerio Público	87,9	195,5	107,6	122,5%
Presidencia de la Nación	362,4	362,4	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	285,7	588,8	303,1	106,1%
Ministerio de Seguridad	964,6	962,3	-2,2	-0,2%
Ministerio de Defensa	767,8	775,7	7,9	1,0%
Ministerio de Economía	11.636,1	20.413,9	8.777,8	75,4%
Ministerio de Desarrollo Productivo	202,2	202,2	0,0	0,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.108,6	2.071,3	962,7	86,8%
Ministerio de Turismo y Deportes	90,6	23,9	-66,7	-73,6%
Ministerio de Transporte	16.538,9	34.323,9	17.785,0	107,5%
Ministerio de Obras Públicas	145.461,4	175.649,2	30.187,8	20,8%
Ministerio de Educación	10.730,0	7.914,7	-2.815,4	-26,2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	6.396,2	6.376,7	-19,5	-0,3%
Ministerio de Cultura	495,3	795,6	300,2	60,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	252,1	317,9	65,9	26,1%
Ministerio de Salud	458,1	653,8	195,7	42,7%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	2.376,0	3.917,6	1.541,5	64,9%
Ministerio de Desarrollo Social	1.726,7	2.151,7	425,0	24,6%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	0,0	69,4	69,4	-
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	200.927,8	259.552,7	58.624,9	29,2%
Poder Legislativo Nacional	887,0	1.369,6	482,6	54,4%
Poder Judicial de la Nación	1.239,3	2.225,0	985,7	79,5%
Ministerio Público	1.631,5	1.144,1	-487,4	-29,9%
Presidencia de la Nación	1.759,6	2.354,2	594,6	33,8%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.339,8	2.766,2	426,4	18,2%
Ministerio del Interior	2.159,5	3.788,5	1.629,0	75,4%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	156,5	381,1	224,6	143,6%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	472,4	751,4	279,0	59,1%
Ministerio de Seguridad	3.487,9	6.665,3	3.177,4	91,1%
Ministerio de Defensa	15.988,7	21.087,4	5.098,7	31,9%
Ministerio de Economía	2.938,8	3.865,4	926,6	31,5%
Ministerio de Desarrollo Productivo	4.628,0	4.975,7	347,8	7,5%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	1.934,3	4.400,3	2.466,0	127,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	224,9	238,3	13,4	6,0%
Ministerio de Transporte	1.334,7	6.434,7	5.100,0	382,1%
Ministerio de Obras Públicas	8.410,3	11.939,3	3.529,0	42,0%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	596,1	793,9	197,8	33,2%
Ministerio de Educación	17.107,2	71.092,2	53.985,0	315,6%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.725,0	1.795,8	70,8	4,1%
Ministerio de Cultura	1.560,3	4.356,6	2.796,3	179,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	3.992,1	5.106,6	1.114,6	27,9%
Ministerio de Salud	2.984,9	9.956,2	6.971,3	233,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	3.453,5	5.297,6	1.844,0	53,4%
Ministerio de Desarrollo Social	367,0	776,0	408,9	111,4%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	73,5	179,3	105,9	144,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	81.452,7	173.740,6	92.287,9	113,3%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	282.380,5	433.293,3	150.912,8	53,4%

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA									
		23		1	5	51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA		0	55.800.000	0	0,00	100,00	100,00	2,08	2,08
				2			Fuero Civil									
					13		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civ									
				2	13	51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civ		0	6.700.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
				3			Fuero Comercial									
					15		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.									
				3	15	51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de montantes. JN Comerciales Av.		7.700.000	19.800.000	7.293.224	3,72	96,28	96,28	30,67	42,32
				4			Fuero del Trabajo									
					6		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras. Juzgado Nacional Trabajo Pte Perón 990 CABA									
				4	6	51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Nuevas Máquinas Enfriadoras. Juzgado Nacional Trabajo Pte Perón 990 CABA		0	30.800.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
					7		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1554 CABA									
					7	51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA		0	2.600.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		24					Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA									
				4			Fuero Federal de la Seguridad Social									
					18		Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268									
						51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268									
		24		4	18	51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268		0	14.100.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
				5			Fuero Electoral									
					1		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245									
						51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA									
				5	1	51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA		0	26.100.000	0	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00
				7			Área Cámara de la Plata									
					10		Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P									
						51	Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P									
				7	10	51	Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P		12.149.694	12.149.694	1.133.243	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11		Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires									
						51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires									
					11	51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires		0	30.000.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
					53		Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad									
						51	Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad									
					53	51	Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pío XI y Mitre, Ciudad		31.859.301	31.859.301	3.446.905	89,12	10,88	10,88	10,88	10,88
							Área Cámara Bahía Blanca									

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				6	51		Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación de Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín N° 117. Campana. Buenos Aii		8.800.000	8.800.000	1.239.931	99,80	0,20	0,20	0,00	0,17
				9			Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.									
					51		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.									
				9	51		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.	0	10.000.000		0	sí	sí	sí	0,00	0,00
				18			Área Cámara Tucumán									
				3			Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman									
					51		Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman									
				18	3	51	Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman	0	183.700.000		55.051.890	0,00	95,31	95,31	28,71	33,27
				19			Área Cámara Salta									
				8			Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy									
					51		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy									
				19	8	51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy	0	18.400.000		0	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
				20			Área Cámara Comodoro Rivadavia									
				8			Redecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia. T									
					51		Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia. T									
				20	8	51	Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160, Ushuaia. T	0	79.300.000		19.658.508	0,00	75,00	75,00	17,07	17,07
				22			Fuero Penal Económico									
				3			Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA									
					51		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA									
				22	3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA	10.500.000	10.500.000		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4			Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subs)									
					51		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subs)									
				4	51		Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subs)	7.365.318	7.365.318		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5			Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.									
					51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.									
				5	51		Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.	9.330.940	9.330.940		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335							Corte Suprema de Justicia de la Nación									
	335						Corte Suprema de Justicia de la Nación									
			4				Mandamientos y Notificaciones									
				1			Ampliación y Remodelación de Sede Judicial									
					51		Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones									
335	335		4	0	1	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	500.000	0		0	99,50	sí	sí	sí	sí
				3			Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731									
					51		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731									
				3	51		Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731	3.876.783	376.783		0	0,00	sí	sí	sí	sí

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
		5					Pericias Judiciales									
				4			Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junin 760									
					51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junin 760									
		5	0	4	51		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junin 760	15.750.000	5.750.000		0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
				5			Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito									
					51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito									
				5	51		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	500.000	50.000		0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
				6			Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell									
					51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell									
				6	51		Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell	9.251.569	1.569		0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
				7			Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA									
					51		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA									
				7	51		Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA	500.000	0		0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
				8			Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718									
					51		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718									
				8	51		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	9.108.845	9.108.845		0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
				9			Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol									
					51		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol									
				9	51		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	3.500.000	4.500.000	4.121.645	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í	s/í
				10			Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA									
					51		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA									
				10	51		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junin N° 762, CABA	5.000.000	2.000.000	1.295.958	18,00	s/í	s/í	s/í	s/í	s/í
		21					Justicia de Máxima Instancia									
				1			Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación									
					51		Reciclado de Fachadas y Patios Interiores									
		21	0	1	51		Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	500.000	0		0	99,80	s/í	s/í	s/í	s/í
				53			Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos									
					53		Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	7.000.000	7.000.000		0	0,00	s/í	s/í	s/í	s/í
				8			Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				8	52		Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000	50.000		0	99,50	s/í	s/í	s/í	s/í
				10			Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				10	51		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	500.000	450.000		0	95,23	s/í	s/í	s/í	s/í
				12			Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires									
					51		Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23									
				12	51		Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23	59.283.294	59.783.294		0	32,98	s/í	s/í	s/í	s/í

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022	
						51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010										
					34	51	Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010		20.000.000	5.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)										
					35	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)	500.000		0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i	
					36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias										
					36	51	Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias	500.000		0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i	
					37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia										
					37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	30.000.000		20.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia										
					38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	7.100.000		7.100.000	1.835.665	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)										
					39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	43.241.952		44.891.952	39.252.152	7,71	s/i	s/i	s/i	s/i	
					40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)										
					40	51	Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)	23.005.120		1.005.120	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C										
					41	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C	3.025.919		3.025.919	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					42	51	Consolidación, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia										
					42	51	Consolidación, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	6.093.200		8.443.200	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
		27					Intercepción y Captación de las Comunicaciones										
					1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834										
					27	0	1	51	Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834	500.000	500.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
					3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires										
					3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.059.236		6.359.236	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	
					4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA										
					4	51	Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA	1.819.640		0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					31	51	Readecuación Edificio N° 5 de la Sede Central					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					32		Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza									
						51	Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza									
					32	51	Reparaciones Edilicias en Paso Fronterizo Salvador Mazza					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					33		Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)									
						51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)									
					33	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)	0				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					34		Refuncionalización de la Delegación Salta									
						51	Refuncionalización de la Delegación Salta									
					34	51	Refuncionalización de la Delegación Salta					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					37		Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central									
						51	Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central									
					37	51	Impermeabilización de Cubierta y Mantenimiento de Lucarna del Edificio N° 1 de la Sede Central	0	0		0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					38		Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central									
						51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central									
					38	51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					39		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5									
						51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5									
					39	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5					sí	100,00	100,00	0,00	0,00
					40		Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central									
						51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central									
					40	51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central	0	5.565.000	5.565.000		3,50	10,00	10,00	0,00	0,00
					41		Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central									
						51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central									
					41	51	Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central	1.581.520	1.631.520	1.550.000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51		Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5									
						51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5									
					51	51	Modificación Estructural de la Cámara Transformadora Eléctrica y Cableado Completo Trifásico en los Edificios N° 1 y N° 5	0	0	0		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					52		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca									
						51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca									
					52	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bahía Blanca	0				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					53		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas									
						51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas									
					53	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Posadas	0				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					54		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche									
						51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche									
					54	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Bariloche	0				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					63		Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos									
						51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos									
					63	51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos		0			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					66		Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales									
						51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales									
					66	51	Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales		28.500.000	28.500.000	11.632.500	15,00	100,00	100,00	45,00	45,00
					67		Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA									
						51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA									
					67	51	Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA		50.300.000	50.300.000	0	15,00	85,00	85,00	85,00	85,00
					68		Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes									
						51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes									
					68	51	Refuncionalización del Inmueble de la Delegación Corrientes		0			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					69		Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central									
						51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central									
					69	51	Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central		4.200.000	4.200.000	3.682.406	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					70		Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central									
						51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central									
					70	51	Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central		4.637.871	26.281.269	26.281.268	15,00	85,00	85,00	85,00	85,00
					71		Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy									
						51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy									
					71	51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Jujuy					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen									
						51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen									
					72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen		4.596.637	4.596.637	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					74		Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa									
						51	Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa									
					74	51	Refuncionalización del Inmueble de las Delegación Formosa		0			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					78		Remodelaciones Edilicias Paso Andresito									
						51	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito									
					78	51	Remodelaciones Edilicias Paso Andresito					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					82		Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca									
						51	Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca									
					82	51	Reestructuración Edilicia Paso la Quiaca					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					84		Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres									
						51	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres									
					84	51	Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres		1.400.000	1.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					86		Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera									
						51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera									
					86	51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera		39.594.643	79.594.643	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programa ción Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)									
				6		51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)		193.530.820	193.530.820	76.282.651	71,02	28,98	28,98	3,03	12,55
				8			Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)									
				8		51	Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)	87.935.150	87.935.150		0	2,86	25,00	25,00	0,00	0,00
				9			Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)									
				9		51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	123.786.727	123.786.727	77.605.925	8,04	79,81	79,81	2,73	5,63	
				10			Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)									
				10		51	Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)	17.790.973	17.790.973		0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				11			Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)									
				11		51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	79.617.871	79.617.871	63.045.672	18,97	81,03	81,03	19,07	40,96	
				12			Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA) (FONPLATA ARG 28/16)									
						51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA) (FONPLATA ARG 28/16)									
				12		51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA) (FONPLATA ARG 28/16)	0				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
380							Prefectura Naval Argentina									
	380						Prefectura Naval Argentina									
			31				Policía de Seguridad de la Navegación									
				17			Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata									
						51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata									
380	380		31	0	17	51	Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata	500.936	500.936	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26			Construcción Contrase Comodoro Rivadavia									
						51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia									
				26		51	Construcción Contrase Comodoro Rivadavia	2.151.765	2.151.765	1.508.424	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34			Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)									
				34		51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	29.330.977	29.330.977	12.716.856	0,00	100,00	100,00	3,95	3,95	
				35			Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)									
						51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)									
				35		51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	59.858.950	59.858.950	20.248.144	0,00	89,39	89,39	4,29	4,29	
				38			Construcción de la Prefectura Itatí									
						51	Construcción de la Prefectura Itatí									
				38		51	Construcción de la Prefectura Itatí	8.770.000	8.770.000	530.498	55,34	44,66	44,66	0,00	0,00	
			37				Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina									
				6			Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año									
						51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año									
			37	0	6	51	Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año	37.182.542	37.182.542	0	28,30	71,70	71,70	0,00	0,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
45							Ministerio de Defensa									
	372						Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)									
		372					Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF)									
			17				Desarrollo Tecnológico para la Defensa									
				7			Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa									
					51		Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa									
45	372	372	17	0	7	51	Modernización Informática del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.000.000	6.950.000	423.973	89,00	4,06	4,06	0,31	6,11	
					9		Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa									
					51		Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa									
					9	51	Mejoras en la Infraestructura Edificio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa	3.000.000	6.950.000	0	72,29	7,17	7,17	0,00	0,00	
	374						Estado Mayor General del Ejército Argentino									
		374					Estado Mayor General del Ejército Argentino									
			16				Alistamiento Operacional del Ejército									
				12			Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					51		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin					83,26	s/í	s/í	1,00	12,00
374	374	16	0	12	51		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					13		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					51		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					13	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin	43.993.500	43.993.500	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					14		Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo									
					51		Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo									
					14	51	Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo	170.000.000	170.000.000	34.457.462	57,50	42,50	42,50	10,00	22,50	
					15		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)									
					51		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)									
					15	51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)	304.037.470	304.037.470	0	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00	
					16		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					51		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					16	51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	210.000.000	210.000.000	0	0,00	66,66	66,66	5,00	10,00	
					19		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba									
					51		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba									
					19	51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba	149.990.796	149.990.796	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II									
					60		Transformación de la Aeronave N°21									
					84	60	Transformación de la Aeronave N°21	74.230.050	74.230.050	0	15,00	10,00	10,00	0,00	0,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA									
					18	51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA		26.700.000	28.572.000	0	10,00	20,00	20,00	3,00	3,50
					19		Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires									
					19	51	Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires		0	7.500.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		20					Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear									
					6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3									
						51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3									
		20	0	6	51	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3		654.270	12.792.435	0	90,25	1,75	1,75	0,00	0,00
					13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza									
						51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza									
					13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza		2.575.666	6.420.099	1.982.815	92,75	2,00	2,00	0,20	0,50
					20		Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes									
						51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes									
					20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes		0	20.855.842	855.841	60,45	6,00	6,00	0,50	0,50
					22		Construcción de Reactor RA-10									
						51	Construcción de Reactor RA-10									
					22	51	Construcción de Reactor RA-10		4.097.922.264	6.697.087.941	3.763.722.355	67,91	3,00	3,00	1,40	3,15
					25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación									
						51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación									
					25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación		3.962.520	8.747.670	206.520	74,25	6,00	6,00	0,00	0,10
					26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II									
						51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II									
					26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II		24.170.820	5.198.500	5.198.500	57,25	15,00	15,00	0,00	7,00
					27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III									
						51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III									
					27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III		1	0	0	79,00	1,00	1,00	0,00	0,00
					28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología									
						51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología									
					28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología		15.980.611	41.624.724	5.398.927	17,75	32,00	32,00	0,00	2,00
					29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes									
						51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes									
					29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyentes		0	2.348.000	0	1,25	0,25	0,25	0,00	0,00
					30		Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
						51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
					30	51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro		831.960	16.663.947	194.000	0,10	3,50	3,50	0,00	0,10

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe									
		22		0	4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe		17.203.709	20.686.025	15.007.018	97,92	0,45	0,45	0,15	0,30
						52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes									
						52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes		26.598.714	16.425.170	12.182.475	77,08	0,60	0,60	0,25	0,35
						53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba									
						53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba		13.148.487	9.152.880	1.766.612	88,65	0,50	0,50	0,01	0,06
					9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible									
					9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible									
					9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible		16.900.000	9.023.142	2.402.193	60,00	5,00	5,00	0,25	1,25
					10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura									
					10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructura		8.925.000	5.150.000	0	61,90	0,25	0,25	0,00	0,00
					11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II									
					11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II									
					11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II		8.762.695	13.300.000	2.007.450	15,00	5,00	5,00	1,50	3,00
		23					Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
					6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones									
					6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones									
		23		0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones		31.515.657	46.600.000	1.690.184	97,77	0,50	0,50	0,00	0,01
					9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo									
					9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo		42.218	1.000.000	0	91,00	0,20	0,20	0,00	0,00
					11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares									
					11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares		0	4.000.000	0	25,30	35,00	35,00	0,00	0,00
					13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología									
					13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología		30.336.220	46.000.000	7.606.203	74,90	20,00	20,00	0,00	3,00
					16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10									
					16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10		309.100.000	336.779.447	101.634.154	12,75	10,00	10,00	0,25	1,75
					17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II									
					17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II		148.530.429	67.300.000	14.367.445	25,75	12,00	12,00	3,00	4,50
					18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc									
					18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc		74.555.573	47.320.000	16.461.624	39,50	22,00	22,00	0,00	8,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Dens!		218.800	2.000.000	0	42,85	2,50	2,50	0,00	0,00
					17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja									
						51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja									
					17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	10.587.000	4.422.000	953.990	43,90	4,00	4,00	0,75	0,80	
					18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu									
						51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu									
					18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	2.500.000	4.211.367	147.600	73,00	6,00	6,00	0,20	0,20	
					19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza									
						51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza									
					19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	5.800.000	11.320.000	712.329	61,50	12,00	12,00	0,70	0,70	
					21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza									
						51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza									
					21	51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	0	500.000	0	29,70	0,10	0,10	0,00	0,00	
					23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo									
						51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo									
					23	51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	7.030.200	1.400.000	9.750	7,45	0,75	0,75	0,05	0,05	
					24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael									
						51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael									
					24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	21.300.000	61.640.000	16.140.069	4,00	35,00	35,00	0,25	6,25	
51							Ministerio de Desarrollo Productivo									
	624						Servicio Geológico Minero Argentino									
		624					Servicio Geológico Minero Argentino									
			16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
				8			Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires									
						51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires									
51	624	624	16	0	8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	50.971.418	41.000.000	0	37,73	7,02	7,02	0,00	0,00	
						11	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados v Resid									
						51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados v Resid									
					11	51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados v Resid	0	30.000.000	0	0,00	28,84	28,84	0,00	0,00	
					19		Producción de Información Geológica de Base									
						2	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico									
						51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico									
			19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	85.200.000	85.907.678	23.161.852	18,42	12,61	12,61	0,12	3,30	
						3	Remodelación Repositorio Geológico									
						51	Remodelación Repositorio Geológico									
					3	51	Remodelación Repositorio Geológico	66.028.582	35.292.322	7.527.105	35,72	21,73	21,73	0,24	5,82	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					65	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chemical, Sección: Km. 211,58 - Km. 28					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					66		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sección: KM. 3377,83 - KM. 3401. PROVINCI									
						51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sección: KM. 3377,83 - KM. 3401. PROVINCI									
					66	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sección: KM. 3377,83 - KM. 3401. PROVINCI					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					67		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San J									
						51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San J					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					67	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San J					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					68		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de Sar									
						51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de Sar									
					68	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de Sar					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					71		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe									
						51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe									
					71	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					75		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sección: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La F									
						51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sección: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La F									
					75	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sección: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La F					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					13		Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II									
					1		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Sección: km 590,15									
						51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Sección: km 590,15									
					13	1	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO, Sección: km 590,15	0				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					2		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sección: Km. 0,00 - Km. 81									
						51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sección: Km. 0,00 - Km. 81									
					2	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sección: Km. 0,00 - Km. 81					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					3		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Limite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21									
						51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Limite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21									
					3	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Limite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21	21.982.065	39.095.087	34.013.263	19,18	26,94	26,94	11,64	21,44	
					4		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478.900.									
						51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478.900.									
					4	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478.900.	0	327.496.500	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					7		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.									
						51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.									
					7	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.	0	331.853.915	23.046.500	0,00	0,09	0,09	6,04	6,04	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Fisica acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					88	51	Malla 302 . Ruta Nacional Nº 20. Tramo: Limite San Luis/San Juan - /N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.		106.619.341	6.619.341	0	99,52	0,48	0,48	0,00	0,00
					90		Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)									
						51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)									
					90	51	Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	334.814.254	123.329.779	22.191.335	97,00	3,00	3,00	0,00	0,71	
					92		Crema MALLA 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0151 / RN 0022 - Provincia de Río Negro									
						51	Crema MALLA 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0151 / RN 0022 - Provincia de Río Negro									
					92	51	Crema MALLA 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0151 / RN 0022 - Provincia de Río Negro					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					94		Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro									
						51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro									
					94	51	Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0250 - Provincia de Río Negro	46.529.344	41.243.208	7.816.118	98,93	1,07	1,07	0,00	0,54	
					95		Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 / Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0231 - Provincia de									
						51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 / Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0231 - Provincia de									
					95	51	Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0237 / Nacional Nº 0040 / Nacional Nº 0231 - Provincia de	777.596.686	458.427.360	196.348.850	97,60	2,40	2,40	0,00	2,40	
					96		Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234									
						51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234									
					96	51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					97		Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Córdoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo									
						51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Córdoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo									
					97	51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Córdoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					98		Malla 104 - Ruta Nacional Nº143, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramend									
						51	Malla 104 - Ruta Nacional Nº143, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramend									
					98	51	Malla 104 - Ruta Nacional Nº143, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramend	8.560.969	8.560.969	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	
					99		Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
						51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
					99	51	Malla 116 A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	62.176.567	47.930.589	16.436.717	89,00	6,29	6,29	0,00	0,67	
				5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V									
					2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa									
						51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa									
				5	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa	771.420	771.420	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
						51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
					3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	1.086.006.912	465.455.918	426.360.449	68,96	15,52	15,52	0,79	7,11	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos									
					85	51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					86		Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán									
						51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán									
					86	51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					87		Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
						51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
					87	51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					88		Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
						51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
					88	51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					89		Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
						51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
					89	51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					91		Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
						51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
					91	51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					92		Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
						51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
					92	51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					94		Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires									
						51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires									
					94	51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					95		Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba									
						51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba									
					95	51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					96		Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
						51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
					96	51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					97		Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
						51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
					97	51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				6	51		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito		3.658.884.669	2.112.716.835	451.612.554	71,99	2,58	2,58	0,73	0,91
					52		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanma									
					52		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanma	159.646.767	159.646.767		0	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: Arroyito - Rio Primero (Sub									
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: Arroyito - Rio Primero (Sub	194.064.095	194.064.095		0	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
				7			Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti									
				7	51		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti	2.153.384.494	1.075.758.133	346.886.980	29,36	36,16	36,16	0,09	0,33	
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul									
					53		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul	985.934.508	768.042.232	257.389.534	94,90	5,10	5,10	1,40	2,82	
				9			Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
				9	51		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	1.526.175.177	2.174.650.187	1.669.806.461	48,42	34,39	34,39	11,66	37,66	
				10			Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist									
					51		Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist									
				10	51		Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	2.869.103.139	2.437.803.691	1.506.403.571	34,40	17,60	17,60	4,73	7,72	
				11			Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 34 , tramo Emp. Ruta Nacional Nº 19- Emp. Ruta Provincial Nº 13 v va									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2º Calzada)									
				11	51		Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2º Calzada)	6.689.884.739	3.677.165.494	2.783.192.005	75,70	17,94	17,94	3,00	6,09	
					52		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 34 , tramo Emp. Ruta Nacional Nº 19- Emp. Ruta Provincial Nº 13 v va									
					52		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 34 , tramo Emp. Ruta Nacional Nº 19- Emp. Ruta Provincial Nº 13 v va					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				14			Autopistas Acceso San Juan									
					52		Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan									
				14	52		Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	432.183.445	441.164.446	155.540	90,22	9,78	9,78	0,00	0,00	
				15			Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí									
				15	51		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	181.396.945	956.395.654	956.395.652	2,74	58,36	58,36	8,51	11,79	
					52		Corredor del Cuyo; Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)									
					52		Corredor del Cuyo: Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418)	21.885.001	21.885.001	731.280	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16			Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado									
				16	51		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	7.733.330	78.412.045	70.678.714	87,22	0,07	0,07	0,00	0,00	
				18			Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de									
					51		Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada									
				18	51		Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	3.711.730.710	2.801.851.805	1.990.435.150	61,03	24,98	24,98	2,07	3,73	
					54		Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.									
					54		Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de									
						55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					20	51	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.									
					20	51	Autopista Ruta Ncional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	11.798.524.947	4.723.654.917	2.291.064.229	84,42	10,13	10,13	3,10	6,01	
						52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto									
						54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes									
						55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.									
					21	51	Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg									
					21	51	Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg	1.695.859.922	1.098.185.956	968.522.041	26,32	27,63	27,63	10,88	21,25	
					24	51	Autopista Ruta Nacional N° 33 Rufino - San Eduardo									
					24	51	Autopista Ruta Nacional N° 33 Rufino - San Eduardo	233.772.941	401.484.043	215.132.986	1,39	19,40	19,40	0,49	1,02	
					25	51	Autovia Ruta Nacional N° 11									
					25	51	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11 Tramo: Limite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	921.803.644	638.500.879	510.121.945	32,50	25,31	25,31	9,71	14,48	
						52	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11; Tramo: Limite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion									
						52	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11; Tramo: Limite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	853.566.680	1.312.061.803	952.512.293	25,26	19,08	19,08	10,94	21,52	
						53	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11 Tatane - Formosa									
						53	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11 Tatane - Formosa	408.343.018	229.546.622	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						54	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11 Travesia Urbana Resistencia									
						54	Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovia R.N.N° 11 Travesia Urbana Resistencia	3.594.809.242	1.994.944.413	1.500.545.712	74,47	25,53	25,53	5,42	11,30	
					30	51	Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51									
					30	51	Acceso Norte a Neuquén	686.454.388	550.174.143	482.137.875	74,02	14,17	14,17	2,95	5,61	
					31	52	Corredor Noa: Autopista RN 66 Acceso A Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. Rp 9.- Grupo 3 (BIRF 8810)									
					31	52	Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	175.391.603	175.391.603	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						55	Corredor NOA: Ruta Nacional N° 34 Rosario de la Frontera - Limite Salta/Jujuy (BIRF N° 8810)									
						55	Corredor NOA: Ruta Nacional N° 34 Rosario de la Frontera - Limite Salta/Jujuy (BIRF N° 8810)	5.380.593	2.585.437.858	0	70,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
						57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales N° 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)									
						57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales N° 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	892.584.653	894.584.653	213.412.620	80,60	7,52	7,52	0,58	1,63	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Fisica acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022	
						58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)										
						58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.Nº 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)		112.817.732	62.817.732	0	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	
						59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL Nº 66- GRUPO						s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL Nº 66- GRUPO						s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Carnas v Loais						s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Carqas v Loais						s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia										
						51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia										
						32	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia		1.303.464.959	2.184.288.171	1.559.193.746	87,01	9,80	9,80	2,44	4,20	
						33	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario										
						51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario										
						33	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario		90.043.036	131.339.883	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						34	Travesía Urbana Corrientes										
						51	Travesía Urbana Corrientes										
						34	Travesía Urbana Corrientes		904.860.847	649.587.337	472.815.790	42,61	34,43	34,43	4,33	7,98	
						35	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria										
						51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria										
						35	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria		1.040.635.186	883.517.728	284.157.515	93,94	0,00	0,00	1,26	1,26	
						36	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)										
						51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)										
						36	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)		3.148.840.799	3.214.960.519	1.010.345.619	71,76	28,24	28,24	3,54	8,29	
						37	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R										
						51	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R										
						37	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
						41	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)										
						51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)										
						41	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)		2.515.245	2.515.245	0	40,00	34,29	34,29	0,00	0,00	
						43	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia										
						52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec										
						43	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec		27.484.904	350.353.827	16.355.162	0,00	0,11	0,11	0,61	0,61	
						54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T										
						54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T		56.087.054	1.945.285.405	0	0,00	0,14	0,14	1,15	1,15	
						44	Construcción de Autopista en Variante RNNº 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta										
						51	Construcción de Autopista en Variante RNNº 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta										
						44	Construcción de Autopista en Variante RNNº 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					45		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb									
					51		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb									
					45	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158 Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb	2.195.234.728	1.853.784.409	1.636.333.389	11,00	53,40	53,40	9,95	16,00	
					47		Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional N° 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E									
					52		Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional N° 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: F									
					47	52	Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional N° 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán, Sección: E	0	100.000.000	0	0,00	0,14	0,14	2,94	2,94	
					51		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A									
					51	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A	0	728.787.175	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					52		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de									
					51	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					52	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					53		Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la provincia de Chaco - Empalme RN N° 81, Sección: KM 1178,00 -									
					51	51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la provincia de Chaco - Empalme RN N° 81, Sección: KM 1178,00 -	0	56.231.825	0	s/í	s/í	s/í	1,20	1,20	
					54		Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se									
					51	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se	200.748.326	909.500.148	909.500.148	2,56	32,48	32,48	4,30	10,06	
					54	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se									
					55		Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me									
					51	51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me	72.140.418	349.463.533	298.481.461	5,68	47,16	47,16	11,34	21,62	
					56		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM									
					51	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					56	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					71		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -									
					51	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -	0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					71	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13, Sección: KM. 44+400 -					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				43			Construcción de Rutas Seguras									
				10			Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1									
					7		Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers									
					52		Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers									
			43	10	7	52	Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					21		Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)									
						51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)									
					21	51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)		0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					22		Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos.									
						51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)									
					22	51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)		3.548.636.721	2.716.021.255	2.121.504.054	78,62	21,38	21,38	5,91	11,47
						52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)									
						52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)		890.974.886	1.053.330.507	776.439.811	70,84	12,96	12,96	5,74	8,20
					24		Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311									
						51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311									
					24	51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264,50 - km 311					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					27		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.									
						51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.									
					27	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					35		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°									
						51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°									
					35	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°		0	351.537.551	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
					36		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476									
						51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476									
					36	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451,00 - PK 476					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					38		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.									
						51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.									
					38	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3 Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.		0	510.296.343	0	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00
					39		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400									
						51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400									
					39	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					44		Construcción de Túneles y Puentes Grandes									
						10	Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1									
						3	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces									
						51	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces									
					44	10	Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces		1.041.197.787	929.077.157	434.759.384	55,47	16,70	16,70	3,41	5,64
						7	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura									
						51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura									
					7	51	Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura		914.666.962	906.686.198	409.618.285	65,20	14,40	14,40	4,12	8,82

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada		132.395.464	435.949.665	159.025.599	69,50	6,81	6,81	0,00	7,93
					16	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40									
					16	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40 Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada		1.725.836.704	1.568.531.981	1.368.547.663	83,10	7,89	7,89	2,44	5,09
					52	52	Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					19	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe									
					19	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					21	52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 1 - Prov. Santa Cruz Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 2 - Prov. Santa Cruz									
					21	52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 2 - Prov. Santa Cruz	0	584.104.889	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					23	51	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - Pº de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta									
					23	51	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - Pº de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					52	52	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - Pº de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					54	54	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					55	55	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - Pº de Sico Sección: Campo Amarillo - Pº de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					35	51	Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta. Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.									
					35	51	Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.	0	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					36	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi									
					36	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					46	51	Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (Rpn°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 - Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF 10703)									
					46	51	Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF 10703)					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					48	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut									
					48	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja									
					50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	926.119.647	1.765.561.479	1.372.917.438	50,94	15,10	15,10	6,03	14,05	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Fisica acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programado Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
				23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán		2.008.670	177.301.670	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Limite Tucumán / Sa									
						51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Limite Tucumán / Sa									
					2	51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Limite Tucumán / Sa	101.267.346	229.382.667	158.808.569	49,99	50,01	50,01	7,23	22,55	
					3		Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia d									
						51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia d									
					3	51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753, Provincia c	0				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					4		Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad									
						51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad									
					4	51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad	0	69.230.000	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
					24		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)									
						51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)									
					24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					25		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
						51	Obras de Seguridad en Distrito Salta									
					25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	4.069.030	4.069.030	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					26		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
						51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
					26	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	2.117.997	86.306.060	8.916.948	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
					27		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
					1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
						51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
					27	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	3.506.872	3.814.585	308.100	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
					2		Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe									
						51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe									
					2	51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					28		Obras de Seguridad en Distrito La Rioja									
					1		Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)									
						51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)									
					28	1	51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	0	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					2		Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda									
						51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda									
					2	51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco		208.558.393	175.641.316	0	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
				39			Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca									
				1		51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
				39	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	25.955.000	0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
				40			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro									
				1		51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)									
				40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				2		51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choel Choel Y Travesía Urbana A Choel Choel									
				2	51	51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choel Choel Y Travesía Urbana A Choel Choel	0	46.725.317	0	s/í	s/í	s/í	4,48	4,48	
				41			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
				1		51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
				41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	77.328.834	37.259.235	777.387	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00	
				2		51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colector Norte y Sur. Construcción de rotonda									
				2	51	51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colector Norte y Sur. Construcción de rotonda	0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
				3		51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)									
				3	51	51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)	0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
				4		51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. N° 188 con RP N° 1 (Km 419,29), RP N° 7 (I) (Km 449,19), RP N° 101 (Km 475,00) v RP									
				4	51	51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. N° 188 con RP N° 1 (Km 419,29), RP N° 7 (I) (Km 449,19), RP N° 101 (Km 475,00) v RP	0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
				42			Obras de Seguridad en Distrito Formosa									
				1		51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)									
				42	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)	0			s/í	s/í	s/í	0,00	0,00	
				43			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz									
				1		51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)									
				43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				44			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego									
				1		51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)									
				44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				2	51		Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278,90 – Km 1.288,3	0	168.040.650		0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				43			Mantenimiento de Obras de Arte en 23ºDistrito - Santa Cruz									
				1			Mantenimiento de Obras de Arte En 23ºDistrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)									
					51		Mantenimiento de Obras de Arte En 23ºDistrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)									
			43	1	51		Mantenimiento de Obras de Arte En 23ºDistrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				2			Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (
					51		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (
				2	51		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				44			Mantenimiento de Obras de Arte en 24ºDistrito - Tierra del Fuego									
				1			Mantenimiento de obras de arte en 24ºdistrito - TIERRA DEL FUEGO									
					51		Mantenimiento de obras de arte en 24ºdistrito - TIERRA DEL FUEGO									
			44	1	51		Mantenimiento de obras de arte en 24ºdistrito - TIERRA DEL FUEGO					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
			53				Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo									
				1			Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo - Fase I									
				1			Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16. Municipalidad de Cañuelas, Provincia de Buen									
					51		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000.									
			53	1	1	51	Municipalidad: Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000.	0				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					52		Municipalidad: Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000.									
					52		Municipalidad: Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000.	0				s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					53		Municipalidad: Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100.									
					53		Municipalidad: Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				2			Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección III: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares									
					51		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares. Pr									
				2	51		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares. Pr					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					52		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares.									
					52		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					53		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección III: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares									
					53		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección III: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				3			Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas.									
					51		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas.									
				3	51		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas.					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
				4			Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección III: Km 16,000 A Km 24,400. Municipal									
					51		Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Municipal									
				4	51		Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Municipal					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso									
					12	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					13		Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipal									
					13	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9.000. Municipalid					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					13	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9.000. Municipalid					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipal					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipal					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					14		Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos A									
					14	51	Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos A					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					15		Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gon									
					15	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonza					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gon					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gon					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					16		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Ca									
					16	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Partido de Carlos Casa					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Ca					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Ca					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					17		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos A									
					17	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos A					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					18		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID									
					18	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					19		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S									
					19	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					53		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
					53		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino S					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					20		Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600. Muni									
						51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000, Munci									
				20		51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincie N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000, Munci					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Muni									
						52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincie N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Muni					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección III: Km 16,000 A Km 24,000. Mu									
						53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincie N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección III: Km 16,000 A Km 24,000. Mu					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección IV: Km 24,000 A Km 32,000. Mun									
						54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincie N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección IV: Km 24,000 A Km 32,000. Mun					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
						55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600. Muni									
						55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincie N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32,000 A Km 39,600. Muni					s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
613							Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
	613						Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
			20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento									
				1			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento									
					89		Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID									
						51	Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID									
613	613		20	1	89	51	Construcción Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas en San Miguel de Tucumán - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID	0	36.366.356		35.426.255	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2	Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable									
						28	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
						51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
				2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	156.241.232	86.985.108		4.468.163	90,89	9,11	9,11	0,00	0,00
						36	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)									
						51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)									
						36	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	619.615.982	619.795.546		6.635.950	72,77	27,23	27,23	3,91	6,86
						37	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)									
						51	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)									
						37	Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)	12.342.869	12.342.869		303.168	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						70	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v									
						51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v									
						70	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v	14.000.000	14.000.000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						76	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR))									
						51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
						76	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	72.151.885	72.651.885		3.535.235	0,00	55,08	55,08	0,39	0,39

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal									
					59		Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)									
						51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)									
				3	59	51	Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC - AR)	11.376.025	24.615.558		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						72	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)									
						51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)									
					72	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Desagües Cloacales - San Carlos de Bariloche (PAYS II) (BID 3451 OC-AR)	3.560.067	3.560.067		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires									
						51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires									
					76	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires					0,00	15,04	15,04	0,00	0,00
					77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)									
						52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)									
					77	52	Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR)	517.365.657	481.266.322		87.457	99,24	0,76	0,76	0,00	0,76
						53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)									
						53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	1.442.542.631	1.442.722.195		613.440.678	80,14	19,86	19,86	7,97	11,36
					88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)									
						51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)									
					88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)	262.232.090	262.513.107		151.521.301	56,36	43,64	43,64	9,43	12,28
				5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II									
					24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
						51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
				5	24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	289.243.628	289.779.153		0	0,00	60,40	60,40	4,04	4,04
						26	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Sali - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)									
						51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Sali - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)									
					26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Sali - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	493.225.794	493.725.794		91.939.877	2,49	54,90	54,90	1,43	8,99
					27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)									
						51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)									
					27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Río Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)	378.165.722	378.665.722		0	8,23	54,90	54,90	2,32	2,74
					28		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa									
						51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa									
					28	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa					0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
					29		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa									
						51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa									
					29	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa					0,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						32	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	55.299.735	77.315.233	49.469.156	20,00	32,00	32,00	s/í	26,00
						33	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						33	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	87.304.303	63.197.895	22.445.007	27,00	32,00	32,00	s/í	9,00
						34	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						34	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.537.658	41.641.776	12.824.829	34,00	41,00	41,00	s/í	11,00
						36	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
						36	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	27.193.123	67.982.807	14.724.278	0,00	39,00	39,00	s/í	0,00
						40	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						40	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	88.367.105	63.537.152	37.168.827	22,00	33,00	33,00	s/í	14,00
						41	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
						41	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	60.799.609	49.520.816	40.740.945	24,00	67,00	67,00	s/í	29,00
						42	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)									
						51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)									
						42	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455)	83.556.480	65.245.471	22.111.878	18,00	73,00	73,00	s/í	11,00
						43	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						43	51	Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	45.387.969	67.743.238	0	0,00	81,00	81,00	s/í	0,00
						44	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						44	51	Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	16.753.409	83.767.044	24.825.554	0,00	79,00	79,00	s/í	0,00
						45	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)									
						51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)									
						45	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229)	102.210.871	71.734.308	55.432.189	32,00	68,00	68,00	s/í	36,00
						46	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
						46	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	67.074.549	23.222.887	1.771.597	22,00	78,00	78,00	s/í	4,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					47		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM									
					51		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM									
					47	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	83.001.619	649.924	649.923	47,00	53,00	53,00	s/í	0,00	
					48		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P									
					51		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P									
					48	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	51.399.573	1.522.194	1.522.193	19,00	73,00	73,00	s/í	4,00	
					50		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires									
					51		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires									
					50	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	31.225.479	64.798.320	19.698.010	0,00	63,00	63,00	s/í	1,00	
					51		Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					51	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	84.646.529	71.479.141	40.710.787	10,00	81,00	81,00	s/í	20,00	
					52		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A									
					52	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Martí y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A	86.327.737	87.206.601	21.856.506	0,00	81,00	81,00	s/í	10,00	
					53		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
					53	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	66.541.945	57.950.438	27.340.947	10,00	72,00	72,00	s/í	16,00	
					54		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID									
					51		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID									
					54	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID	67.499.297	85.233.096	0	0,00	81,00	81,00	s/í	0,00	
					55		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					55	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	40.611.156	69.078.732	27.598.653	7,00	81,00	81,00	s/í	17,00	
					56		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					56	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	38.944.138	72.963.112	29.859.128	0,00	81,00	81,00	s/í	24,00	
					66		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					66	51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	51.613.205	37.815.131	28.762.517	39,00	35,00	35,00	s/í	20,00	
					71		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					71	51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	57.383.031	47.365.317	32.444.128	29,00	39,00	39,00	s/í	24,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
					27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)		62.697.806	38.968.730	29.980.093	0,00	39,00	39,00	s/í	0,00
					28		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	56.373.145	34.431.119	25.060.943	0,00	39,00	39,00	s/í	0,00	
					29		Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					29	51	Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	15.697.540	0	0	0,00	39,00	39,00	s/í	0,00	
					34		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					34	51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	93.002.295	69.478.915	29.779.128	0,00	39,00	39,00	s/í	0,00	
					60		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					60	51	Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	66.786.453	66.786.453	17.846.922	0,00	33,00	33,00	s/í	0,00	
					64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									
					51		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									
					64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	12.402.381	12.402.381	2.713.728	92,00	8,00	8,00	s/í	0,00	
					65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
					51		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
					65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	12.128.806	12.128.806	1.899.006	100,00	0,00	0,00	s/í	0,00	
					66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
					51		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
					66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	14.295.805	14.295.805	1.849.990	55,00	0,00	0,00	s/í	0,00	
					4		Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba									
					1		Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza									
					51		Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza									
					4	1	Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza	6.002.924	6.002.924	0	16,00	68,00	68,00	s/í	0,00	
					8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					8	51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	36.571.712	24.059.236	18.004.504	50,00	36,00	36,00	s/í	32,00	
					9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					9	51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	33.814.037	29.838.427	17.071.413	48,00	40,00	40,00	s/í	20,00	
					32		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					51		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
					32	51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	63.281.930	24.734.252	20.448.460	69,00	31,00	31,00	s/í	18,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programa ción Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022	
						51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)										
				98		51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracín de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	76.785.154	76.704.208		58.839.689	0,00	42,00	42,00	s/i	0,00	
				5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino										
					8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
				5	8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	118.423.037	66.211.947		59.711.119	44,00	52,00	52,00	s/i	29,00	
					9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	123.603.395	68.237.431		53.162.572	39,00	52,00	52,00	s/i	22,00	
					10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)										
					51		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)										
					10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)	117.926.238	48.752.800		48.752.799	48,00	51,00	51,00	s/i	34,00	
					11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)										
					51		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)										
					11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC AR)	127.377.552	67.716.831		63.087.459	43,00	52,00	52,00	s/i	28,00	
					29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	53.182.616	24.721.160		23.501.831	58,00	33,00	33,00	s/i	24,00	
					30		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56.933.353	31.838.828		31.838.827	46,00	39,00	39,00	s/i	54,00	
					31		Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					31	51	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	61.630.687	101.701.692		58.118.587	2,00	39,00	39,00	s/i	32,00	
					58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.480.578	36.930.287		33.692.392	35,00	39,00	39,00	s/i	0,00	
					59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					51		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
					59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.349.863	41.614.763		29.422.261	22,00	39,00	39,00	s/i	27,00	
					60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
					51		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
					60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	54.400.934	24.872.796		24.834.975	59,00	39,00	39,00	s/i	38,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				98			Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
				98	51		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	45.050.687	35.291.456	27.797.333	31,00	57,00	57,00	s/í	28,00	
				6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino									
					25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
				6	25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.301.990	301.990	0	100,00	0,00	0,00	s/í	0,00	
					28		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					28	51	Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	6.992.236	992.236	0	100,00	0,00	0,00	s/í	0,00	
				9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II									
					1		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
				9	1	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	105.992.818	74.360.355	37.702.271	31,00	20,00	20,00	s/í	16,00	
					2		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					2	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	90.207.291	58.170.116	32.072.377	38,00	20,00	20,00	s/í	12,00	
					3		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					3	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	53.343.759	27.332.423	27.332.422	43,00	20,00	20,00	s/í	22,00	
					4		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
					4	51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	73.753.564	34.917.700	34.917.700	56,00	20,00	20,00	s/í	21,00	
					5		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV									
					51		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV									
					5	51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV	74.019.101	51.294.670	32.571.872	57,00	15,00	15,00	s/í	18,00	
					7		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					7	51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	41.241.080	56.851.309	21.570.743	15,00	44,00	44,00	s/í	13,00	
					8		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					51		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
					8	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	67.131.018	52.526.605	35.467.565	40,00	20,00	20,00	s/í	18,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022	
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)		57.590.820	36.927.151	21.613.559	33,00	49,00	49,00	s/í	23,00	
						52	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)										
						52	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)		27.360.363	14.920.070	12.508.209	52,00	48,00	48,00	s/í	27,00	
						53	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)										
						53	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)		64.569.167	43.416.182	21.875.332	38,00	39,00	39,00	s/í	16,00	
						54	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)										
						54	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)		30.050.795	18.347.031	13.454.912	55,00	45,00	45,00	s/í	28,00	
						55	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						55	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		28.038.281	16.238.519	10.539.221	45,00	55,00	55,00	s/í	38,00	
						56	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)										
						56	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)		28.629.547	17.155.907	10.648.386	42,00	39,00	39,00	s/í	28,00	
						57	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)										
						57	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)		51.507.913	29.867.469	26.534.281	39,00	39,00	39,00	s/í	37,00	
						58	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						58	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		54.431.080	28.026.747	26.089.379	61,00	39,00	39,00	s/í	35,00	
						59	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						59	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		44.289.205	33.625.778	12.190.902	31,00	44,00	44,00	s/í	21,00	
						60	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						60	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		35.812.708	14.846.019	12.364.602	72,00	28,00	28,00	s/í	16,00	
						61	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)										
						61	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)		38.831.346	26.827.750	15.900.892	32,00	44,00	44,00	s/í	40,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
				9	51		Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)		1.939.514.555	1.775.514.555	650.434.154	92,99	2,00	2,00	0,50	1,00
				12			Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B									
					51		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B									
				12	51		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	132.131.644	126.131.644	73.500.000	1,50	2,00	2,00	0,00	0,00	
				13			Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)									
					51		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)									
				13	51		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	114.800.072	114.800.072	28.730.000	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00	
				17			Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
					1		Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas									
					52		Configuración de Vehículo Espacial									
				17	0	1	52	Configuración de Vehículo Espacial	1.264.066.829	1.103.066.829	68.870.040	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C									
					51		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C									
				5	51		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C	213.022.390	213.022.390	1.342.311	4,10	2,00	2,00	0,50	1,00	
72							Ministerio de Cultura									
	337						Ministerio de Cultura									
		337					Ministerio de Cultura									
			1				Actividades Centrales									
				1			Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA									
					51		Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA									
72	337	337	1	0	1	51	Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA	737.960	737.960	737.960	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
				18			Gestión de Museos Nacionales									
					6		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales									
					51		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales									
				18	0	6	51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	56.635.916	41.035.916	10.959.653	87,00	13,00	13,00	13,00	13,00
					7		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1									
					51		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1									
				7	51		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	49.896.403	187.211.403	31.232.945	87,00	13,00	13,00	6,00	13,00	
				1			Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA									
					6		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
					51		Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
				1	6	51	Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	53.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	113						Teatro Nacional Cervantes									
		113					Teatro Nacional Cervantes									
			16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
					27		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11									
					51		Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11									
	113	113	16	0	27	51	Ejecución de Obras Adecuación e Implementación Cantina Piso 11	5.426.000	5.426.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2									
					88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	49.846.602	84.896.651	42.827.325	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1				Desarrollo de Infraestructura									
					2		Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III									
						51	Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III									
			1	2	51	51	Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III	750.000	750.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3		Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III									
						51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III									
					3	51	Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III	4.300.000	5.658.462	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA									
						51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA									
					9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	7.800.000	0	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral									
						51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral									
					11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	18.574.206	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
					12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste									
						51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste									
					12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	17.852.059	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
					18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA									
						51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA									
					18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	13.500.000	16.237.468	0	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
						51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	26.900.000	33.226.979	0	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste									
						51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste									
					22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	8.990.606	21.000.000	0	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
					23		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I									
						51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I									
					23	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I	0	52.800.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
80							Ministerio de Salud									
	310						Ministerio de Salud									
		310					Ministerio de Salud									
			1				Actividades Centrales									
				1			Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL									
						51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL									
80	310	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	3.909.836	3.909.836	0	45,00	55,00	55,00	48,00	55,00	
							Cobertura de Emergencias Sanitarias									

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022	
						54	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						55	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)										
						55	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						56	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)										
						56	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						57	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)										
						57	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						58	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)										
						58	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						59	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)										
						59	Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						60	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)										
						60	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						61	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)										
						61	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
						62	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (RCIF N° 2215)										
						62	Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215)		1.547.255	1.547.255		0	0,00	31,00	31,00	s/í	s/í
					37		Prevención y Control de Enfermedades Endémicas										
							Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)										
						6											
						51	Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)										
						37	Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019)		22.078.100	22.078.100		0	0,00	20,41	20,41	s/í	s/í
						52	Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)										
						52	Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019)		10.682.900	10.682.900		0	0,00	30,00	30,00	s/í	s/í
						53	Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)										
						53	Construcción de Base Nacional en San Juan (FONPLATA ARG 41/2019)		12.463.400	12.463.400		0	0,00	30,00	30,00	s/í	s/í
						55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)										
						55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)		0				0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						7	Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)										
						51	Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)										
						7	Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019)						0,00	63,27	63,27	0,00	0,00
						52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)										
						52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)		0				0,00	50,62	50,62	0,00	0,00
						53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)										
						53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)						0,00	72,31	72,31	0,00	0,00
						55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)										
						55	Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019)						0,00	60,26	60,26	0,00	0,00

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
		906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán									
			56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud									
				1			Desarrollo y Producción de Biológicos									
					28		Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA									
						51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA									
906	906	906	56	1	28	51	Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA	13.525.000	525.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	s/i	0,00
					37		Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides									
						51	Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides									
					37	51	Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides	31.997.264	85.797.264	0	22,11	77,89	77,89	77,89	s/i	3,75
					38		Readec Edificia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA									
						51	Readec Edificia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA									
					38	51	Readec Edificia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA	27.671.606	25.471.606	0	16,55	83,45	83,45	83,45	s/i	6,09
					39		Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B									
						51	Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B									
					39	51	Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B	14.800.000	17.190.000	10.446.209	27,23	72,77	72,77	72,77	s/i	5,00
					40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA									
						51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA									
					40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA	20.050.000	23.335.000	12.803.335	21,75	78,25	78,25	78,25	s/i	15,00
				2			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas									
					14		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA									
						51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA									
				2	14	51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA	30.686.688	30.686.688	5.431.702	70,00	30,00	30,00	30,00	s/i	5,00
				6			Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias									
					12		Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé									
						51	Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé									
				6	12	51	Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé	14.136.589	4.136.589	2.944.941	85,00	15,00	15,00	15,00	s/i	8,00
				8			Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias									
					15		Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi									
						51	Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi									
				8	15	51	Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi	45.700.000	27.050.000	24.271.259	85,00	15,00	15,00	15,00	s/i	12,00
				12			Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales									
					1		Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores									
						51	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores									
				12	1	51	Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores	308.000.000	135.500.000	100.145.094	92,23	7,77	7,77	7,77	s/i	4,58
							Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca									

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
		909					Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca									
			59				Atención de Pacientes (DIS)									
					20		Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)									
						51	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)									
	909	909	59	0	20	51	Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)		4.000.000	4.000.000	0	48,96	25,52	25,52	0,00	0,00
						33	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)									
						51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)									
					33	51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)		5.095.000	5.095.000	0	20,00	80,00	80,00	40,00	40,00
					35		Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)									
						51	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)									
					35	51	Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)		2.500.000	2.500.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
					36		Refacción de Lavadero Central (DIS)									
						51	Refacción de Lavadero Central (DIS)									
					36	51	Refacción de Lavadero Central (DIS)		20.000.000	22.000.000	3.403.540	20,53	79,47	79,47	12,57	12,57
81							Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
	317						Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
		317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
			60				Política Ambiental en Recursos Naturales									
				5			Protección Ambiental de los Bosques Nativos									
					12		Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)									
						51	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)									
81	317	317	60	5	12	51	Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)		88.790.000	88.790.000	27.021.823	46,00	54,00	54,00	44,00	54,00
						13	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR									
						51	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR									
					13	51	Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, er las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR		28.410.000	28.410.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II (BIRF N° 8493)									
						51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II (BIRF N° 8493)									
					15	51	Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II (BIRF N° 8493)		213.080.000	213.080.000	42.510.312	38,00	62,00	62,00	39,00	62,00
			61				Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible									
					1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF -AF/AI/									
						51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF -AF/AU/									
			61	0	1	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco de Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF -AF/AU/		0	34.630.000	0	0,00	80,00	80,00	1,39	5,29
			63				Control Ambiental									
					31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)									
						51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)									
			63	0	31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID N° 3249/OC-AR)		341.318.935	341.318.935	211.537.483	23,50	61,69	61,69	15,79	27,65

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programa do Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)									
				5		51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viv para Guardaparques en el Parque Marino Coster(GEF TF 0A0233/AR)	2.218.563	2.218.563	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
					44		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)									
					51		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)									
					44	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)	5.316.513	5.316.513	0	35,82	64,18	64,18	8,09	8,09	
					45		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)									
					51		Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)									
					45	51	Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)	14.449.488	14.449.488	89.555	98,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
					46		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)									
					51		Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)									
					46	51	Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)	11.287.110	11.287.110	0	100,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
			23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID N° 2606/OC-AR)									
					24		Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Trafal (BID N° 2606/OC-AR)									
					51		Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Trafal (BID N° 2606/OC-AR)									
			23	0	24	51	Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estac Lindante Peñon Villa Trafal (BID N° 2606/OC-AR)	2.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25		Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)									
					51		Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)									
					25	51	Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Com San en Isla Victoria en Parque Nac Nahuel H(BID N° 2606/OC-AR)	5.300.000	0	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i	s/i
					26		Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)									
					51		Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)									
					26	51	Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID N° 2606/OC-AR)	24.000.000	391.993.501	63.955.783	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
					33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
					51		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
					33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	7.931.909	53.022.060	6.804.640	25,24	74,76	74,76	14,83	14,83	18,48
					45		Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Quetihue (BID N° 2606/OC-									
					51		Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Quetihue (BID N° 2606/OC-									
					45	51	Proveeduría , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Península de Quetihue (BID N° 2606/OC-	10.050.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
					3		Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos									
					51		Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos									
			24	0	3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos	0	8.400.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00	0,00
					7		Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos-									
					51		Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N									
					7	51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Río Cincel - M.N	0	112.600.000	0	0,00	43,33	43,33	0,00	0,00	

Jur	SAF	UD	Pg	Sp	Py	Ob	Descripción	Ejec. Financiera acum. al 2021	Crédito inicial 2022	Vigente al 30/06/2022	Devengado al 30/06/2022	Ejec. Física acum. al 2021	Programación Inicial 2022	Programado Vig. al 30/06/2022	Ejecutado 2º trim	Ejecutado al 30/06/2022
						51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos									
				84		51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos	0	16.800.000		0	s/í	s/í	s/í	0,00	0,00
85							Ministerio de Desarrollo Social									
	311						Ministerio de Desarrollo Social									
		311					Ministerio de Desarrollo Social									
			52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
				1			Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					51		Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
85	311	311	52	0	1	51	Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIS) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	1.326.660.782	726.069.601		559.679.119	63,17	36,83	36,83	13,18	30,34
						2	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					51		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	280.000.000	1.073.104.272		609.713.558	0,00	93,87	93,87	22,58	39,81
						3	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					51		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	120.000.000	352.486.909		141.152.836	0,00	97,03	97,03	2,64	16,98

CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	53.588,5	139.317,8	65.224,1	52.390,1	35,1%
Provincia de Buenos Aires	74.179,6	98.136,6	43.311,3	27.619,2	18,5%
Provincia de Catamarca	2.590,9	3.077,7	1.257,0	753,4	0,5%
Provincia de Córdoba	16.850,3	13.518,0	8.199,6	7.402,1	5,0%
Provincia de Corrientes	3.422,8	3.360,0	2.568,9	2.440,6	1,6%
Provincia del Chaco	5.398,7	4.676,3	4.101,9	2.880,3	1,9%
Provincia del Chubut	3.893,7	5.600,3	6.741,3	3.123,0	2,1%
Provincia de Entre Ríos	9.890,6	9.539,5	6.005,0	5.618,0	3,8%
Provincia de Formosa	5.926,1	5.921,7	3.622,4	3.001,4	2,0%
Provincia de Jujuy	1.690,7	2.251,9	953,8	608,2	0,4%
Provincia de La Pampa	2.649,4	2.689,4	1.112,3	996,4	0,7%
Provincia de La Rioja	8.198,9	7.124,5	4.578,4	4.473,3	3,0%
Provincia de Mendoza	6.215,7	8.076,6	4.026,6	3.182,8	2,1%
Provincia de Misiones	3.014,6	3.234,6	2.046,4	1.879,8	1,3%
Provincia del Neuquén	4.118,8	4.241,9	2.400,9	2.088,7	1,4%
Provincia de Río Negro	6.680,2	5.570,0	2.881,6	2.349,0	1,6%
Provincia de Salta	10.279,7	11.529,0	6.155,6	5.539,6	3,7%
Provincia de San Juan	1.903,8	2.142,7	1.150,7	818,6	0,5%
Provincia de San Luis	867,9	1.690,7	1.181,0	724,3	0,5%
Provincia de Santa Cruz	1.290,0	4.581,0	810,3	407,6	0,3%
Provincia de Santa Fe	12.022,1	12.860,1	7.242,3	6.411,2	4,3%
Provincia de Santiago del Estero	2.156,7	2.348,3	1.296,0	953,8	0,6%
Provincia de Tucumán	5.072,7	6.077,4	1.948,8	1.577,4	1,1%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	3.762,1	10.772,6	529,7	216,2	0,1%
Interprovincial	8.649,0	25.990,6	2.683,9	2.551,5	1,7%
Nacional	25.913,8	36.634,0	13.131,3	8.749,4	5,9%
No Clasificado	2.153,2	2.329,9	447,7	387,2	0,3%
Total Inversión Real Directa	282.380,5	433.293,3	195.608,7	149.143,3	100,0%

CUADRO E
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1.291,0	1.305,0	259,8	259,8	19,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.811,2	3.153,3	31,4	31,4	1,0%
Ministerio del Interior	7.767,1	7.117,2	3.560,5	2.589,9	36,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,0	9,6	9,6	9,6	100,0%
Ministerio de Seguridad	959,1	601,6	601,6	601,6	100,0%
Ministerio de Economía	45.603,1	48.644,7	20.079,6	20.079,2	41,3%
Ministerio de Desarrollo Productivo	33.423,1	32.878,0	5.599,7	5.581,5	17,0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	6.792,2	4.475,6	2.189,7	1.741,4	38,9%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.667,5	3.560,0	1.126,1	1.126,1	31,6%
Ministerio de Transporte	20.970,9	25.620,9	10.691,0	1.566,7	6,1%
Ministerio de Obras Públicas	172.597,2	199.757,7	89.843,7	89.566,4	44,8%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	300.842,4	300.251,4	126.933,9	123.119,6	41,0%
Ministerio de Educación	46.611,6	72.131,9	9.629,5	9.629,5	13,3%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.105,5	13.700,3	8.614,1	8.501,5	62,1%
Ministerio de Cultura	574,5	872,5	92,2	92,2	10,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	342,9	342,9	45,1	45,1	13,2%
Ministerio de Salud	3.059,1	2.886,6	648,7	607,6	21,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,2	2.177,3	1.665,7	1.665,7	76,5%
Ministerio de Desarrollo Social	12.241,3	11.902,7	4.963,7	4.824,0	40,5%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	1.792,2	1.617,0	37,9	37,9	2,3%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	252.667,2	264.215,6	65.288,5	65.288,5	24,7%
Total Transferencias de Capital	917.818,4	997.221,8	351.911,9	336.965,2	33,8%

CUADRO F
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1.291,0	1.305,0	14,0	1,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	2.811,2	3.153,3	342,1	12,2%
Ministerio del Interior	7.767,1	7.117,2	-649,9	-8,4%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,0	9,6	9,6	-
Ministerio de Seguridad	959,1	601,6	-357,5	-37,3%
Ministerio de Economía	45.603,1	48.644,7	3.041,7	6,7%
Ministerio de Desarrollo Productivo	33.423,1	32.878,0	-545,2	-1,6%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	6.792,2	4.475,6	-2.316,6	-34,1%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.667,5	3.560,0	-1.107,5	-23,7%
Ministerio de Transporte	20.970,9	25.620,9	4.650,0	22,2%
Ministerio de Obras Públicas	172.597,2	199.757,7	27.160,5	15,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	300.842,4	300.251,4	-591,0	-0,2%
Ministerio de Educación	46.611,6	72.131,9	25.520,3	54,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.105,5	13.700,3	11.594,8	550,7%
Ministerio de Cultura	574,5	872,5	298,0	51,9%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	342,9	342,9	0,0	0,0%
Ministerio de Salud	3.059,1	2.886,6	-172,5	-5,6%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,2	2.177,3	1.478,1	211,4%
Ministerio de Desarrollo Social	12.241,3	11.902,7	-338,6	-2,8%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	1.792,2	1.617,0	-175,2	-9,8%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	252.667,2	264.215,6	11.548,4	4,6%
Total Transferencias de Capital	917.818,4	997.221,8	79.403,4	8,7%

CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	248.090,9	257.631,9	138.745,8	138.654,0	41,1%
Provincia de Buenos Aires	87.198,4	101.189,3	52.055,3	47.676,8	14,1%
Provincia de Catamarca	2.959,8	5.042,0	3.362,7	3.130,0	0,9%
Provincia de Córdoba	14.942,2	12.770,6	6.540,5	5.823,5	1,7%
Provincia de Corrientes	4.764,7	5.020,9	3.831,3	2.994,7	0,9%
Provincia del Chaco	9.855,2	12.324,2	8.221,6	7.488,6	2,2%
Provincia del Chubut	3.233,9	4.787,2	1.245,9	1.175,6	0,3%
Provincia de Entre Ríos	6.155,6	10.669,3	6.595,5	5.683,1	1,7%
Provincia de Formosa	4.615,8	6.228,2	5.732,5	5.629,8	1,7%
Provincia de Jujuy	3.185,3	3.926,6	1.651,0	1.437,7	0,4%
Provincia de La Pampa	1.013,7	3.143,8	1.080,1	1.074,9	0,3%
Provincia de La Rioja	64.275,1	79.132,2	14.703,1	14.188,5	4,2%
Provincia de Mendoza	4.019,1	6.469,8	3.229,8	2.754,4	0,8%
Provincia de Misiones	3.541,6	4.252,2	3.750,5	3.696,6	1,1%
Provincia del Neuquén	5.243,5	9.135,7	4.842,9	3.446,1	1,0%
Provincia de Río Negro	3.947,3	4.579,5	4.023,2	2.126,7	0,6%
Provincia de Salta	5.889,5	8.433,5	3.118,1	3.098,8	0,9%
Provincia de San Juan	3.698,7	4.649,2	3.160,7	3.076,7	0,9%
Provincia de San Luis	5.861,3	5.508,1	3.578,5	3.269,9	1,0%
Provincia de Santa Cruz	39.131,8	39.223,4	16.870,0	16.715,7	5,0%
Provincia de Santa Fe	6.713,0	11.088,0	6.445,7	5.437,7	1,6%
Provincia de Santiago del Estero	2.875,0	3.276,9	5.638,3	5.164,6	1,5%
Provincia de Tucumán	4.998,8	7.992,0	5.548,3	5.439,9	1,6%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	2.444,1	4.422,5	2.898,2	2.738,7	0,8%
Interprovincial	149.303,2	151.392,9	17.318,7	17.318,7	5,1%
Nacional	228.856,3	233.027,3	27.619,5	27.619,5	8,2%
Binacional	978,6	978,6	104,1	104,1	0,0%
No Clasificado	26,0	926,0	0,0	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	917.818,4	997.221,8	351.911,9	336.965,2	100,0%

Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y
FUNCIÓN AL 30/06/2022
(en millones de \$)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	330,9	0,0	330,9
Judicial	1.143,8	0,0	1.143,8
Dirección Superior Ejecutiva	727,6	0,0	727,6
Relaciones Exteriores	36,6	0,0	36,6
Relaciones Interiores	1.280,6	11.090,0	12.370,6
Administración Fiscal	236,1	0,0	236,1
Control de la Gestión Pública	7,9	0,0	7,9
Información y Estadística Básicas	118,2	0,0	118,2
Subtotal	3.881,8	11.090,0	14.971,8
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	6.996,7	0,0	6.996,7
Seguridad Interior	1.393,8	601,6	1.995,4
Sistema Penal	610,1	649,2	1.259,3
Inteligencia	211,7	0,0	211,7
Subtotal	9.212,3	1.250,8	10.463,1
Servicios Sociales			
Salud	365,3	8.022,9	8.388,2
Promoción y Asistencia Social	1.501,7	8.396,1	9.897,9
Seguridad Social	1.495,4	16,6	1.511,9
Educación y Cultura	36.030,3	13.706,9	49.737,1
Ciencia y Técnica	13.064,7	9.663,7	22.728,3
Trabajo	100,3	45,1	145,5
Vivienda y Urbanismo	65,6	132.609,8	132.675,3
Agua Potable y Alcantarillado	1.948,1	66.483,2	68.431,4
Subtotal	54.571,3	238.944,3	293.515,7
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	35,3	34.142,3	34.177,6
Comunicaciones	218,5	669,8	888,2
Transporte	78.046,4	30.469,0	108.515,5
Ecología y Medio Ambiente	2.220,0	10.666,3	12.886,3
Agricultura	511,7	1.741,4	2.253,1
Industria	52,7	4.373,5	4.426,2
Comercio, Turismo y Otros Servicios	268,3	491,6	759,9
Seguros y Finanzas	125,0	3.126,0	3.251,0
Subtotal	81.477,8	85.680,0	167.157,8
Total	149.143,3	336.965,2	486.108,4
