

Seguimiento Físico Financiero
Seguimiento Físico Financiero

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL


Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Semestre 2024

INTRODUCCIÓN


La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2024 alcanza los \$3.088.742,3 millones de crédito, con la siguiente evolución nominal¹:

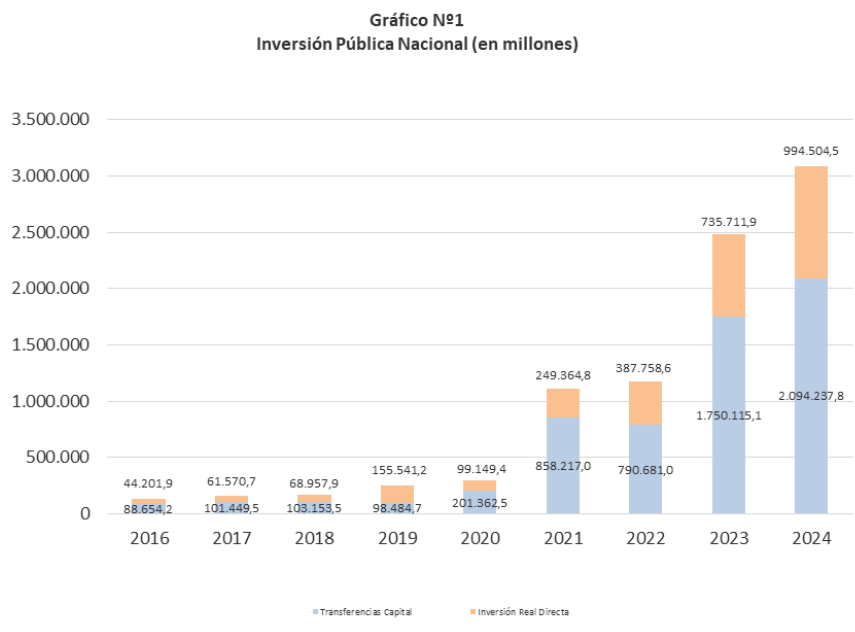

La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/2024 un devengado de \$177.724,1 millones (17,9% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realizó transferencias para gastos de capital, las cuales totalizaron \$510.872,4 millones, representando el 24,4% del crédito vigente:

¹ Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2016/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2016/2020 del FEDEI.

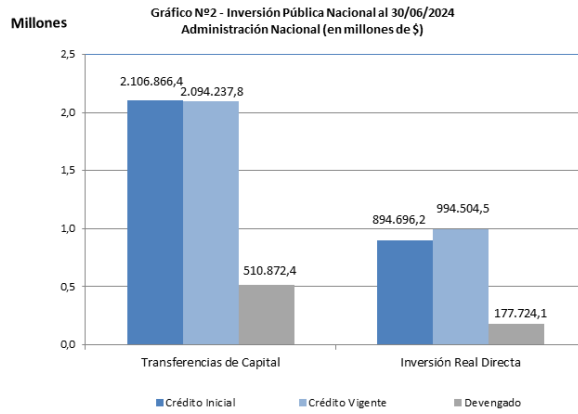

A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al 30/06/24, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro N°1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2024 (en millones de \$)
Administración Nacional


Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	894.696,2	994.504,5	177.724,1	25,8%	17,9%
Obras de Inversión	546.878,7	586.323,0	122.634,9	17,8%	20,9%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	347.817,4	408.181,6	55.089,2	8,0%	13,5%
Transferencias de Capital	2.106.866,4	2.094.237,8	510.872,4	74,2%	24,4%
Total Inversión Pública Nacional	3.001.562,5	3.088.742,3	688.596,5	100,0%	22,3%

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/06/2024 una ejecución del 22,3% del crédito vigente (más de 40 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 68,3%), representando las transferencias de capital el 74,2% del monto global ejecutado.

CAPÍTULO I: INVERSIÓN REAL DIRECTA

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto para 2024 la suma de \$994.504,5 millones, conforme a la siguiente evolución:

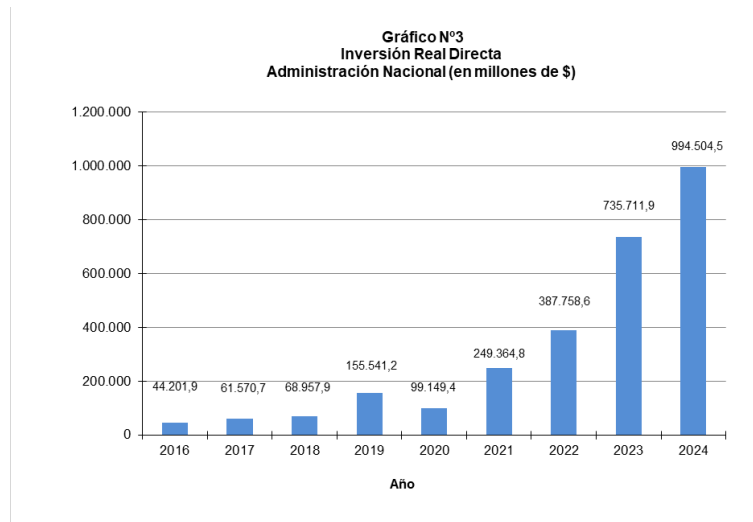

(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al 30/06/2024, por nivel institucional:

Cuadro N°2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2024 (en millones de \$)

Administración Nacional

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Administración Central	488.752,8	551.041,1	60.882,6	34,3%	11,0%
Organismos Descentralizados	399.662,1	437.207,1	115.754,3	65,1%	26,5%
Instituciones de Seguridad Social	6.281,2	6.256,3	1.087,3	0,6%	17,4%
TOTAL	894.696,2	994.504,5	177.724,1	100,0%	17,9%

La ejecución de los Organismos Descentralizados representa el 65,1% del gasto ejecutado en 2024, seguido por la Administración Central con el 34,3%. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2023:

**Cuadro N° 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/06 - Años 2023/2024 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2024 -**

Organismo	Devengado 2023	Devengado 2024	Variación
Dirección Nacional de Vialidad	119.137,8	51.335,5	-56,9
Comisión Nacional de Energía Atómica	12.967,9	32.756,1	152,6
Ministerio de Seguridad	6.177,3	17.634,0	185,5
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	5.018,9	14.011,1	179,2
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	4.884,2	9.796,0	100,6
Estado Mayor General Fuerza Aérea	5.660,9	7.290,0	28,8
Secretaría de Obras Públicas	43.144,4	5.600,4	-87,0
Secretaría de Educación	38.832,4	4.827,5	-87,6
Jefatura de Gabinete de Ministros	981,5	3.791,7	286,3
Ministerio de Salud	1.686,1	3.740,5	121,8
Secretaría de Transporte	17.462,6	2.803,6	-83,9
Subtotal	255.954,0	153.586,5	-40,0
Otros	33.259,5	24.137,6	-27,4
Total IRD	289.213,5	177.724,1	-38,5

Se aprecia la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente de los programas Construcción de Autopistas y Autovías y Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración; seguido por la Comisión Nacional de Energía Atómica (construcción Reactor de Baja Potencia CAREM y RA – 10); el Ministerio de Seguridad con las acciones de Planificación Logística y Equipamiento Federal; el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con la ampliación de plantas depuradoras, sistemas de desagües cloacales, y sistemas de agua potable; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con las misiones satelitales y la construcción de vehículos lanzadores Tronador II; la Fuerza Aérea Argentina con el alistamiento operacional en el marco del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); la Secretaría de Obras Públicas con la construcción de 10 Radars Meteorológicos Argentinos y por otra parte, la Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús en el marco del Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo; la Secretaría de Educación con las acciones de Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles; la Jefatura de Gabinete con las iniciativas de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos; el Ministerio de Salud para el desarrollo de seguros públicos de salud y acciones de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19; y la Secretaría de Transporte para la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca, Ramal Constitución - La Plata.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 39,1% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N°4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/06/2024
(en millones de \$)**

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	374.787,4	406.848,3	69.524,4	39,1%	17,1%
Financiamiento Externo	166.917,8	176.159,6	48.343,2	27,2%	27,4%
Transferencias Internas	125.492,3	125.492,3	26.069,9	14,7%	20,8%
Crédito Interno	53.618,0	53.618,0	16.869,8	9,5%	31,5%
Recursos Afectación Específica	154.093,1	208.371,8	13.354,0	7,5%	6,4%
Recursos Propios	19.787,5	24.014,5	3.562,8	2,0%	14,8%
TOTAL	894.696,2	994.504,5	177.724,1	100,0%	17,9%

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, a la Comisión Nacional de Energía Atómica para la construcción del Reactor de Baja Potencia Carem Fase II (\$15.043,6 millones) y del Reactor RA-10 (\$8.717,7 millones); al Ministerio de Seguridad para la planificación logística y equipamiento federal (\$12.675,1 millones); a la Fuerza Aérea Argentina para las adquisiciones en el marco del Fondo Nacional de la Defensa FONDEF (\$7.010,8 millones); y a la Dirección Nacional de Vialidad principalmente para la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red por administración (\$2.085,7 millones). Respecto de las fuentes de **Financiamiento Externo** se destaca el gasto del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento correspondió a infraestructura para el saneamiento por \$13.884,5 millones; y el de la Dirección Nacional de Vialidad por \$8.005,4 millones principalmente para la construcción de autopistas y autovías por \$5.041,5 millones y para la ejecución obras de rehabilitación y mantenimiento en red por sistema de gestión integral por \$2.645,8 millones. Asimismo, el gasto de la Secretaría de Educación con destino al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles por \$4.110,7 millones. Por otra parte, el gasto en **Transferencias Internas** correspondió casi en su totalidad a obras de la Dirección Nacional de Vialidad (\$25.707,1 millones) principalmente para la construcción de autopistas y autovías (\$7.226,8 millones) y para la ejecución de obras, operación y mantenimiento en corredores viales (\$6.510,1 millones). Por último, en el gasto correspondiente al **Crédito Interno** (\$16.869,8 millones) se destacan las acciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica principalmente destinado a las misiones satelitales (\$3.466,7 millones) y a las acciones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para la construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM (\$3.583,0 millones) y del Reactor RA-10 (\$4.124,0 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro, que concentraron el 70,3% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$69.232,5 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica mayormente en esta jurisdicción.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron \$33.765,4 millones, destacándose la la construcción del Reactor RA-10 en el marco de la Comisión Nacional de Energía Atómica (\$12.835,7 millones). Por otro lado, se destaca construcción de autopistas y autovías de rutas nuevas y obras de pavimentación, de la Dirección Nacional de Vialidad, en particular la Autopista Presidente Juan Domingo Perón, la obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista, la construcción de distribuidor en acceso (\$1.984,4 millones) y la Variante Cañuelas de la Ruta Nacional N° 3 / 205 (\$1.474,8 millones). En la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron \$7.728,1 millones, de los cuales \$2.645,8 millones competen a rehabilitación y mantenimiento en red por sistema de gestión integral para la Malla 513C, Ruta Nacional N° 0012, Tramo Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial N° 32; y \$1.076,5 millones a la construcción de rutas seguras. En la

provincia de **Córdoba** se ejecutaron \$7.272,3 millones, destinados principalmente a las misiones satelitales (\$2.245,3 millones) y a la construcción de vehículos lanzadores Tronador II (\$1.660,4 millones) de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Por último, en la provincia de **Río Negro** se ejecutaron \$6.895,6 millones, de los cuales \$2.876,3 millones se ejecutaron en la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes y \$1.323,2 millones en la construcción de sistema de desagües cloacales para la localidad de Catriel.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera de 2024:

Cuadro N° 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2023	Devengado 30/06/2024	% Dev. Ac.30/06/24 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	6.361.000,0	1.157.304,5	48.171,0	19,0%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	862.264,3	51.346,5	18.626,6	8,1%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	251.177,3	28.527,3	5.880,2	13,7%
Construcción de Reactor RA-10	156.061,5	32.457,6	12.841,6	29,0%
Construcción de Jardines de Infantes	138.332,4	10.392,0	4.110,7	10,5%
Total (Proyectos de gran envergadura)	7.768.835,4	1.280.027,9	89.630,1	17,6%

(*) Costo total de obras de inversión extraído de BAPIN. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión destacadas, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 17,6% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia, a los fines de contextualizar el análisis del presente apartado. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

Se lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional mediante obras nuevas y obras de mantenimiento. En la construcción de autopistas, se encontraban en construcción al trimestre 715,49 kilómetros en distintas obras de inversión. Asimismo, en el marco de los Sistemas de Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales los kilómetros rehabilitados alcanzaron a 1.598,1, en promedio, al 30/06.

Por otra parte, en las Obras de Repavimentación se encontraban en ejecución 524,17 kilómetros. Asimismo, en las acciones de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/06/24 estuvieron en construcción 1.620,7 metros de obras en puentes. Respecto de las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias, al cierre del primer semestre se finalizaron dos iniciativas y 48 se encontraban en ejecución.

En relación a la Construcción de Rutas Seguras, se encontraban en construcción 186,54 kilómetros, mientras la Construcción de Túneles y Puentes Grandes registró 11,92 kilómetros en

ejecución de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial y 740 metros en construcción de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles.

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional en el segundo trimestre se encontraban 2 obras civiles en ejecución. Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte se encontraban en ejecución 3 intervenciones con una intervención finalizada.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/06/24 en el marco del Plan Espacial Nacional se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro N° 6: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Respecto de la serie SAOCOM 1, Satélite Argentino de Observación con radar de Microondas, formada por el satélite SAOCOM 1ª y por el satélite SAOCOM 1B, que llevan a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) en banda L, compuesto por 7 paneles con una superficie total de 35 metros cuadrados y un peso de 1,5 toneladas. El objetivo es generar información útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y proveer datos sobre humedad de suelo, con beneficios para la actividad productiva nacional, entre otros. Los satélites SAOCOM contribuyen a la gestión de emergencias y al desarrollo económico. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 99,90%. Por otra parte, la Misión SABIAMAR se dedica esencialmente a la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. La obra alcanzó al 30/06 un avance físico acumulado de 97,49%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor, se asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina; consolidará las capacidades para desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas. Al 30/06/24, el proyecto registra un avance físico acumulado de 79,71% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de \$45.299,2 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes

centrales nucleares, entre otras. Al 30/06/24 se registra un avance físico acumulado de 63,75% y una ejecución financiera acumulada de \$69.973,1 millones.

Secretaría de Educación

Construcción de Jardines: Se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, conforme la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina.

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto al 30/06/24 ascendió a \$55.089,2 millones, financiado principalmente por Tesoro Nacional (64,5%), seguido por Crédito Externo (25,4%) y Recursos Propios (4,9%), exponiéndose los diversos conceptos que representan el 86,2% del gasto en maquinaria, equipos y otros al 30/06/24.

Cuadro N°7: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/24 (en millones de pesos)
- según crédito vigente-

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Acciones para la Seguridad	39.474,3	63.739,5	18.368,4	33,3%	28,8%
Acciones para la Defensa	35.894,8	38.825,2	9.589,7	17,4%	24,7%
Fortalecimiento del Transporte	22.455,9	27.450,2	3.648,2	6,6%	13,3%
Equipamiento para Salud	20.042,3	24.329,0	4.099,7	7,4%	16,9%
Equipamiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación	15.771,9	16.803,1	2.235,7	4,1%	13,3%
Equipamiento Asociado a Dirección Ejecutiva	11.945,9	15.547,6	4.636,0	8,4%	29,8%
Administración Gubernamental	9.505,9	13.236,4	1.873,1	3,4%	14,2%
Ecología y Desarrollo Sostenible	10.331,7	9.678,6	3.016,8	5,5%	31,2%
Subtotal	165.422,7	209.609,6	47.467,6	86,2%	22,6%
Otros	182.394,7	198.571,9	7.621,6	13,8%	3,8%
Total	347.817,4	408.181,6	55.089,2	100,0%	13,5%

Acciones para la Seguridad

Al 30/06/24 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de \$18.368,4 millones (33,3% del gasto global en equipamiento), destacándose las adquisiciones del Ministerio de Seguridad en el marco de las acciones de planificación logística y equipamiento federal (\$12.675,1 millones) y para el Programa Federal de Seguridad (\$2.444,7 millones).

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó \$9.589,7 millones al 30/06/24, el 17,4% del total en equipamiento, principalmente destinado al gasto del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en el marco de las acciones de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea (\$7.290,0 millones). Entre los principales proyectos se pueden destacar: la recuperación de 34 Aeronaves de Transporte de corto y mediano alcance en la II Brigada Aérea y la recuperación de 18 aviones A-4R para la conservación de la capacidad de operaciones aeroespaciales en la V Brigada Aérea.

Fortalecimiento del Transporte

En relación con el Fortalecimiento del Transporte, al 30/06/24 se devengaron \$3.648,2 millones que corresponden al 4,1% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad por \$3.164,5 millones.

Equipamiento para Salud

Respecto del gasto en equipamiento para salud, se ejecutaron \$4.099,7 millones (7,4% del total devengado en equipamiento) de los cuales \$3.722,6 millones se devengaron en el marco de las acciones del Ministerio de Salud, de los cuales \$1.716,7 millones se destinaron al desarrollo de seguros públicos de salud y \$1.344,5 millones al equipamiento de las acciones de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19.

Equipamiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación

Al 30/06/24 se destinaron \$2.235,7 millones a equipos para ciencia, técnica e innovación, 4,1% del total destinado a equipamiento. Al respecto, \$1.115,7 millones financiaron equipamiento para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbrán en acciones prevención, control e investigación de patologías en salud, y \$425,5 millones competen a la Comisión Nacional de Energía Atómica principalmente para servicios operativos de apoyo. En relación al gasto correspondiente a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales se devengaron \$239,5 millones principalmente para la operación de estaciones terrenas y prestaciones de servicios tecnológicos.

Equipamiento Asociado a Dirección Ejecutiva

Al 30/06/24 se destinaron \$4.636,0 millones para el equipamiento en el marco de acciones de administración general, entre las que se destaca el gasto en la inclusión digital e innovación de los servicios públicos (81,5% del total) para la adquisición de infraestructura tecnológica para los centros de datos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Administración Gubernamental

Respecto de las acciones de administración gubernamental, al 30/06/24 se devengaron \$1.873,1 millones en su mayoría en las acciones correspondientes al Registro Nacional de las Personas destinado a la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional (\$1.611,0 millones) y el equipamiento de la Dirección Nacional de Migraciones (\$257,0 millones) para el control de ingresos y egresos, admisión y permanencia de personas dentro del Territorio.

Ecología y Desarrollo Sostenible


Al 30/06/24 se destinaron \$3.016,8 millones a acciones de ecología y desarrollo sostenible, principalmente en el marco de las acciones de la Administración de Parques Nacionales (\$1.317,7 millones) destinado en su mayoría a la iniciativa de recuperación sustentable de paisajes y medios de vida en Argentina. Asimismo, en el marco de las acciones de

ambiente, se financiaron \$1.072,7 millones para el fomento a la gestión integral de residuos sólidos urbanos.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2016-2024 se puede apreciar en el siguiente gráfico².

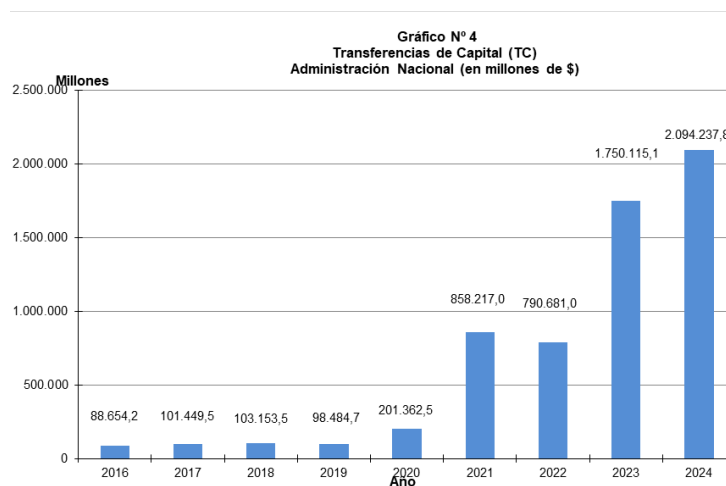

1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N°8: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2024 (en millones de \$)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	1.931.706,8	1.988.496,8	502.323,1	98,3%	25,3%
Organismos Descentralizados	175.159,6	105.741,0	8.549,3	1,7%	8,1%
TOTAL	2.106.866,4	2.094.237,8	510.872,4	100,0%	24,4%

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/24 y la variación interanual respecto al ejercicio 2023:

² Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2016/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2016/2020 la ejecución del FEDEL.

Cuadro N° 9: Ejecución Transferencias de Capital al 30/06/24
(en millones de pesos) – según Ejecución 2024

Organismo	Ejecución 2023	Ejecución 2024	Variación
Secretaría de Energía	30.018,3	185.626,7	518,4
Obligaciones a Cargo del Tesoro	230.577,5	152.203,3	-34,0
Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda	109.004,9	146.118,6	34,0
Secretaría de Transporte	6.044,9	5.961,0	-1,4
Ministerio de Salud	1.776,2	5.613,9	216,1
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	25.290,4	5.196,3	-79,5
Ministerio del Interior	8.313,0	3.354,5	-59,6
Secretaría de Obras Públicas	91.817,5	2.259,2	-97,5
Subtotal	502.842,8	506.333,5	0,7
Otros	159.548,7	4.538,9	-97,2
Total Transferencias de Capital	662.391,4	510.872,4	-22,9

En lo que respecta a las transferencias correspondientes al periodo 2024, la Secretaría de Energía realizó erogaciones por \$185.626,7 millones, de los cuales \$185.346,0 millones fueron destinados como Apoyo al Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, realizado como Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Por el lado de la jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro, la misma realizó transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) por \$75.000,0 millones, a Energía Argentina S.A. por \$66.000,0 millones, a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$5.515,0 millones, a Operador Ferroviario S.E. \$3.183,1 millones, y a las Autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo por \$2.294,4 millones.

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda realizó asistencias financieras por \$146.118,6 millones, de los cuales \$81.461,3 millones se destinaron al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) y \$62.252,8 millones se destinaron al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

La Secretaría de Transporte devengó \$5.961,0 millones, de los cuales \$4.830,2 millones se destinaron a la Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires, en la Línea Mitre, y \$1.130,8 millones tuvieron como destino la Renovación Integral del Ramal M correspondiente al Ferrocarril Belgrano Sur, tramo Tapiales – Marinos del Crucero General Belgrano.

En cuanto al Ministerio de Salud, las erogaciones del mismo como asistencias financieras fueron de \$5.613,9 millones, y las mismas estuvieron destinadas a las provincias para financiar el funcionamiento de distintos hospitales, cómo: Hospital El Cruce de Florencio Varela (\$2.150,0 millones), Hospital Garrahan (\$1.500,0 millones), Hospital Presidente Néstor Kirchner (\$1.059,5 millones), y al Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría (\$653,6 millones). Y por otro lado, se destinaron \$58,5 millones hacia el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en concepto de Acciones Vinculadas a la Gestión por Resultados en Salud para la Atención de la Población Adulta Mayor.

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) realizó transferencias por \$5.196,3 millones, de las cuales \$2.866,4 millones se realizaron a provincias para el desarrollo de obras de saneamiento y agua potable del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) y por otro lado, se realizaron transferencias a las administraciones provinciales por \$2.298,8 millones para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas. Además, de las transferencias en el marco del Plan Argentina Hace por \$31,7 millones para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento.

El Ministerio del Interior realizó transferencias a las provincias por el monto de \$2.689,1 millones en concepto del Fortalecimiento de la Gestión Provincial. Por otro lado, se ejecutaron \$665,4 millones en concepto de Asistencia Financiera para la Mejora de los Gobiernos Locales, a través de la iniciativa "Municipios de Pie".

Por último, la Secretaría de Obras Públicas ejecutó \$2.259,2 millones en concepto de: Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento para el AMBA (\$797,8 millones), Ejecución de Obras de Infraestructura de Saneamiento Norte Grande (\$558,9 millones), Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento - Plan Belgrano (\$467,2 millones), Infraestructura Hídrica del Norte Grande (\$422,9 millones), entre otros.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro N°10: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/06/2024 (en millones de \$)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	1.062.264,9	1.238.475,1	263.881,9		51,7%
Financiamiento Externo	514.539,5	571.822,5	200.685,2		39,3%
Crédito Interno	416.268,8	207.109,6	45.095,7		8,8%
Recursos con Afectación Específica	81.980,6	45.018,1	0,0		0,0%
Transferencias Internas	25.822,9	25.822,9	0,0		0,0%
Recursos Propios	5.989,6	5.989,6	1.209,6		0,2%
TOTAL	2.106.866,4	2.094.237,8	510.872,4		100,0%

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en las transferencias realizadas, a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) por \$75.000,0 millones, a Energía Argentina S.A. por \$66.000,0 millones, al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social por \$62.252,8 millones, y al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) por \$36.391,8 millones. Además, en el marco de la Asistencia Financiera a Empresas del Sector Ferroviario, se realizaron transferencias a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por \$5.515,0 millones y a Operador Ferroviario S.E. por \$3.183,1 millones. Por otro lado, mencionar las transferencias realizadas para el funcionamiento de distintos hospitales por \$5.555,4 millones, entre los cuales se destacan: el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Garrahan, o el Hospital Presidente Néstor Kirchner, entre otros. Para finalizar, y en relación a la Asistencia Técnico - Financiera y el Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento, se realizaron transferencias en Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y

Agua Potable del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) por \$2.866,4 millones y transferencias para Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas por \$2.298,2 millones.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió, prácticamente, en un 100,0% a **Crédito Externo**, y fue aplicado principalmente a las Asistencias Financieras a Empresas Públicas, particularmente, a la empresa Energía Argentina S.A. por \$185.346,0 millones, con el fin de dar Apoyo al Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte. Por otro lado, se transfirieron \$7.002,1 millones a las provincias, con el fin de promover el Fortalecimiento de la Gestión Provincial, el Mejoramiento Integral del Hábitat y Mejoramientos de Barrios (PROMEBA V), entre otros. Asimismo, desde la Secretaría de Transporte, se transfirieron \$5.961,0 a la empresa Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. para la Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires, a través de la Línea Mitre y la Renovación Integral del Ramal M del Ferrocarril Belgrano Sur, Tramo Tapiales - Marinos del Crucero-General.

El **Crédito Interno** financió solamente transferencias al: Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) por \$45.069,6 millones, a Cooperativas de Servicios públicos (\$22,2 millones) en el marco de la Promoción, Capacitación y Fomento Cooperativo Mutuo por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y a Entidades Mutuales (\$4,0 millones).

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (54,5% del monto global). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** (\$263.518,1 millones) debe considerarse que diversas iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** (\$8.968,4 millones) se destacaron, entre otras, las transferencias a las provincias (\$4.817,6 millones), a las Autoridades de la Cuenca Matanza Riachuelo (\$1.712,6 millones), a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (\$1.130,8 millones), AySA S.A. (\$810,2 millones) y a las Cooperativas de Servicios Públicos (\$284,5 millones). En la provincia de **Córdoba** (\$3.585,3 millones) se destacaron las transferencias para las Administraciones Provinciales, en Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable, al desarrollo de Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas, y para el Mejoramiento Integral del Hábitat; asimismo se realizaron transferencias para Cooperativas de Servicios Públicos, Asistencia Financiera para la Mejora de los Gobiernos Locales a través de la iniciativa "Municipios de Pie", para Infraestructura Social y la ejecución del Plan "Argentina Hace". En total, estas transferencias correspondieron al 98,4% del total de las transferencias a la provincia (\$3.526,6 millones). Por último, en las transferencias a la provincia de

Santa Fe (\$2.247,7 millones), se destacan las mismas hacia la Administración Provincial, en mayor parte, destinadas al Fortalecimiento de la Gestión Provincial, al Mejoramiento Integral del Hábitat y de Barrios, y para Obras de Infraestructura de Agua Potable y Desagües en Áreas Urbanas. A su vez, se destinaron transferencias al Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos, buscando Financiamiento y Divulgación en Ciencia y Técnica. Además, se destinaron erogaciones para Asistencia a Municipios para Infraestructura Social en el marco del plan "Municipios de Pie", y para Entidades Mutuales en el marco de la Promoción, Capacitación y Fomento Cooperativo Mutuo. Estas iniciativas representaron el 91,7% del total de las erogaciones de la provincia.

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al 30/06/24, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro N° 11: Ejecución por Beneficiario al 30/06/24 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Sector Público Empresarial	342.306,8	67,0%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	146.067,0	28,6%
Gobiernos Provinciales	18.926,8	3,7%
Gobiernos Municipales	808,2	0,2%
Otros	2.763,6	0,5%
Total	510.872,4	100,00%

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones al Sector Público Empresarial, a los Fondos Fiduciarios y otros Entes; y a gobiernos provinciales. En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las asistencias financieras a las firmas Energía Argentina S.A. (\$251.346,0 millones), AySA (\$75.810,2 millones), Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (11.476,0 millones), y Operador Ferroviario S.E. (\$3.183,1 millones) acumulando, prácticamente, el 100,0% de la categoría.

Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) (\$81.461,3 millones), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (\$62.252,8 millones) y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (2.294,4 millones).

Respecto de las transferencias a **Gobiernos Provinciales** se destacan las transferencias que tienen como destino distintos hospitales públicos por \$5.555,4 millones, para la asistencia técnico - financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento (\$5.074,3 millones) en particular las destinadas al PROFESA (\$2.776,2 millones), y obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas (\$2.298,2 millones). Asimismo, se destacan las asistencias para el Fortalecimiento de la Gestión Provincial (\$2.689,1 millones), entre otras transferencias.

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 97,3% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/06/24:

Cuadro N° 12: Principales transferencias de capital al 30/06/24 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Asistencia Financiera al Sistema Energético	560.125,7	618.531,9	251.626,7	49,3%	40,7%
Acciones de Vivienda	435.832,4	435.832,4	146.118,6	28,6%	33,5%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	320.094,0	320.094,0	82.455,5	16,1%	25,8%
Políticas de Transporte	281.534,5	212.001,1	15.338,0	3,0%	7,2%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	105.307,4	104.496,3	1.144,2	0,2%	1,1%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo	28.759,6	28.759,6	2.392,3	0,5%	8,3%
SubTotal	1.731.653,7	1.720.211,2	499.075,3	97,7%	29,0%
Otros	375.212,7	374.026,6	11.797,1	2,3%	3,2%
Total	2.106.866,4	2.094.237,8	510.872,4	100,0%	24,4%

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/24 el sector energético recibió \$251.626,7 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 49,3% de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 13: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 30/06/24 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Energía Argentina S.A.	251.346,0	99,9%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	280,7	0,1%
Resto	0,0	0,0%
Total	251.626,7	100,0%

De acuerdo a la información del cuadro, se destacan las transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. por \$251.346,0 millones, principalmente para Asistencia Financiera para la ejecución de diversas obras de infraestructura energética, como el Apoyo al Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte. Además, se realizaron transferencias a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, por \$280,7 millones destinadas para Acciones de Apoyo al Incremento de Eficiencia del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

Acciones de Vivienda

Al 30/06/24 se devengaron \$146.118,6 millones para la construcción de viviendas, principalmente de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales. Estas asistencias financieras representaron el 28,6% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas:

Cuadro N° 14: Acciones de Vivienda al 30/06/24 (en millones de pesos)

Iniciativa	Devengado	% Part. Devengado
PROCREAR	81.461,3	55,8%
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	62.252,8	42,6%
Resto	2.404,5	1,6%
Total	146.118,6	100,0%

Conforme al cuadro precedente, se destinaron \$81.461,3 millones (55,8% del total) para el Fondo PROCREAR que realiza la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Asimismo, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social financia programas sociales habitacionales e infraestructura básica, representando el 42,6% del total devengado.

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de \$82.445,5 millones al 30/06/24, de los cuales se destinaron transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) para ayuda financiera y para obras de Agua Potable y Saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por \$75.810,2 millones. Por otra parte, las provincias recibieron transferencias por \$6.523,3 millones, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento, agua potable, desagües en áreas urbanas e infraestructura hídrica. Asimismo, se transfirieron \$122,0 millones para infraestructura de agua potable y saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace.

Políticas de Transporte

Al 30/06/24 se devengaron \$15.338,0 millones bajo este concepto, destinándose el 74,8% a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. para la Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte y Asistencia Financiera. El 20,8% se destinó a Operador Ferroviario S.E., para asistencia financiera; y además, se destinó el 3,4% a las Provincias para Ejecución de Obras de Infraestructura Vial Regional.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/24 se devengaron \$1.144,2 millones con destino a acciones de infraestructura y equipamiento educativo, destinándose el 100,0% a instituciones de enseñanza provinciales.

Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

Al 30/06/24 se destinaron \$2.392,3 millones en asistencias financieras, de las cuales el 95,9% se realizaron en el marco de las acciones de ecología y medio ambiente, y el 4,1%

restante en acciones de salud. El mayor beneficiario de las transferencias resultó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo con \$2.294,4 millones (95,9% del total) destinados principalmente al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo, y el 4,1% restante (\$97,9 millones) fue destinado a la Administración Provincial en conceptos de transferencias para el Funcionamiento del Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner.
